

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Norme employée : AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)
Date du repérage : 12/06/2025
Heure d'arrivée : 08 h 30
Date émission : 23/06/2025

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **IUT SAINT-NAZAIRE
BATIMENT 6
58 RUE MICHEL ANGE
44600 ST NAZAIRE**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Sanitaires**

Propriétaire

Nom : **NANTES UNIVERSITE**
Adresse : **1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTES**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) : **Autre**
Nom : **NANTES UNIVERSITE**
Adresse : **1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTES**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, allée Pierre-Gilles de Gennes
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00027**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2025**

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	COU Hervé	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 09/04/2024 Échéance : 08/04/2031 N° de certification : 24-2497
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	COU Hervé	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 09/04/2024 Échéance : 08/04/2031 N° de certification : 24-2497

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	6
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	7
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	10
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.	10
	D.6. Zones non visitées.....	11
E.	Annexes au rapport.....	12
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	12
	E.2. Planches de repérage.....	19
	E.3. Résultats d'analyses.....	22

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **12/06/2025**

Type de bâtiment : **IUT**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Le donneur d'ordre

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Néant

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	7 rue Pierre Adolphe Bobierre - 44308 NANTES	1-5597



Programme de travaux

Réhabilitation des blocs sanitaires



C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Colle de plinthe carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC - Sanitaires	Enduit ciment (A)+ peinture de Cueillie (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 1 - Sanitaires Hommes; Étage 1 - Sanitaires Femmes
Conduit fibres-ciment (Après analyse en laboratoire) Localisation : Étage 2 - Sanitaires Femmes; Étage 2 - Sanitaires Hommes	

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.



D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- ❖ RDC - Sanitaires
- ❖ Étage 2 - Sanitaires Femmes

- ❖ Étage 1 - Sanitaires Hommes
- ❖ Étage 2 - Sanitaires Hommes

- ❖ Étage 1 - Sanitaires Femmes



D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
RDC - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0003 Description : Colle de plinthe carrelage	Après analyse en laboratoire (P0003)
Étage 1 - Sanitaires Hommes; Étage 1 - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0020 Description : Enduit ciment (A)+ peinture de Cueillie	Après analyse en laboratoire (P0020)
Étage 2 - Sanitaires Femmes; Étage 2 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0029 Description : Conduit fibres-ciment	Après analyse en laboratoire (P0036; P0049)



D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
RDC - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0001 (P0001) Description : Colle de carrelage de sol
RDC - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0002 (P0002) Description : Colle + ragréage
RDC - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0004 (P0004) Description : Joint d'étanchéité de canalisation d'EU
RDC - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0005 (P0005) Description : Enduit plâtre sur cloison béton
RDC - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0006 (P0006) Description : Colle de faïence
RDC - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0007 (P0007) Description : Enduit plâtre sur mur béton
RDC - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0008 (P0008) Description : Faux plafond
RDC - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0009 (P0009) Description : Enduit ciment + peinture de plafond
RDC - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0010 (P0010) Description : Joint Scotch d'étanchéité de canalisation d'EU
RDC - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0011 (P0011) Description : Joint d'étanchéité de canalisation d'EU
RDC - Sanitaires	Identifiant : ZPSO-0012 (P0012) Description : Peinture murale
Étage 1 - Sanitaires Hommes; Étage 1 - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0013 (P0013) Description : Colle de carrelage de sol
Étage 1 - Sanitaires Hommes; Étage 1 - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0014 (P0014) Description : Colle + ragréage
Étage 1 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0015 (P0015) Description : Joint d'étanchéité de canalisation d'EU
Étage 1 - Sanitaires Hommes; Étage 1 - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0016 (P0016; P0033) Description : Enduit plâtre sur cloison béton
Étage 1 - Sanitaires Hommes; Étage 1 - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0017 (P0017; P0026) Description : Joint d'étanchéité de canalisation de VMC
Étage 1 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0018 (P0018) Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)
Étage 1 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0018-2 (P0018-2) Description : Matériau fibreux de type isolant (jaune)
Étage 1 - Sanitaires Hommes; Étage 1 - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0019 (P0019; P0029) Description : Enduit ciment + peinture de plafond



Localisation	Description du matériau
Étage 1 - Sanitaires Hommes; Étage 1 - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0021 (P0021; P0028) Description : Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)
Étage 1 - Sanitaires Hommes; Étage 1 - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0021-2 (P0021-2) Description : Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
Étage 1 - Sanitaires Hommes; Étage 1 - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0021-2 (P0028-2) Description : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (clair)
Étage 1 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0022 (P0022) Description : Peinture murale
Étage 1 - Sanitaires Hommes; Étage 1 - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0023 (P0023; P0035) Description : Colle de faïence
Étage 1 - Sanitaires Hommes; Étage 1 - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0024 (P0024) Description : Colle de plinthe carrelage
Étage 1 - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0025 (P0025; P0032) Description : Joint d'étanchéité d'évier
Étage 1 - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0026 (P0027) Description : Colle mousse antivibratoire
Étage 1 - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0027 (P0031) Description : Toile de verre + colle
Étage 1 - Sanitaires Hommes; Étage 1 - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0028 (P0034) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Étage 2 - Sanitaires Femmes; Étage 2 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0030 (P0037) Description : Colle de carrelage de sol
Étage 2 - Sanitaires Femmes; Étage 2 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0031 (P0038) Description : Colle + ragréage
Étage 2 - Sanitaires Femmes; Étage 2 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0032 (P0039) Description : Colle de plinthe carrelage
Étage 2 - Sanitaires Femmes; Étage 2 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0033 (P0040; P0050) Description : Enduit plâtre sur mur béton
Étage 2 - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0034 (P0041) Description : Toile de verre + colle
Étage 2 - Sanitaires Femmes; Étage 2 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0035 (P0042; P0052) Description : Colle de faïence
Étage 2 - Sanitaires Femmes; Étage 2 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0036 (P0043) Description : Faux plafond
Étage 2 - Sanitaires Femmes; Étage 2 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0037 (P0044; P0053) Description : Enduit ciment + peinture de plafond
Étage 2 - Sanitaires Femmes; Étage 2 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0038 (P0045) Description : Enduit plâtre + peinture de cueillie
Étage 2 - Sanitaires Femmes; Étage 2 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0039 (P0046) Description : Joint d'étanchéité de canalisation de VMC



Localisation	Description du matériau
Étage 2 - Sanitaires Femmes; Étage 2 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0040 (P0047; P0051) Description : Enduit plâtre sur cloison béton
Étage 2 - Sanitaires Femmes; Étage 2 - Sanitaires Hommes	Identifiant : ZPSO-0041 (P0048; P0054) Description : Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural
Étage 1 - Sanitaires Hommes; Étage 1 - Sanitaires Femmes	Identifiant : ZPSO-0042 (P0030) Description : Enduit ciment + peinture de Cueillie



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **ST NAZAIRE**, le **23/06/2025**

Par : **COU Hervé**

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - 102, route de Limours - Bat A6 - 78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE**

E. Annexes au rapport

E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Colle de carrelage de sol	RDC - Sanitaires	
P0002	Colle + ragréage	RDC - Sanitaires	
P0003	Colle de plinthe carrelage	RDC - Sanitaires	
P0004	Joint d'étanchéité de canalisation d'EU	RDC - Sanitaires	
P0005	Enduit plâtre sur cloison béton	RDC - Sanitaires	
P0006	Colle de faïence	RDC - Sanitaires	
P0007	Enduit plâtre sur mur béton	RDC - Sanitaires	
P0008	Faux plafond	RDC - Sanitaires	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0009	Enduit ciment + peinture de plafond	RDC - Sanitaires	
P0010	Joint Scotch d'étanchéité de canalisation d'EU	RDC - Sanitaires	
P0011	Joint d'étanchéité de canalisation d'EU	RDC - Sanitaires	
P0012	Peinture murale	RDC - Sanitaires	
P0013	Colle de carrelage de sol	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0014	Colle + ragréage	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0015	Joint d'étanchéité de canalisation d'EU	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0016	Enduit plâtre sur cloison béton	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0017	Joint d'étanchéité de canalisation de VMC	Étage 1 - Sanitaires Hommes	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0018	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0018-2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0019	Enduit ciment + peinture de plafond	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0020	Enduit ciment (A)+ peinture de Cueillie	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0021	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0021-2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0022	Peinture murale	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0023	Colle de faïence	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0024	Colle de plinthe carrelage	Étage 1 - Sanitaires Hommes	
P0025	Joint d'étanchéité d'évier	Étage 1 - Sanitaires Femmes	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0026	Joint d'étanchéité de canalisation de VMC	Étage 1 - Sanitaires Femmes	
P0027	Colle mousse antivibratoire	Étage 1 - Sanitaires Femmes	
P0028	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Étage 1 - Sanitaires Femmes	
P0028-2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (clair)	Étage 1 - Sanitaires Femmes	
P0029	Enduit ciment + peinture de plafond	Étage 1 - Sanitaires Femmes	
P0030	Enduit ciment + peinture de Cueillie	Étage 1 - Sanitaires Femmes	
P0031	Toile de verre + colle	Étage 1 - Sanitaires Femmes	
P0032	Joint d'étanchéité d'évier	Étage 1 - Sanitaires Femmes	
P0033	Enduit plâtre sur cloison béton	Étage 1 - Sanitaires Femmes	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0034	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 1 - Sanitaires Femmes	
P0035	Colle de faïence	Étage 1 - Sanitaires Femmes	
P0036	Conduit fibres-ciment	Étage 2 - Sanitaires Femmes	
P0037	Colle de carrelage de sol	Étage 2 - Sanitaires Femmes	
P0038	Colle + ragréage	Étage 2 - Sanitaires Femmes	
P0039	Colle de plinthe carrelage	Étage 2 - Sanitaires Femmes	
P0040	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 2 - Sanitaires Femmes	
P0041	Toile de verre + colle	Étage 2 - Sanitaires Femmes	
P0042	Colle de faïence	Étage 2 - Sanitaires Femmes	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0043	Faux plafond	Étage 2 - Sanitaires Femmes	
P0044	Enduit ciment + peinture de plafond	Étage 2 - Sanitaires Femmes	
P0045	Enduit plâtre + peinture de cueillie	Étage 2 - Sanitaires Femmes	
P0046	Joint d'étanchéité de canalisation de VMC	Étage 2 - Sanitaires Femmes	
P0047	Enduit plâtre sur cloison béton	Étage 2 - Sanitaires Femmes	
P0048	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage 2 - Sanitaires Femmes	
P0049	Conduit fibres-ciment	Étage 2 - Sanitaires Hommes	
P0050	Enduit plâtre sur mur béton	Étage 2 - Sanitaires Hommes	
P0051	Enduit plâtre sur cloison béton	Étage 2 - Sanitaires Hommes	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0052	Colle de faïence	Étage 2 - Sanitaires Hommes	
P0053	Enduit ciment + peinture de plafond	Étage 2 - Sanitaires Hommes	
P0054	Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural	Étage 2 - Sanitaires Hommes	


E.2. Planches de repérage

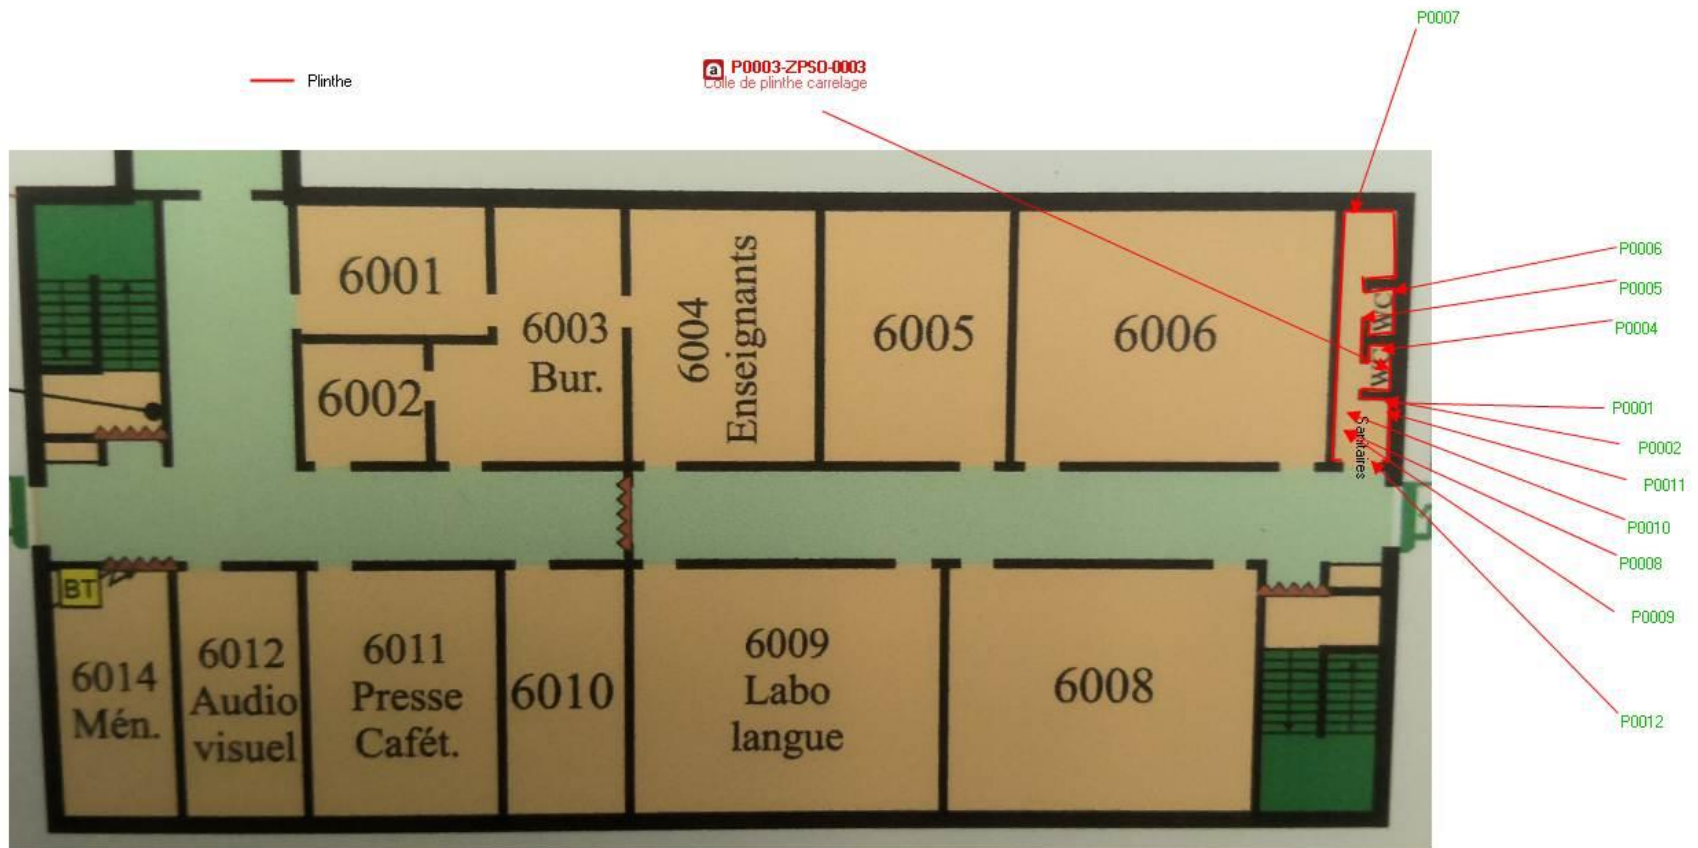

Annexe au rapport : UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01

Propriétaire : NANTES UNIVERSITE
1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTESBien : IUT SAINT-NAZAIRE
BATIMENT 6
58 RUE MICHEL ANGE
44600 ST NAZAIREEtabli par : COU Hervé
Société : AED Groupe
Le : 23/06/2025Croquis 1 / 3
Version : V01
du : 23/06/2025

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

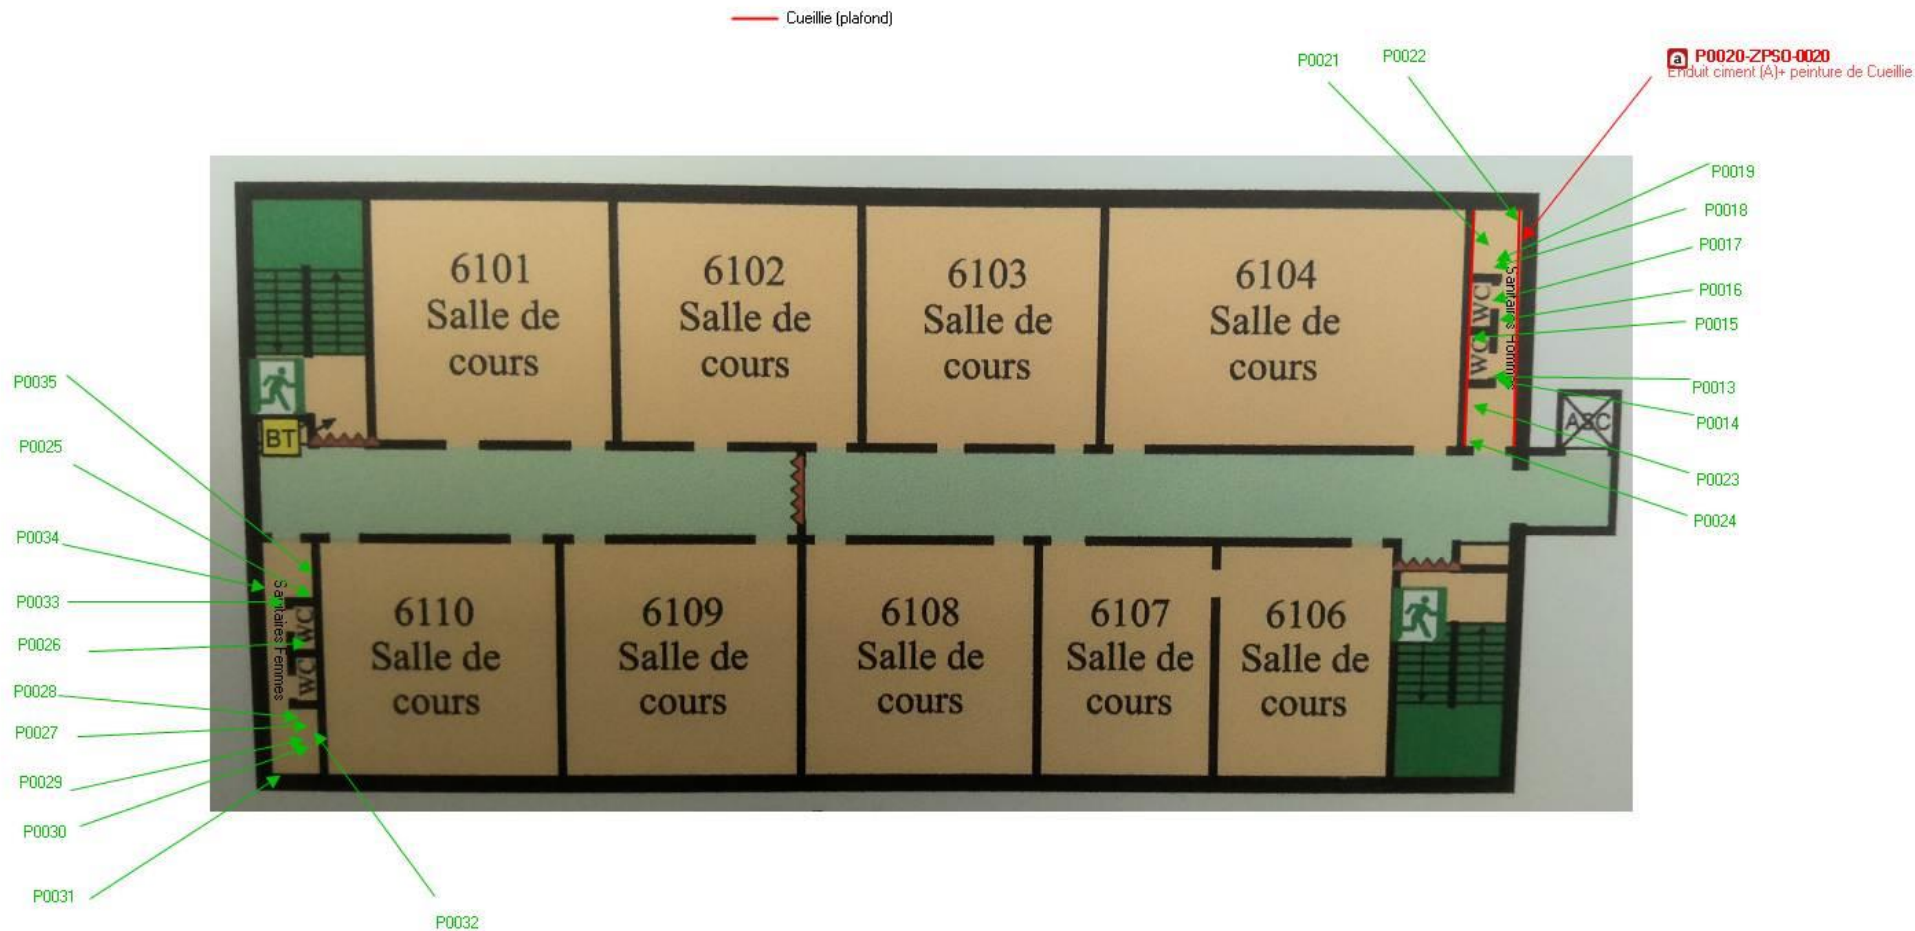Annexe au rapport : **UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01**


Propriétaire : NANTES UNIVERSITE
1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTES

Bien : IUT SAINT-NAZAIRE
BATIMENT 6
58 RUE MICHEL ANGE
44600 ST NAZAIRE

Etabli par :	COU Hervé
Société :	AED Groupe
Le :	23/06/2025

Croquis 2 / 3	
Version :	V01
du :	23/06/2025

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

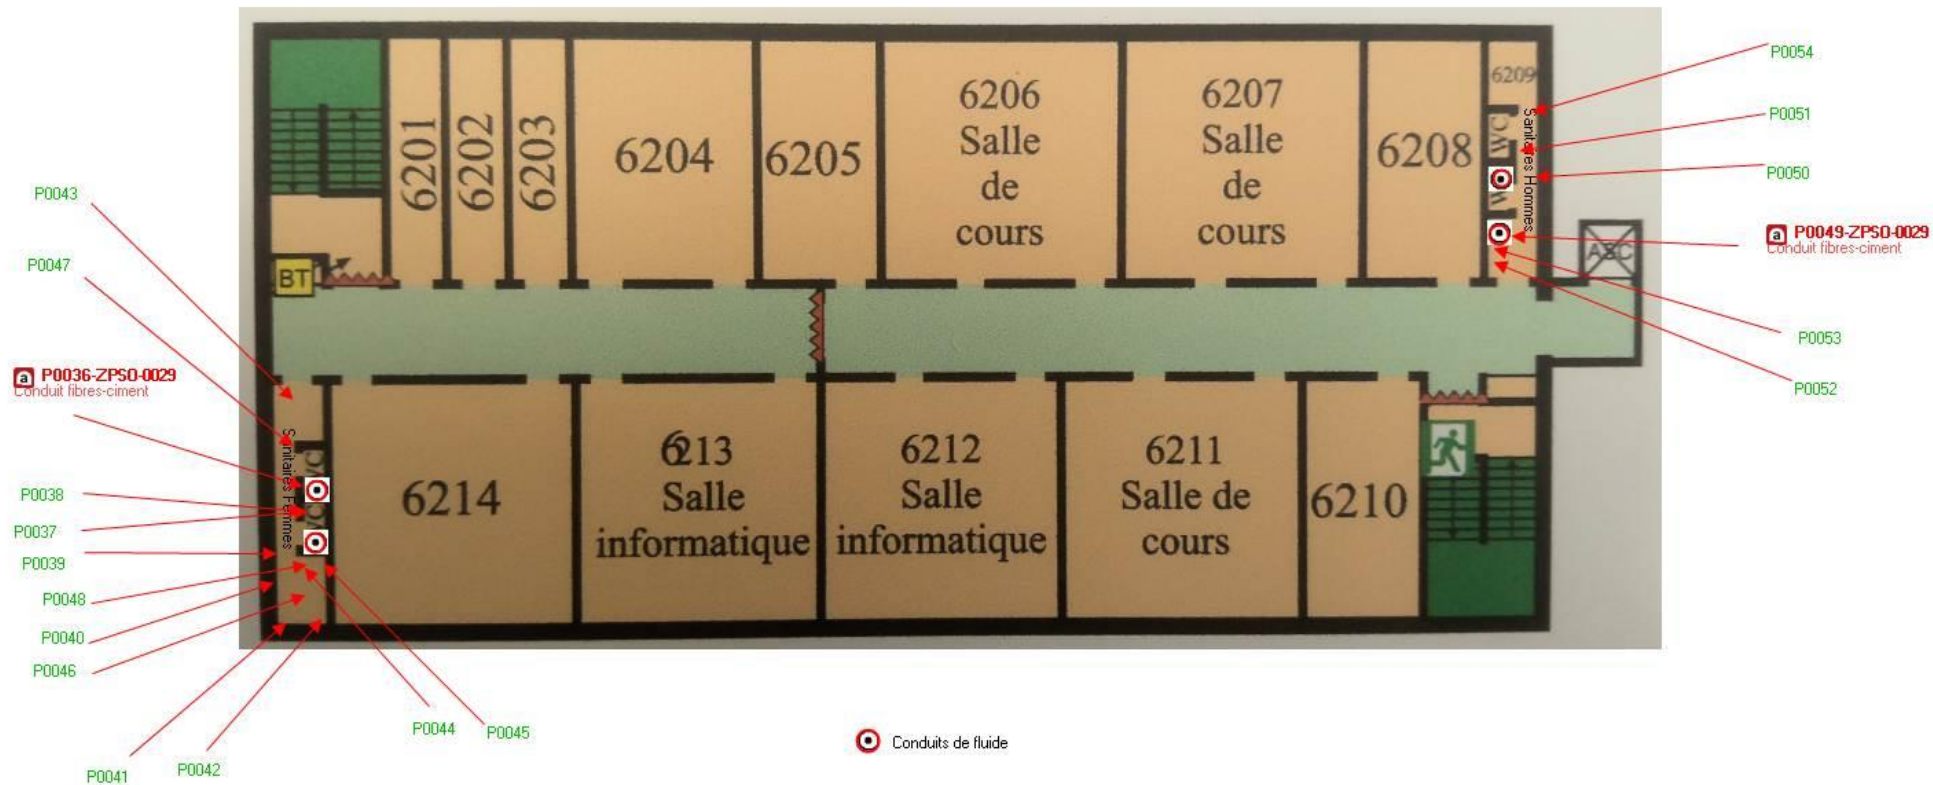

Annexe au rapport : UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01

Propriétaire : NANTES UNIVERSITE
1 QUAI DE TOURVILLE
44035 NANTES

Bien : IUT SAINT-NAZAIRE
BATIMENT 6
58 RUE MICHEL ANGE
44600 ST NAZAIRE

Etabli par : COU Hervé
Société : AED Groupe
Le : 23/06/2025

Croquis 3 / 3
Version : V01
du : 23/06/2025

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



E.3. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES

Mr. Hervé COU

310 Rue des Fougères

35700 RENNES

Notre référence : AR-25-NS-075070-01

Numéro de dossier : 25W020304**Référence de dossier : Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25W020304-001 - Référence *P0001* - *Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-002 - Référence *P0002* - *Revetements de sol - Colles - Colle + ragreage - RDC - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-003 - Référence *P0003* - *Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-004 - Référence *P0004* - *Canalisation - Canalisation - Joint d'etancheite de canalisation d'EU - RDC - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-005 - Référence *P0005* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur cloison beton - RDC - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-006 - Référence *P0006* - *Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - RDC - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-007 - Référence *P0007* - *Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - RDC - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-008 - Référence *P0008 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-009 - Référence *P0009 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de plafond - RDC - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-010 - Référence *P0010 - Canalisation - Canalisation - Joint Scotch d'étanchéité de canalisation d'EU - RDC - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-011 - Référence *P0011 - Canalisation - Canalisation - Joint d'étanchéité de canalisation d'EU - RDC - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-012 - Référence *P0012 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC - Sanitaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-013 - Référence *P0013 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-014 - Référence *P0014 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-015 - Référence *P0015 - Canalisation - Canalisation - Joint d'étanchéité de canalisation d'EU - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-016 - Référence *P0016 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur cloison béton - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-017 - Référence *P0017 - Canalisation VMC - Canalisation VMC - Joint d'étanchéité de canalisation de VMC - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-018 - Référence *P0018 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-019 - Référence *P0019 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de plafond - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-020 - Référence *P0020 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de Cueilie - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-021 - Référence *P0021 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-022 - Référence *P0022 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-023 - Référence *P0023 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-024 - Référence *P0024 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 1 - Sanitaires Hommes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-025 - Référence *P0025 - Evier - Joint - Joint d'étanchéité d'évier - Etage 1 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-026 - Référence *P0026 - Canalisation VMC - Canalisation VMC - Joint d'étanchéité de canalisation de VMC - Etage 1 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-027 - Référence *P0027 - Plafonds - Colle - Colle mousse antivibratoire - Etage 1 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-028 - Référence *P0028 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage 1 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-029 - Référence *P0029 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture de plafond - Etage 1 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-030 - Référence *P0030 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture de Cueilie - Etage 1 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-031 - Référence *P0031 - Revêtements de murs - Revêtement avec sous-couche - Toile de verre + colle - Etage 1 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-032 - Référence *P0032 - Evier - Joint - Joint d'etancheite d'evier - Etage 1 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-033 - Référence *P0033 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur cloison beton - Etage 1 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-034 - Référence *P0034 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-035 - Référence *P0035 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - Etage 1 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-036 - Référence *P0036 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Etage 2 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-037 - Référence *P0037 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 2 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-038 - Référence *P0038 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragreage - Etage 2 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-039 - Référence *P0039* - *Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 2 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-040 - Référence *P0040* - *Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Etage 2 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-041 - Référence *P0041* - *Revetements de murs - Revêtement avec sous-couche - Toile de verre + colle - Etage 2 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-042 - Référence *P0042* - *Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 2 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-043 - Référence *P0043* - *Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Etage 2 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-044 - Référence *P0044* - *Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de plafond - Etage 2 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-045 - Référence *P0045* - *Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre + peinture de cueillie - Etage 2 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-046 - Référence *P0046* - *Canalisation VMC - Canalisation VMC - Joint d'étanchéité de canalisation de VMC - Etage 2 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-047 - Référence *P0047* - *Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur cloison béton - Etage 2 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-048 - Référence *P0048* - *Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage 2 - Sanitaires Femmes*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-049 - Référence P0049 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Etage 2 - Sanitaires Hommes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-050 - Référence P0050 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - Etage 2 - Sanitaires Hommes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-051 - Référence P0051 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur cloison beton - Etage 2 - Sanitaires Hommes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-052 - Référence P0052 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faience - Etage 2 - Sanitaires Hommes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-053 - Référence P0053 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture de plafond - Etage 2 - Sanitaires Hommes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 25W020304-054 - Référence P0054 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque de platre mural - Etage 2 - Sanitaires Hommes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS

Sous-traitance Bâtiment Nantes

EUROFINS ABO

Site de la Géraudière

Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827

44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029809-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page1/17
Dossier N° : 25SE015233 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015233 Référence de suivi du dossier N° : 25W020304
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25W020304-001 - P0001 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - RDC - Sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) en traces	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	25W020304-002 - P0002 - Revetements de sol - Colles - Colle + ragréage - RDC - Sanitaires	Matériau dur (noir) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	25W020304-003 - P0003 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC - Sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029809-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page2/17
Dossier N° : 25SE015233 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015233 Référence de suivi du dossier N° : 25W020304
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25W020304-004 - P0004 - Canalisation - Canalisation - Joint d'etancheite de canalisation d"EU - RDC - Sanitaires	Matériau de type peinture (noir) en traces ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	25W020304-005 - P0005 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur cloison beton - RDC - Sanitaires	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	25W020304-006 - P0006 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - RDC - Sanitaires	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	25W020304-007 - P0007 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - RDC - Sanitaires	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029809-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page3/17
Dossier N° : 25SE015233 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015233 Référence de suivi du dossier N° : 25W020304
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25W020304-008 - P0008 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC - Sanitaires	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	25W020304-009 - P0009 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de plafond - RDC - Sanitaires	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	25W020304-010 - P0010 - Canalisation - Canalisation - Joint Scotch d"étancheité de canalisation d"EU - RDC - Sanitaires	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1)	25W020304-011 - P0011 - Canalisation - Canalisation - Joint d"étancheité de canalisation d"EU - RDC - Sanitaires	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau souple de type joint (noir)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029809-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page4/17
Dossier N° : 25SE015233 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015233 Référence de suivi du dossier N° : 25W020304
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25W020304-012 - P0012 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - RDC - Sanitaires	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	25W020304-013 - P0013 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	25W020304-014 - P0014 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragréage - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	25W020304-015 - P0015 - Canalisation - Canalisation - Joint d'étanchéité de canalisation d'EU - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029809-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page5/17
Dossier N° : 25SE015233 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015233 Référence de suivi du dossier N° : 25W020304
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25W020304-016 - P0016 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur cloison béton - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	25W020304-017 - P0017 - Canalisation VMC - Canalisation VMC - Joint d'étanchéité de canalisation de VMC - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	25W020304-018 - P0018 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029809-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page6/17
Dossier N° : 25SE015233 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015233 Référence de suivi du dossier N° : 25W020304
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	25W020304-019 - P0019 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de plafond - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	25W020304-020 - P0020 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de Cueillie - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
021	25W020304-021 - P0021 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029809-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page 7/17
Dossier N° : 25SE015233 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015233 Référence de suivi du dossier N° : 25W020304
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25W020304-022 - P0022 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023 (2)	25W020304-023 - P0023 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	25W020304-024 - P0024 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 1 - Sanitaires Hommes	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type béton (gris) en traces	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025 (2)	25W020304-025 - P0025 - Evier - Joint - Joint d'étanchéité d'évier - Etage 1 - Sanitaires Femmes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029809-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page 8/17
Dossier N° : 25SE015233 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015233 Référence de suivi du dossier N° : 25W020304
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	25W020304-026 - P0026 - Canalisation VMC - Canalisation VMC - Joint d'étanchéité de canalisation de VMC - Etage 1 - Sanitaires Femmes	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	25W020304-027 - P0027 - Plafonds - Colle - Colle mousse antivibratoire - Etage 1 - Sanitaires Femmes	Matériau de type mousse (gris) (foncé)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	25W020304-028 - P0028 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage 1 - Sanitaires Femmes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (clair)	MOLP * / KC6K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029809-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page9/17
Dossier N° : 25SE015233 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015233 Référence de suivi du dossier N° : 25W020304
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	25W020304-029 - P0029 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de plafond - Etage 1 - Sanitaires Femmes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	25W020304-030 - P0030 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de Cueillie - Etage 1 - Sanitaires Femmes	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	25W020304-031 - P0031 - Revêtements de murs - Revêtement avec sous-couche - Toile de verre + colle - Etage 1 - Sanitaires Femmes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau (noir) en traces	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029809-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page10/17
Dossier N° : 25SE015233 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015233 Référence de suivi du dossier N° : 25W020304
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	25W020304-032 - P0032 - Evier - Joint - Joint d"etancheite d"evier - Etage 1 - Sanitaires Femmes	Matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	25W020304-033 - P0033 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur cloison beton - Etage 1 - Sanitaires Femmes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	25W020304-034 - P0034 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur beton - Etage 1 - Sanitaires Femmes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	25W020304-035 - P0035 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 1 - Sanitaires Femmes	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029809-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page11/17
Dossier N° : 25SE015233 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015233 Référence de suivi du dossier N° : 25W020304
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	25W020304-036 - P0036 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Etage 2 - Sanitaires Femmes	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / S3PF	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
037	25W020304-037 - P0037 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage 2 - Sanitaires Femmes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	25W020304-038 - P0038 - Revêtements de sol - Colles - Colle + ragrage - Etage 2 - Sanitaires Femmes	Matériau semi-dur de type ragrage (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	25W020304-039 - P0039 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - Etage 2 - Sanitaires Femmes	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) + (gris)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029809-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page12/17
Dossier N° : 25SE015233 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015233 Référence de suivi du dossier N° : 25W020304
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	25W020304-040 - P0040 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Etage 2 - Sanitaires Femmes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	25W020304-041 - P0041 - Revêtements de murs - Revêtement avec sous-couche - Toile de verre + colle - Etage 2 - Sanitaires Femmes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	25W020304-042 - P0042 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 2 - Sanitaires Femmes	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029809-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page13/17
Dossier N° : 25SE015233 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015233 Référence de suivi du dossier N° : 25W020304
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	25W020304-043 - P0043 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - Etage 2 - Sanitaires Femmes	Matériau souple (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	25W020304-044 - P0044 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de plafond - Etage 2 - Sanitaires Femmes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	25W020304-045 - P0045 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit plâtre + peinture de cueillie - Etage 2 - Sanitaires Femmes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) (cimenteux)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029809-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page14/17
Dossier N° : 25SE015233 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015233 Référence de suivi du dossier N° : 25W020304
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	25W020304-046 - P0046 - Canalisation VMC - Canalisation VMC - Joint d'etancheite de canalisation de VMC - Etage 2 - Sanitaires Femmes	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	25W020304-047 - P0047 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur cloison béton - Etage 2 - Sanitaires Femmes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	25W020304-048 - P0048 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage 2 - Sanitaires Femmes	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029809-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page15/17
Dossier N° : 25SE015233 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015233 Référence de suivi du dossier N° : 25W020304
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049 (3)	25W020304-049 - P0049 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Conduit fibres-ciment - Etage 2 - Sanitaires Hommes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / S3PF	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
050	25W020304-050 - P0050 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur mur béton - Etage 2 - Sanitaires Hommes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) (cémenteux)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	25W020304-051 - P0051 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Enduit plâtre sur cloison béton - Etage 2 - Sanitaires Hommes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029809-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page16/17
Dossier N° : 25SE015233 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015233 Référence de suivi du dossier N° : 25W020304
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client:Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	25W020304-052 - P0052 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de faïence - Etage 2 - Sanitaires Hommes	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / H3WZ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	25W020304-053 - P0053 - Plafonds - Enduits projetés - Enduit ciment + peinture de plafond - Etage 2 - Sanitaires Hommes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	25W020304-054 - P0054 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural - Etage 2 - Sanitaires Hommes	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / BZ65	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-SE-029809-01 Date d'émission de rapport : 20/06/2025 15:14 Page 17/17
Dossier N° : 25SE015233 Date de réception : 18/06/2025 Date d'analyse : 19/06/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25SE015233 Référence de suivi du dossier N° : 25W020304
Reçu au laboratoire le : 18/06/2025 Date de réception : 17/06/2025
Date d'analyse : 19/06/2025
Référence dossier Client: Dossier: UNIVNANTES_03_09_06_DATBAT_01
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Description client non-cohérente avec l'échantillon physiquement présent.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibres-ciment ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Kévin Ducloyer
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

COU Hervé

sous le numéro 24-2497

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

☒	Termites Metropole	Prise d'effet : 09/04/2024	Validité : 08/04/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	Amiante Sans Mention	Prise d'effet : 09/04/2024	Validité : 08/04/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	Amiante Avec Mention	Prise d'effet : 09/04/2024	Validité : 08/04/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	Plomb Crep	Prise d'effet : 24/01/2024	Validité : 23/01/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	GAZ	Prise d'effet : 24/01/2024	Validité : 23/01/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			
☒	Electricite	Prise d'effet : 24/01/2024	Validité : 23/01/2031
[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]			



Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des
opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO 06



Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

Certificat N° C4126

Monsieur Hervé COU

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et /
ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément
à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret
2006-1114 du 05 septembre 2006.



dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

**Diagnostic de performance énergétique
individuel**

Certificat valable
Du 10/03/2025
au 06/05/2025

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs
intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.

**Diagnostic de performance énergétique tous
types de bâtiments**

Certificat valable
Du 07/05/2025
au 08/04/2031

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs
intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.

Date d'établissement le mercredi 07 mai 2025

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

P/O Aurelie MARCELLIN

*Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le
site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.*

F09 Certification de compétence version N 010120



SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC FR

AGENT

EI- DE LA CHAPELLE, STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE
4 ALLEE PIERRE GILLES DE GENNES
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

AED Expertises
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

AED Services
4 allée Pierre Gilles de Gennes
33700 Mérignac

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **27/12/2024**, garantissant sa responsabilité civile et professionnelle pour les activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termite** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

- Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique.
- Repérages et examens visuels avant travaux, avant démolitions dans les différents types d'établissements (tels ERP Catégories 1 à 4, IGH....) comme le prévoit le Code du travail.
- Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.
- Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.
- Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

AUDIT REGLEMENTAIRE ENERGETIQUE

DIAGNOSTICS PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX

Les garanties s'exercent à concurrence des montants des garanties du tableau ci-après.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **27/12/2024** au **01/07/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 9 janvier 2025

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
