



APAVE
AGENCE DE METZ

METZ Technopôle 8 rue Pierre
Simon de Laplace BP 65175
57075 METZ CEDEX
Tél. : 03 87 74 01 71

DONNEUR D'ORDRE

EPFGE

Rue Robert Blum

54700 PONT-À-MOUSSON

CONTACT : Monsieur RABEAU Anthony



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'affaire : **T220001632**
Numéro de rapport : **C22001552 rev 00**
Date : **26/10/2022**

Lieu d'intervention :

Bâtiment
DAAD
207 rue Division Leclerc
88140 CONTREXÉVILLE

Destinataire rapport :
EPFGE

Date d'intervention :

Du **11/10/2022** au

Intervenant : **Monsieur Boris SEBAIBI**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité

Nombre de pages total du document : 80 pages

1	INFORMATIONS GÉNÉRALES
----------	-------------------------------

1.1	DESIGNATION DU BATIMENT
------------	--------------------------------

Adresse : DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE	Référence Cadastre : Non communiqué Date du Permis de Construire : Antérieur au 1er juillet 1997
--	---

 Nature du bâtiment : **Bâtiment**

1.2	DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE
------------	---------------------------------------	------------------------------------

Nom : EPFGE Adresse : Rue Robert Blum 54700 PONT-À-MOUSSON	Nom : EPFGE Adresse : Rue Robert Blum 54700 PONT-À-MOUSSON
---	---

1.3	EXÉCUTION DE LA MISSION
------------	--------------------------------

Rapport N° : C22001552 rev 00 Repérage réalisé par : SEBAIBI Boris N° certificat de qualification : CPDI3512 Date d'obtention : 17/12/2019 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : I.CERT I.CERT Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K 35760 SAINT-GRÉGOIRE Date de la commande : 12/10/2022 Accompagnateur : Aucun	Laboratoire d'Analyses : Eurofins Eichrom Amiante Adresse laboratoire : Campus de Ker Lann – Parc de Lormandière Rue Maryse Bastié Bât. C 35170 BRUZ Numéro d'accréditation : 1-6491 Organisme d'assurance professionnelle : AXA FRANCE IARD Adresse assurance : 313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX N° de contrat d'assurance : 10800807204 Date de validité : 31/12/2022
---	--

1.4	SIGNATURE DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT
------------	---	--

Nom du diagnostiqueur : SEBAIBI Boris AGENCE DE METZ METZ Technopôle 8 rue Pierre Simon de Laplace BP 65175 57075 METZ CEDEX Signature de l'opérateur 	Lieu et date d'établissement du rapport Fait à METZ CEDEX le 26/10/2022
--	--

2	CONCLUSION(S) DU RAPPORT
----------	---------------------------------

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	2
DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
SIGNATURE DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE.....	5
INVESTIGATIONS NON REALISEES	9
LOCAUX NON VISITES / MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	9
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	9
MATERIAUX OU PRODUITS NON PRELEVES	9
PRECONISATIONS	9
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	10
OBJECTIF	10
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	10
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	10
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	10
PROGRAMME DE DEMOLITION.....	10
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE.....	10
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S).....	12
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	13
ANNEXE CROQUIS	55
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	61
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES	73
ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE	76
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS.....	78

3 RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

3.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Pièce n°2	Plancher	Bois - Sol souple	Résultat d'analyse (P007)		Z006
RDC	Atelier	Vrac	Plaques en fibrociment - /	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z008
RDC	Magasin	Plancher	Bois - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P009)		Z011
		Plancher	Bois - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P010)		Z011
RDC	Chaufferie	Chaudière	Joint de bride - /	Résultat d'analyse (P011)		Z009
		Conduit de cheminée	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P016)		Z008
R+1	Salle de Bains	Murs - Noire	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P021)		Z017
R+1	Terrasse	Conduit de cheminée	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z008
		Etanchéité de toiture terrasse	Complexe asphalté - /	Résultat d'analyse (P025)		Z007
R+1	Abri ext.	Plaques ondulées	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z008
		Bardages	Plaques ondulées	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z008
Sous sol	Abri	Plaques ondulées	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z008
		Vrac	Plaques en fibrociment - /	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z008
Sous sol	Espace sous atelier	Plancher haut - Plaque dans le béton	Coffrage perdu	Résultat d'analyse (P039)		
Extérieur	Toiture	Conduit de cheminée	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z008
		Conduit de cheminée	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z008
		Plaques ondulées	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z008

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
		Plaques ondulées	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z008
		Éléments associés à la toiture	Bardeaux bitumineux - Brut	Résultat d'analyse (P025 - idem)		Z007
Extérieur	Façade	Conduit de cheminée	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z008
		Conduit de cheminée	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z008
Extérieur	Terrain	Éléments décoratif	Plaques ondulées	Résultat d'analyse (P016 - idem)		Z008

3.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Entrée	Plinthes	Colle de plinthes - Carrelage	Résultat d'analyse (P001)		Z001
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
		Placher	Béton - Sol souple	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z003
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002)		Z002
		Placher	Béton - Sol souple	Résultat d'analyse (P003)		Z003
RDC	Pièce n°1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
RDC	Pièce n°2	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
RDC	Atelier	Fenêtre métal	Mastic vitrier - /	Résultat d'analyse (P004)		Z005
		Fenêtre métal	Mastic vitrier - /	Résultat d'analyse (P005)		Z005
		Vrac	Plaques en fibrociment - /	Résultat d'analyse (P006)		Z008
RDC	Dégagement n°1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Placher	Béton - Sol souple	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z003
		Placher	Béton - Sol souple	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z003
RDC	WC n°1	Plancher	Béton - Carrelage	Résultat d'analyse (P008)		Z012
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
		Placher	Béton - Sol souple	Résultat d'analyse (P003 - idem)		Z003
		Plancher - Plinthe	Béton - Carrelage	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z012
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
RDC	Magasin	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
RDC	Chaufferie	Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
		Plancher	Béton - Sol souple	Résultat d'analyse (P014)		Z003
		Plinthes	Colle de plinthes - Carrelage	Résultat d'analyse (P015)		Z001
RDC	Réserve	Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P012)		Z019
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
		Plafond - Plaque de plafond	Colle - Polystyrène	Résultat d'analyse (P013)		Z020
R+1	Palier	Plancher	Béton - Carrelage	Résultat d'analyse (P017)		Z014
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
R+1	Pièce n°3	Plancher	Bois brut - Moquette	Résultat d'analyse (P028)		Z018
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038)		Z010

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
				- idem)		
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
R+1	Pièce n°4	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
R+1	Pièce n°5	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
R+1	Cuisine	Plancher	Béton - Carrelage + lino	Résultat d'analyse (P020)		Z014
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
		Plinthes	Colle de plinthes - Carrelage	Résultat d'analyse (P019)		Z001
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P018)		Z015
		Plafond - Plaque de plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P024)		Z010
R+1	Salle de Bains	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
		Murs - Bleue	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P022)		Z016
		Plinthes	Colle de plinthes - Carrelage	Résultat d'analyse (P023)		Z001
R+1	Terrasse	Etanchéité de toiture terrasse	Complexe asphalté - /	Résultat d'analyse (P026)		Z007
R+1	Abri ext.	Toiture - Element sous toiture	Plaques fibreuses - /	Résultat d'analyse (P027)		
R+1	Salle d'eau n°1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P018 - idem)		Z015
R+2	Pièce n°6	Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P030)		Z016

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
		Murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P031)		
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038)		Z010
R+2	WC n°2	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
		Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P022 - idem)		Z016
R+2	Salle d'eau n°2	Murs	Colle de faïence - Faïence	Résultat d'analyse (P034)		Z016
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
		Plancher	Béton - Carrelage	Résultat d'analyse (P033)		Z014
R+2	Pièce n°7	Plancher	Bois - Sol souple	Résultat d'analyse (P037)		Z021
		Plafond - Plaque de plafond	Colle - Polystyrène	Résultat d'analyse (P035)		Z020
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
R+2	Pièce n°8	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
R+2	Grenier	Plancher	Bois - Sol souple	Résultat d'analyse (P036)		Z021
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
Combles	Combles	Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002)		Z002

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
				- idem)		
Sous sol	Cave n°4	Conduit de fluide	Calorifugeage - Carton	Résultat d'analyse (P042)		
Extérieur	Façade	Facades lourdes y compris poteaux	Crépi extérieur - Peinture	Résultat d'analyse (P040)		Z004
		Facades lourdes y compris poteaux	Crépi extérieur - Peinture	Résultat d'analyse (P041)		Z004
R+1	Cage d'escalier n°2	Escalier - Nez de marche	Bois brut - Nez de marche + lino	Résultat d'analyse (P029)		Z013
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
RDC	Cage d'escalier n°1	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
		Escalier - Nez de marche	Bois brut - Nez de marche + lino	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z013
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
R+2	Dégagement n°2	Plancher	Bois - Sol souple	Résultat d'analyse (P032)		Z021
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z010
		Murs	Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002

4 INVESTIGATIONS NON REALISEES

4.1 Locaux non visités / Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

4.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4.3 Matériaux ou produits non prélevés

Sans objet

5 PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

6	COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION
6.1	OBJECTIF

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer avant démolition totale ou de plus de 50 % de la structure de son immeuble.

6.2	REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES
------------	--

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,
 Décret n° 2010 – 1200 du 11 Octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation,
 Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
 Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,
 Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

6.3	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
------------	--

Date de réalisation du repérage : 11/10/2022

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Documents remis : Ancien DTA

Commentaire : Néant

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Il ne peut être finalisé qu'après évacuation définitive de l'immeuble bâti et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient accessibles.

7	PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION
----------	---

7.1	PROGRAMME DE DEMOLITION
------------	--------------------------------

Démolition de l'ensemble du bâtiment

7.2	PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE
------------	---

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties d'immeuble concernés par la démolition telle que définie par le donneur d'ordre.

Programme de repérage : Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par la démolition en regard des matériaux ou produits figurant dans la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, le tableau A1 de la norme NF X 46 020 et tout autre matériau réputé contenir de l'amiante dont l'opérateur aurait connaissance.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de démolition tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

Liste des locaux (visités / non visités) :

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	Entrée	OUI	
RDC	Pièce n°1	OUI	
RDC	Pièce n°2	OUI	
RDC	Atelier	OUI	
RDC	Dégagement n°1	OUI	
RDC	WC n°1	OUI	
RDC	Magasin	OUI	
RDC	Chaufferie	OUI	
RDC	Réserve	OUI	
R+1	Palier	OUI	
R+1	Pièce n°3	OUI	
R+1	Pièce n°4	OUI	
R+1	Pièce n°5	OUI	
R+1	Cuisine	OUI	
R+1	Salle de Bains	OUI	
R+1	Terrasse	OUI	
R+1	Abri ext.	OUI	
R+1	Salle d'eau n°1	OUI	
R+2	Pièce n°6	OUI	
R+2	WC n°2	OUI	
R+2	Salle d'eau n°2	OUI	
R+2	Pièce n°7	OUI	
R+2	Pièce n°8	OUI	
R+2	Grenier	OUI	
Comble s	Combles	OUI	
Sous sol	Cave n°1	OUI	
Sous sol	Cave n°2	OUI	
Sous sol	Cave n°3	OUI	
Sous sol	Cave n°4	OUI	
Sous sol	Local cuve	OUI	
Sous sol	Cave n°5	OUI	
Sous sol	Abri	OUI	
Sous sol	Espace sous atelier	OUI	


Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
Extérieur	Toiture	OUI	
Extérieur	Façade	OUI	
Extérieur	Terrain	OUI	
R+1	Cage d'escalier n°2	OUI	
RDC	Cage d'escalier n°1	OUI	
R+2	Dégagement n°2	OUI	

8 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
23/01/2017	117.17.1	ADR Sarl	Rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de Santé Publique avant la vente du bien	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

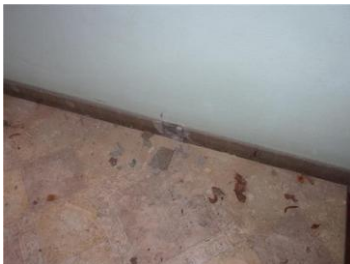PRELEVEMENT : P001		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes - Carrelage	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plinthes - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle de plinthes / Carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces + (vert) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Moellons / Crépi+Plâtre+ Papier peint		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (marron)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Sol souple	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Placher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Béton / Sol souple		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0
CUST 01	Matériau dur (rouge)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	RDC - Atelier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier - /	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Fenêtre métal - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Mastic vitrier //		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type mastic (vert) (marron)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	RDC - Atelier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier - /	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Fenêtre métal - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Mastic vitrier / /		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau (marron)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	RDC - Atelier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques en fibrociment - /	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Vrac - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Plaques en fibrociment //		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	RDC - Pièce n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bois - Sol souple	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Bois / Sol souple		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (rouge) + (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P008		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	RDC - WC n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Carrelage	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Béton / Carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	RDC - Magasin
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bois - Dalles de sol	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Bois / Dalles de sol		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P010		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	RDC - Magasin
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bois - Dalles de sol	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Bois / Dalles de sol		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P011		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	RDC - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de bride - /	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Chaudière - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Joint de bride //		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (noir) + (rouge)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P012		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	RDC - Réserve
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence - Faïence	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle de faïence / Faïence		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	RDC - Réserve
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Polystyrène	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle / Polystyrène		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type colle (beige) ; matériau de type peinture (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	RDC - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Sol souple	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plancher - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Béton / Sol souple		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (noir)	0
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	RDC - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes - Carrelage	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plinthes - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle de plinthes / Carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (noir) ; matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	RDC - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Amiante ciment	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Conduit de cheminée - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Amiante ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (marron) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P017		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+1 - Palier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Carrelage	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Béton / Carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+1 - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence - Faïence	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle de faïence / Faïence		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+1 - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes - Carrelage	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plinthes - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle de plinthes / Carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) + (gris) (foncé)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+1 - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Carrelage + lino	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Béton / Carrelage + lino		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau souple (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+1 - Salle de Bains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence - Faïence	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle de faïence / Faïence		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) + (gris) (foncé)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P022		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+1 - Salle de Bains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence - Faïence	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle de faïence / Faïence		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+1 - Salle de Bains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes - Carrelage	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plinthes - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle de plinthes / Carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+1 - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - Peinture	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Plâtre / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+1 - Terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Complexe asphalté - /	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Etanchéité de toiture terrasse - Sol		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Complexe asphalté //		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau (beige) (rose)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P026		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+1 - Terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Complexe asphalté - /	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Etanchéité de toiture terrasse - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Complexe asphalté //		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+1 - Abri ext.
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques fibreuses - /	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Toiture - Toiture		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Plaques fibreuses / /		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type plaque (fibreux) (noir) ; matériau (rouge)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+1 - Pièce n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bois brut - Moquette	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Bois brut / Moquette		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+1 - Cage d'escalier n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bois brut - Nez de marche + lino	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Escalier - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Bois brut / Nez de marche + lino		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 02	Matériau de type colle (jaune)	0
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	0
CUST 01	Matériau souple (marron)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 02	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+2 - Pièce n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence - Faïence	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle de faïence / Faïence		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+2 - Pièce n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - Peinture	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Plâtre / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+2 - Dégagement n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bois - Sol souple	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Bois / Sol souple		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau (fibreuse) (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (rouge) + (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+2 - Salle d'eau n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Carrelage	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Béton / Carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+2 - Salle d'eau n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence - Faïence	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle de faïence / Faïence		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+2 - Pièce n°7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Polystyrène	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle / Polystyrène		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (beige) ; matériau de type peinture (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+2 - Grenier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bois - Sol souple	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Bois / Sol souple		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron) (bleu)	0
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (bitumineux) (noir) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+2 - Pièce n°7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bois - Sol souple	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Bois / Sol souple		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (bitumineux) (noir) + (rouge) (fibreux)	0
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (bitumineux) (noir) + (gris) (fibreux)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	R+2 - Pièce n°6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - Peinture	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Plâtre / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	Sous sol - Espace sous atelier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Coffrage perdu	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Plancher haut - Plafond		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Coffrage perdu		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur (fibreuse) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P040		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	Extérieur - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Crépi extérieur - Peinture	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Facades lourdes y compris poteaux - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Crépi extérieur / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (marron)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	Extérieur - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Crépi extérieur - Peinture	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Facades lourdes y compris poteaux - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Crépi extérieur / Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (marron)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P042		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
EPFGE	T220001632	Sous sol - Cave n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifugeage - Carton	11/10/2022	SEBAIBI Boris
Localisation		
Conduit de fluide - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Calorifugeage / Carton		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (poudreux) (gris) (marron)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SE-021197-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE CROQUIS

Client :	EPFGE	Titre :	RDC
N° dossier :	T220001632	Adresse :	DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE
N° planche :	1/5		
Type :	Version : 0 Planche de repérage usuel en plan		
Date :	26/10/2022	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	SEBAIBI Boris	Niveau :	RDC
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	


Legende :

- Colle (sol) contenant de l'amiante
- Dalles de sols contenant de l'amiante
- Joint (tresses, bandes)
- Conduit amiante-ciment
- Plaques fibre-ciment

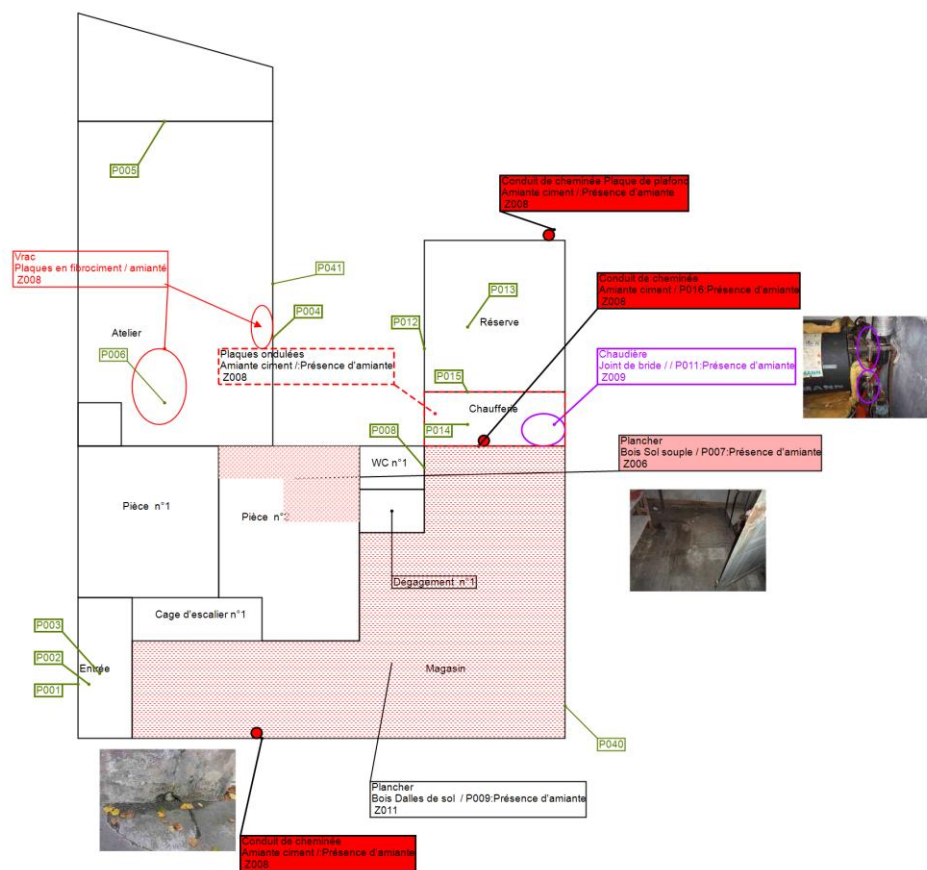


-  Plancher haut contenant de l'amiante (fond de coffrage)
-  Plaque(s) amiante ciment
-  Conduit amiante-ciment

Client :	EPFGE	Titre :	Sous sol
N° dossier :	T220001632	Adresse :	DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE
N° planche :	2/5		
Type :	Version : 0 Planche de repérage usuel en plan		
Date :	26/10/2022	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	SEBAIBI Boris	Niveau :	
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	

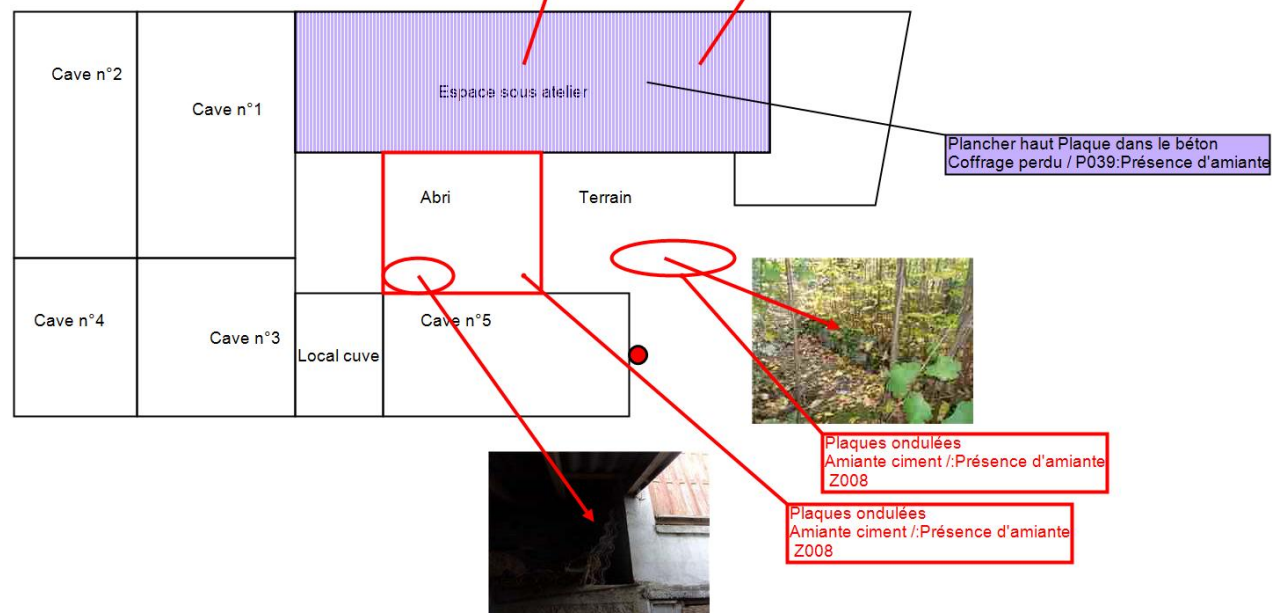


-  Colle de faïence contenant de l'amiante
-  Etanchéité contenant de l'amiante
-  Plaques ondulées en amiante-ciment
-  Conduit amiante-ciment

Client :	EPFGE	Titre :	R+1
N° dossier :	T220001632	Adresse :	DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE
N° planche :	3/5	Version :	0
Type :	Planche de repérage usuel en plan		
Date :	26/10/2022	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	SEBAIBI Boris	Niveau :	
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	

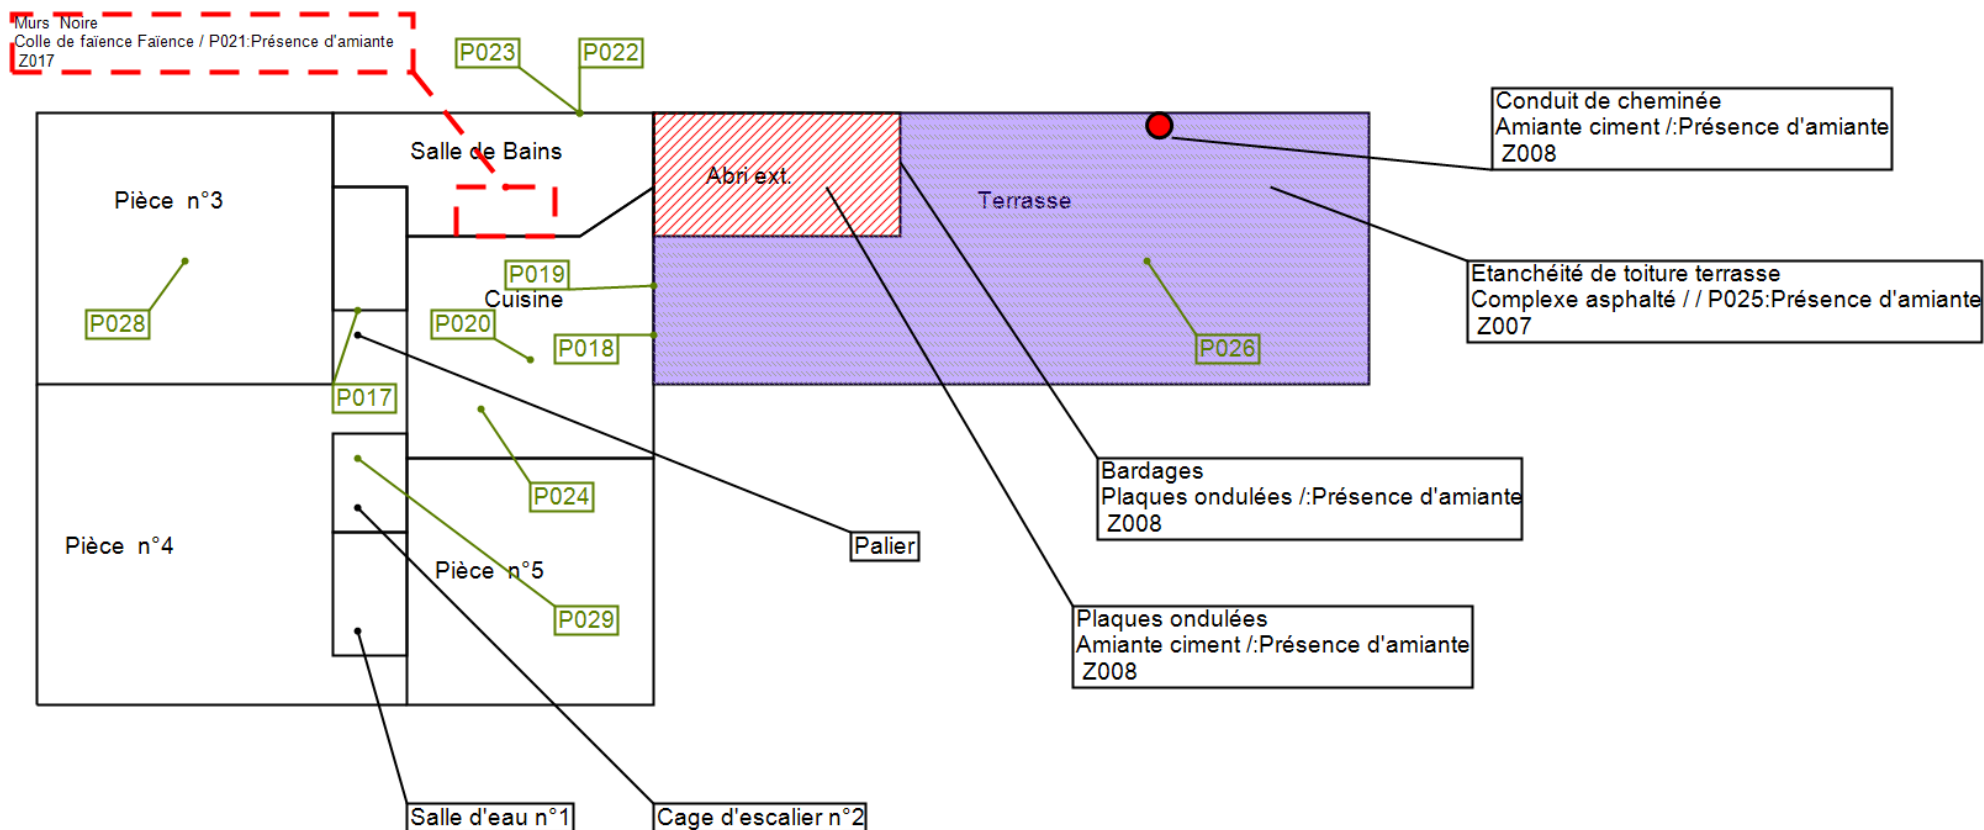

Client :	EPFGE	Titre :	R+2
N° dossier :	T220001632	Adresse :	DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE
N° planche :	4/5		
Type :	Version : 0 Planche de repérage usuel en plan		
Date :	26/10/2022	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	SEBAIBI Boris	Niveau :	
Origine du plan :	Fourni par le client	Commentaire :	

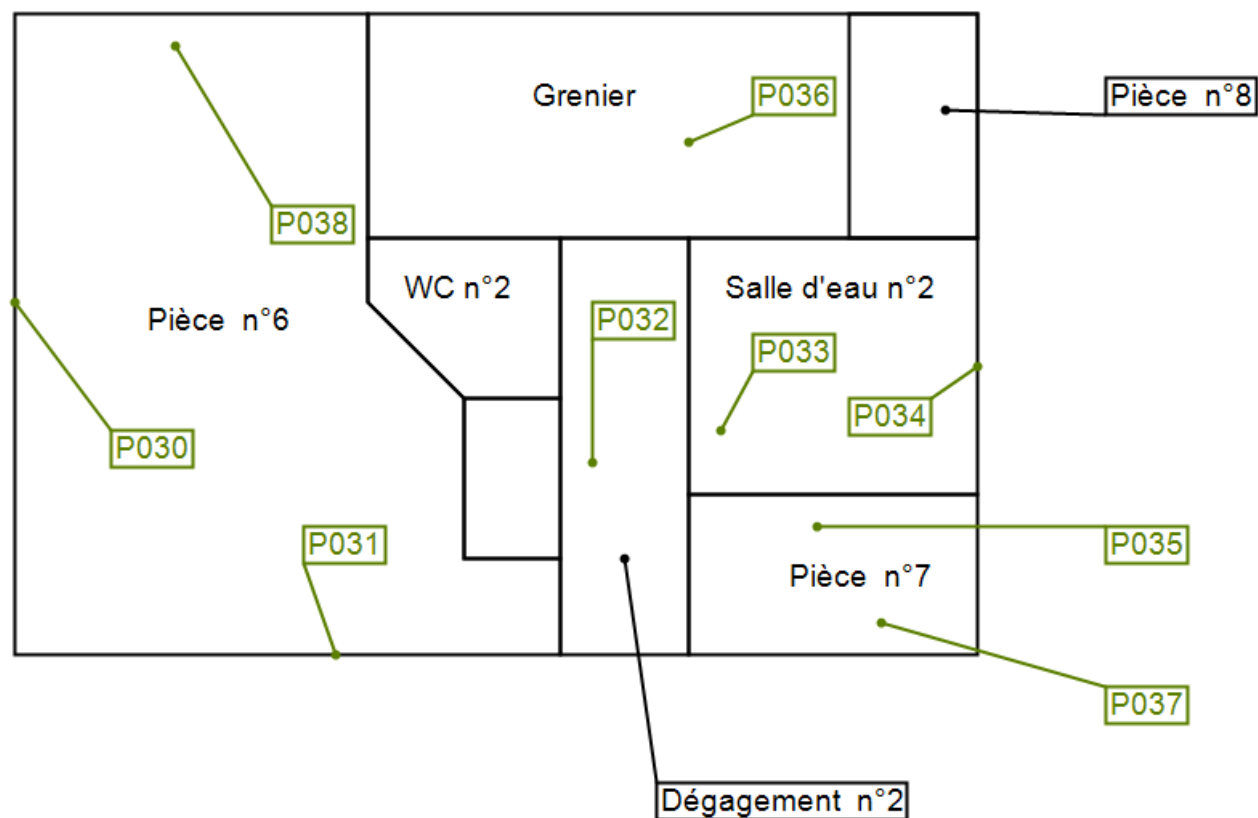

Client :	EPFGE	Titre :	Toiture
N° dossier :	T220001632	Adresse :	DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE
N° planche :	5/5		
Type :	Croquis		
Date :	26/10/2022	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	SEBAIBI Boris	Niveau :	
Origine du plan :	Sans objet	Commentaire :	



Eléments associés à la toiture
 Bardeaux bitumineux Brut /:Présence d'amiante
 Z007

Conduit de cheminée
 Amiante ciment /:Présence d'amiante
 Z008

Conduit de cheminée
 Amiante ciment /:Présence d'amiante
 Z008

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720221000905388



Eurofins Eichrom Amiante SAS

APAVE ALSACIENNE SAS
Boris SEBAIBI
 8 Rue Pierre Simon de Laplace
 57075 METZ CEDEX 03

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SE-021197-01 Date d'émission de rapport : 21/10/2022 4:48 Page 1/12
 Dossier N° : 22SE014648 Date de réception : 13/10/2022 Date d'analyse : 19/10/2022
 Référence dossier Client:3027710
 T220001632 A - DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE - EPFGE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC - Entrée - Murs - Plinthes - Colle de plinthes - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (beige) en traces + (vert) en traces	MET / DY32 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-RDC - Entrée - Murs - Murs - Moellons - Crépi+Plâtre+ Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (marron)	MET / DY32 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-RDC - Entrée - Sol - Placher - Béton - Sol souple	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / DY32 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur (rouge)	MET / DY32 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations reportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Kér Lann, Parc de Lormandière
 35170 Bruz, FRANCE
 Tél: +33 (0)3 88 91 65 31 - Fax: +33 (0)3 88 91 65 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SE-021197-01 Date d'émission de rapport : 21/10/2022 4:48 Page 2/12
Dossier N° : 22SE014648 Date de réception : 13/10/2022 Date d'analyse : 19/10/2022
Référence dossier Client: 3027710
T220001632 A - DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE - EPFGE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	P004-RDC - Atelier - Murs - Fenêtre métal - Mastic vitrier - /	Matériau semi-dur de type mastic (vert) (marron)	MET / DY32 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-RDC - Atelier - Murs - Fenêtre métal - Mastic vitrier - /	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau (marron)	MET / DY32 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-RDC - Atelier - Toutes zones - Vrac - Plaques en fibrociment - /	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MET / DY32 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-RDC - Pièce n°2 - Sol - Plancher - Bois - Sol souple	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (rouge) + (gris) (i)	MET / BA9B *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
008	P008-RDC - WC n°1 - Sol - Plancher - Béton - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / DY32 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Kér Lann, Parc de Lormandière
35170 Bruz, FRANCE
Tél: +33 (0)3 88 91 65 31 - Fax: +33 (0)3 88 91 65 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SE-021197-01 Date d'émission de rapport : 21/10/2022 4:48 Page 3/12
Dossier N° : 22SE014648 Date de réception : 13/10/2022 Date d'analyse : 19/10/2022
Référence dossier Client: 3027710
T220001632 A - DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE - EPFGE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	P009-RDC - Magasin - Sol - Plancher - Bois - Dalles de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / DY32	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
010 (1)	P010-RDC - Magasin - Sol - Plancher - Bois - Dalles de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(ii)	MET * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
011	P011-RDC - Chaufferie - Toutes zones - Chaudière - Joint de bride - /	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (noir) + (rouge)	MOLP * / N9VA	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012	P012-RDC - Réserve - Murs - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013-RDC - Réserve - Plafond - Plafond - Colle - Polystyrène	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type colle (beige) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Kér Lann, Parc de Lormandière
35170 Bruz, FRANCE
Tél: +33 (0)3 88 91 65 31 - Fax: +33 (0)3 88 91 65 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SE-021197-01 Date d'émission de rapport : 21/10/2022 4:48 Page 4/12
Dossier N° : 22SE014648 Date de réception : 13/10/2022 Date d'analyse : 19/10/2022
Référence dossier Client: 3027710
T220001632 A - DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE - EPFGE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	P014-RDC - Chaufferie - Toutes zones - Plancher - Béton - Sol souple	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (noir)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-RDC - Chaufferie - Murs - Plinthes - Colle de plinthes - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (noir) ; matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016-RDC - Chaufferie - Toutes zones - Conduit de cheminée - Amiante ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (marron) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / N9VA *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
017	P017-R+1 - Palier - Sol - Plancher - Béton - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Kér Lann, Parc de Lormandière
35170 Bruz, FRANCE
Tél: +33 (0)3 88 91 65 31 - Fax: +33 (0)3 88 91 65 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SE-021197-01 Date d'émission de rapport : 21/10/2022 4:48 Page 5/12
Dossier N° : 22SE014648 Date de réception : 13/10/2022 Date d'analyse : 19/10/2022
Référence dossier Client: 3027710
T220001632 A - DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE - EPFGE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	P018-R+1 - Cuisine - Murs - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P019-R+1 - Cuisine - Murs - Plinthes - Colle de plinthes - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) + (gris) (foncé)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P020-R+1 - Cuisine - Sol - Plancher - Béton - Carrelage + lino	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple (gris)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021-R+1 - Salle de Bains - Murs - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) + (gris) (foncé)(i)	MET / BA9B *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Kér Lann, Parc de Lormandière
35170 Bruz, FRANCE
Tél: +33 (0)3 88 91 65 31 - Fax: +33 (0)3 88 91 65 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SE-021197-01 Date d'émission de rapport : 21/10/2022 4:48 Page 6/12
Dossier N° : 22SE014648 Date de réception : 13/10/2022 Date d'analyse : 19/10/2022
Référence dossier Client: 3027710
T220001632 A - DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE - EPFGE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	P022-R+1 - Salle de Bains - Murs - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P023-R+1 - Salle de Bains - Murs - Plinthes - Colle de plinthes - Carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P024-R+1 - Cuisine - Plafond - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / BA9B *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025-R+1 - Terrasse - Sol - Etanchéité de toiture terrasse - Complexe asphalté - /	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau (beige) (rose) (i)	MET / BA9B *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Kér Lann, Parc de Lormandière
35170 Bruz, FRANCE
Tél: +33 (0)3 88 91 65 31 - Fax: +33 (0)3 88 91 65 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SE-021197-01 Date d'émission de rapport : 21/10/2022 4:48 Page 7/12
Dossier N° : 22SE014648 Date de réception : 13/10/2022 Date d'analyse : 19/10/2022
Référence dossier Client: 3027710
T220001632 A - DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE - EPFGE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	P026-R+1 - Terrasse - Sol - Etanchéité de toiture terrasse - Complexe asphalté - /	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibres)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P027-R+1 - Abri ext. - Toiture - Toiture - Plaques fibreuses - /	Matériau souple de type plaque (fibres) (noir) ; matériau (rouge)	MET / BA9B *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P028-R+1 - Pièce n°3 - Sol - Toiture - Bois brut - Moquette	Matériau souple fibres de type moquette (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P029-R+1 - Cage d'escalier n°2 - Sol - Escalier - Bois brut - Nez de marche + lino	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple (marron)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Kér Lann, Parc de Lormandière
35170 Bruz, FRANCE
Tél: +33 (0)3 88 91 65 31 - Fax: +33 (0)3 88 91 65 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SE-021197-01 Date d'émission de rapport : 21/10/2022 4:48 Page 8/12
Dossier N° : 22SE014648 Date de réception : 13/10/2022 Date d'analyse : 19/10/2022
Référence dossier Client: 3027710
T220001632 A - DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE - EPFGE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P030-R+2 - Pièce n°6 - Murs - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BA9B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031-R+2 - Pièce n°6 - Murs - Murs - Plâtre - Peinture	Matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P032-R+2 - Dégagement n°2 - Sol - Plancher - Bois - Sol souple	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (rouge) + (gris)	MET * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Kér Lann, Parc de Lormandière
35170 Bruz, FRANCE
Tél: +33 (0)3 88 91 65 31 - Fax: +33 (0)3 88 91 65 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SE-021197-01 Date d'émission de rapport : 21/10/2022 4:48 Page 9/12
 Dossier N° : 22SE014648 Date de réception : 13/10/2022 Date d'analyse : 19/10/2022
 Référence dossier Client: 3027710
 T220001632 A - DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE - EPFGE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (fibreuse) (gris)	MET * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P033-R+2 - Salle d'eau n°2 - Sol - Plancher - Béton - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P034-R+2 - Salle d'eau n°2 - Murs - Murs - Colle de faïence - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / LEZ2	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P035-R+2 - Pièce n°7 - Plafond - Plafond - Colle - Polystyrène	Matériau de type colle (beige) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / BA9B	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P036-R+2 - Grenier - Sol - Plancher - Bois - Sol souple					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Kér Lann, Parc de Lormandière
 35170 Bruz, FRANCE
 Tél: +33 (0)3 88 91 65 31 - Fax: +33 (0)3 88 91 65 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
 1-6491
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SE-021197-01 Date d'émission de rapport : 21/10/2022 4:48 Page 10/12
Dossier N° : 22SE014648 Date de réception : 13/10/2022 Date d'analyse : 19/10/2022
Référence dossier Client: 3027710
T220001632 A - DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE - EPFGE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (bitumineux) (noir) (gris)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron) (bleu)	MET / LEZ2 *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P037-R+2 - Pièce n°7 - Sol - Plancher - Bois - Sol souple	Matériau souple de type revêtement de sol (bitumineux) (noir) + (rouge) (fibreuse)(i)	MET / BA9B *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (bitumineux) (noir) + (gris) (fibreuse)(ii)	MET / BA9B *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P038-R+2 - Pièce n°6 - Plafond - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(ii)	MET / M33I *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Kér Lann, Parc de Lormandière
35170 Bruz, FRANCE
Tél: +33 (0)3 88 91 65 31 - Fax: +33 (0)3 88 91 65 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SE-021197-01 Date d'émission de rapport : 21/10/2022 4:48 Page 11/12
Dossier N° : 22SE014648 Date de réception : 13/10/2022 Date d'analyse : 19/10/2022
Référence dossier Client: 3027710
T220001632 A - DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE - EPFGE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	P039-Sous sol - Espace sous atelier - Plafond - Plancher haut - Coffrage perdu	Matériau dur (fibreuse) (gris)	MOLP [*] / N9VA	2 / 2 [*]	- [*]	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
040	P040-Extérieur - Façade - Murs - Facades lourdes y compris poteaux - Crépi extérieur - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (marron)	MET [*] / LEZ2	1 / 2 [*]	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
041	P041-Extérieur - Façade - Murs - Facades lourdes y compris poteaux - Crépi extérieur - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type peinture (marron)	MET [*] / LEZ2	1 / 2 [*]	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
042	P042-Sous sol - Cave 1 ^{er} - Toutes zones - Conduit de fluide - Calorifugeage - Carton	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (poudreuseux) (gris) (marron)	MET [*] / LEZ2	1 / 2 [*]	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Observation(s) couche(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Kér Lann, Parc de Lormandière
35170 Bruz, FRANCE
Tél: +33 (0)3 88 91 65 31 - Fax: +33 (0)3 88 91 65 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Eichrom Amiante SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SE-021197-01 Date d'émission de rapport : 21/10/2022 4:48 Page 12/12
 Dossier N° : 22SE014648 Date de réception : 13/10/2022 Date d'analyse : 19/10/2022
 Référence dossier Client: 3027710
 T220001632 A - DAAD 207 rue Division Leclerc 88140 CONTREXÉVILLE - EPFGE

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
 NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
 NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.
 NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
 NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).
 NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Kévin Garnier
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
 Rue Maryse Bastie, Campus de Kér Lann, Parc de Lormandière
 35170 Bruz, FRANCE
 Tél: +33 (0)3 88 91 65 31; +33 2 23 50 13 80 - Fax: +33 (0)3 88 91 65 31 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
RDC	Pièce n°2	Plancher	Bois - Sol souple	4 m²	
RDC	Atelier	Vrac	Plaques en fibrociment - /	5 m²	
RDC	Magasin	Plancher	Bois - Dalles de sol	45 m²	
		Plancher	Bois - Dalles de sol		
RDC	Chaufferie	Chaudière	Joint de bride - /	5 u	
		Conduit de cheminée	Amiante ciment	3 m²	
R+1	Salle de Bains	Murs - Noire	Colle de faïence - Faïence	8 m²	
R+1	Terrasse	Conduit de cheminée	Amiante ciment		
		Etanchéité de toiture terrasse	Complexe asphalté - /	70 m²	
R+1	Abri ext.	Plaques ondulées	Amiante ciment	6 m²	
		Bardages	Plaques ondulées	2 m²	
Sous sol	Abri	Plaques ondulées	Amiante ciment	15 m²	
		Vrac	Plaques en fibrociment - /	5 m²	
Sous sol	Espace sous atelier	Plancher haut - Plaque dans le béton	Coffrage perdu	70 m²	
Extérieur	Toiture	Conduit de cheminée	Amiante ciment	8 ml	
		Conduit de cheminée	Amiante ciment	8 ml	
		Plaques ondulées	Amiante ciment	5 m²	
		Plaques ondulées	Amiante ciment	15 m²	
		Éléments associés à la toiture	Bardeaux bitumineux - Brut	3 m²	
Extérieur	Façade	Conduit de cheminée	Amiante ciment	2 ml	
		Conduit de cheminée	Amiante ciment	6 ml	
Extérieur	Terrain	Eléments décoratif	Plaques ondulées	3 m²	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- ☐ Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- ☐ Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés. La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE CERTIFICAT DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 3512 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SEBAIBI Boris

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention**
	Date d'effet : 17/12/2019 - Date d'expiration : 16/12/2024
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention*
	Date d'effet : 17/12/2019 - Date d'expiration : 16/12/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 01/10/2020.



Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev14

ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE



Contrat RC n° 10800807204 1/2

AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale **APAVE ALSACIENNE SAS**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° **10800807204**, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ bâtiment et génie civil
- ☐ essais, mesures et métrologie
- ☐ laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ conseils
- ☐ formation
- ☐ certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces métiers, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Contrat RC n° 10800807204 2/2

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2022 au 31/12/2022** inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre le 30/12/2021
Par délégation
POUR L'ASSUREUR :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.**

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

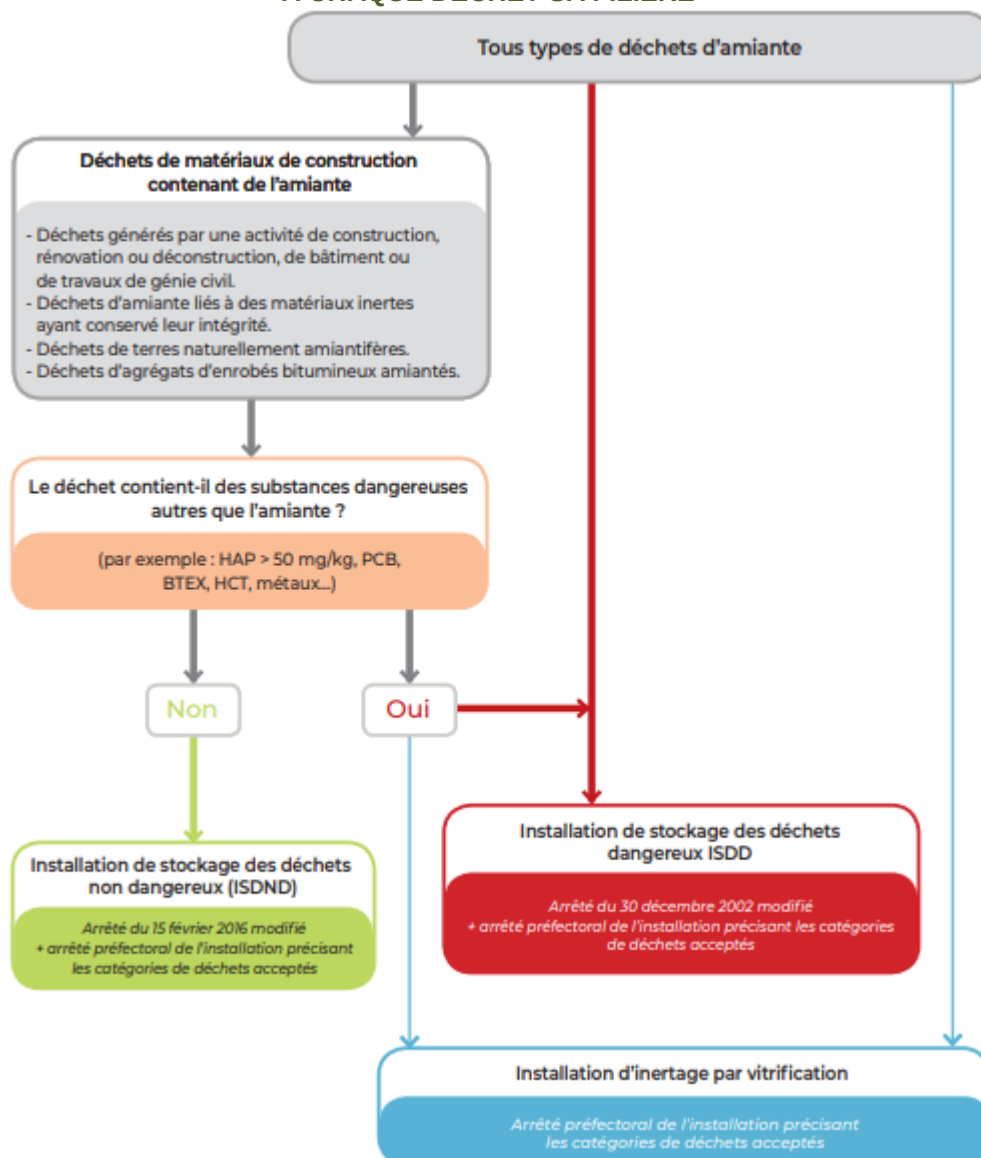

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>
