

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

18 Rue de la Sorbonne
CAMPUS PIERRE-ET-MARIE-CURIE (JUSSIEU) – GYMNASSE
75005 PARIS (France)

Propriétaire

Société SORBONNE UNIVERSITE
21 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE
75006 PARIS (France)

Demandeur

SORBONNE UNIVERSITE - Société SORBONNE UNIVERSITE
21 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE
75006 PARIS (France)

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 21/04/2026

Date de visite : 13/04/2026

Nombre de pages : 27

Fait à : 92366 MEUDON-LA FORET

Référence du dossier : 2604CIDME -
BI1208000002381

Nombre de prélèvements : 14

Nombre d'analyses réalisées : 13

Le présent rapport est établi par :
Yohann DELPLANQUE

dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy
Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
sur la durée de validité du : 30/06/2020 au
29/06/2027

Certificat de compétence :
n° DTI/202006 - 005

Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026

Révision	Date	Objet
Version initiale	21/04/2026	Edition initiale

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE.....	3
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION	4
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	5
1. PRESTATIONS REALISEES.....	5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	6
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION	6
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	7
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE.....	8
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	9
VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....	10
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT	10
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	10
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	11
1. PRELEVEMENTS	12
2. COMPOSANTS.....	16
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	17
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	20
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	25
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	26
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE	27

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Référence du programme de travaux transmis :

Dépose des ouvrants existants, remplissage des ouvrants existants avec du béton cellulaire, pose de câbles pour plantes grimpantes.

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

Façades gymnase.

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Localisation	Matériau ou produit
Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade A-B-C	Joint de mastic de vitrage
	Joint de mastic de vitrage
Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	Joint de mastic de vitrage
	Joint de mastic de vitrage

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Gymnase Jussieu/ Rdc	Façade A-B-C
Gymnase Jussieu/ Rdc	Façade D-E-F-G

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Saint Grégoire BAT K (Cofrac : 1-5970)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Sans accompagnateur

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables			X
Toiture accessible et visitable			X
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement	X		

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Localisation	Parties du local	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Néant	-		

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Occupé.

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Axonométrie existant	Axonométrie existant

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.3)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-003	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade A-B-C; Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage	P005 (Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E- F-G) P006 (Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E- F-G) P011 (Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade A-B- C) P012 (Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade A-B- C)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	33U

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade A-B-C; Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur de rebouchage ciment	Enduit extérieur de rebouchage ciment	P001 (Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E- F-G) P002 (Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E- F-G)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade A-B-C; Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Joint d'étanchéité	Joint d'étanchéité	P003 (Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E- F-G) P004 (Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E- F-G)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade A-B-C; Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	P007 (Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E- F-G) P008 (Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E- F-G)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	9 - Fondations et soubassements - Étanchéité des murs enterrés - Enduit bitumineux des ouvrages enterrés	Enduit bitumineux des ouvrages enterrés	P009 (Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E- F-G) P010 (Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E- F-G)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction concernés	Descriptif	Conclusion (justification)
ZPSO-006	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries - Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)	Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)	Susceptible de contenir de l'amiante (En attente des résultats d'analyse)
	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries - Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)	Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)	Susceptible de contenir de l'amiante (En attente des résultats d'analyse)

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

1. PRELEVEMENTS

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001 <u>Description:</u> Enduit extérieur de rebouchage ciment	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	13/04/2026	Absence d'amiante	
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001 <u>Description:</u> Enduit extérieur de rebouchage ciment	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	13/04/2026	Absence d'amiante	
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	13/04/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	13/04/2026	Absence d'amiante	
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	13/04/2026	Présence d'amiante	
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	13/04/2026	Présence d'amiante	
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO-004 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	13/04/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO-004 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	13/04/2026	Absence d'amiante	
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO-005 <u>Description:</u> Enduit bitumineux des ouvrages enterrés	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	9 - Fondations et soubassements - Étanchéité des murs enterrés	13/04/2026	Absence d'amiante	
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO-005 <u>Description:</u> Enduit bitumineux des ouvrages enterrés	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	9 - Fondations et soubassements - Étanchéité des murs enterrés	13/04/2026	Absence d'amiante	
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade A-B-C	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	13/04/2026	Présence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade A-B-C	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	13/04/2026	Présence d'amiante	
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO-006 <u>Description:</u> Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	13/04/2026	Pas de réponse	
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO-006 <u>Description:</u> Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	10 - Aménagements, voiries et réseaux divers - Voiries	13/04/2026	Pas de réponse	

2. COMPOSANTS

N° de composant	Localisation	Description	Justification
ZPSO-001	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade A-B-C; Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	Enduit extérieur de rebouchage ciment	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade A-B-C; Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	Joint d'étanchéité	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade A-B-C; Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	Joint de mastic de vitrage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade A-B-C; Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Gymnase Jussieu/ Rdc - Façade D-E-F-G	Enduit bitumineux des ouvrages enterrés	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

----- Gymnase Jussieu/ Rdc -----

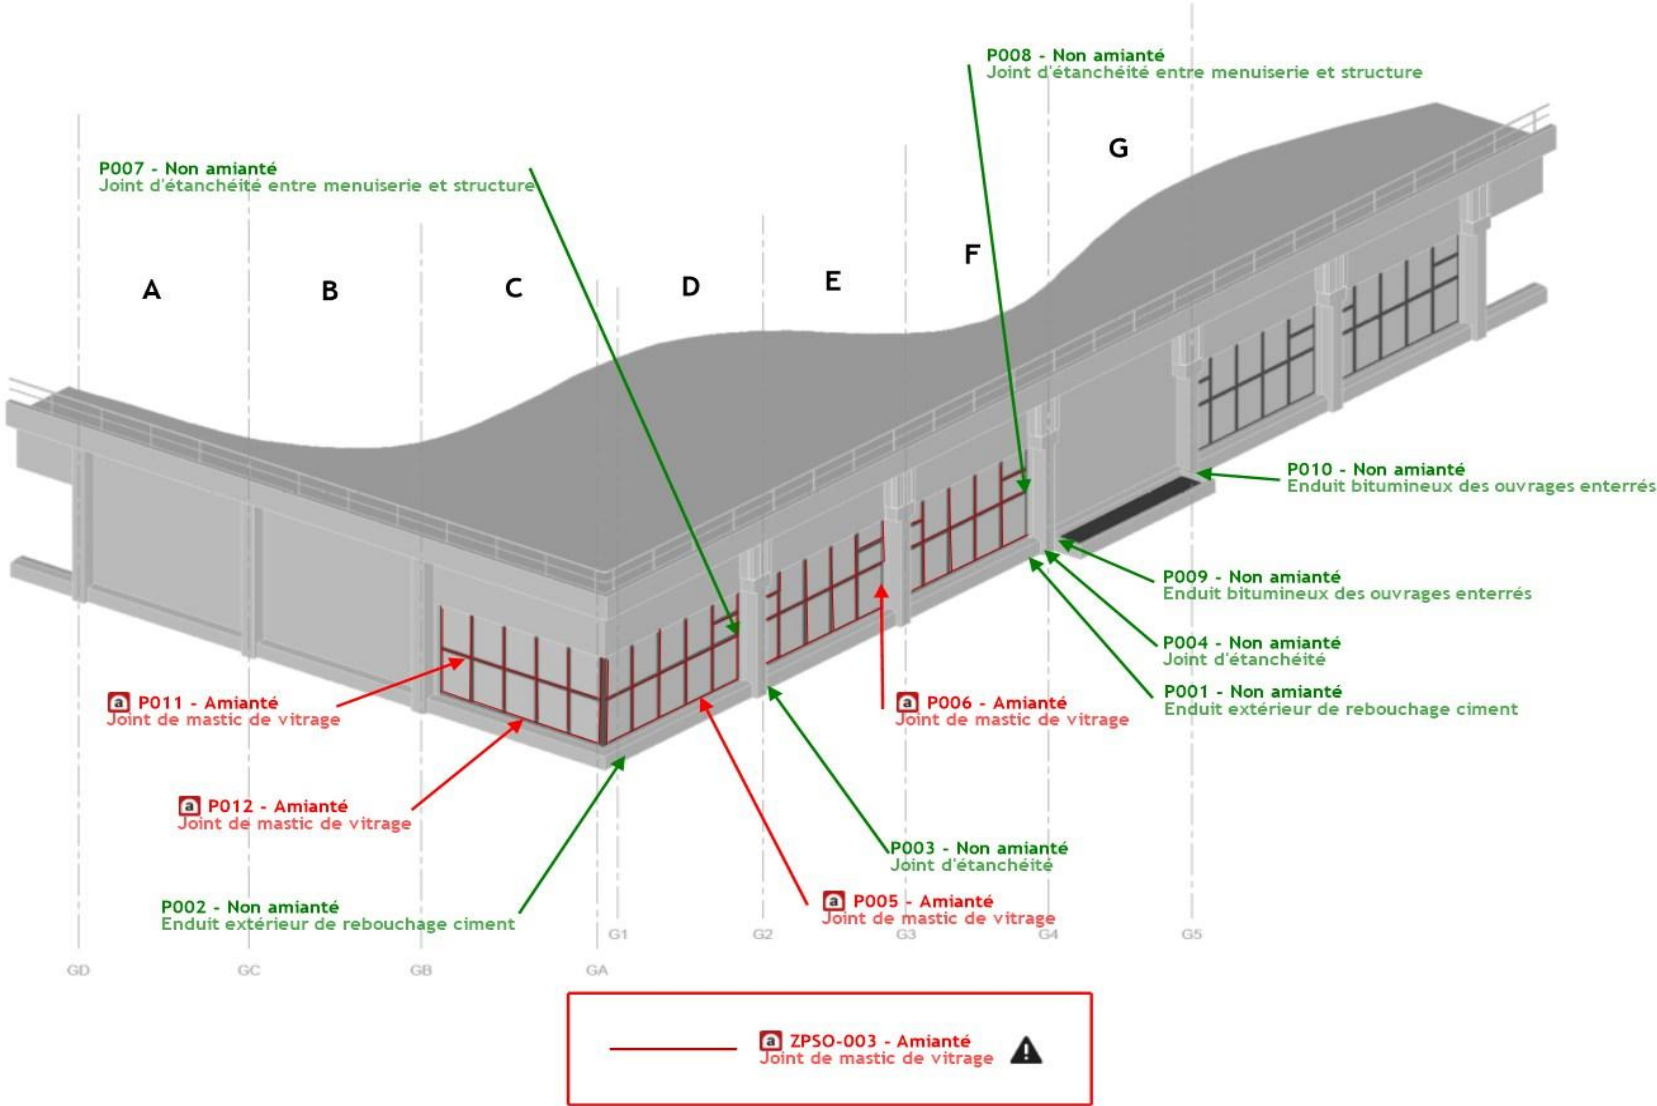


Planche de repérage technique

N° planche :1/1

Nom du plan :
Axonométrie existant

Entreprise réalisant le repérage :
SOCOTEC Diagnostic Meudon
Immeuble Le Dynasteur-6-8 rue Andras Beck
92366 MEUDON-LA FORET

Adresse du bien :
18 Rue de la Sorbonne
CAMPUS PIERRE-ET-MARIE-CURIE (JUSSIU) – GYMNASE
75005 PARIS (France)

Informations relatives au rapport du repérage :
Réf. du rapport : 2604CIDME - BI12080000002381
Rédacteur : Yohann DELPLANQUE
Date : 21/04/2026

Commentaires :

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0726-15493 EN DATE DU 20/04/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MEUDON (CIDME) Immeuble Le Dynasteur 6-8 rue Andras Beck 92366 MEUDON-LA-FORET CEDEX	Réf. Commande ITGA : IT0726-15493 Réf. Commande Client : 2604CIDME_-_BI12080000002381_2026_04_13_1646_388 3
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 15/04/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2604CIDME - BI12080000002381 - 18 Rue de la Sorbonne CAMPUS PIERRE-ET-MARIE-CURIE (JUSSIEU) - GYMNASE 75005 PARIS France ITC-EXPGEJ-271752		Réf échantillon ITGA : IT072604-23372	
Réf échantillon client : P001 - Enduit extérieur de rebouchage ciment - Gymnase Jussieu/ Rdc - Facade D-E-F-G ITC-MJNFT-3065915		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
1 ¹ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 20/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : 2604CIDME - BI12080000002381 - 18 Rue de la Sorbonne CAMPUS PIERRE-ET-MARIE-CURIE (JUSSIEU) - GYMNASE 75005 PARIS France ITC-EXPGEJ-271752		Réf échantillon ITGA : IT072604-23373	
Réf échantillon client : P002 - Enduit extérieur de rebouchage ciment - Gymnase Jussieu/ Rdc - Facade D-E-F-G ITC-JUXUW-3065947		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
1 ¹ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 20/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-15493 EN DATE DU 20/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2604CIDME - BI1208000002381 - 18 Rue de la Sorbonne CAMPUS PIERRE-ET-MARIE-CURIE (JUSSIÉU) - GYMNASE 75005 PARIS France ITC-EXPGEJ-271752 Réf échantillon client : P003 - Joint d'étanchéité - Gymnase Jussieu/ Rdc - Facade D-E-F-G ITM-PHYKJ-3065948			
		Réf échantillon ITGA : IT072604-23374	
		Description ITGA :	Matériau souple gris avec poussières / Matériau gris en faible quantité hétérogène avec poussières
1 ¹ Matériau souple gris avec poussières	META (B) le 20/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : MVS
1 ¹ Matériau gris en faible quantité hétérogène avec poussières	META (A) le 20/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD
Réf dossier client : 2604CIDME - BI1208000002381 - 18 Rue de la Sorbonne CAMPUS PIERRE-ET-MARIE-CURIE (JUSSIÉU) - GYMNASE 75005 PARIS France ITC-EXPGEJ-271752 Réf échantillon client : P004 - Joint d'étanchéité - Gymnase Jussieu/ Rdc - Facade D-E-F-G ITM-AMDJN-3065949			
		Réf échantillon ITGA : IT072604-23375	
		Description ITGA :	Matériau souple gris avec poussières
1 ¹ Matériau souple gris avec poussières	META (B) le 20/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : MVS
Réf dossier client : 2604CIDME - BI1208000002381 - 18 Rue de la Sorbonne CAMPUS PIERRE-ET-MARIE-CURIE (JUSSIÉU) - GYMNASE 75005 PARIS France ITC-EXPGEJ-271752 Réf échantillon client : P005 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Gymnase Jussieu/ Rdc - Facade D-E-F-G ITM-RETMJ-3065950			
		Réf échantillon ITGA : IT072604-23376	
		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau gris en vrac
1 ¹ Peintures multiples non séparable + Matériau gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 20/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : 2604CIDME - BI1208000002381 - 18 Rue de la Sorbonne CAMPUS PIERRE-ET-MARIE-CURIE (JUSSIÉU) - GYMNASE 75005 PARIS France ITC-EXPGEJ-271752 Réf échantillon client : P006 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Gymnase Jussieu/ Rdc - Facade D-E-F-G ITM-RYVTB-3065951			
		Réf échantillon ITGA : IT072604-23377	
		Description ITGA :	Peintures multiples / Matériau gris
1 ¹ Peintures multiples non séparable + Matériau gris (1)	META (A) le 20/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FNK (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 2/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-15493 EN DATE DU 20/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2604CIDME - BI12080000002381 - 18 Rue de la Sorbonne CAMPUS PIERRE-ET-MARIE-CURIE (JUSSIÉU) - GYMNASSE 75005 PARIS France ITC-EXPGEJ-271752		Réf échantillon ITGA : IT072604-23378	
Réf échantillon client : P007 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Gymnase Jussieu/ Rdc - Facade D-E-F-G ITC-WKCOL-3065952		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau gris en vrac	
1 ¹ Peinture en faible quantité non séparable + Matériau gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 20/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : 2604CIDME - BI12080000002381 - 18 Rue de la Sorbonne CAMPUS PIERRE-ET-MARIE-CURIE (JUSSIÉU) - GYMNASSE 75005 PARIS France ITC-EXPGEJ-271752		Réf échantillon ITGA : IT072604-23379	
Réf échantillon client : P008 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Gymnase Jussieu/ Rdc - Facade D-E-F-G ITC-CHFRNR-3065953		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
1 ¹ Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 20/04/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IOC (4)
Réf dossier client : 2604CIDME - BI12080000002381 - 18 Rue de la Sorbonne CAMPUS PIERRE-ET-MARIE-CURIE (JUSSIÉU) - GYMNASSE 75005 PARIS France ITC-EXPGEJ-271752		Réf échantillon ITGA : IT072604-23380	
Réf échantillon client : P009 - Enduit bitumineux des ouvrages enterrés - Gymnase Jussieu/ Rdc - Facade D-E-F-G ITC-WIQVY-3065957		Description ITGA : Enduit bitumineux	
1 ¹ Enduit bitumineux	META (B) le 20/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : 2604CIDME - BI12080000002381 - 18 Rue de la Sorbonne CAMPUS PIERRE-ET-MARIE-CURIE (JUSSIÉU) - GYMNASSE 75005 PARIS France ITC-EXPGEJ-271752		Réf échantillon ITGA : IT072604-23381	
Réf échantillon client : P010 - Enduit bitumineux des ouvrages enterrés - Gymnase Jussieu/ Rdc - Facade D-E-F-G ITC-DEWVK-3065958		Description ITGA : Enduit bitumineux	
1 ¹ Enduit bitumineux	META (B) le 20/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 3/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0726-15493 EN DATE DU 20/04/2026
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2604CIDME - BI12080000002381 - 18 Rue de la Sorbonne CAMPUS PIERRE-ET-MARIE-CURIE (JUSSIEU) - GYMNASSE 75005 PARIS France Réf échantillon client : P011 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Gymnase Jussieu/ Rdc - Facade A-B-C ITC-EXPGEJ-271752 Réf échantillon ITGA : IT072604-23382 Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac / Matériau gris en vrac			
1 ¹ Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 20/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : 2604CIDME - BI12080000002381 - 18 Rue de la Sorbonne CAMPUS PIERRE-ET-MARIE-CURIE (JUSSIEU) - GYMNASSE 75005 PARIS France Réf échantillon client : P012 - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Gymnase Jussieu/ Rdc - Facade A-B-C ITC-YVFL-3065960 Réf échantillon ITGA : IT072604-23383 Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac			
1 ¹ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 20/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FNK (4)

- (1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
- 1.accréditation n° 1-5967

Validé par : Pierre SZCZEPANSKI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 4/4

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

N° DTI/202006 - 005

Date d'émission: 24/05/2024

Certifie par la présente que :

YOHANN DELPLANQUE

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	23/12/2021	22/12/2028
Electricité	Etat des installations intérieures d'électricité	23/12/2021	22/12/2028
PLOMB	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	23/12/2021	22/12/2028
Termites métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole et en outre-mer	26/01/2022	25/01/2029
DPE - avec mention	Diagnostique de performance énergétique d'immeubles ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation	24/05/2022	23/05/2029
DPE	Diagnostique de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique	24/05/2022	23/05/2029
Amiante - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	30/06/2020	29/06/2027
Amiante	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	30/06/2020	29/06/2027

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément :

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 4-0086
PORTÉE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR



Xavier Daniel, Directeur de la Certification

SOCOTEC Certification France - 13, cours Voltaire 92877 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Orléans 490 954 308 - www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex

 **01 41 34 50 00**
 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
 Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
 Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 12/12/2025
 POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
