

Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants NF X46-035



Numéro de rapport	29855895 - PLOMB - PJJ P
Propriétaire	MINISTERE DE LA JUSTICE
Donneur d'ordre	MINISTERE DE LA JUSTICE
Adresse de l'immeuble	PJJ rue d'Auxonne 54000 NANCY
Bâtiment ou installation	Bâtiment
Date de la commande	13/03/2026
La ou le(s) date(s) de la visite	05/02/2026
Date d'édition du rapport de repérage	13/03/2026
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	63

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise



Opérateur de repérage :

Madame LIPIEC Solène
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 5 rue Pablo
Picasso
57365 ENNERY
Le 13/03/2026

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE :	3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE	4
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	5
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X	8
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS)	8
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	8
METHODOLOGIE EMPLOYEE	9
INTERPRETATION DES RESULTATS	12
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	12
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES	12
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	56
ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE	62

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission : **29855895 - PLOMB - PJJ**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	MINISTERE DE LA JUSTICE
Demeurant :	
Représenté par :	
Donneur d'ordre du repérage :	MINISTERE DE LA JUSTICE
Demeurant :	
Représenté par :	Mr FUHRMANN
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Madame LIPIEC Solène
Nom et adresse de l'entreprise :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION 5 rue Pablo Picasso 57365 ENNERY
N° de Siret :	79018467501068
RCP-compagnie-n° de police :	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - FRL001575

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	PJJ
Adresse complète :	rue d'Auxonne 54000 NANCY
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire :	Construction :
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

1.5 Liste des documents remis :

<[Absence de document remis]>

Type de document
PLANS

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Reprise des cloisons, rafraichissement des locaux (peintures plafonds et murs), remplacement des sols, isolation des murs (ITI), remplacement des menuiseries, remplacement de la verrière de toiture. Reprise de l'isolation des toitures terrasses, isolation des planchers de combles, isolation des planchers bas sur sous sol. Mise en place de panneaux photovoltaïques et pompes à chaleur air-eau.

3 Elément de la mission de repérage

3.1	Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :
-----	---

Local	Étage	Visité	Justification de non-visite
Localisation		OUI	
CHAUFFERIE		OUI	
LOCAL 13		OUI	
LOCAL 14		OUI	
LOCAL 12		OUI	
LOCAL 10		OUI	
LOCAL 11		OUI	
LOCAL 08		OUI	
LOCAL 09		OUI	
LOCAL 16		OUI	
LOCAL 24		OUI	
LOCAL 23		OUI	
LOCAL 22		OUI	
LOCAL 21		OUI	
LOCAL 17		OUI	
LOCAL 18		OUI	
LOCAL 19		OUI	
LOCAL 20		OUI	
LOCAL 01		OUI	
LOCAL 02		OUI	
LOCAL 04		OUI	
LOCAL 05		OUI	
LOCAL 06		OUI	
LOCAL 07		OUI	
LOCAL 114		OUI	
LOCAL 118		OUI	
LOCAL 117		OUI	
LOCAL 122		OUI	
LOCAL 120		OUI	
LOCAL 121		OUI	
LOCAL 119		OUI	
LOCAL 116		OUI	
LOCAL 123		OUI	
LOCAL 124		OUI	
LOCAL 112		OUI	
LOCAL 107		OUI	
LOCAL 108		OUI	
LOCAL 110		OUI	
LOCAL 111		OUI	
LOCAL 106		OUI	
LOCAL 101		OUI	
LOCAL 104		OUI	
LOCAL 105		OUI	
LOCAL 213		OUI	
LOCAL 232		OUI	
LOCAL 234		OUI	
LOCAL 235		OUI	
LOCAL 236		OUI	
LOCAL 215		OUI	
LOCAL 211		OUI	

LOCAL 210		OUI	
LOCAL 209		OUI	
LOCAL 208		OUI	
LOCAL 207		OUI	
LOCAL 206		OUI	
LOCAL 201		OUI	
LOCAL 204		OUI	
LOCAL 205		OUI	
LOCAL 212		OUI	
LOCAL 311		OUI	
LOCAL 310		OUI	
LOCAL 309		OUI	
LOCAL 308		OUI	
LOCAL 307		OUI	
LOCAL 306		OUI	
LOCAL 301		OUI	
LOCAL 304		OUI	
LOCAL 305		OUI	
LOCAL 317		OUI	
LOCAL 318		OUI	
LOCAL 319		OUI	
LOCAL 320		OUI	
LOCAL 321		OUI	
LOCAL 322		OUI	
LOCAL 323		OUI	
LOCAL 326		OUI	
LOCAL 343		OUI	
LOCAL 342		OUI	
LOCAL 341		OUI	
LOCAL 340		OUI	
LOCAL 339		OUI	
LOCAL 338		OUI	
LOCAL 337		OUI	
LOCAL 336		OUI	
LOCAL 334		OUI	
LOCAL 333		OUI	
LOCAL 332		OUI	
LOCAL 331		OUI	
LOCAL 330		OUI	
LOCAL 329		OUI	
LOCAL 328		OUI	
LOCAL 327		OUI	
LOCAL 218		OUI	
LOCAL 219		OUI	
LOCAL 220		OUI	
LOCAL 221		OUI	
LOCAL 222		OUI	
LOCAL 223		OUI	
LOCAL 225		OUI	
LOCAL 227		OUI	
LOCAL 228		OUI	

LOCAL 230		OUI	
LOCAL 231		OUI	
LOCAL 216		OUI	
LOCAL 128		OUI	
LOCAL 129		OUI	
LOCAL 130		OUI	
LOCAL 131		OUI	
LOCAL 132		OUI	
LOCAL 133		OUI	
LOCAL 141		OUI	
LOCAL 142		OUI	
LOCAL 143		OUI	
LOCAL 136/137		OUI	
LOCAL 139		OUI	
LOCAL 138		OUI	
LOCAL 134		OUI	

3.2 L'appareil portable à fluorescence X	
Marque :	Heureusis
Modèle :	Pb200i
Numéro de série :	8151
Date de changement de source :	25/08/2025
Nature du radionucléide :	Co-57
Activité de la source :	199 Mbq
Limite de quantification de l'appareil	0,31 mg/cm ²
Étalon 1	Étalon 2
Fabricant de l'étalon : NIST	Fabricant de l'étalon : NIST
Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm ²	Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm ²
Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm ²	Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm ²
N° NIST de l'étalon : SRM2575	N° NIST de l'étalon : SRM2574

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)				
N° de mesure	valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie (mg/cm ²)	Date	Observation
2	0,3	0,14	05/02/2025	Etalonnage de début
2	0,7	0,16	05/02/2025	Etalonnage de début
710	0,34	0,12	05/02/2025	Etalonnage de début
711	0,71	0,13	05/02/2025	Etalonnage de début

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique	
Nom :	
Adresse :	
Numéro d'accréditation :	

4 Méthodologie Employée

Vérification de justesse de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur vérifie la justesse de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- chaque palier ;
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;

Une gaine d'ascenseur est considérée comme un seul local


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de repérage (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

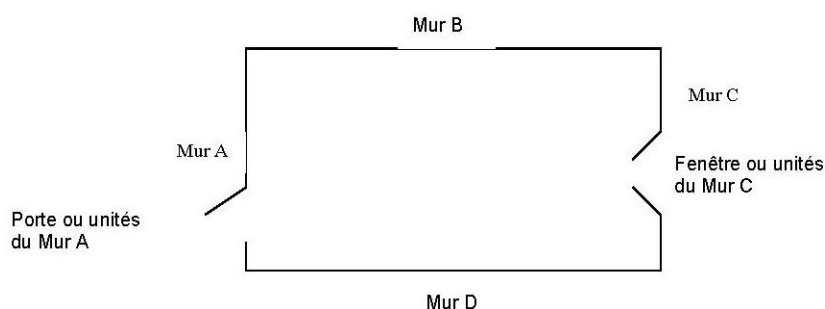

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de repérage et substrat

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage se définit à minima avec les critères suivants :

- Niveau (rez de chaussée, étage X...) ;
- Le local ;
- La zone ;
- Produit ou matériau ;
- Le substrat ;
- Le revêtement.

Dans chaque local, toutes les surfaces concernées par les travaux susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Constituent des unités de repérage distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'un façade (unité de repérage discontinue) ;

Conformément à la NF X 46-035, sont exclus du présent repérage :

- Les PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits...) ;
- Le polystyrène
- Les carrelages, faïences et plinthes carrelées

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

Il est effectué à minima 2 mesures dont à minima 1 mesure par local, par unité de repérage, à l'aide de l'appareil à fluorescence X

4.1 Interprétation des résultats

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.

Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats des mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur mesurée et l'incertitude de mesure élargie (ex : 13,4 +/- 0,41).

Toute mesure < à la LQ de l'appareil (0,31 mg/cm²) doit être interprétée comme étant inférieure à 0,31 mg/cm².

4.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb, dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

5 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet de mesures sont classées dans le tableau des mesures suivant.

CHAUFFERIE (SOUS SOL)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
9	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,13	UR3
5	A	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,12	UR2
8	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,13	UR4
6	D	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,12	UR2
11	D	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0,23	0,12	UR5
7	PLAFOND	PLAFOND	FLOCAGE	NON PEINT				
3	PLANCHER	SOL	BETON	PEINTURE		0,88	0,13	UR1
4						0,79	0,08	
10	TOUTE ZONE	CONDUITE JAUNE	METAL	PEINTURE		2,35	0,18	UR6
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 13 (SOUS SOL)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
15	A	DORMANT PORTE	METAL	PEINTURE		0,63	0,2	UR7
16	A	MUR	BETON	PEINTURE		0,08	0,13	UR2
14	A	OUVRANT PORTE	METAL	PEINTURE		0,51	0,19	UR8
13	B	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,13	UR3
12	B	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,13	UR4
19	PLAFOND	PLAFOND	METAL	PEINTURE		35,59	3,65	UR11
17	PLANCHER	SOL	BETON	PEINTURE		0,21	0,12	UR1

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

LOCAL 14 (SOUS SOL)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
18	A	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,04	UR2
	B	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	C	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE				UR9
	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	PEINTURE		0,05	0,04	UR10

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

LOCAL 12 (SOUS SOL)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
21	A	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,04	UR2
	B	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	C	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
20	PLAFOND	PLAFOND	METAL	PEINTURE		33,33	3,43	UR11
22	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	PEINTURE		0,05	0,04	UR10

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

LOCAL 10 (SOUS SOL)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
24	B	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,04	UR2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
23	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE		0,03	0,04	UR9
25	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	PEINTURE		0,05	0,04	UR10
Commentaire sur le local		Néant						

LOCAL 11 (SOUS SOL)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	B	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
27	C	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,02	UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
26	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE		0,03	0,06	UR9
28	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	PEINTURE		0,02	0,07	UR10
Commentaire sur le local		Néant						

LOCAL 08 (SOUS SOL)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	B	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
30	C	MUR	BETON	PEINTURE		0,03	0,02	UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
29	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE		0	0,04	UR9
31	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	PEINTURE		0,07	0,07	UR10
Commentaire sur le local		Néant						

LOCAL 09 (SOUS SOL)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	B	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
33	C	MUR	BETON	PEINTURE		0,07	0,12	UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
32	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE		0,02	0,06	UR9
34	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	PEINTURE		0	0,04	UR10

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

LOCAL 16 (SOUS SOL)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
36	B	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,05	UR2
	C	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
35	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE		0,03	0,08	UR9
37	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	PEINTURE		0	0,05	UR10

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

LOCAL 24 (SOUS SOL)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
65	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
66	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0,68	0,05	UR4
	B	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
39	C	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,04	UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
67	ESCALIERS	GARDE CORPS	METAL	PEINTURE		7,5	0,85	UR12
38	PLAFOND	PLAFOND	METAL	PEINTURE		4,67	1,21	UR11
40	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	PEINTURE		0,03	0,06	UR10

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

LOCAL 23 (SOUS SOL)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
42	B	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,05	UR2
	C	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
41	PLAFOND	PLAFOND	METAL	PEINTURE		5,22	1,3	UR11
43	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	PEINTURE		0,01	0,04	UR10

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

LOCAL 22 (SOUS SOL)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	B	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
45	C	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,04	UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
44	PLAFOND	PLAFOND	METAL	PEINTURE		4,9	1,25	UR11
46	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	PEINTURE		0,01	0,03	UR10
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 21 (SOUS SOL)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	B	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
48	C	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,03	UR2
63						0	0,04	
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
62	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE		0	0,06	UR9
47	PLAFOND	PLAFOND	METAL	PEINTURE		3,98	0,9	UR11
49	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	PEINTURE		0,02	0,03	UR10
64						0,01	0,04	
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 17 (SOUS SOL)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
51	B	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,03	UR2
	C	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
50	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE		0,04	0,09	UR9
52	PLANCHER	SOL	BETON	PEINTURE		0,91	0,14	UR13
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 18 (SOUS SOL)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
54	B	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,04	UR2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
53	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE		0,07	0,1	UR9
55	PLANCHER	SOL	BETON	PEINTURE		0,44	0,13	UR13
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 19 (SOUS SOL)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	B	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
57	C	MUR	BETON	PEINTURE		0,04	0,08	UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
56	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE		0,02	0,04	UR9
58	PLANCHER	SOL	BETON	PEINTURE		0,75	0,18	UR13
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 20 (SOUS SOL)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	B	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
60	C	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,03	UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
59	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE		0	0,05	UR9
61	PLANCHER	SOL	BETON	PEINTURE		0,8	0,04	UR13
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 01 (SOUS SOL)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	B	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
69	C	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,01	UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
71	D	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	E	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	F	MUR	BETON	PEINTURE				UR2

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	G	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	H	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	I	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
73	J	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,01	0,04	UR15
	J	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	K	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
68	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE		0,02	0,06	UR9
70	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT		0	0,13	UR14

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

LOCAL 02 (SOUS SOL)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
74	B	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,02	UR2
75	C	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
79	D	MUR	BETON	PEINTURE		0,01	0,03	UR2
76	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE		0	0,05	UR9
72	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT		0	0,14	UR14

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

LOCAL 04 (SOUS SOL)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
78	A	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
	B	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
84	B	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
87	C	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
77	C	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,02	UR2
85	C	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
88	C	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
86	D	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
81	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE		0,02	0,04	UR9
80	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

LOCAL 05 (SOUS SOL)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
82	A	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,02	UR2
	B	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	C	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
90	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE		0,03	0,05	UR9
89	PLANCHER	SOL	BETON	PEINTURE		0,12	0,15	UR13
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 06 (SOUS SOL)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	B	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
94	C	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,03	UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
93	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE		0,02	0,06	UR9
83	PLANCHER	SOL	BETON	PEINTURE		0,08	0,08	UR13
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 07 (SOUS SOL)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
97	B	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,03	UR2
	C	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR2
96	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE		0,01	0,05	UR9
95	PLANCHER	SOL	BETON	PEINTURE		0,08	0,1	UR13
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 114 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
92	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,13	0,04	UR18
98	D	GARDE CORPS	METAL	PEINTURE		0,01	0,06	UR16

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	E	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	F	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	G	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
100	H	MUR	BOIS	VERNIS		0	0,04	UR17
91	H	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0	0,03	UR5
99	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				
103	TOUTE ZONE	PLINTHES	BETON	PEINTURE		9,75	1,01	UR19
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 118 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
108	B	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0	0,02	UR5
107	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
104	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				
106	TOUTE ZONE	PLINTHES	BETON	PEINTURE		0	0,02	UR19
105	TOUTE ZONE	PLINTHES	CARRELAGE	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 117 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
112	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,04	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	E	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
109	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				
111	TOUTE ZONE	PLINTHES	BETON	PEINTURE		0	0,02	UR19
110	TOUTE ZONE	PLINTHES	CARRELAGE	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 122 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
115	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
102	C	VOLET	METAL	PEINTURE		7	0,8	UR21
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	E	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR3
101	E	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
	E	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR4
	F	MUR	BOIS	VERNIS				UR17
113	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				
114	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	VERNIS		0,01	0,02	UR20
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 120 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
119	A	EMBRASURE PORTE	BOIS	PEINTURE		15,08	1,55	UR22
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
120	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,02	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
118	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 121 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
	A	EMBRASURE PORTE	BOIS	PEINTURE				UR22
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
122	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
124	C	EMBRASURE	BOIS	PEINTURE		15,59	1,6	UR24
123	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,02	UR23
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
125	C	VOLET	METAL	PEINTURE		6,52	0,75	UR21
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
121	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 119 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
126	H	DAUPHIN	FORTE	PEINTURE		0	0,04	UR25
127	H	EMBRASURE	CREPIS	PEINTURE		0	0,03	UR26
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 116 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
129	A	BARREAUX FENETRE	METAL	PEINTURE		0	0,03	UR28
128	A	FENETRE	BOIS	VERNIS		0	0,04	UR27
	D	MUR	BOIS	VERNIS				UR17
131	E	MUR	BOIS	VERNIS		0	0,04	UR17
130	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		30	2,97	UR29
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 123 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
132								FERME
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 124 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BOIS	VERNIS				UR17
134	B	MUR	BOIS	VERNIS		2,26	0,06	UR17
	C	MUR	BOIS	VERNIS				UR17
137	C ET D	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
135	D	CHEMINEE	BOIS	VERNIS		0,35	0,06	UR31
	D	MUR	BOIS	VERNIS				UR17
117	D	VOLET	METAL	PEINTURE		3,83	0,33	UR21
116	PLANCHER	SOL	MOQUETTE	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 112 (RDC)								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
139	A	MUR	BOIS	PEINTURE		20,78	2,12	UR30
140	B	MUR	BOIS	PEINTURE		20,39	2,08	UR30
141	C	MUR	BOIS	PEINTURE		21,73	2,21	UR30
	D	MUR	BOIS	PEINTURE				UR30
142	D	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0,02	0,04	UR5
143	D	VOLET	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR21
138	PLANCHER	SOL	MOQUETTE	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 107 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BOIS	VERNIS				UR17
	B	MUR	BOIS	VERNIS				UR17
144	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,02	UR23
	C	MUR	BOIS	VERNIS				UR17
145	C	VOLET	METAL	PEINTURE		0,03	0,04	UR21
146	D	MUR	BOIS	VERNIS		0	0,04	UR17
147	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 108 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
148	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,02	UR18
	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE				UR23
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
150	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0,01	0,04	UR5
	C	VOLET	METAL	PEINTURE				UR21
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
149	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
151	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0		UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 110 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
157	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,07	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
158	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,1	UR4
154	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
152	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0,23	0,14	UR23
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE				UR5
153	C	VOLET	METAL	PEINTURE		5,75	0,67	UR21
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
133	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
156	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		12,21	1,26	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 111 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
164	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
165	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,03	UR4
160	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,02	UR18
	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE				UR23
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
162	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0,04	0,04	UR5
136	C	VOLET	METAL	PEINTURE		5,25	0,46	UR21
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
161	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
163	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,07	0,09	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 106 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
167	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,12	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
166	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
168	TOUTE ZONE	PLINTHES	CARRELAGE	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 101 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
171	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,02	UR18
	E	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	F	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	G	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
169	J	VERRIERE	METAL	PEINTURE		0	0,06	UR33
170	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 104 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
174	A	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
175	B	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
176	C	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
177	D	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
172	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				
173	TOUTE ZONE	PLINTHES	CARRELAGE	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 105 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
180	A	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
181	B	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
155	C	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
183	D	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
178	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
179	TOUTE ZONE	PLINTHES	CARRELAGE	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 128 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
623	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0,05	0,01	UR3
616	A	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
624	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0,08	0,04	UR4
620	A	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0,04	0,08	UR5
617	B	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
622	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
618	C	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
619	D	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
625	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR38
615	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				
621	TOUTE ZONE	PLINTHES	CARRELAGE	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 129 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
631	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,02	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
632	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
630	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0	0,05	UR40
492	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
633	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0,02	0,03	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
629	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,02	UR38
626	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
627	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,03	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 130 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
639	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,02	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
640	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
638	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0	0,05	UR40
636	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
641	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0,02	0,03	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
637	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,02	UR38
634	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
635	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,03	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 131 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
647	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,02	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
648	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
646	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0	0,05	UR40
644	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
649	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0,02	0,03	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
645	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,02	UR38
642	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
643	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,03	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 132 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
655	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,02	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
656	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
654	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0	0,05	UR40
652	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
657	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0,02	0,03	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
653	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,02	UR38
650	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
651	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,03	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 133 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
664	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,02	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
665	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
663	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0	0,05	UR40
660	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
666	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0,02	0,03	UR5
661	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
662	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,02	UR38
658	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
659	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,03	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 141 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
672	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,02	UR3
696	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,05	UR18
673	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
671	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0	0,05	UR40
669	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
674	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0,02	0,03	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
670	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,02	UR38
694	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				
667	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
668	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,03	UR32

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
695	TOUTE ZONE	PLINTHES	CARRELAGE	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 142 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
680	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,02	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
681	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
679	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0	0,05	UR40
677	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
682	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0,02	0,03	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
536	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,02	UR38
675	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
676	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,03	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 143 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
688	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,02	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
689	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
687	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0	0,05	UR40
685	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
690	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0,02	0,03	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
686	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,02	UR38
683	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
684	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,03	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 136/137 (RDC)								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
693	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,04	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
691	PLANCHER	SOL	BETON	PEINTURE		0,96	0,14	UR41
692	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR32

Commentaire sur le local

Néant

LOCAL 139 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
699	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,02	UR18
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
697	PLANCHER	SOL	BETON	PEINTURE		0,88	0,13	UR41
698	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03	0,05	UR32

Commentaire sur le local

Néant

LOCAL 138 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
702	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,02	UR18
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
700	PLANCHER	SOL	BETON	PEINTURE		0,87	0,12	UR41
701	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR32

Commentaire sur le local

Néant

LOCAL 134 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
704	C	PORTE	METAL	PEINTURE		0,45	0,19	UR42
708	ESCALIERS	GARDE CORPS	METAL	PEINTURE		0,5	0,09	UR45
709						0,54	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
705	PLAFOND	PLAFOND	BETON	PEINTURE		0	0,05	UR43
706						0	0,05	
703	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				
707	PLANCHER	TRAPPE	METAL	PEINTURE		0	0,01	UR44
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 213 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
184	A	GARDE CORPS	METAL	PEINTURE		0,83	0,18	UR16
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 232 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
192	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		15	1,54	UR34
191	A	EMBRASURE PORTE	BOIS	PEINTURE		12,89	1,33	UR22
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
193	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		13,21	1,6	UR35
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
189	C	BARREAUX FENETRE	METAL	PEINTURE		18,37	1,93	UR28
190	C	EMBRASURE	BOIS	PEINTURE		9,8	1,26	UR24
187	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0,28	0,06	UR23
186	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,04	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
185	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
188	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 234 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
198	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		18,25	1,85	UR34
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
199	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		10,21	1,01	UR35
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
196	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0,01	0,04	UR23

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
195	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,02	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
194	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
197	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,03	0,02	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 235 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
204	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		10,12	1,35	UR34
206	A	EMBRASURE PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR22
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR35
205	B	BARREAUX FENETRE	METAL	PEINTURE		4,98	1,23	UR28
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
202	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,07	UR23
159	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
200	PLANCHER	SOL	PARQUET FLOTTANT	NON PEINT				
203	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,07	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 236 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
211	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		12,56	1,33	UR34
213	A	EMBRASURE PORTE	BOIS	PEINTURE		4,22	1,23	UR22
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR35
212	B	BARREAUX FENETRE	METAL	PEINTURE		5,25	1,35	UR28
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
209	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,07	UR23
208	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
207	PLANCHER	SOL	PARQUET FLOTTANT	NON PEINT				
210	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,07	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 215 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
218	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		10,35	1,33	UR34
220	A	EMBRASURE PORTE	BOIS	PEINTURE		3,99	1,23	UR22
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR35
219	B	BARREAUX FENETRE	METAL	PEINTURE		6,1	1,4	UR28
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
216	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,07	UR23
215	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
214	PLANCHER	SOL	PARQUET FLOTTANT	NON PEINT				
217	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,07	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 211 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR4
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
221	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,02	UR23
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
225	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0	0,02	UR5
222	C	VOLET	METAL	PEINTURE		0,03	0,04	UR21
223	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
224	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
226	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 210 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
231	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0		UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
232	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0,23	0,14	UR4
228	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,04	UR18
	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE				UR23

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE				UR5
182	C	VOLET	METAL	PEINTURE		5,75	0,67	UR21
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
229	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
230	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR32

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

LOCAL 209 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR4
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
233	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,07	UR23
235	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,1	UR18
	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE				UR5
234	C	VOLET	METAL	PEINTURE		12,21	1,26	UR21
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
236	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
237	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01	0,04	UR32

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

LOCAL 208 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
242	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
239	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,07	0,09	UR18
243	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,03	UR4
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
238	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0,04	0,04	UR23
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE				UR5
	C	VOLET	METAL	PEINTURE				UR21
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
240	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
241	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,12	UR32

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

LOCAL 207 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR4
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
244	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,02	UR23
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE				UR5
245	C	VOLET	METAL	PEINTURE		0,03	0,04	UR21
246	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
247	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE				UR32

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

LOCAL 206 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
249	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,12	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
248	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				
250	TOUTE ZONE	PLINTHES	CARRELAGE	NON PEINT				

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

LOCAL 201 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
251	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,06	UR18
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	E	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
201	F	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,02	UR18
	G	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

LOCAL 204 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
255	A	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
256	B	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
257	C	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
258	D	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
253	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				
254	TOUTE ZONE	PLINTHES	CARRELAGE	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 205 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
261	A	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
262	B	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
263	C	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
264	D	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
259	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				
260	TOUTE ZONE	PLINTHES	CARRELAGE	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 212 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
266	A	CIMASE	BOIS	PEINTURE		0	0,03	UR36
269	A	EMBRASURE	BOIS	PEINTURE		20,49	2,15	UR24
268	A	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0,33	0,06	UR23
267	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
265	ESCALIERS	GARDE CORPS	METAL	PEINTURE		15,43	1,64	UR16
272	ESCALIERS	MARCHES	BOIS	PEINTURE		0,11	0,15	UR37
273						0,08	0,1	
271	PLAFOND	PLAFOND	CIMENT	PEINTURE		15,69	1,61	UR36
270	TOUTE ZONE	CREMAILLERE	BOIS	PEINTURE		9,74	1,01	UR38
274	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,08	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 218 (R+1)								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
518	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
519	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
515	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
517	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
520	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
516	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
513	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
514	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 219 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
526	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
527	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
523	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
525	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
528	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
524	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
521	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
522	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 220 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
534	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
535	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
531	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
533	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
422	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
532	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
529	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
530	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 221 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
542	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
543	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
539	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
541	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
544	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
540	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
537	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
538	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 222 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
550	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
551	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
547	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
549	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
552	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
548	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
545	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
546	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 223 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
558	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
559	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
555	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
557	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
560	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
556	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
553	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
554	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 225 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
566	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
567	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
563	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
565	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
568	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
564	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
561	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
562	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 227 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
574	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
575	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
452	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
573	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
576	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
572	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
569	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
570	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 228 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
582	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
590						0	0,04	
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
583	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
591						0	0,04	
579	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
587						0	0,05	
581	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
589						0,05	0,1	
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
584	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
592						0	0,04	
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
580	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
588						0	0,03	
577	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
585								
578	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
586						0,02	0,04	
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 230 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
598	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
599	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
595	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
597	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
600	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
596	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
593	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
594	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 231 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
609	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
602	A	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
610	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,02	UR4
606	A	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0	0,07	UR5
603	B	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
604	C	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
608	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,02	0,05	UR18
605	D	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE				UR38
601	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				
607	TOUTE ZONE	PLINTHES	CARRELAGE	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 216 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
	B	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
	C	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
611	D	MUR	BETON	PEINTURE		0,03	0,04	UR37
	E	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
	F	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
	G	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
	H	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
	I	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
	J	MUR	BETON	PEINTURE				UR37

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	K	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
	L	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
612	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
613	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,05	UR32
614	TOUTE ZONE	RAMBARDE	METAL	PEINTURE		0	0,1	UR39
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 311 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR4
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
275	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,02	UR23
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
279	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0	0,02	UR5
276	C	VOLET	METAL	PEINTURE		0,03	0,04	UR21
277	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
278	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
280	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 310 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
285	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0		UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
286	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0,23	0,14	UR4
282	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,01	0,04	UR18
	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE				UR23
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE				UR5
281	C	VOLET	METAL	PEINTURE		4,89	0,5	UR21
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
283	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
284	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 309 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR4
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
287	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,07	UR23
289	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,1	UR18
	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE				UR5
288	C	VOLET	METAL	PEINTURE		10,1	1,3	UR21
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
290	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
291	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,01	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 308 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
296	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
227	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0,07	0,09	UR18
297	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,03	UR4
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
292	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0,04	0,04	UR23
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE				UR5
	C	VOLET	METAL	PEINTURE				UR21
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
294	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
295	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,12	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 307 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
302	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		15,23	1,12	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
303	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		9,82	1,01	UR4
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
298	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,02	UR23

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE				UR5
299	C	VOLET	METAL	PEINTURE		0,03	0,04	UR21
300	D	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
301	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE				UR32

Commentaire sur le local

Néant

LOCAL 306 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
309	A	DORMANT PORTE 308	BOIS	PEINTURE		15,4	1,5	UR3
310	A	DORMANT PORTE 308	BOIS	PEINTURE		10,12	1,1	UR4
307	A	DORMANT PORTE 309	BOIS	PEINTURE		8,22	1,02	UR3
308	A	DORMANT PORTE 309	BOIS	PEINTURE		12,34	1,2	UR4
313	A	DORMANT PORTE 310	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
314	A	DORMANT PORTE 310	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
311	A	DORMANT PORTE 311	BOIS	PEINTURE		0	0,06	UR3
312	A	DORMANT PORTE 311	BOIS	PEINTURE		0	0,02	UR4
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
305	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,12	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
304	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				
306	TOUTE ZONE	PLINTHES	CARRELAGE	NON PEINT				

Commentaire sur le local

Néant

LOCAL 301 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
315	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,06	UR18
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	E	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
316	F	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,02	UR18
	G	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18

Commentaire sur le local

Néant

LOCAL 304 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
319	A	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
320	B	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
321	C	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
252	D	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
317	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				
318	TOUTE ZONE	PLINTHES	CARRELAGE	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 305 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
325	A	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
326	B	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
327	C	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
328	D	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
323	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				
324	TOUTE ZONE	PLINTHES	CARRELAGE	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 317 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
333	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		12,5	1,41	UR34
335	A	EMBRASURE PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR22
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR35
334	B	BARREAUX FENETRE	METAL	PEINTURE		4,4	1,1	UR28
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
331	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,07	UR23
330	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
329	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
332	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,07	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 318 (R+2)								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
340	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		10,25	1,2	UR34
342	A	EMBRASURE PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR22
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR35
341	B	BARREAUX FENETRE	METAL	PEINTURE		5,23	1,1	UR28
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
338	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,07	UR23
337	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
336	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
339	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,05	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 319 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		8,84	1,2	UR34
350	A	EMBRASURE PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR22
344	A	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR35
349	B	BARREAUX FENETRE	METAL	PEINTURE		6,15	1,1	UR28
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
346	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,07	UR23
345	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
343	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
347	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,05	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 320 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
355	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		11,33	1,2	UR34
357	A	EMBRASURE PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR22
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR35
356	B	BARREAUX FENETRE	METAL	PEINTURE		4,46	1,1	UR28
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
353	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,07	UR23

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
352	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
351	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
354	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,05	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 321 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
362	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		11,03	0,98	UR34
364	A	EMBRASURE PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR22
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR35
363	B	BARREAUX FENETRE	METAL	PEINTURE		5,55	1,08	UR28
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
360	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,07	UR23
359	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
358	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
361	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,05	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 322 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
369	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		12,6	1,2	UR34
371	A	EMBRASURE PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR22
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR35
370	B	BARREAUX FENETRE	METAL	PEINTURE		6,1	1,03	UR28
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
367	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,07	UR23
366	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
365	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
368	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,05	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 323 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
375	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		15,4	1,2	UR34
377	A	EMBRASURE PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR22
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE				UR35
376	B	BARREAUX FENETRE	METAL	PEINTURE		2,24	1,1	UR28
	B	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
373	C	FENETRE	BOIS	PEINTURE		0	0,07	UR23
372	C	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,04	UR18
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
374	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0	0,05	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 326 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
	B	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
	C	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
	D	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
	E	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
	F	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
378	G	MUR	BETON	PEINTURE		0	0,04	UR37
	H	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
	I	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
	J	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
	K	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
	L	MUR	BETON	PEINTURE				UR37
379	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
380	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
392	TOUTE ZONE	RAMBARDE	METAL	PEINTURE		0	0,05	UR39
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 343 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
389	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,02	UR3

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
382	A	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
390	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,01	UR4
386	A	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
293	B	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
388	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,01	UR18
384	C	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
385	D	MUR	FAIENCE	NON PEINT				
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
391	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
381	PLANCHER	SOL	CARRELAGE	NON PEINT				
387	TOUTE ZONE	PLINTHES	CARRELAGE	NON PEINT				
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 342 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
398	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
399	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
395	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
397	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
400	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
396	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
393	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
394	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 341 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
406	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
407	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
403	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
405	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
408	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
404	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
401	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
402	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32

Commentaire sur le local

Néant

LOCAL 340 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
414	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
415	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
411	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
413	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
416	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
412	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
409	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
410	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32

Commentaire sur le local

Néant

LOCAL 339 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
322	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
423	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
419	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
421	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
424	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
420	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
417	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
418	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

LOCAL 338 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
430	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
431	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
427	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
429	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
432	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
428	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
425	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
426	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

LOCAL 337 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
438	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
439	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
435	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
437	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
440	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
436	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
433	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
434	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

LOCAL 336 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
446	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
447	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
443	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
445	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
448	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
444	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
441	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
442	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 334 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
454	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
455	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
451	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
453	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
456	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
348	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
449	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
450	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 333 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
462	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
463	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
459	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
461	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
464	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
460	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
457	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
458	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 332 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
470	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
471	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
467	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
469	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
472	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
468	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
465	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
466	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 331 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
478	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
479	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
475	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
477	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
480	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
476	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
473	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
474	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 330 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
486	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
487	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
483	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
485	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
488	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
484	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
481	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
482	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 329 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
494	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
495	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
491	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
493	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
496	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
383	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
489	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
490	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 328 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
502	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
503	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
499	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
501	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
504	C	RADIAEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
500	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
497	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
498	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LOCAL 327 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
510	A	DORMANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR3
	A	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
511	A	OUVRANT PORTE	BOIS	PEINTURE		0	0,04	UR4
507	B	MUR	PLATRE	PEINTURE		0	0,05	UR18
509	C	FENETRE	METAL	PEINTURE		0,05	0,1	UR40
	C	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
512	C	RADIATEUR	METAL	PEINTURE		0	0,04	UR5
	D	MUR	PLATRE	PEINTURE				UR18
508	PLAFOND	PLAFOND	PLATRE	PEINTURE		0	0,03	UR38
505	PLANCHER	SOL	LINO	NON PEINT				
506	TOUTE ZONE	PLINTHES	BOIS	PEINTURE		0,02	0,04	UR32
Commentaire sur le local			Néant					

LEGENDE			
Localisation de la mesure	HG : en Haut à Gauche	HC : en Haut au Centre	HD : en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	C : au Centre	MD : au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	BC : en Bas au Centre	BD : en Bas à Droite

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : PJJ rue d'Auxonne 54000 NANCY
N° dossier :	29855895 - PLOMB - PJJ			
N° planche :	1/4	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : Croquis N°2

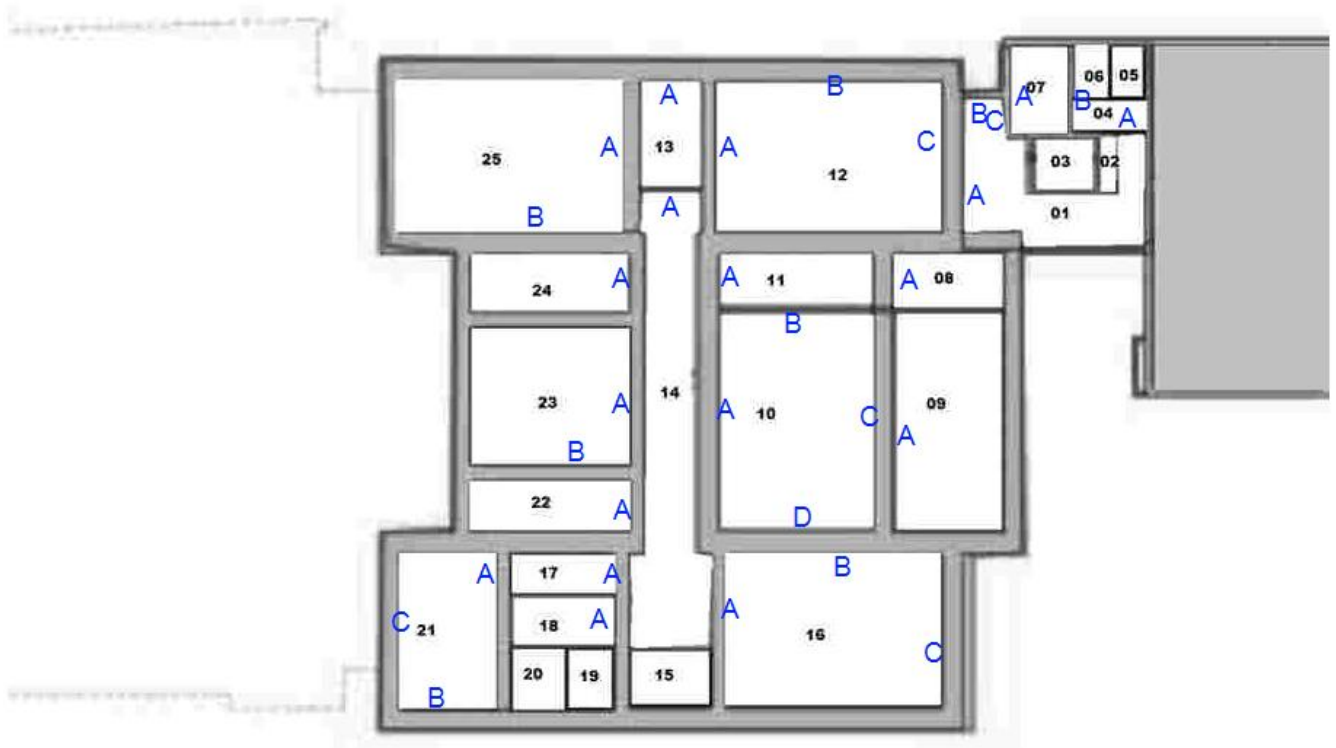


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : PJJ rue d'Auxonne 54000 NANCY	
N° dossier :	29855895 - PLOMB - PJJ				
N° planche :	3/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Croquis N°4

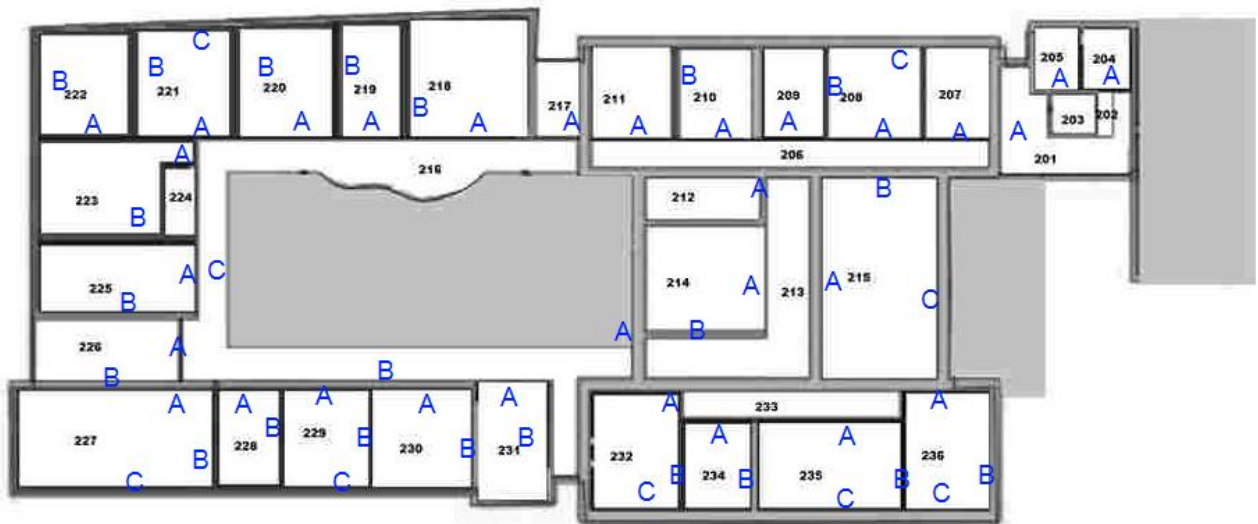


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : PJJ rue d'Auxonne 54000 NANCY	
N° dossier :	29855895 - PLOMB - PJJ				
N° planche :	4/4	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Croquis N°5





Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- ☐ Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- ☐ Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- ☐ Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- ☐ Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- ☐ Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- ☐ Etat parasitaire
- ☐ Etat relatif à la présence de termites
- ☐ Diagnostic mûr

Missions exploitation :

- ☐ Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- ☐ Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- ☐ Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- ☐ Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- ☐ Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- ☐ Diagnostic technique global
- ☐ Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- ☐ Repérage amiante pour établissement du constat vente
- ☐ Constat des risques d'exposition au plomb
- ☐ Etat relatif à la présence de termites
- ☐ Diagnostic de performance énergétique
- ☐ Etat de l'installation intérieure d'électricité
- ☐ Etat de l'installation intérieure de gaz
- ☐ Mesurages Carrez - Boutin
- ☐ Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA Intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsplatz 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Attestation d'assurance

Autres missions :

- ☐ Assistance technique amiante et plomb
- ☐ Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.


Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA Intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Recommended usage time for Co-57 isotope source in Heuresis XRF Analysis

Traduction du document d'Heuresis corp (au dos) effectuée par Fondis Electronic
Durée d'utilisation recommandée pour la source d'isotope Co-57 équipant l'analyseur de
fluorescence X d'Heuresis

15 Mars 2016

Pour valoir ce que droit,

En ce qui concerne la performance de l'instrument de fluorescence X portable d'Heuresis, muni d'une source d'isotope Co-57, conçu pour les applications de détection de plomb dans la peinture, nous déclarons les éléments suivants :

En se fondant sur la demi-vie prouvée du Co-57 d'une durée de 271,8 jours et sur les caractéristiques techniques de la détection en temps réel du système, la durée d'utilisation maximale d'une source au Co-57 est déterminée par l'activité minimum restante nécessaire à une analyse d'une durée pertinente avec des rapports signal-sur-bruit statistiquement acceptables. Lorsqu'on s'approche de la fin de vie de la source, le rapport signal-sur-bruit décroît jusqu'au point d'être masqué par le bruit de fond électronique.

Pour une activité inférieure à 29 MBq, le temps d'analyse nécessaire croît jusqu'au niveau de rendre l'instrument impraticable à l'application d'analyse de plomb dans la peinture. Pour des activités très basses, d'autres sources d'erreurs diminuent aussi la précision des résultats.

Pour un analyseur équipé d'une source au Co-57 d'activité initiale de 185 MBq, cette limite est atteinte après 24 mois.

Cette limite est indépendante de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance d'activité de la source débute au moment de sa fabrication. Compte tenu de la décroissance de la source, la durée réelle d'analyse nécessaire à l'acquisition de données analytiques pertinentes augmente au moins de façon proportionnelle.

La durée maximum d'utilisation déclarée de 24 mois (compte tenu de l'activité initiale de 185 MBq), avant de procéder au renouvellement recommandé de la source, est fondée sur des constantes et des lois physiques. Passé cette durée, les analyseurs deviennent inopérants à leur usage. L'intervalle maximum de renouvellement des sources ne doit donc pas excéder cette durée maximale de façon à maintenir le cycle de fonctionnement correct qui respecte les performances de l'analyseur.

Pour une analyse conduite par l'analyseur de fluorescence X Heuresis Pb200i sur un échantillon contenant 1 mg/cm² de plomb, nous déclarons qu'au-delà de la durée maximale énoncée ci-dessus (i.e. 24 mois), nous ne pouvons garantir que l'analyse décrite ci-dessus puisse être conduite avec une marge d'erreur dans les limites des spécifications de notre produit.

Ken Martins,

Vice-Président, Directeur de la Sécurité et Personne Compétente en Radioprotection Heuresis corporation

Nom de la société : BUREAU VERITAS

Modèle de l'analyseur :	Pb200i
Numéro de série analyseur :	8151
Activité de la source (Mbq) :	199
Numéro de série de la source :	CO57.5335.25
Date d'origine de la source :	25/08/2025
Date de fin de validité de la source :	19/09/2027



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Recommended usage time for Co-57 isotope source in Heuresis XRF Analysis

To Whom It May Concern,

15 March 2016

With regard to the instrument performance of Co-57 isotope source based handheld Heuresis XRF analyzers, Model Pb200i, designed for lead-in-paint applications, we state the following:

Based on the established physical half-life of Co-57 of 271.8 days and the live time characteristics of the detection system, the maximum use for a Co-57 source is determined by the minimum remaining activity for a useful analysis time with statistically acceptable signal-to-noise ratios. Towards the end of the life for the source the signal-to-noise ratio decreases until the electronic noise sources becomes more dominant.

At an activity below 29MBq the required analysis time increases to levels which render the instrument impractical for the application. At very low activities also other sources of error diminish the precision and accuracy of the results.

For an analyzer with a Co-57 source with an initial activity of 185 MBq this limit is reached after 24 months.

These limits are independent of the actual use of the instrument. The clock for the decay of the source starts with the assembly of the source. With the decay of the source the actual analysis time necessary to acquire meaningful analytical data increases at least proportionally.

The stated maximum usage time of 24 months (with an initial 185 MBq source) prior to the recommended resourcing is based on physical constants and laws. Past those usage periods the units become not practical to use. The maximum resourcing intervals should therefore be scheduled to not exceed those maximum periods to ensure the optimum duty cycle within proper performance characteristics the analyzer.

Assuming that an analysis is performed with a Heuresis Pb200i, XRF analyzer on a sample containing 1 mg/cm² of lead, we state the following: Beyond the time limit stated above (i.e. 24 months), we cannot guarantee that the analysis described above can be performed with an error smaller than described in our product specifications.



Ken Martin, CIH
VP, Director Compliance
Heuresis corporation
63 Chapel Street
Newton, MA 02458 USA
Mobile: +1 617-751-8286
Fax: +1 617-467-5024
kenmartin@heuresistech.com
www.heuresistech.com



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.
