



ENVIRONNEMENT

AGENCE HAUTE GARONNE

Immeuble Les Triades - Bât. C - 130 rue de
Galilée
31670 LABEGE
Tel : 0561141428
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D OCCITANIE
1025, AV HENRI BECQUEREL
34000 MONTPELLIER

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX027685
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 12/11/2025
Référence mandataire : Usine Toupnot

DÉSIGNATION DU BIEN

Usine Toupnot
16 Rue Mirambel
65100 LOURDES

PROPRIÉTAIRE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D
OCCITANIE
1025, AV HENRI BECQUEREL
34000 MONTPELLIER

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



ENVIRONNEMENT

AGENCE HAUTE GARONNE

Immeuble Les Triades - Bât. C - 130 rue de
Galilée
31670 LABEGE
Tel : 0561141428
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D OCCITANIE
1025, AV HENRI BECQUEREL
34000 MONTPELLIER

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EX027685

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 12/11/2025

Référence mandataire : Usine Toupnot

DÉSIGNATION DU BIEN

Usine Toupnot
16 Rue Mirambel
65100 LOURDES

PROPRIÉTAIRE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D
OCCITANIE
1025, AV HENRI BECQUEREL
34000 MONTPELLIER

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles R1334-19 et R1334-22 du Code de la santé publique, et conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à l'arrêté du 24 Décembre 2021, l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, ainsi qu'à la norme NF X46 - 020 d'août 2017(2ème tirage).

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 16 Rue Mirambel 65100 LOURDES

Référence client : Usine Toupnot

Désignation : Usine Toupnot

Date de construction : Avant 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : SERGENT NATHAN

Accompagnateur : Mme Claire STCHEPINSKY (Tél. 06.58.57.93;6

Date de repérage 12/11/2025

Numéro attestation : CPDI6701

Délivré le : 31/01/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D OCCITANIE
1025, AV HENRI BECQUEREL
34000 MONTPELLIER

Donneur d'ordre :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D OCCITANIE
1025, AV HENRI BECQUEREL
34000 MONTPELLIER

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 14/11/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 14/11/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Levée de réserves sur les éléments constatés sur site

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Terres polluées
Massifs
Déchets

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME DE REPÉRAGE REGLEMENTAIRE

Conformément au programme des travaux de démolition défini par le donneur d'ordre, nous avons recherché l'ensemble des Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) concernés par les travaux de démolition définis par le donneur d'ordre, sur la base des composants et parties de composant de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, ainsi que les MPSCA qui n'y figurant pas, cette liste étant indicative.

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées.	Plaques en fibres-ciment.
Ardoises.	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Éléments ponctuels.	Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles.
Revêtements bitumineux d'étanchéité.	Rivets, faîtages, closoirs...
Accessoires de toitures.	
2. Façades	
Panneaux-sandwichs.	Plaques, joints d'assemblage, tresses....
Bardages.	Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenêtres.	Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	



Murs et cloisons.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.
Poteaux (périphériques et intérieurs).	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Cloisons légères ou préfabriquées.	
Gaines et coffres verticaux.	Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	
	Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Interfaces entre structures.	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Faux plafonds.	Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduits de vapeur, fumée, échappement.	Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapet, volet, rebouchage.
Vide-ordures.	Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières.	Portes et cloisons palières.
Trémie, machinerie.	Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudières, tuyauteries, étuves,
groupes électrogènes,
convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes (internes et externes),
tissu amiante.

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture
anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante,
freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante et qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme NF X46-020 d'août 2017, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 01/10/2019 : « Chaque couche dissociable d'un échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait l'objet d'une analyse propre ». Afin de pouvoir respecter cette exigence réglementaire qui s'impose au donneur d'ordre, à l'opérateur de repérage et au laboratoire d'analyse, l'opérateur procédera systématiquement lors de son intervention et dans la mesure du possible, à la séparation des couches constitutives de l'ouvrage prélevé. Si le donneur d'ordre souhaite malgré tout une analyse globale des couches constituant l'échantillon, il est porté à son attention que les résultats d'analyse ne seraient pas rendus sous couvert d'accréditation COFRAC ni sous couvert de la réglementation en vigueur si les couches constituant l'échantillon étaient séparables soit lors du prélèvement soit lors de la préparation de l'échantillon par le laboratoire.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux de démolition ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Dans certains cas, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante au cœur d'un ouvrage peut être impossible à identifier avant le début des travaux de démolition (exemples : écarteurs de banches noyés dans le béton, calles de ferrailage des dalles béton, ancienne colle de revêtement de sol noyée dans une nouvelle dalle béton pour rehaussement d'un plancher, conduit noyé dans un mur en béton, etc.). Dans de tels cas, la responsabilité de l'opérateur ne pourra pas être recherchée en cas de défaut de conclusion dans son rapport. Une nouvelle intervention de repérage complémentaire pourra être organisée, selon nos conditions tarifaires en vigueur ou conditions prévues au contrat.

Enfin, il est rappelé au donneur d'ordre que le repérage doit se faire en site vide d'occupant et d'équipement ou mobilier. La présence d'occupant, d'équipement ou de mobilier peut limiter fortement la réalisation d'investigations et de sondages destructifs, et donc l'exhaustivité des conclusions du présent rapport de repérage. Le donneur d'ordre est présumé informé de nos exigences d'intervention dès la commande de notre intervention et ne pourra se prévaloir ultérieurement de défaut de conclusion ayant pour cause la présence d'occupant, d'équipements ou de mobiliers lors de notre intervention.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Conformément à l'article R1334-29-6 du Code de la santé publique, le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante avant démolition est communiqué par le propriétaire du bâtiment à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (Terrain)	Voies et réseaux divers	Massif	Éléments en fibrociment	P1
Vol 1 (Terrain)	Voies et réseaux divers	Terre polluée	Éléments en fibrociment	P2
Vol 1 (Terrain)	Voies et réseaux divers	Déchets	Éléments en fibrociment	P3
Vol 1 (Terrain)	Voies et réseaux divers	Terre polluée	Éléments en fibrociment	P4
Vol 1 (Terrain)	Voies et réseaux divers	Terre polluée	Éléments en fibrociment	P5
Vol 1 (Terrain)	Voies et réseaux divers	Déchets	Éléments en fibrociment	P6
Vol 1 (Terrain)	Voies et réseaux divers	Terre polluée	Éléments en fibrociment	P7
Vol 1 (Terrain)	Voies et réseaux divers	Terre polluée	Éléments en fibrociment	P8

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Découverte MPCA : Si des MPCA de même nature sont découverts lors de l'avancement des travaux, ils pourront être traités de la même manière que ceux déjà repérés dans le présent rapport de repérage.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Voies et réseaux divers



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Usine Toupinot	Vol 1 (Terrain)	Massif	Éléments en fibrociment	P1	Réalisation d'un prélèvement	Sous terre	002EX 02768 5 n°1 - 2 - 002EX 02768 5 n°1 - 4 - 002EX 02768 5 n°1 - 6	P1	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Usine Toupinot	Vol 1 (Terrain)	Massif	Éléments en fibrociment	S1 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Sous terre	002EX 02768 5 n°1 - 2 - 002EX 02768 5 n°1 - 4 - 002EX 02768 5 n°1 - 6	P1	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Usine Toupnot	Vol 1 (Terrain)	Massif	Éléments en fibrociment	S2 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Sous terre	002EX 02768 5 n°1 - 2 - 002EX 02768 5 n°1 - 4 - 002EX 02768 5 n°1 - 6	P1	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Usine Toupnot	Vol 1 (Terrain)	Massif	Éléments en fibrociment	S3 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Sous terre	002EX 02768 5 n°1 - 2 - 002EX 02768 5 n°1 - 4 - 002EX 02768 5 n°1 - 6	P1	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Usine Toupinot	Vol 1 (Terrain)	Massif	Éléments en fibrociment	S4 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Sous terre	002EX 02768 5 n°1 - 2 - 002EX 02768 5 n°1 - 4 - 002EX 02768 5 n°1 - 6	P1	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Usine Toupinot	Vol 1 (Terrain)	Massif	Éléments en fibrociment	S5 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Sous terre	002EX 02768 5 n°1 - 2 - 002EX 02768 5 n°1 - 4 - 002EX 02768 5 n°1 - 6	P1	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Usine Touptot	Vol 1 (Terrain)	Massif	Éléments en fibrociment	S6 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Sous terre	002EX 02768 5 n°1 - 2 - 002EX 02768 5 n°1 - 4 - 002EX 02768 5 n°1 - 6	P1	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Usine Touptot	Vol 1 (Terrain)	Massif	Éléments en fibrociment	S7 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Sous terre	002EX 02768 5 n°1 - 2 - 002EX 02768 5 n°1 - 4 - 002EX 02768 5 n°1 - 6	P1	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Usine Touptot	Vol 1 (Terrain)	Massif	Éléments en fibrociment	S8 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Sous terre	002EX 02768 5 n°1 - 2 - 002EX 02768 5 n°1 - 4 - 002EX 02768 5 n°1 - 6	P1	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Usine Touptot	Vol 1 (Terrain)	Massif	Éléments en fibrociment	S9 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Sous terre	002EX 02768 5 n°1 - 2 - 002EX 02768 5 n°1 - 4 - 002EX 02768 5 n°1 - 6	P1	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Usine Toupnot	Vol 1 (Terrain)	Massif	Éléments en fibrociment	S10 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Sous terre	002EX 02768 5 n°1 - 2 - 002EX 02768 5 n°1 - 4 - 002EX 02768 5 n°1 - 6	P1	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Usine Toupnot	Vol 1 (Terrain)	Massif	Éléments en fibrociment	S11 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Sous terre	002EX 02768 5 n°1 - 2 - 002EX 02768 5 n°1 - 4 - 002EX 02768 5 n°1 - 6	P1	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Usine Toupnot	Vol 1 (Terrain)	Massif	Éléments en fibrociment	S12 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Sous terre	002EX 02768 5 n°1 - 2 - 002EX 02768 5 n°1 - 4 - 002EX 02768 5 n°1 - 6	P1	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Usine Toupnot	Vol 1 (Terrain)	Massif	Éléments en fibrociment	S13 (P1)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Sous terre	002EX 02768 5 n°1 - 2 - 002EX 02768 5 n°1 - 4 - 002EX 02768 5 n°1 - 6	P1	Fibres-cime nt - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Usine Touptot	Vol 1 (Terrain)	Terre polluée	Éléments en fibrociment	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EX 02768 5 n°2 - 2 - 002EX 02768 5 n°2 - 4 - 002EX 02768 5 n°2 - 6 - 002EX 02768 5 n°2 - 8	P2	Fibres-cime nt - Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Usine Touptot	Vol 1 (Terrain)	Terre polluée	Éléments en fibrociment	S14 (P2)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EX 02768 5 n°2 - 2 - 002EX 02768 5 n°2 - 4 - 002EX 02768 5 n°2 - 6 - 002EX 02768 5 n°2 - 8	P2	Fibres-cime nt - Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Usine Touptnot	Vol 1 (Terrain)	Déchets	Éléments en fibrociment	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EX 02768 5 n°3 - 2	P3	Fibres-cime nt - Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Usine Touptnot	Vol 1 (Terrain)	Terre polluée	Éléments en fibrociment	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EX 02768 5 n°4 - 2 - 002EX 02768 5 n°4 - 4	P4	Fibres-cime nt - Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Usine Touptnot	Vol 1 (Terrain)	Terre polluée	Éléments en fibrociment	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EX 02768 5 n°5 - 2 - 002EX 02768 5 n°5 - 4 - 002EX 02768 5 n°5 - 6	P5	Fibres-cime nt - Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Usine Touptnot	Vol 1 (Terrain)	Déchets	Éléments en fibrociment	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EX 02768 5 n°6 - 2	P6	Fibres-cime nt - Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Usine Toupnot	Vol 1 (Terrain)	Terre polluée	Éléments en fibrociment	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EX 02768 5 n°7 - 2 - 002EX 02768 5 n°7 - 4 - 002EX 02768 5 n°7 - 6 - 002EX 02768 5 n°7 - 8	P7	Fibres-cime nt - Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Usine Toupnot	Vol 1 (Terrain)	Terre polluée	Éléments en fibrociment	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EX 02768 5 n°8 - 2 - 002EX 02768 5 n°8 - 4 - 002EX 02768 5 n°8 - 6	P8	Fibres-cime nt - Fibreux - Gris	Positif	Présen ce sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
			Usine Toupnot				
P1	Massif	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 1 (Terrain) - Vol 1 (Terrain) - Vol 1 (Terrain) - Vol 1 (Terrain) - Vol 1 (Terrain) - Vol 1 (Terrain) - Vol 1 (Terrain) - Vol 1 (Terrain) - Vol 1 (Terrain) - Vol 1 (Terrain) - Vol 1 (Terrain) - Vol 1 (Terrain) - Vol 1 (Terrain) - Vol 1 (Terrain) - Vol 1 (Terrain) - Vol 1 (Terrain)	152,57 m		107,05 m²	
P2	Terre polluée	Fibres-ciment - Fibreux - Gris	Vol 1 (Terrain) - Vol 1 (Terrain)	291,69 m		476,56 m²	
P3	Déchets	Fibres-ciment - Fibreux - Gris	Vol 1 (Terrain)	15,29 m		14,36 m²	
P4	Terre polluée	Fibres-ciment - Fibreux - Gris	Vol 1 (Terrain)	102,74 m		509,18 m²	
P5	Terre polluée	Fibres-ciment - Fibreux - Gris	Vol 1 (Terrain)	92,02 m		518,02 m²	
P6	Déchets	Fibres-ciment - Fibreux - Gris	Vol 1 (Terrain)	9,65 m		5,6 m²	
P7	Terre polluée	Fibres-ciment - Fibreux - Gris	Vol 1 (Terrain)	118,04 m		749,59 m²	
P8	Terre polluée	Fibres-ciment - Fibreux - Gris	Vol 1 (Terrain)	122,1 m		837,15 m²	

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	 Usine Toupnot	Usine Toupnot - Plan de repérage - Actions menées
	 Usine Toupnot	Usine Toupnot - MPCA Voies et réseaux divers

USINE TOUPNOT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX027685


Légende

P

Localisation d'un prélèvement positif

§

Localisation dun sondage positif

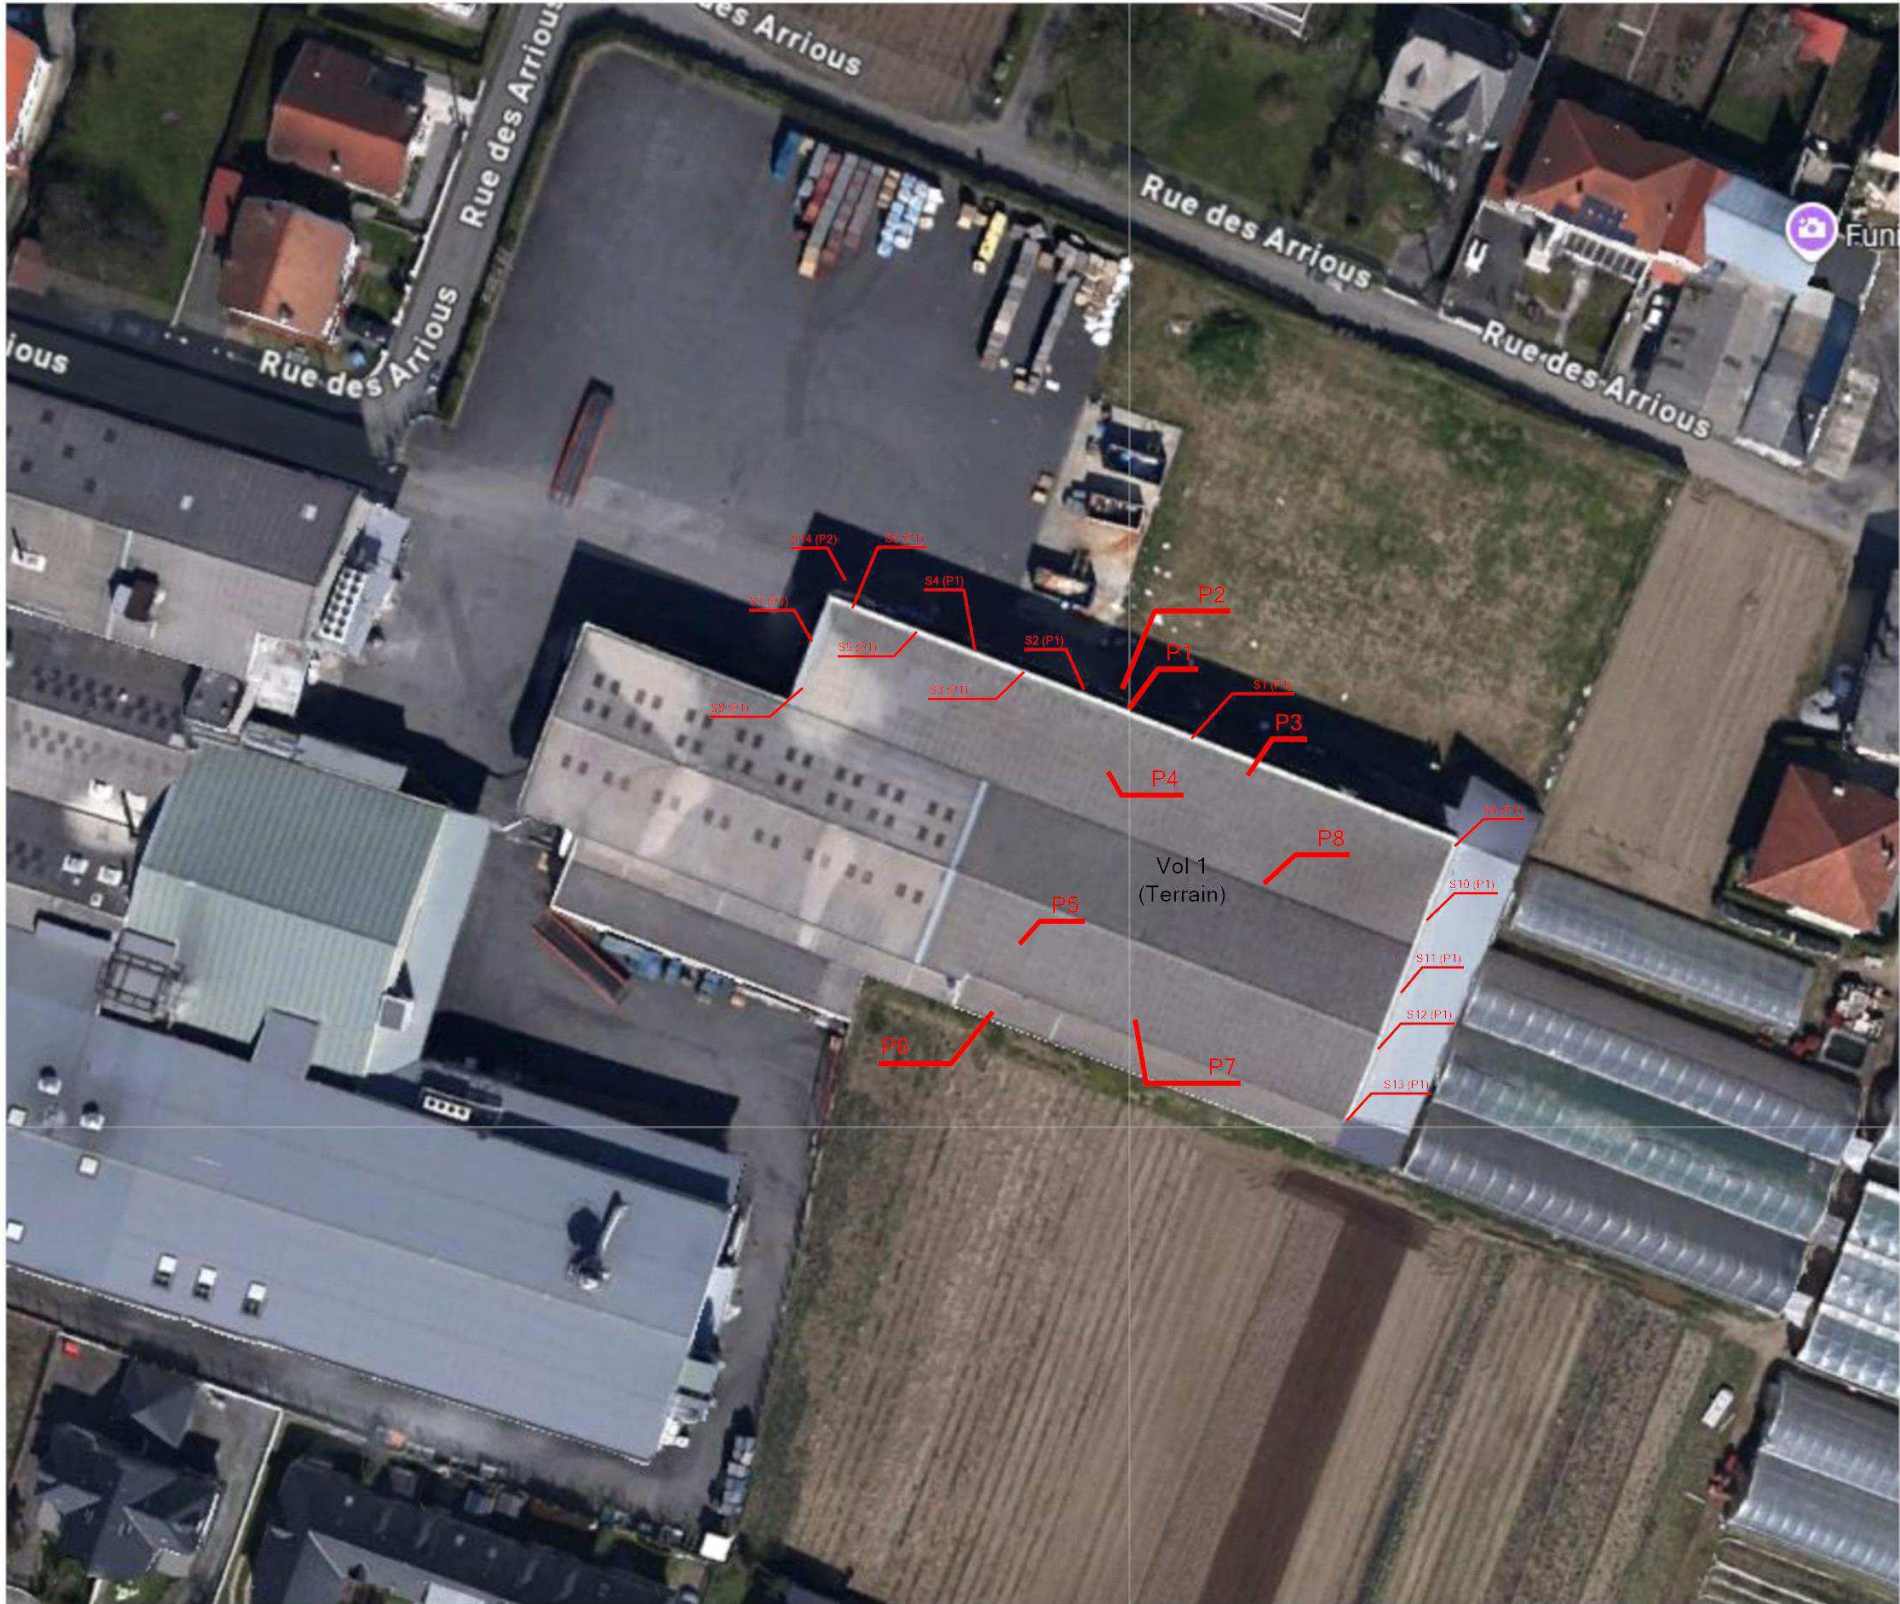

Adresse du bien

16 Rue Mirambel
65100 LOURDES

Désignation


Usine Toupnot

Date intervention

12/11/2025

Techniciens intervenant

SERGEANT NATHAN

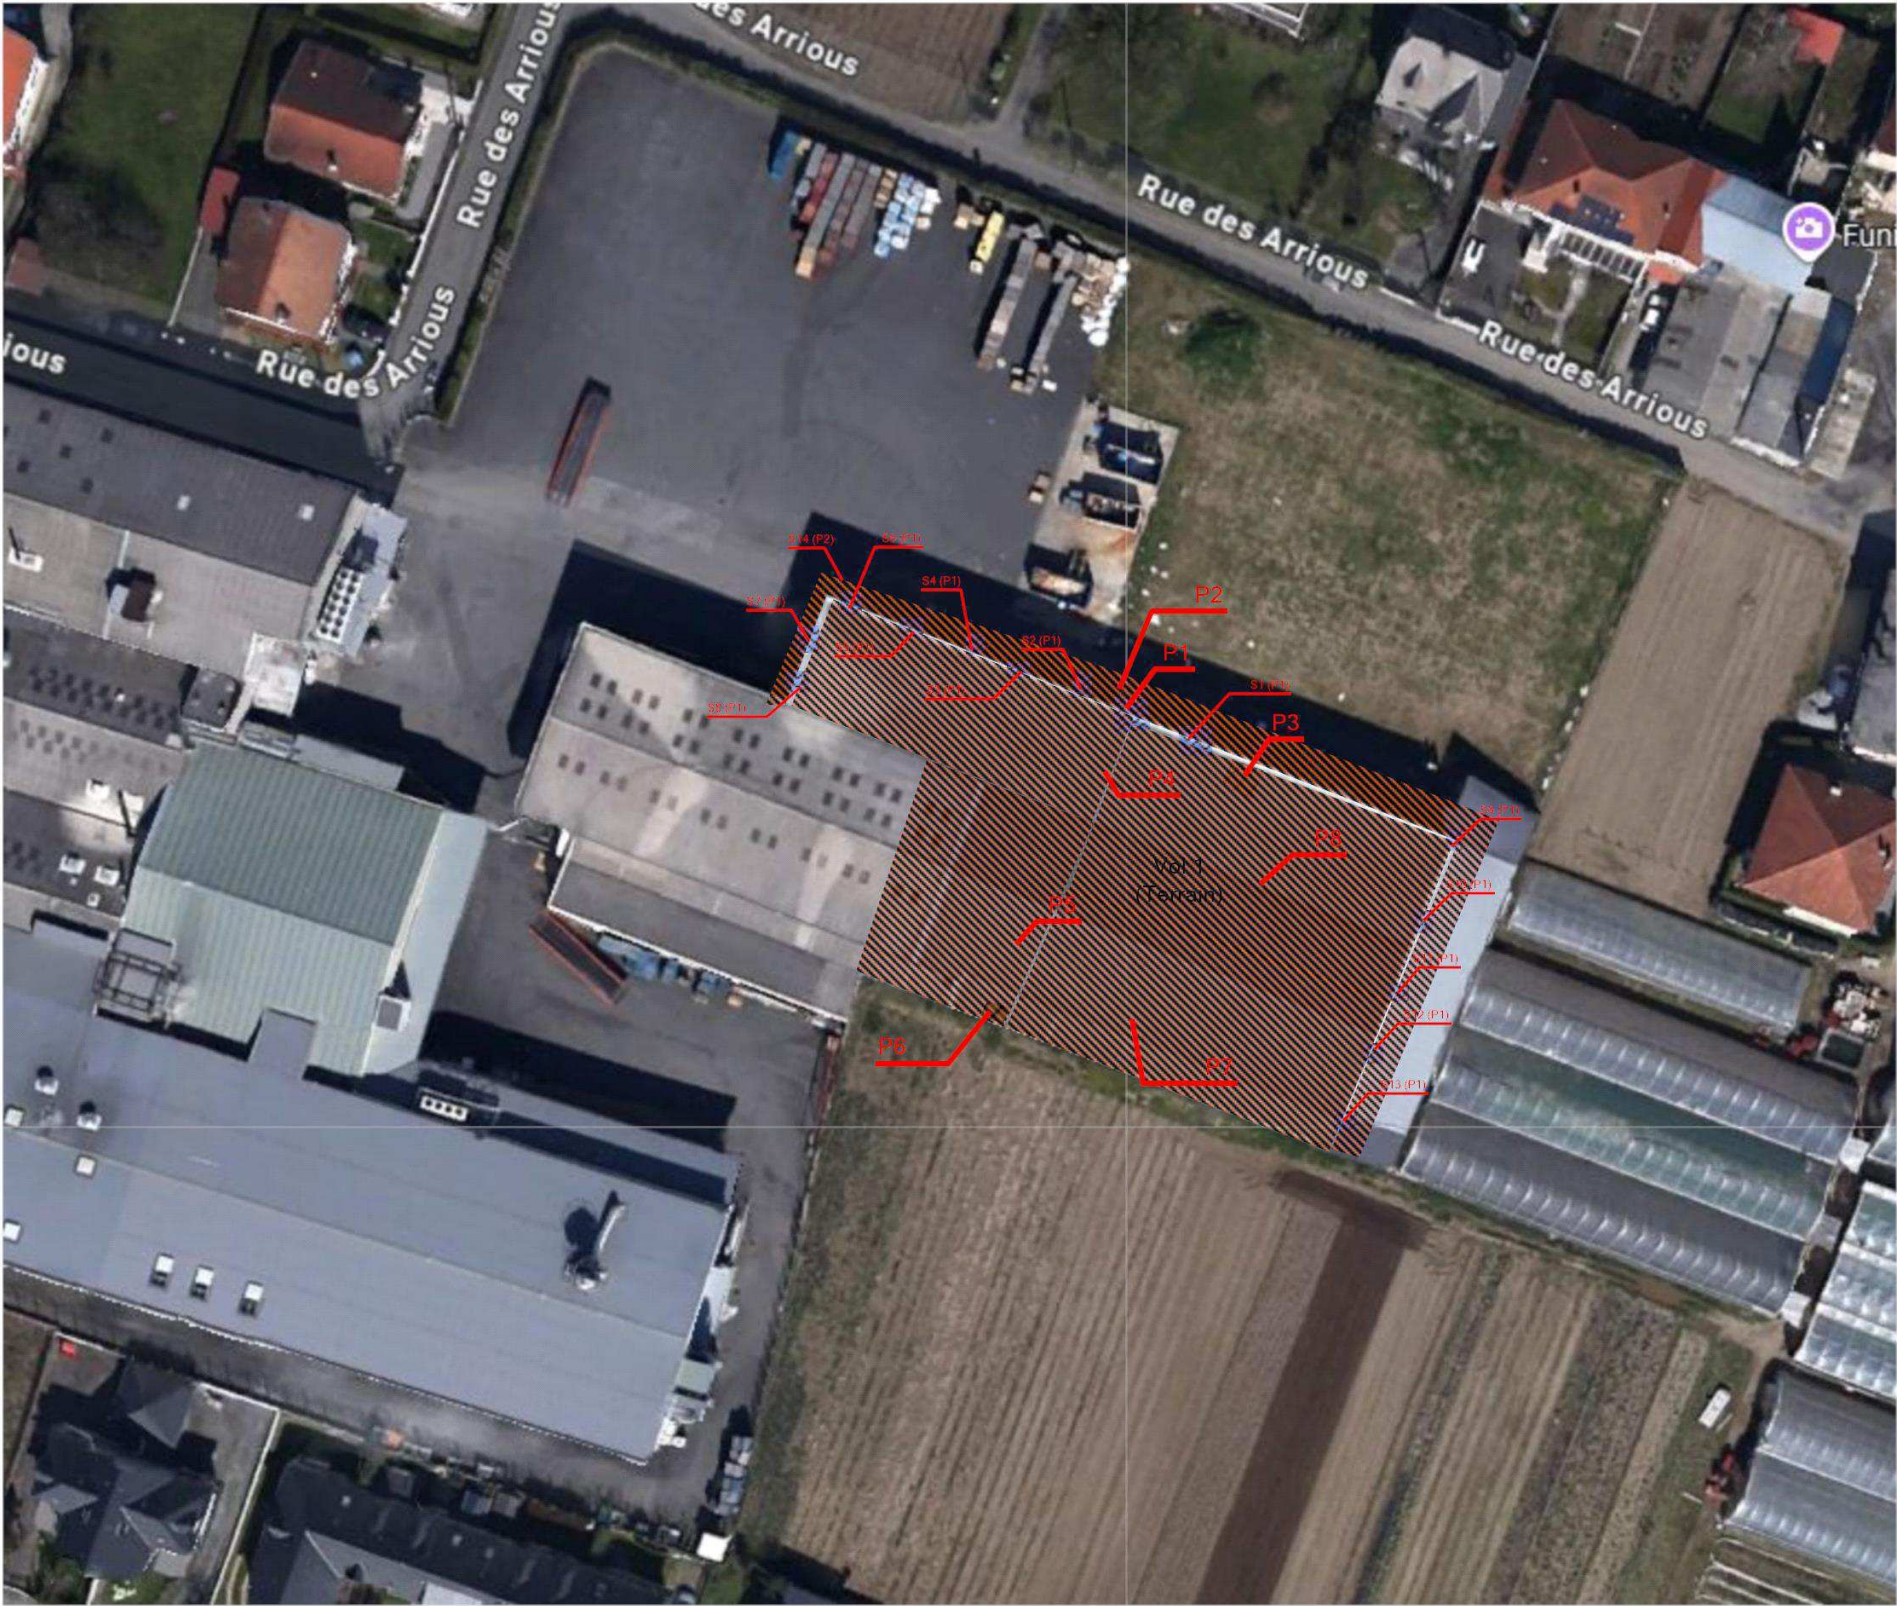

Légende



P2 : Éléments en fibrociment




P3 : Éléments en fibrociment



P8 : Éléments en fibrociment



P5 : Éléments en fibrociment



P1 : Éléments en fibrociment




P6 : Éléments en fibrociment



P7 : Éléments en fibrociment



P4 : Éléments en fibrociment



Technicien intervenant

SERGENT NATHAN

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EX027685 n°1 - 2 (P1)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°1 - 4 (P1)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°1 - 6 (P1)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°2 - 2 (P2)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°2 - 8 (P2)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°2 - 6 (P2)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°2 - 4 (P2)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°3 - 2 (P3)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°4 - 4 (P4)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°4 - 2 (P4)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°5 - 2 (P5)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°5 - 4 (P5)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°5 - 6 (P5)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°6 - 2 (P6)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°7 - 8 (P7)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°7 - 4 (P7)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°7 - 2 (P7)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°7 - 6 (P7)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°8 - 2 (P8)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°8 - 6 (P8)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif
002EX027685 n°8 - 4 (P8)	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	Prélèvement positif



002EX027685 n°1 - 2 (P1) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°1 - 4 (P1) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°1 - 6 (P1) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°2 - 2 (P2) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°2 - 8 (P2) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°2 - 6 (P2) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°2 - 4 (P2) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°3 - 2 (P3) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°4 - 4 (P4) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°4 - 2 (P4) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°5 - 2 (P5) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°5 - 4 (P5) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°5 - 6 (P5) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°6 - 2 (P6) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°7 - 8 (P7) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°7 - 4 (P7) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°7 - 2 (P7) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°7 - 6 (P7) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°8 - 2 (P8) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°8 - 6 (P8) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)



002EX027685 n°8 - 4 (P8) - Usine Toupnot - Vol 1
(Terrain)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Voies et réseaux divers	Massif	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Sous terre	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	
P2	Voies et réseaux divers	Terre polluée	Fibres-ciment - Fibreux - Gris	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	
P3	Voies et réseaux divers	Déchets	Fibres-ciment - Fibreux - Gris	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	
P4	Voies et réseaux divers	Terre polluée	Fibres-ciment - Fibreux - Gris	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	
P5	Voies et réseaux divers	Terre polluée	Fibres-ciment - Fibreux - Gris	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	
P6	Voies et réseaux divers	Déchets	Fibres-ciment - Fibreux - Gris	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	
P7	Voies et réseaux divers	Terre polluée	Fibres-ciment - Fibreux - Gris	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	
P8	Voies et réseaux divers	Terre polluée	Fibres-ciment - Fibreux - Gris	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)	



ITGA ANALYTICS ARCUEIL
16 rue Marcel Vigneron
94110 Arcueil
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7327
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CHANTIER

Référence **C012025811955**
Adresse Commande : 002EX027685
Affaire : Usine Toupnot
16 Rue Mirambel
65100 LOURDES

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 14/11/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025811955 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Arcueil
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) ⁽¹⁾ : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EX027685_001

Référence labo	PM07421805	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	14/11/2025
Type de prélèvement	Voies et réseaux divers - Massif - Éléments en fibrociment		
Zone de prélèvement	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)		
Remarque concernant le prélèvement	Sous terre		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	WSN	-	-	-	-	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET				

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat

1 MOLP

0 MET

Remarque concernant l'analyse

RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025811955
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002EX027685_002

Référence labo	PM07421806	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	14/11/2025
Type de prélèvement	Voies et réseaux divers - Terre polluée - Éléments en fibrociment		
Zone de prélèvement	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Fibres-ciment Fibreux Gris	1	1 WSN	-	-	-	-	Chrysotile	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET					

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002EX027685_003

Référence labo	PM07421807	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	14/11/2025
Type de prélèvement	Voies et réseaux divers - Déchets - Éléments en fibrociment		
Zone de prélèvement	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Fibres-ciment Fibreux Gris	1	1 WSN	-	-	-	-	Chrysotile	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET					

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002EX027685_004

Référence labo	PM07421808	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	14/11/2025
Type de prélèvement	Voies et réseaux divers - Terre polluée - Éléments en fibrociment		
Zone de prélèvement	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Fibres-ciment Fibreux Gris	1	1 WSN	-	-	-	-	Chrysotile	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET					

Remarque concernant l'analyse

RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025811955
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002EX027685_005

Référence labo	PM07421809	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	14/11/2025
Type de prélèvement	Voies et réseaux divers - Terre polluée - Éléments en fibrociment		
Zone de prélèvement	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Fibres-ciment Fibreux Gris	1	1 WSN	-	-	-	Chrysotile	●	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET					

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002EX027685_006

Référence labo	PM07421810	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	14/11/2025
Type de prélèvement	Voies et réseaux divers - Déchets - Éléments en fibrociment		
Zone de prélèvement	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Fibres-ciment Fibreux Gris	1	1 WSN	-	-	-	Chrysotile	●	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET					

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002EX027685_007

Référence labo	PM07421811	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	14/11/2025
Type de prélèvement	Voies et réseaux divers - Terre polluée - Éléments en fibrociment		
Zone de prélèvement	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Fibreux Gris	1	1	WSN	-	-	-	-	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET					

Remarque concernant l'analyse

RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012025811955
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EX027685_008

Référence labo	PM07421812	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/11/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	NATHAN SERGENT	Date d'analyse	14/11/2025
Type de prélèvement	Voies et réseaux divers - Terre polluée - Éléments en fibrociment		
Zone de prélèvement	Usine Toupnot - Vol 1 (Terrain)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Fibres-ciment Fibreux Gris	1	1 WSN	-	-	-	Chrysotile		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET					

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence dossier: RSC012025811955

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 8 MOLP et 0 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 8/8

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

Analyste
Marion Gauin Thimon



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

