

Pré-Rapport du 16/04/2025 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Bâtiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine
(Devis N°2305-CNABO-085)
23100 LA COURTINE

Propriétaire

ESID DE BORDEAUX
9 rue de CURSOL
33068 BORDEAUX CEDEX

Demandeur

ESID DE BORDEAUX
9 rue de CURSOL
33068 BORDEAUX CEDEX

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 16/04/2025

Date de visite : 17/10/2023

Nombre de pages : 62

Fait à : 64100 BAYONNE

Référence du dossier : 2310CNABA -
BI2190000000019

Nombre de prélèvements : 83

Le présent rapport est établi par :
David LOKIETEK

dont les compétences sont certifiées par : I.Cert
Centre Alphas - Bâtiment K - Parc d'affaires -
Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE
(détail sur www.info-certif.fr)
sur la durée de validité du : 18/07/2022 au
17/07/2029
Certificat de compétence :
n° CPDI2619
Contrat d'assurance :
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2025

Révision	Date	Objet
Version initiale	17/10/2023	Edition initiale
V2	09/01/2024	Ajout des garnitures de freins, séparation de couches des sols au R+1 levé de doute sur les colles de carrelage au Rdc.
V3	16/04/2025	Ajout des conduits amiantés dans les 3 cheminées (cf plan)

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE.....	3
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION	4
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	5
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	5
1. PRESTATIONS REALISEES.....	5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	6
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION	7
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE	9
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF.....	14
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	14
VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....	15
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT	15
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	15
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	16
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	20
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	25
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	60
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	61
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE	62

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Cartographie amiante du bâtiment sur les sols murs et plafond intérieur du bâtiment, enduits de façades, revêtements sur la toiture.

Les garnitures de frein de l'ascenseur ont été prélevées, à la demande du client, pour garantir l'absence d'amiante si maintenance sur ce composant.

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

Contrôle sur Sol, Murs et plafond intérieur du bâtiment et revêtement de toiture.

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

Localisation	Matériau ou produit
R+2 - Pièce 1; Rdc - Pièce 5 (sous-station vers pignon gauche); Rdc - Pièce 10 (plénum); R+1 - Pièce 1 (vers toiture)	Conduit en fibres-ciment
Rdc - Pièce 13 plénum sanitaires vers toiture.	Conduit en fibres-ciment
Extérieur - Toiture secondaire	Ardoises en fibro ciment
Extérieur - Pignon Gauche	Enduit extérieur
R+1 - Pièce 5; R+1 - Pièce 6	Dalle de sol grise (uniquement)
	Dalle de sol Noire (uniquement)
Cheminée des fours à pain	Conduits en fibres-ciment (3 cheminées)

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : < 1997

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
R+2	Pièce 1
R+2	Pièce 2
R+2	Pièce 3
R+2	Pièce 4
R+1	Pièce 1
R+1	Pièce 2
R+1	Pièce 3
R+1	Pièce 4
R+1	Pièce 5
R+1	Pièce 6
R+1	Pièce 7
Rdc	Pièce 1
Rdc	Pièce 2
Rdc	Pièce 3
Rdc	Pièce 4
Rdc	Pièce 5
Rdc	Pièce 6
Rdc	Pièce 7
Rdc	Pièce 8
Rdc	Pièce 9
Rdc	Pièce 10
Rdc	Pièce 11
Rdc	Pièce 12
Rdc	Pièce 13
Extérieur	Façade avant
Extérieur	Façade arrière
Extérieur	Pignon Gauche
Extérieur	Pignon Droit
Extérieur	Toiture

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Bordeaux (Cofrac : 1-5908)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Pré-Rapport du 16/04/2025 de la mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> USID De La Courtine

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Remarques :

Attention, les pléniums n'ont pas pu être contrôlés de manière exhaustive, si des travaux sont prévus dans ces zones, s'assurer de l'absence de matériaux et produits amiantés lors de la dépose des dalles de faux plafond.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X
Toiture accessible et visitable	X		
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement	X		

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Localisation	Parties du local	Raison
Rdc - Plénum	Toutes	Non visitable de manière exhaustive

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Occupé

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Oui DTA
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Bâtiment 190	R+2
Bâtiment 190	R+1
Bâtiment 190	Rdc
Bâtiment 190	Extérieur

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-023	R+2 - Pièce 1; Rdc - Pièce 5 (sous-station vers pignon gauche); Rdc - Pièce 10 (plénum); R+1 - Pièce 1 (vers toiture)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	P030 (R+1 - Pièce 1)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
	Rdc - Pièce 13 plénum sanitaires vers toiture.	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	P030 (R+1 - Pièce 1)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-024	Extérieur - Toiture secondaire	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux - Ardoises en fibro ciment	Ardoises en fibro ciment	P031 (Extérieur - Toiture secondaire) P036 (Extérieur - Toiture secondaire)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-072	Extérieur - Pignon Gauche	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur	P080 (Extérieur - Pignon Gauche)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-073	R+1 - Pièce 5; R+1 - Pièce 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol grise (uniquement)		Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	
ZPSO-074	R+1 - Pièce 5; R+1 - Pièce 6	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol Noire (uniquement)		Présence d'amiante (Sur anciennes analyses)	
ZPSO-078	Cheminée des fours à pain	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Conduits en fibres-ciment (3 cheminées)	P084 (Cheminée des fours à pain)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	R+2 - Pièce 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle Lino	P001 (R+2 - Pièce 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	R+2 - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit cloison	P002 (R+2 - Pièce 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	R+2 - Pièce 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle Lino	P003 (R+2 - Pièce 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	R+2 - Pièce 2; R+2 - Pièce 4	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plafond	P004 (R+2 - Pièce 2) P006 (R+2 - Pièce 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	R+2 - Pièce 2; R+2 - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit Périphérique	P005 (R+2 - Pièce 4) P007 (R+2 - Pièce 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	R+2 - Pièce 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Pare vapeur	Pare vapeur	P008 (R+2 - Pièce 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	R+2 - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit	P009 (R+2 - Pièce 1) P010 (R+2 - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	R+2 - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture IPN	P011 (R+2 - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	R+2 - Pièce 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Pare vapeur	Pare vapeur ballon d'eau chaude	P012 (R+2 - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	R+2 - Pièce 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	mastic de vitrage	P013 (R+2 - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Extérieur - Toiture principale	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Ardoises, bardeaux bitumineux - Ardoises composites hors fibro ciment	Ardoises composites	P014 (Extérieur - Toiture principale)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	R+1 - Pièce 6	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle	Colle de revêtement vinyle	P015 (R+1 - Pièce 6)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-013	R+1 - Pièce 1; R+1 - Pièce 3; R+1 - Pièce 5; R+1 - Pièce 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit périphérique	P016 (R+1 - Pièce 6) P019 (R+1 - Pièce 5) P021 (R+1 - Pièce 1) P023 (R+1 - Pièce 1) P033 (R+1 - Pièce 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	R+1 - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit cloison	P017 (R+1 - Pièce 5) P020 (R+1 - Pièce 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	R+1 - Pièce 5	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plafond	P018 (R+1 - Pièce 5)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	R+1 - Pièce 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P022 (R+1 - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	R+1 - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit poteau	P024 (R+1 - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	R+1 - Pièce 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit poutre	P025 (R+1 - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	R+1 - Pièce 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plafond	P026 (R+1 - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	R+1 - Pièce 7	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit Périphérique	P027 (R+1 - Pièce 7)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	R+1 - Pièce 7	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	mastic de vitrage	P028 (R+1 - Pièce 7)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	R+1 - Pièce 7	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	mastic de vitrage	P029 (R+1 - Pièce 7)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	R+1 - Pièce 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle Lino	P032 (R+1 - Pièce 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	R+1 - Pièce 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plafond	P034 (R+1 - Pièce 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	R+1 - Pièce 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P035 (R+1 - Pièce 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-029	R+1 - Pièce 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	mastic de vitrage imposte	P037 (R+1 - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	Rdc - Pièce 13	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P038 (Rdc - Pièce 13)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	Rdc - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe carrelage	P039 (Rdc - Pièce 13)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	Rdc - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P040 (Rdc - Pièce 13)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	Rdc - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit	P041 (Rdc - Pièce 13)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	Rdc - Pièce 13	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P042 (Rdc - Pièce 13)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	Rdc - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P043 (Rdc - Pièce 13)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	Rdc - Pièce 13	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Dalles de faux-plafond	P044 (Rdc - Pièce 13)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	Rdc - Pièce 13	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P045 (Rdc - Pièce 13)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	Rdc - Pièce 13	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit	P046 (Rdc - Pièce 13)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	Rdc - Pièce 13	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	mastic de vitrage	P047 (Rdc - Pièce 13)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	Rdc - Pièce 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit	P048 (Rdc - Pièce 5)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	Rdc - Pièce 5	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit	P049 (Rdc - Pièce 5)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-042	Rdc - Pièce 5	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plafond	P050 (Rdc - Pièce 5)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-043	Rdc - Pièce 12	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P051 (Rdc - Pièce 12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	Rdc - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe carrelage	P052 (Rdc - Pièce 12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	Rdc - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P053 (Rdc - Pièce 12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	Rdc - Pièce 12	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit	P054 (Rdc - Pièce 12)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	Rdc - Escaliers	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit	P055 (Rdc - Escaliers)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	Rdc - Pièce 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit	P056 (Rdc - Pièce 4)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	Rdc - Pièce 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit	P057 (Rdc - Pièce 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	Rdc - Pièce 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit	P058 (Rdc - Pièce 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-051	R+2 - Pièce 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Colle Lino	P059 (R+2 - Pièce 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-052	Rdc - Pièce 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit plafond	P060 (Rdc - Pièce 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-053	Rdc - Pièce 7	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes - Plaques	Plaques débris caniveau	P061 (Rdc - Pièce 7)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-054	Rdc - Pièce 8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit	P062 (Rdc - Pièce 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-055	Rdc - Pièce 8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit	P063 (Rdc - Pièce 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-056	Rdc - Pièce 8	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit cheminée	P064 (Rdc - Pièce 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-057	Rdc - Pièce 8	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol	Peinture de sol	P065 (Rdc - Pièce 8)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-058	Rdc - Pièce 7	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Dalles de faux-plafond	P066 (Rdc - Pièce 7)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-059	Rdc - Pièce 7	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture sur parpaing	P067 (Rdc - Pièce 7)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-061	Rdc - Pièce 6	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe carrelage	P069 (Rdc - Pièce 6)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-062	Rdc - Pièce 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit	P070 (Rdc - Pièce 6)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-063	Rdc - Pièce 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit	P071 (Rdc - Pièce 6)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-064	Rdc - Pièce 6	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	mastic de vitrage	P072 (Rdc - Pièce 6)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-065	Rdc - Pièce 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit	P073 (Rdc - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-066	Rdc - Pièce 6	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit	P074 (Rdc - Pièce 6)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-067	Extérieur - Façade avant	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur	P075 (Extérieur - Façade avant)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-068	Extérieur - Façade avant	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur Appui	P076 (Extérieur - Façade avant)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-069	Extérieur - Pignon Droit	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur	P077 (Extérieur - Pignon Droit)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-070	Extérieur - Façade arrière	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur	P078 (Extérieur - Façade arrière)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-071	Extérieur - Façade arrière	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Isolant	P079 (Extérieur - Façade arrière)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-075	Rdc - Pièce 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P081 (Rdc - Pièce 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-076	R+1 - Pièce 5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage, colle sous dalle	P082 (R+1 - Pièce 5)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-077	R+2 - Pièce 1	7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - Matériels en machinerie - Frein d'ascenseur	Frein d'ascenseur	P083 (R+2 - Pièce 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.


Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.


ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION



Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P001
Description : Colle Lino
Localisation : R+2 - Pièce 4
Résultat : Absence d'amiante

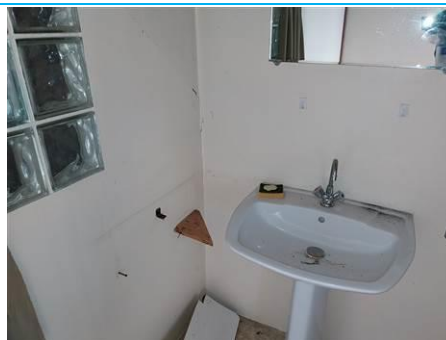

Matériaux : ZPSO-002
Prélèvement : P002
Description : Enduit cloison
Localisation : R+2 - Pièce 4
Résultat : Absence d'amiante

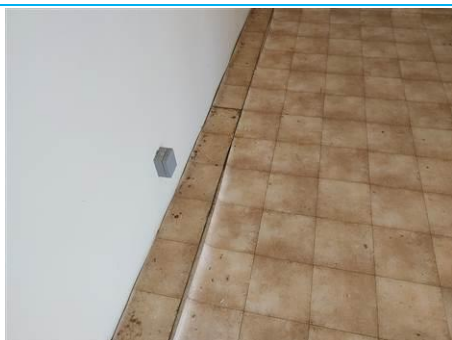

Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P003
Description : Colle Lino
Localisation : R+2 - Pièce 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-004
Prélèvement : P004; P006
Description : Enduit plafond
Localisation : R+2 - Pièce 2; R+2 - Pièce 4
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005
Prélèvement : P005; P007
Description : Enduit Périphérique
Localisation : R+2 - Pièce 2; R+2 - Pièce 4
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006
Prélèvement : P008
Description : Pare vapeur
Localisation : R+2 - Pièce 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008
Prélèvement : P011
Description : Peinture IPN
Localisation : R+2 - Pièce 1
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-011
Prélèvement : P014
Description : Ardoises composites
Localisation : Extérieur - Toiture principale
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-012
Prélèvement : P015
Description : Colle de revêtement vinyle
Localisation : R+1 - Pièce 6
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-013
Prélèvement : P016; P019; P021; P023; P033
Description : Enduit périphérique
Localisation : R+1 - Pièce 1; R+1 - Pièce 3; R+1 - Pièce 5; R+1 - Pièce 6
Résultat : Absence d'amiante

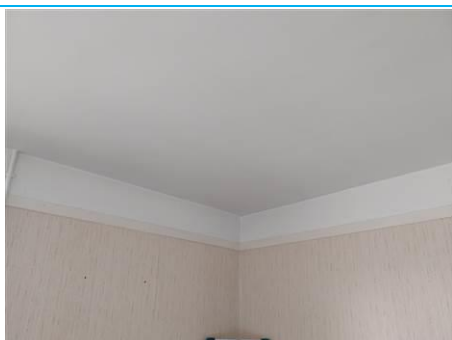

Matériaux : ZPSO-015
Prélèvement : P018
Description : Enduit plafond
Localisation : R+1 - Pièce 5
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016
Prélèvement : P022
Description : Ragréage
Localisation : R+1 - Pièce 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-023

Prélèvement : P030

Description : Conduit en fibres-ciment

Localisation : R+2 - Pièce 1; Rdc - Pièce 5 (sous-station vers pignon gauche); Rdc - Pièce 10 (plénum); R+1 - Pièce 1 (vers toiture)

Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-024

Prélèvement : P031; P036

Description : Ardoises en fibro ciment

Localisation : Extérieur - Toiture secondaire

Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-036

Prélèvement : P044

Description : Dalles de faux-plafond

Localisation : Rdc - Pièce 13

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-040


Prélèvement : P048

Description : Enduit

Localisation : Rdc - Pièce 5

Résultat : Absence d'amiante

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

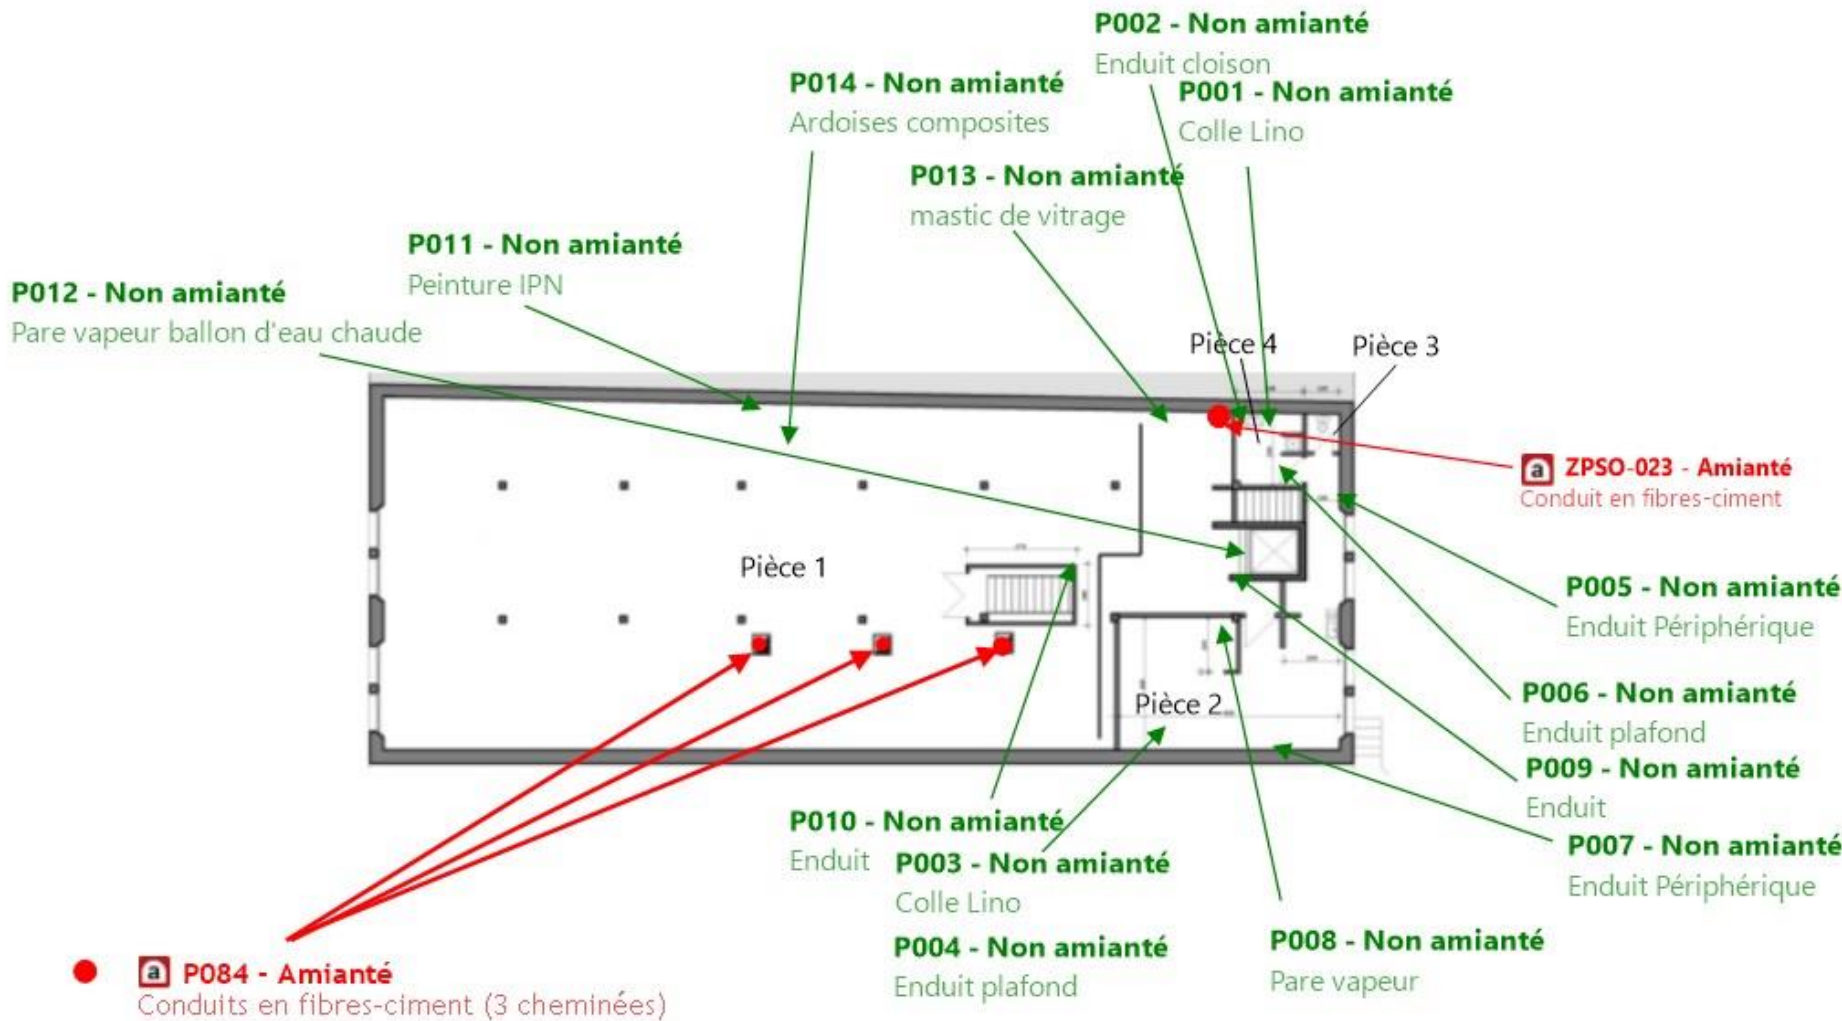 P012 - Non amianté Pare vapeur ballon d'eau chaude P011 - Non amianté Peinture IPN P014 - Non amianté Ardoises composites P013 - Non amianté mastic de vitrage P002 - Non amianté Enduit cloison P001 - Non amianté Colle Lino P005 - Non amianté Enduit Périphérique P006 - Non amianté Enduit plafond P009 - Non amianté Enduit P007 - Non amianté Enduit Périphérique P008 - Non amianté Pare vapeur P004 - Non amianté Enduit plafond P003 - Non amianté Colle Lino P010 - Non amianté Enduit P084 - Amianté Conduits en fibres-ciment (3 cheminées) ZPSO-023 - Amianté Conduit en fibres-ciment Pièce 1, Pièce 2, Pièce 3, Pièce 4	Planche de repérage technique
	N° planche : 1/4
	Nom du plan : Bâtiment 190 - R+2
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Bayonne Immeuble Toki Lana-7 chemin de la Marouette 64100 BAYONNE
	Adresse du bien : Bâtiment 190 lot 9 du Camp de La Courtine (Devis N°2305-CNABO-085) 23100 LA COURTINE
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2310CNABA - BI2190000000019 Rédacteur : David LOKIETEK Date : 16/04/2025
	Commentaires :

Bâtiment 190 - R+2

Planche de repérage technique

N° planche : 2/4

Nom du plan :
Bâtiment 190 - R+1

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Bayonne
Immeuble Toki Lana-7 chemin de la
Marouette
64100 BAYONNE


Adresse du bien :

Bâtiment 190 lot 9 du Camp de La Courtine
(Devis N°2305-CNABO-085)
23100 LA COURTINE

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2310CNABA -
BI2190000000019
Rédacteur : David LOKIETEK
Date : 16/04/2025

Commentaires :

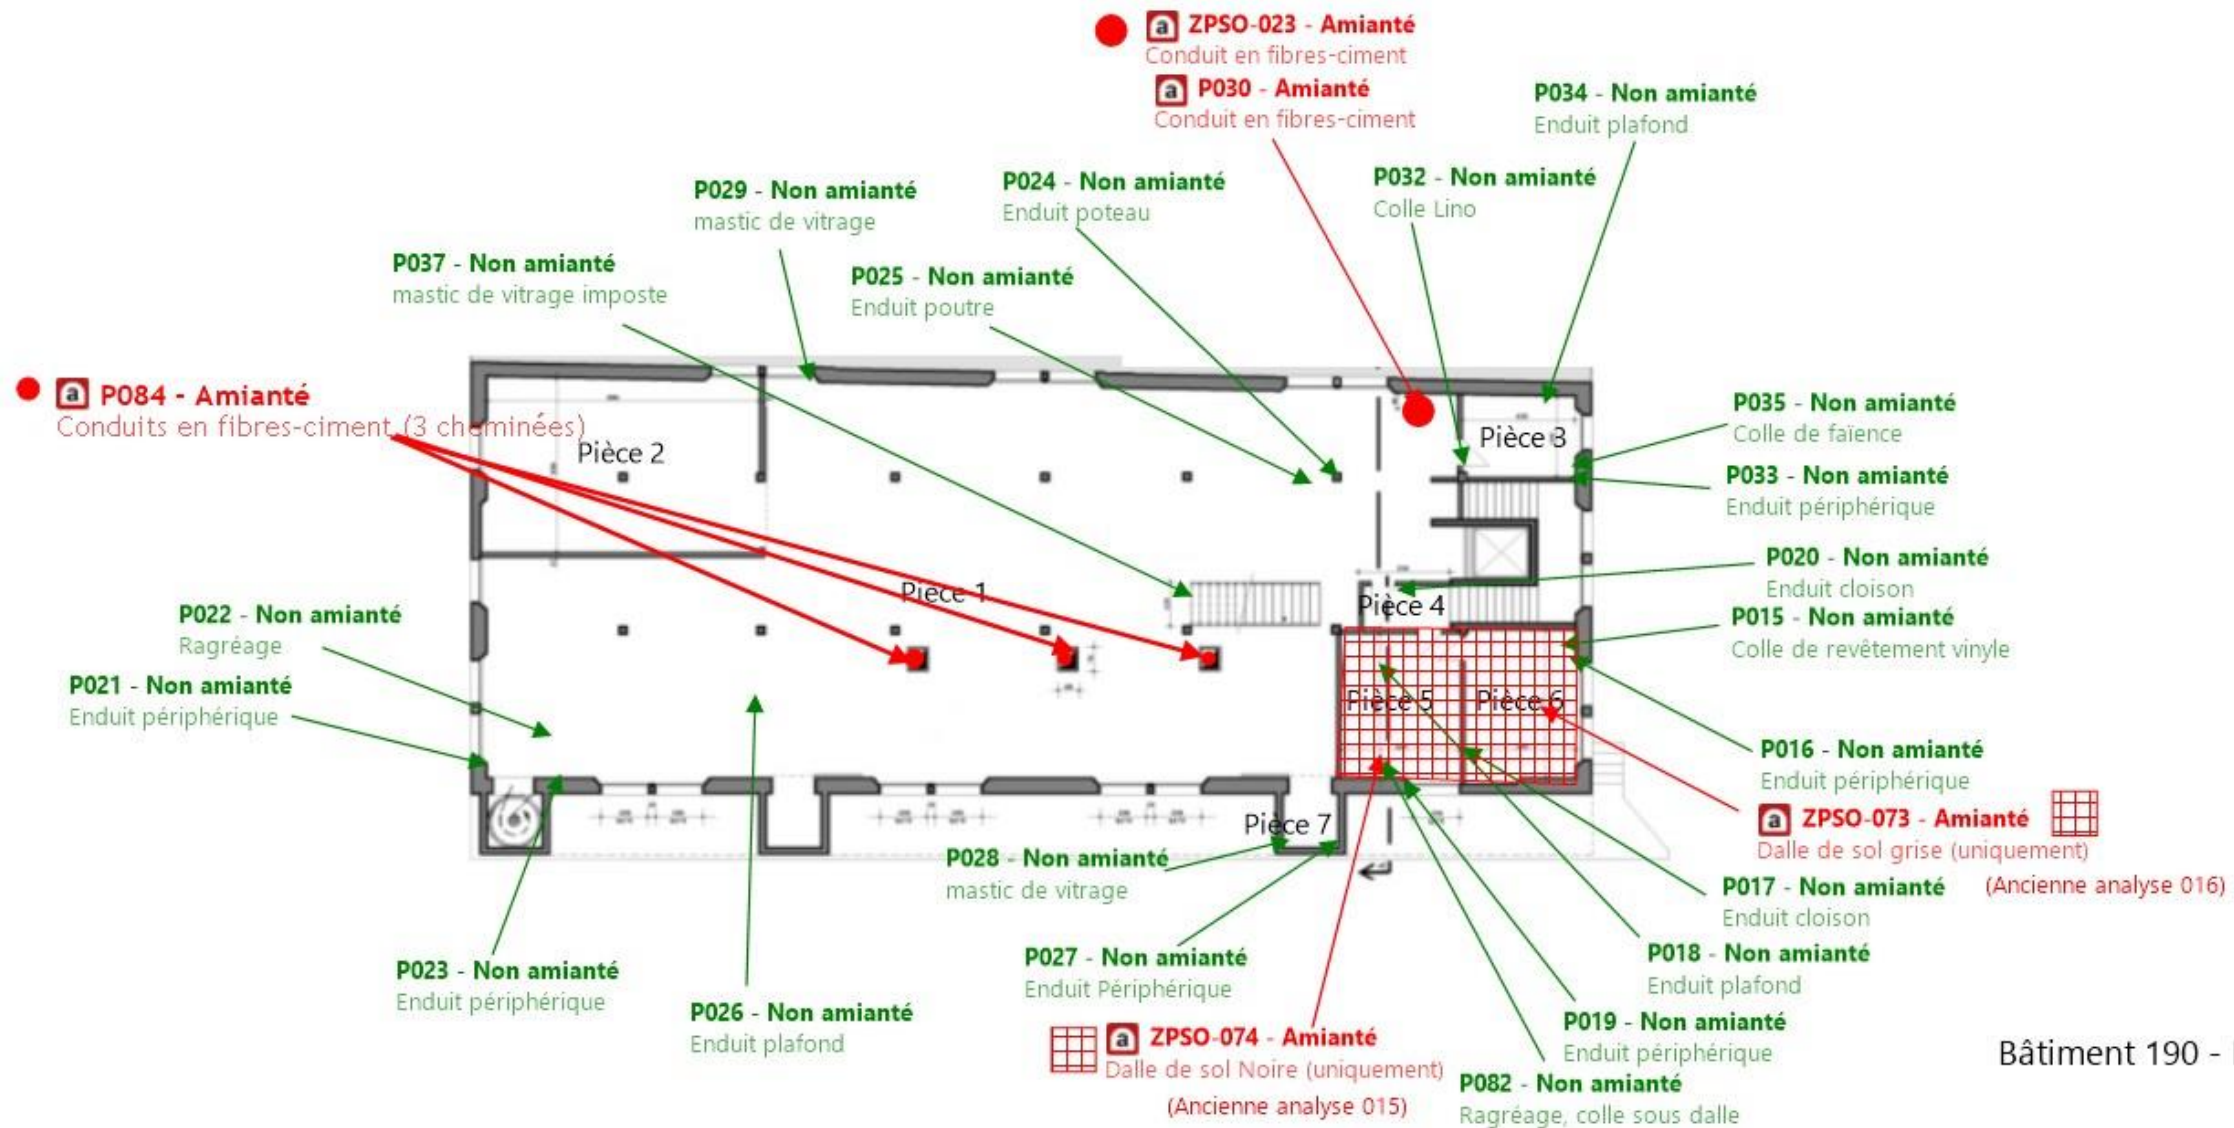

Bâtiment 190 - R+1

Planche de repérage technique

N° planche : 3/4

Nom du plan :
Bâtiment 190 - Rdc

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Bayonne
Immeuble Toki Lana-7 chemin de la
Marouette
64100 BAYONNE

Adresse du bien :

Bâtiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine
(Devis N°2305-CNABO-085)
23100 LA COURTINE

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2310CNABA -
BI2190000000019
Rédacteur : David LOKIETEK
Date : 16/04/2025

Commentaires :

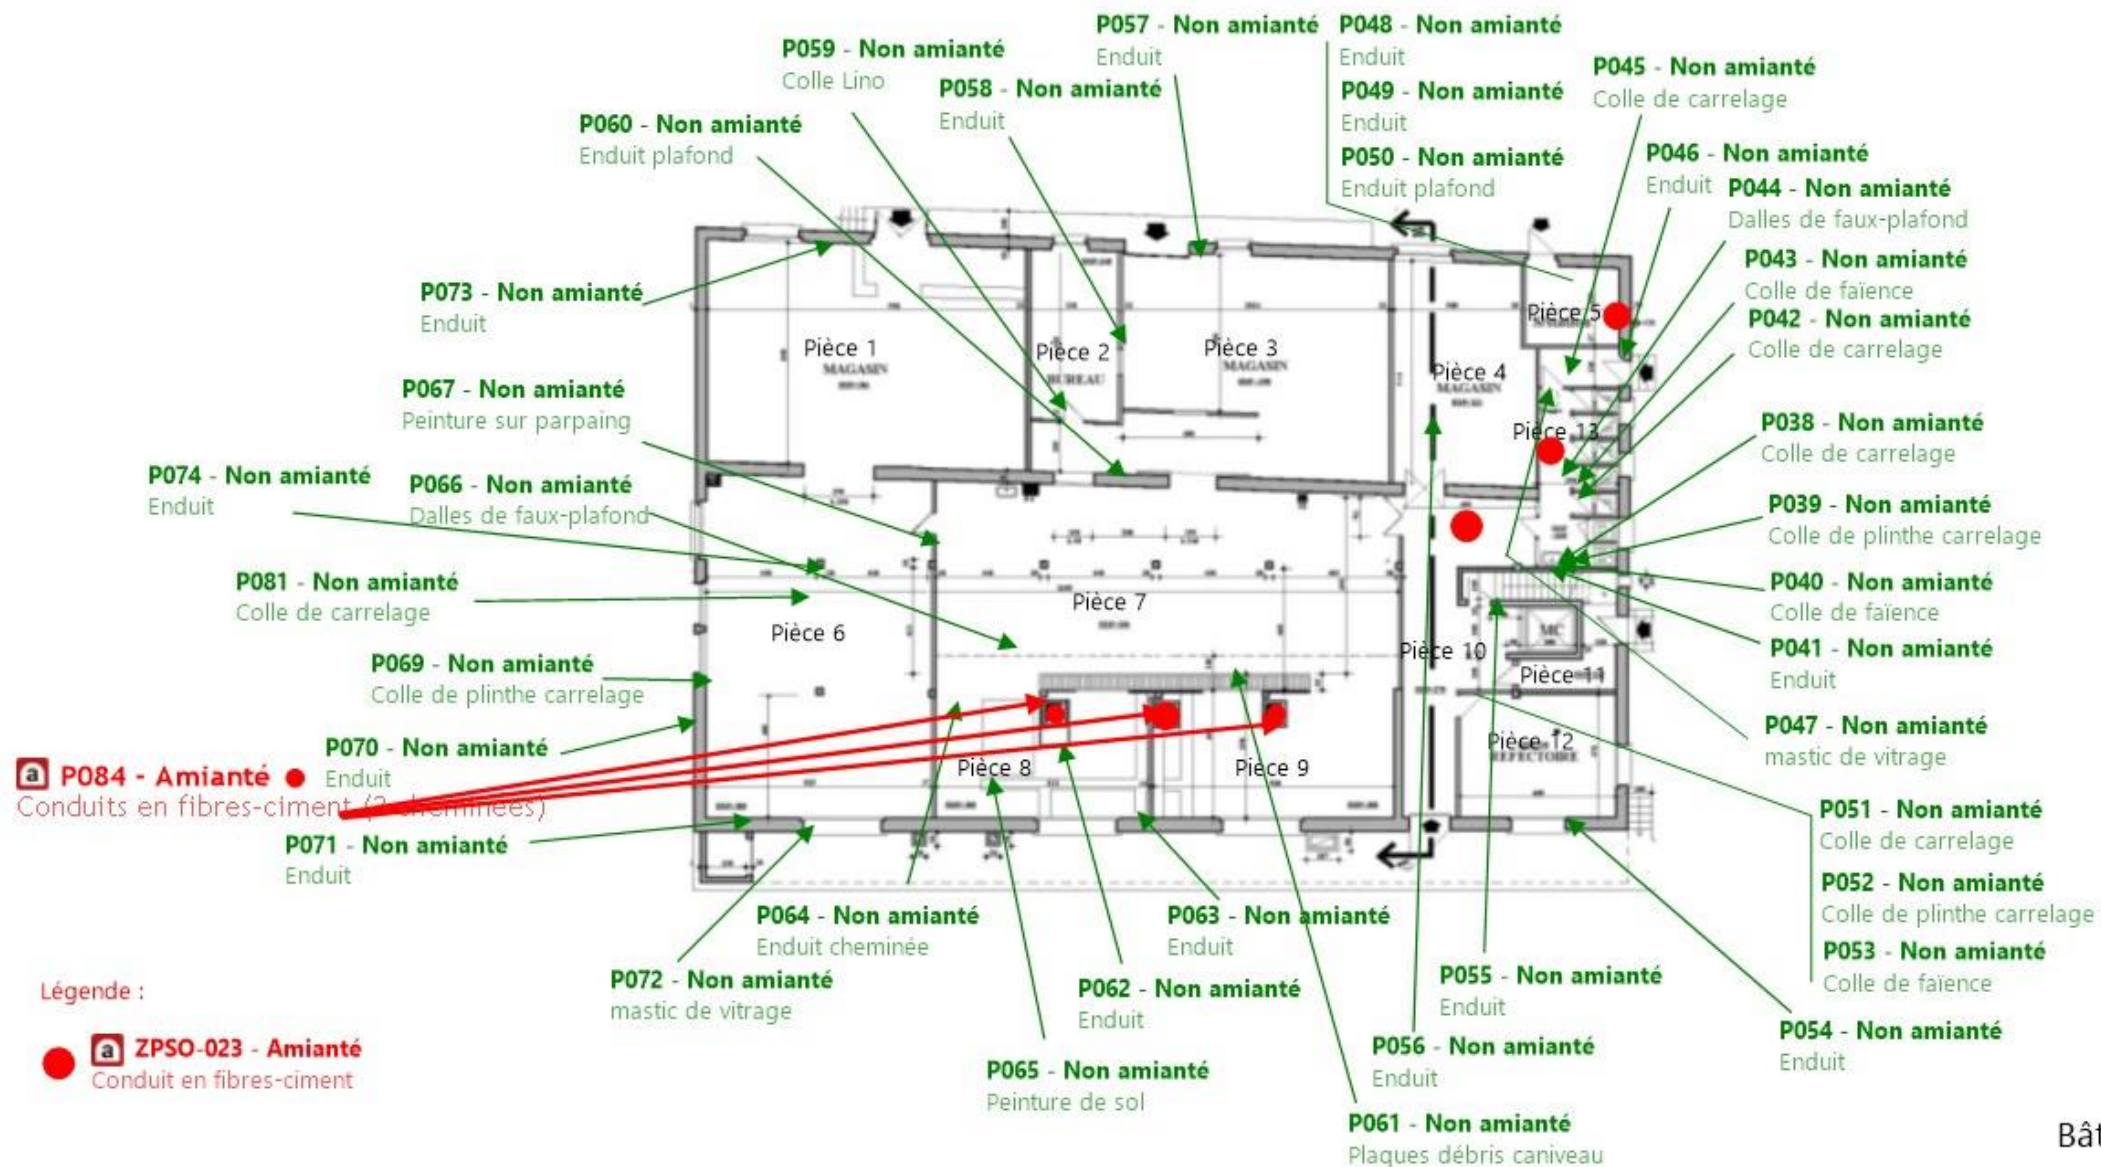


Planche de repérage technique

N° planche : 4/4

Nom du plan :
Bâtiment 190 - Extérieur

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Bayonne
Immeuble Toki Lana-7 chemin de la
Marouette
64100 BAYONNE


Adresse du bien :

Bâtiment 190 lot 9 du Camp de La Courtine
(Devis N°2305-CNABO-085)
23100 LA COURTINE

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2310CNABA -
BI2190000000019
Rédacteur : David LOKIETEK
Date : 16/04/2025

Commentaires :

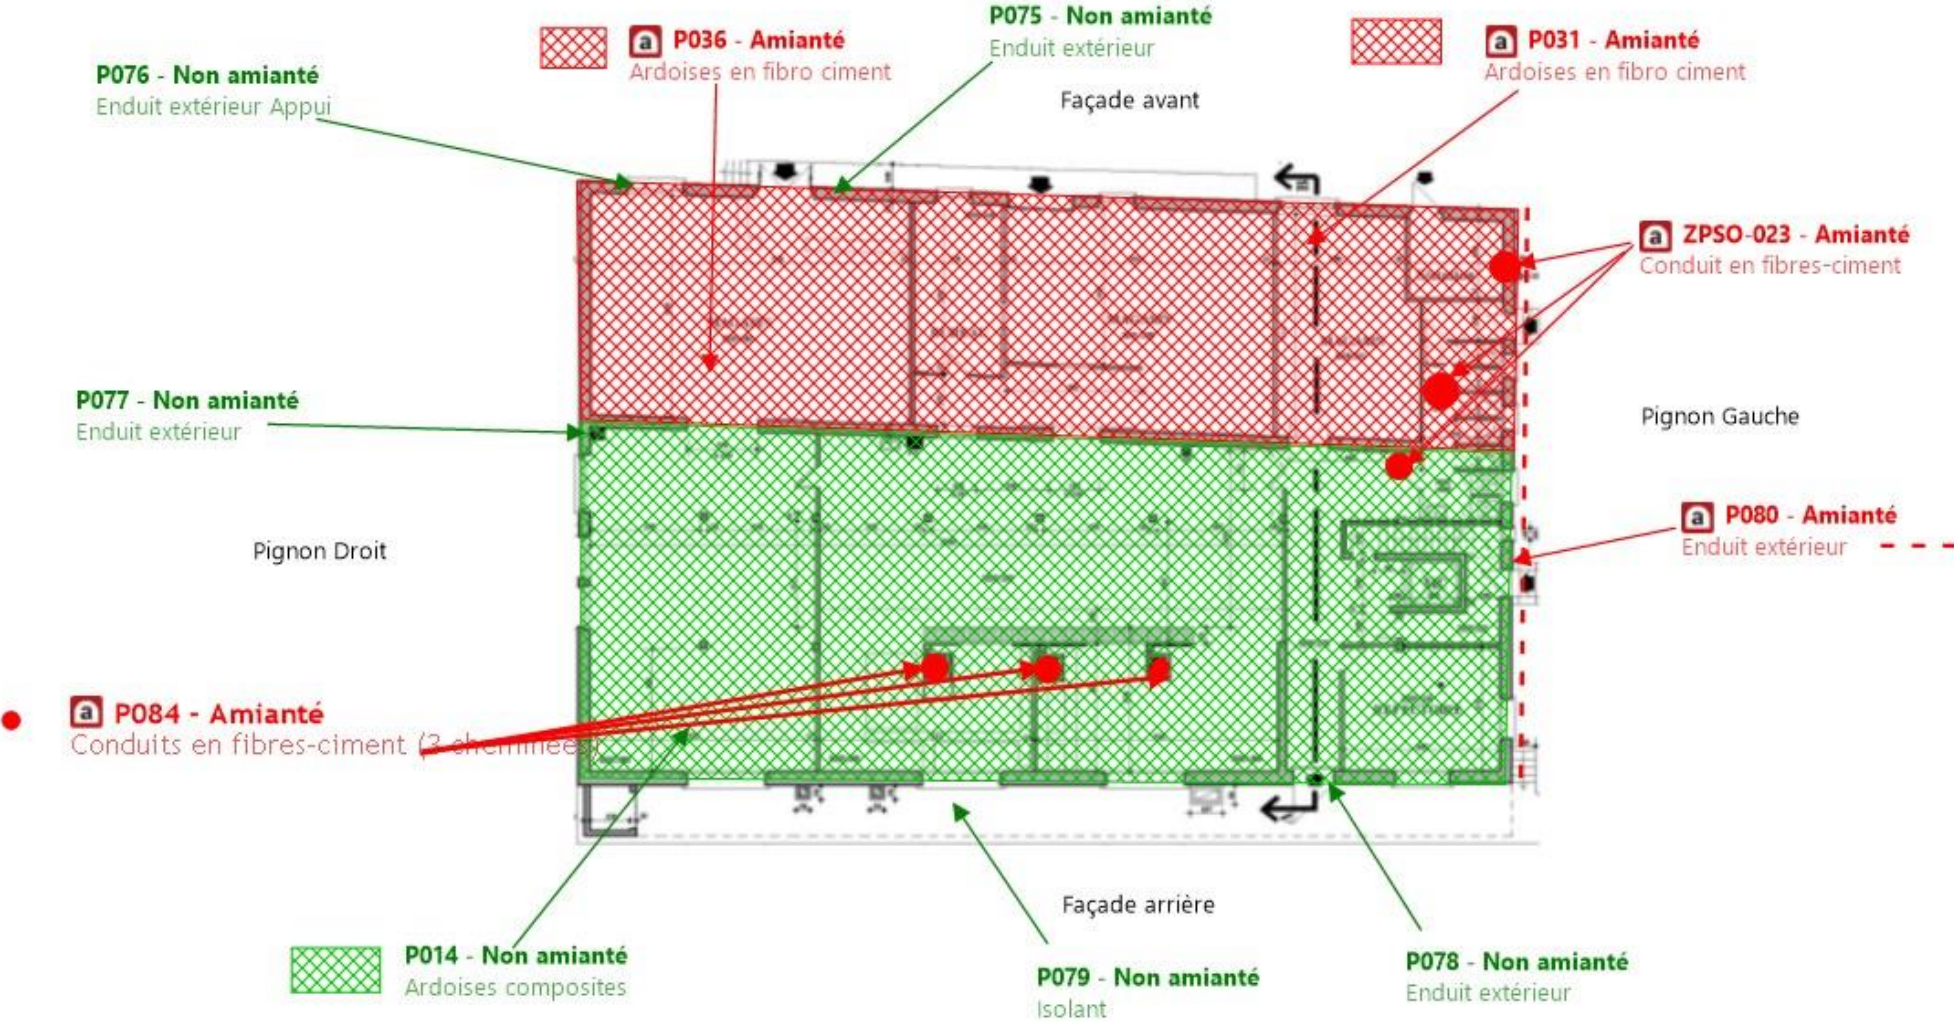

Bâtiment 190 - Extérieur

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC BAYONNE (CNABA) Immeuble Toki Lana -7 chemin de la Marouette 64100 BAYONNE	Réf. Commande ITGA : IT0523-13393 Réf. Commande Client : 2310CNABA_-_BI2190000000019_2023_10_26_1505_448 9
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 27/10/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P001 - Colle Lino - R+2 - Piece 4			
Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris		Réf échantillon ITGA : IT152310-12382	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P002 - Enduit cloison - R+2 - Piece 4			
Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène		Réf échantillon ITGA : IT152310-12383	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P003 - Colle Lino - R+2 - Piece 2		Réf échantillon ITGA : IT152310-12384 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec couche en toile / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
▸ Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + Ragréage gris	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P004 - Enduit plafond - R+2 - Piece 2		Réf échantillon ITGA : IT152310-12385 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 02/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (3) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P005 - Enduit Peripherique - R+2 - Piece 4		Réf échantillon ITGA : IT152310-12386 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ (Peinture non séparable) + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P006 - Enduit plafond - R+2 - Piece 4		Réf échantillon ITGA : IT152310-12387 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distingues par M/D. (3) Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P007 - Enduit Peripherique - R+2 - Piece 2		Réf échantillon ITGA : IT152310-12388 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ (Peinture non séparable) + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12389	
Réf échantillon client : P008 - Pare vapeur - R+2 - Piece 2		Description ITGA : Papier / Matériau fibreux vert	
▸ Papier non séparable + Matériau fibreux vert	MOLP + META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12390	
Réf échantillon client : P009 - Enduit - R+2 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ (Peinture non séparable) + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12391	
Réf échantillon client : P010 - Enduit - R+2 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ (Peinture non séparable) + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12392	
Réf échantillon client : P011 - Peinture IPN - R+2 - Piece 1		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12393	
Réf échantillon client : P012 - Pare vapeur ballon d'eau chaude - R+2 - Piece 1		Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune	
▸ Papier bitumé	MOLP + META (B) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
▸ Matériau fibreux jaune	MOLP le 31/10/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RNN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P013 - mastic de vitrage - R+ 1 - Piece 1			
Réf échantillon ITGA : IT152310-12394		Description ITGA : Matériau beige en vrac	
▸ Matériau beige en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P014 - Ardoises composites - Extérieur - Toiture principale			
Réf échantillon ITGA : IT152310-12395		Description ITGA : Matériau compact noir	
▸ Matériau compact noir	MOLP + META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P015 - Colle de revêtement vinyle - R+ 1 - Piece 6			
Réf échantillon ITGA : IT152310-12396		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P016 - Enduit périphérique - R+ 1 - Piece 6			
Réf échantillon ITGA : IT152310-12397		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P017 - Enduit cloison - R+ 1 - Piece 5			
Réf échantillon ITGA : IT152310-12398		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12399	
Réf échantillon client : P018 - Enduit plafond - R+1 - Piece 5		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12400	
Réf échantillon client : P019 - Enduit peripherique - R+1 - Piece 5		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12401	
Réf échantillon client : P020 - Enduit cloison - R+1 - Piece 4		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12402	
Réf échantillon client : P021 - Enduit peripherique - R+1 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12403	
Réf échantillon client : P022 - Ragréage - R+1 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Ragréage gris hétérogène	
Peinture non séparable + Ragréage gris hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12404	
Réf échantillon client : P023 - Enduit peripherique - R+1 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12405	
Réf échantillon client : P024 - Enduit poteau - R+1 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12406	
Réf échantillon client : P025 - Enduit poutre - R+1 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12407	
Réf échantillon client : P026 - Enduit plafond - R+1 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12408	
Réf échantillon client : P027 - Enduit Peripherique - R+1 - Piece 7		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 6/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12409	
Réf échantillon client : P028 - mastic de vitrage - R+ 1 - Piece 7		Description ITGA : Matériau beige en vrac	
▸ Matériau beige en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12410	
Réf échantillon client : P029 - mastic de vitrage - R+ 1 - Piece 7		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12411	
Réf échantillon client : P030 - Conduit en fibres-ciment - R+ 1 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Peinture non séparable + Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 31/10/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RNIN (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12412	
Réf échantillon client : P031 - Ardoises en fibre ciment - Exterieur - Toiture secondaire		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles / Mousse végétale	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 31/10/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RNIN
Mousse végétale	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12413	
Réf échantillon client : P032 - Colle Lino - R+ 1 - Piece 3		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 7/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine	Réf échantillon ITGA : IT152310-12414		
Réf échantillon client : P033 - Enduit peripherique - R+1 - Piece 3	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine	Réf échantillon ITGA : IT152310-12415		
Réf échantillon client : P034 - Enduit plafond - R+1 - Piece 3	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine	Réf échantillon ITGA : IT152310-12416		
Réf échantillon client : P035 - Colle de faïence - R+1 - Piece 3	Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec couche en papier / Couche plâtrée blanche		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige avec couche en papier + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine	Réf échantillon ITGA : IT152310-12417		
Réf échantillon client : P036 - Ardoises en fibre ciment - Exterieur - Toiture secondaire	Description ITGA : Mousse végétale / Fibrociment gris avec fibres visibles		
Mousse végétale	---	Non analysé	
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 02/11/2023 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FLD
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine	Réf échantillon ITGA : IT152310-12418		
Réf échantillon client : P037 - mastic de vitrage imposte - R+1 - Piece 1	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 8/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P038 - Colle de carrelage - Rdc - Piece 13			
		Réf échantillon ITGA : IT152310-12419	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P039 - Colle de plinthe carrelage - Rdc - Piece 13			
		Réf échantillon ITGA : IT152310-12420	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris	
▸ Peinture non séparable + Colle beige + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P040 - Colle de faïence - Rdc - Piece 13			
		Réf échantillon ITGA : IT152310-12421	
		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Colle grise + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P041 - Enduit - Rdc - Piece 13			
		Réf échantillon ITGA : IT152310-12422	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P042 - Colle de carrelage - Rdc - Piece 13			
		Réf échantillon ITGA : IT152310-12423	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 9/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12424	
Réf échantillon client : P043 - Colle de faïence - Rdc - Piece 13		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
▸ Peinture non séparable + Colle beige	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12425	
Réf échantillon client : P044 - Dalles de faux-plafond - Rdc - Piece 13		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12426	
Réf échantillon client : P045 - Colle de carrelage - Rdc - Piece 13		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Matériau beige en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12427	
Réf échantillon client : P046 - Enduit - Rdc - Piece 13		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 02/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12428	
Réf échantillon client : P047 - mastic de vitrage - Rdc - Piece 13		Description ITGA : Matériau compact beige	
▸ Matériau compact beige	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 10/ 11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12429	
Réf échantillon client : P048 - Enduit - Rdc - Piece 5		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12430	
Réf échantillon client : P049 - Enduit - Rdc - Piece 5		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12431	
Réf échantillon client : P050 - Enduit plafond - Rdc - Piece 5		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Validé par : Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 11/11



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC BAYONNE (CNABA) Immeuble Toki Lana -7 chemin de la Marouette 64100 BAYONNE	Réf. Commande ITGA : IT0523-13393 Réf. Commande Client : 2310CNABA_-_BI2190000000019_2023_10_26_1505_448 9
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 27/10/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P001 - Colle Lino - R+2 - Piece 4 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris			
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P002 - Enduit cloison - R+2 - Piece 4 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène			
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P003 - Colle Lino - R+2 - Piece 2		Réf échantillon ITGA : IT152310-12384 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec couche en toile / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
▸ Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + Ragréage gris	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P004 - Enduit plafond - R+2 - Piece 2		Réf échantillon ITGA : IT152310-12385 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 02/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (3) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P005 - Enduit Peripherique - R+2 - Piece 4		Réf échantillon ITGA : IT152310-12386 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ (Peinture non séparable) + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P006 - Enduit plafond - R+2 - Piece 4		Réf échantillon ITGA : IT152310-12387 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distingues par M/D. (3) Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P007 - Enduit Peripherique - R+2 - Piece 2		Réf échantillon ITGA : IT152310-12388 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ (Peinture non séparable) + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12389	
Réf échantillon client : P008 - Pare vapeur - R+2 - Piece 2		Description ITGA : Papier / Matériau fibreux vert	
▸ Papier non séparable + Matériau fibreux vert	MOLP + META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12390	
Réf échantillon client : P009 - Enduit - R+2 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ (Peinture non séparable) + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12391	
Réf échantillon client : P010 - Enduit - R+2 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ (Peinture non séparable) + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12392	
Réf échantillon client : P011 - Peinture IPN - R+2 - Piece 1		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12393	
Réf échantillon client : P012 - Pare vapeur ballon d'eau chaude - R+2 - Piece 1		Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune	
▸ Papier bitumé	MOLP + META (B) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
▸ Matériau fibreux jaune	MOLP le 31/10/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RNN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine	Réf échantillon ITGA : IT152310-12394		
Réf échantillon client : P013 - mastic de vitrage - R+ 1 - Piece 1	Description ITGA : Matériau beige en vrac		
▸ Matériau beige en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine	Réf échantillon ITGA : IT152310-12395		
Réf échantillon client : P014 - Ardoises composites - Extérieur - Toiture principale	Description ITGA : Matériau compact noir		
▸ Matériau compact noir	MOLP + META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine	Réf échantillon ITGA : IT152310-12396		
Réf échantillon client : P015 - Colle de revêtement vinyle - R+ 1 - Piece 6	Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine	Réf échantillon ITGA : IT152310-12397		
Réf échantillon client : P016 - Enduit périphérique - R+ 1 - Piece 6	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine	Réf échantillon ITGA : IT152310-12398		
Réf échantillon client : P017 - Enduit cloison - R+ 1 - Piece 5	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12399	
Réf échantillon client : P018 - Enduit plafond - R+1 - Piece 5		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12400	
Réf échantillon client : P019 - Enduit peripherique - R+1 - Piece 5		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12401	
Réf échantillon client : P020 - Enduit cloison - R+1 - Piece 4		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12402	
Réf échantillon client : P021 - Enduit peripherique - R+1 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12403	
Réf échantillon client : P022 - Ragréage - R+1 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Ragréage gris hétérogène	
Peinture non séparable + Ragréage gris hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12404	
Réf échantillon client : P023 - Enduit périphérique - R+1 - Pièce 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12405	
Réf échantillon client : P024 - Enduit poteau - R+1 - Pièce 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12406	
Réf échantillon client : P025 - Enduit poutre - R+1 - Pièce 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12407	
Réf échantillon client : P026 - Enduit plafond - R+1 - Pièce 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12408	
Réf échantillon client : P027 - Enduit Périphérique - R+1 - Pièce 7		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 6/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12409	
Réf échantillon client : P028 - mastic de vitrage - R+1 - Piece 7		Description ITGA : Matériau beige en vrac	
▸ Matériau beige en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12410	
Réf échantillon client : P029 - mastic de vitrage - R+1 - Piece 7		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12411	
Réf échantillon client : P030 - Conduit en fibres-ciment - R+1 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Peinture non séparable + Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 31/10/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RNIN (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12412	
Réf échantillon client : P031 - Ardoises en fibre ciment - Exterieur - Toiture secondaire		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles / Mousse végétale	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 31/10/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RNIN
Mousse végétale	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12413	
Réf échantillon client : P032 - Colle Lino - R+1 - Piece 3		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 7/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12414	
Réf échantillon client : P033 - Enduit peripherique - R+1 - Piece 3		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12415	
Réf échantillon client : P034 - Enduit plafond - R+1 - Piece 3		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12416	
Réf échantillon client : P035 - Colle de faïence - R+1 - Piece 3		Description ITGA : Carrelage / Colle beige avec couche en papier / Couche plâtrée blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige avec couche en papier + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12417	
Réf échantillon client : P036 - Ardoises en fibre ciment - Exterieur - Toiture secondaire		Description ITGA : Mousse végétale / Fibrociment gris avec fibres visibles	
Mousse végétale	---	Non analysé	
Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 02/11/2023 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FLD
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12418	
Réf échantillon client : P037 - mastic de vitrage imposte - R+1 - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 8/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12419	
Réf échantillon client : P038 - Colle de carrelage - Rdc - Piece 13		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12420	
Réf échantillon client : P039 - Colle de plinthe carrelage - Rdc - Piece 13		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris	
▸ Peinture non séparable + Colle beige + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12421	
Réf échantillon client : P040 - Colle de faïence - Rdc - Piece 13		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Colle grise + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12422	
Réf échantillon client : P041 - Enduit - Rdc - Piece 13		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtré blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12423	
Réf échantillon client : P042 - Colle de carrelage - Rdc - Piece 13		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 9/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12424	
Réf échantillon client : P043 - Colle de faïence - Rdc - Piece 13		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
▸ Peinture non séparable + Colle beige	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12425	
Réf échantillon client : P044 - Dalles de faux-plafond - Rdc - Piece 13		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12426	
Réf échantillon client : P045 - Colle de carrelage - Rdc - Piece 13		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Matériau beige en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12427	
Réf échantillon client : P046 - Enduit - Rdc - Piece 13		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 02/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12428	
Réf échantillon client : P047 - mastic de vitrage - Rdc - Piece 13		Description ITGA : Matériau compact beige	
▸ Matériau compact beige	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 10/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13393 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12429	
Réf échantillon client : P048 - Enduit - Rdc - Piece 5		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12430	
Réf échantillon client : P049 - Enduit - Rdc - Piece 5		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12431	
Réf échantillon client : P050 - Enduit plafond - Rdc - Piece 5		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Validé par : Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 11/11



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-13394 EN DATE DU 02/11/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC BAYONNE (CNABA) Immeuble Toki Lana -7 chemin de la Marouette 64100 BAYONNE	Réf. Commande ITGA : IT0523-13394 Réf. Commande Client : 2310CNABA_-_BI2190000000019_2023_10_26_1505_448 9
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 27/10/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12432	
Réf échantillon client : P051 - Colle de carrelage - Rdc - Piece 12		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 02/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12433	
Réf échantillon client : P052 - Colle de plinthe carrelage - Rdc - Piece 12		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13394 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12434	
Réf échantillon client : P053 - Colle de faïence - Rdc - Piece 12		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12435	
Réf échantillon client : P054 - Enduit - Rdc - Piece 12		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (3)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12436	
Réf échantillon client : P055 - Enduit - Rdc - Escaliers		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12437	
Réf échantillon client : P056 - Enduit - Rdc - Piece 4		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12438	
Réf échantillon client : P057 - Enduit - Rdc - Piece 3		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-13394 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P058 - Enduit - Rdc - Piece 3			
		Réf échantillon ITGA : IT152310-12439	
		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P059 - Colle Lino - R+2 - Piece 2			
		Réf échantillon ITGA : IT152310-12440	
		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P060 - Enduit plafond - Rdc - Piece 3			
		Réf échantillon ITGA : IT152310-12441	
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : CTP (3)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P061 - Plaques debris cariveau - Rdc - Piece 7			
		Réf échantillon ITGA : IT152310-12442	
		Description ITGA : Matériau fibreux avec paillettes	
▸ Matériau fibreux avec paillettes	MOLP + META (A) le 02/11/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine Réf échantillon client : P062 - Enduit - Rdc - Piece 8			
		Réf échantillon ITGA : IT152310-12443	
		Description ITGA : Matériau compact rouge hétérogène / Enduit compact gris / Peinture	
▸ Matériau compact rouge hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
▸ Enduit compact gris + Peinture non séparable	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13394 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12444	
Réf échantillon client : P063 - Enduit - Rdc - Piece 8		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ (Peinture non séparable) + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12445	
Réf échantillon client : P064 - Enduit cheminee - Rdc - Piece 8		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12446	
Réf échantillon client : P065 - Peinture de sol - Rdc - Piece 8		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12447	
Réf échantillon client : P066 - Dalles de faux-plafond - Rdc - Piece 7		Description ITGA : Matériau fibreux avec paillettes	
▸ Matériau fibreux avec paillettes	MOLP + META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12448	
Réf échantillon client : P067 - Peinture sur parpaing - Rdc - Piece 7		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13394 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12450	
Réf échantillon client : P069 - Colle de plinthe carrelage - Rdc - Pce 6		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 02/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12451	
Réf échantillon client : P070 - Enduit - Rdc - Pce 6		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ (Peinture non séparable) + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12452	
Réf échantillon client : P071 - Enduit - Rdc - Pce 6		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ (Peinture non séparable) + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12453	
Réf échantillon client : P072 - mastic de vitrage - Rdc - Pce 6		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-13394 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12454	
Réf échantillon client : P073 - Enduit - Rdc - Piece 6		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12455	
Réf échantillon client : P074 - Enduit - Rdc - Piece 6		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ (Peinture non séparable) + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12456	
Réf échantillon client : P075 - Enduit extérieur - Extérieur - Facade avant		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ (Peinture non séparable) + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12457	
Réf échantillon client : P076 - Enduit extérieur Appui - Extérieur - Facade avant		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ (Peinture non séparable) + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 02/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (3)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12458	
Réf échantillon client : P077 - Enduit extérieur - Extérieur - Pignon Droit		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ (Peinture non séparable) + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 02/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 6/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0523-13394 EN DATE DU 02/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12459	
Réf échantillon client : P078 - Enduit extérieur - Extérieur - Facade arriere		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ (Peinture non séparable) + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 31/10/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12460	
Réf échantillon client : P079 - Isolant - Extérieur - Facade arriere		Description ITGA : Matériau fibreux jaune / Poussières	
▸ Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 02/11/2023 Nombre de préparations : 6 Nombre de supports d'analyse : 10	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Poussières	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 La Courtine		Réf échantillon ITGA : IT152310-12461	
Réf échantillon client : P080 - Enduit extérieur - Extérieur - Pignon Gauche		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 02/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EWB (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Validé par : Erwan BELLEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 7/7



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tel : 05.57.92.80.12
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-16322 EN DATE DU 21/12/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC BAYONNE (CNABA) Immeuble Toki Lana -7 chemin de la Marouette 64100 BAYONNE	Réf. Commande ITGA : IT0523-16322 Réf. Commande Client : 2310CNABA_-_BI2190000000019_2023_12_18_1757_349 3
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/12/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 LA COURTINE		Réf échantillon ITGA : IT052312-6197	
Réf échantillon client : P081 - Colle de carrelage - Rdc - Piece 3		Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise hétérogène	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
Colle grise hétérogène	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0523-16322 EN DATE DU 21/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 Ilot 9 du Camp de La Courtine (Devis No2305-CNABO-085) 23100 LA COURTINE Réf échantillon client : P082 - Ragréage, colle sous dalle - R+ 1 - Piece 5			
Réf échantillon ITGA : IT052312-6198 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Peinture			
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 21/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMB (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : **Mylène MATTEI** Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 2/2

SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur David LOKIETEK
 Domaine Le Millénium
 3 Impasse Henry Le Chatelier
 33692 MERIGNAC CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-KC-008181-01 Version du : 24/01/2019 20:55 Page 1/1
 Dossier N° : 19K001831 Date de réception : 22/01/2019 Date d'analyse : 23/01/2019
 Référence Dossier : Commande EOL n° 006-10514-427444
 DTA LA COURTINE 44 BATIMENTS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
015 (1)	015 / BATIMENT 190 / Dalle de sol noire	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type peinture beige, colle jaune est présent dans l'échantillon, en quantité trop faible pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.



Océane Melle
 Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134
 33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
 Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
 N° 1- 5840
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SOCOTEC CONSTRUCTION
Monsieur David LOKIETEK
 Domaine Le Millénium
 3 Impasse Henry Le Chatelier
 33692 MERIGNAC CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-KC-008182-01 Version du : 24/01/2019 20:55 Page 1/1
 Dossier N° : 19K001831 Date de réception : 22/01/2019 Date d'analyse : 23/01/2019
 Référence Dossier : Commande EOL n° 006-10514-427444
 DTA LA COURTINE 44 BATIMENTS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
016 (1)	016 / BATIMENT 190 / dalle de sol grise	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET *	1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type colle jaune est présent dans l'échantillon, en quantité trop faible pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.



Océane Melle
 Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134
 33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE
 Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: + 33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION
 N° 1- 5840
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tel : 05.57.92.80.12
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0525-5880 EN DATE DU 14/04/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC LIMOGES (ONALI) 5 rue Colombia - BP 6833-Lam d'Esther - Technopole 87068 LIMOGES CEDEX	Réf. Commande ITGA : IT0525-5880 Réf. Commande Client : 2310CNABA_-_BI2190000000019_2025_04_09_0743_394 5
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2310CNABA - BI2190000000019 - Batiment 190 I lot 9 du Camp de La Courtine (Devis N°2305-CNABO-085) 23100 LA COURTINE ITC-GCI YGS-148948		Réf échantillon ITGA : IT052504-3331	
Réf échantillon client : P084 - Conduit en fibres-ciment - Cheminée des fours à pain ITM-DAPCH-1839020		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MKH

Validé par : Dylan DUBOIS Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/1

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI 2619 Version 005

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LOKIETEK David

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention
	Date d'effet : 18/07/2022 - Date d'expiration : 17/07/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention
	Date d'effet : 18/07/2022 - Date d'expiration : 17/07/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 11/07/2022.



Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des conseils de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis, ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amianté dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification - Ou Arrêté du 7 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0322
PORTÉE
CERTIFICATION DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev18

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex

 **01 41 34 50 00**
 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
 Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction ; Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
 Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2025 au 01/01/2026.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 05/12/2024
 POUR LA SOCIETE :
 Mathieu GODART
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
