

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 23620468/S2/3/AM-RTV_V1

Rédigé le : 10/10/2024

Référence au programme de travaux :
N°NC réalisé le 10/03/2023 par

DONNEUR D'ORDRE

Nicolas SOUCHAUD
33 RUE DE SAGET
CS 91813
33080 BORDEAUX CEDEX

SITE D'INTERVENTION

Ancien SPIP de la Vendée
53 rue de Verdun
85000 LA ROCHE SUR YON
Batiment

SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Andreas LEROUX	DIAGNOSTIQUEUR	15042964	Andreas LEROUX
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	6
2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre	7
2.3. Obligations réglementaires	8
2.4. Remarque(s) complémentaire(s)	8
3. INFORMATIONS GENERALES	9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	9
3.2. Parties prenantes	9
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	9
4.1. Références réglementaires	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
5.1. Date(s) de visite(s)	10
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	10
5.3. Conditions spécifiques	10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	10
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
6.1. Matériaux et produits repérés	11
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	53
7. ANNEXES	54
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	54
7.2. Photos prélèvements	57
7.3. Photos inaccessibilités	71
7.4. Attestation d'assurance	77
7.5. Certificat de compétence	79
7.6. Croquis de repérage	80
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire	87

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Curage selon plans des zones concernées transmis dans l'APD

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entre-couche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutremments, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutremments, Ossature, Rebouchages, Volets
07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Cloisons palière monte-charges	Panneaux
Cloisons palières ascenseur	
Convecteurs électriques	Calorifugeages
Equipements	
Matériel en machinerie ascenseur	Eléments de protection contre les arcs électriques, Freins d'ascenseurs, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie escalier mécanique	Eléments de protection contre les arcs électriques, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie monte-charges	Eléments de protection contre les arcs électriques, Joints plats, Tresses
Parois des ascenseurs	Calfeutrement entre mur et plancher, Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs, Plaques
Parois des escaliers mécaniques	Calfeutrement entre mur et plancher, Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs, Plaques
Parois des monte-charges	Calfeutrement entre mur et plancher, Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs, Plaques
Portes palière ascenseur	Panneaux

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
1	SS -> CHAUFFERIE	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris
32	EXTERIEUR	Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales	Fibres-ciment	Gris
32	EXTERIEUR -> Toiture	Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales	Fibres-ciment	Gris

2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
RDC -> HALL 1 (IA 7)	3- Parois verticales intérieures - gaine	Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> ELEVATEUR (IA 1)	7- Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Machinerie ascenseur, investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 pour mise à l'arrêt de l'installation et démontage de parties d'équipements.
RDC -> SANIT (IA 6)	3- Parois verticales intérieures - gaine	Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> BUREAU 3 (IA 8)	3- Parois verticales intérieures - gaine	Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
RDC -> BUREAU 4 (IA 9)	3- Parois verticales intérieures - gaine	Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> BUREAU 1 (IA 10)	3- Parois verticales intérieures - gaine	Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> BUREAU 4 (IA 12)	3- Parois verticales intérieures - gaine	Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> CIRC (IA 13)	3- Parois verticales intérieures - gaine	Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> TISANERIE (IA 4)	3- Parois verticales intérieures - Gaine à démonter	Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> TISANERIE (IA 11)	3- Parois verticales intérieures - gaine	Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> TOITURE TERRASSE (IA 3)	1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités - prévoir étanchéité	Investigations destructives sur couverture requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire intervenir un étancheur qualifié pour rebouchage des investigations destructives
R+2 -> BUREAU 1 (IA 14)	3- Parois verticales intérieures - gaine	Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 -> BUREAU 4 (IA 16)	3- Parois verticales intérieures - gaine	Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 -> SANIT (IA 5)	2- Parois verticales extérieures et façades - hauteur trop importante pour accéder aux mastics de vitrage	Inspection de(s) garniture(s) de friction de fenêtre(s) basculante(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder au démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 -> SANIT (IA 15)	3- Parois verticales intérieures - gaine	Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
EXTERIEUR -> FACADES (IA 2)	2- Parois verticales extérieures et façades - joints precadres	Refus de réalisation d'investigations approfondies destructives	Permettre la réalisation des investigations approfondies destructives

2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

2.4. Remarque(s) complémentaire(s)

Absence d'électricité dans le bâtiment

Intérieur dégradé

Absence d'éclairage sur les niveaux SS et RDC BAS

FACADE arrière non visualisable entièrement au vu de la mitoyenneté

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : Ancien SPIP de la Vendée
53 rue de Verdun
85000 LA ROCHE SUR YON

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
Ancien SPIP de la Vendée	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Nicolas SOUCHAUD	Donneur d'ordre	/	33 RUE DE SAGET 33080 BORDEAUX CEDEX	0000000000 - 0000000000
NICOLAS SOUCHAUD	Accompagnateur	/	/	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 24/09/2024 au 24/09/2024

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
CCTP / APD	/	10/03/2023	NC	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
 xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
 Sxx = Sondage n°xx
 xx* = élément témoin de la ZPSO
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
 AN = Analyse
 DC = Document consulté
 MA = Marquage
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SS -> CHAUFFERIE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	P5* N	/	AN	/	Non
SS -> CHAUFFERIE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	P6 N	/	AN	/	Non
SS -> CHAUFFERIE	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	1	P1* P	/	AN	/	Oui
SS -> CHAUFFERIE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	P3* N	/	AN	/	Non
SS -> CHAUFFERIE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	P4 N	/	AN	/	Non
SS -> CHAUFFERIE	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	2	P2* N	/	AN	/	Non
SS -> CHAUFFERIE	Chaudières (mixtes, collectives)	Bourre	Laineux	Jaune	5	P7* N	/	AN	/	Non
SS -> CHAUFFERIE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SS -> CHAUFFERIE	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
SS -> RESERVE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	16	P27* N	/	AN	30x30 beige	Non
SS -> RESERVE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	17	P29* N	/	AN	30x10 beige	Non
SS -> RESERVE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
SS -> RESERVE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
SS -> RESERVE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
SS -> RESERVE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
SS -> RESERVE	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
SS -> RESERVE	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SS -> CIRC 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 1	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	2	Idem P 2	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 1	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 1	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
SS -> ESC	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
SS -> ESC	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
SS -> ESC	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
SS -> ESC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
SS -> ESC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
SS -> ESC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
SS -> ESC	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
SS -> ESC	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
SS -> ARCHIVES	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	P17* N	/	AN	lino	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SS -> ARCHIVES	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
SS -> ARCHIVES	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
SS -> ARCHIVES	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
SS -> ARCHIVES	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
SS -> ARCHIVES	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
SS -> ARCHIVES	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
SS -> ARCHIVES	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
SS -> ARCHIVES	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	8	P10* N	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	9	P12* N	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 2	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	P14* N	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SS -> CIRC 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 2	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 2	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 3	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	14	P26* N	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 3	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
SS -> CIRC 3	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
SS -> RGT 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	P16 N	/	AN	lino	Non
SS -> RGT 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	P24* N	/	AN	/	Non
SS -> RGT 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
SS -> RGT 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SS -> RGT 1	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
SS -> RGT 1	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
SS -> RGT 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	P25 N	/	AN	/	Non
SS -> RGT 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
SS -> RGT 2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
SS -> RGT 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
SS -> RGT 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
SS -> RGT 2	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
SS -> RGT 2	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
SS -> ESC 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
SS -> ESC 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
SS -> ESC 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
SS -> ESC 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SS -> ESC 2	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
SS -> ESC 2	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
SS -> CUISINE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	12	P18* N	/	AN	20x20 blanche	Non
SS -> CUISINE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	12	P19 N	/	AN	20x20 blanche	Non
SS -> CUISINE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
SS -> CUISINE	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
SS -> CUISINE	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
SS -> CUISINE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
SS -> CUISINE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
SS -> CUISINE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
SS -> CUISINE	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
SS -> CUISINE	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
SS -> LT INFO	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	6	P8* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SS -> LT INFO	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	P9 N	/	AN	/	Non
SS -> LT INFO	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
SS -> LT INFO	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
SS -> LT INFO	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
SS -> LT INFO	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
SS -> LT INFO	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
SS -> SALLE REUNION	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	14	P22 N	/	AN	/	Non
SS -> SALLE REUNION	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	P23* N	/	AN	/	Non
SS -> SALLE REUNION	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	8	P11 N	/	AN	/	Non
SS -> SALLE REUNION	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	9	P13 N	/	AN	/	Non
SS -> SALLE REUNION	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	P15 N	/	AN	/	Non
SS -> SALLE REUNION	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	P20* N	/	AN	/	Non
SS -> SALLE REUNION	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	6	P21 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
SS -> SALLE REUNION	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
SS -> SALLE REUNION	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
SS -> SALLE REUNION	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
SS -> SALLE REUNION	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
SS -> SALLE REUNION	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
SS -> SALLE REUNION	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
RDC -> HALL 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 1	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> HALL 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 1	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 1	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
RDC -> ELEVATEUR	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> ELEVATEUR	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> ELEVATEUR	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> ELEVATEUR	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
RDC -> ELEVATEUR	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> ELEVATEUR	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
RDC -> ELEVATEUR	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> ELEVATEUR	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> ELEVATEUR	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> ELEVATEUR	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
RDC -> ELEVATEUR	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
RDC -> ESC	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	16	P28 N	/	AN	30x30 beige	Non
RDC -> ESC	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	17	P30 N	/	AN	30x10 beige	Non
RDC -> ESC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	6	P44 N	/	AN	/	Non
RDC -> ESC	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> ESC	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> ESC	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> ESC	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
RDC -> ESC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> ESC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> ESC	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
RDC -> ESC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> ESC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> ESC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> ESC	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
RDC -> ESC	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
RDC -> SANIT	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	21	P36* N	/	AN	/	Non
RDC -> SANIT	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Beige	22	P37* N	/	AN	/	Non
RDC -> SANIT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	12	P31 N	/	AN	20x20 blanche	Non
RDC -> SANIT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	18	P32* N	/	AN	2x2	Non
RDC -> SANIT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	18	P33 N	/	AN	2x2	Non
RDC -> SANIT	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	P34* N	/	AN	/	Non
RDC -> SANIT	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	20	P35* N	/	AN	/	Non
RDC -> SANIT	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	P38 N	/	AN	/	Non
RDC -> SANIT	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> SANIT	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> SANIT	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> SANIT	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	16	Idem P 27	/	AN	30x30 beige	Non
RDC -> SANIT	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> SANIT	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> SANIT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	17	Idem P 29	/	AN	30x10 beige	Non
RDC -> SANIT	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
RDC -> SANIT	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	P45 N	/	AN	lino	Non
RDC -> HALL 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 2	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 2	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> HALL 2	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 2	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
RDC -> HALL 2	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
RDC -> CIRC	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> CIRC	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> CIRC	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> CIRC	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
RDC -> CIRC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> CIRC	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
RDC -> CIRC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> CIRC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> CIRC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> CIRC	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
RDC -> CIRC	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	14	P43 N	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	P39 N	/	AN	lino	Non
RDC -> BUREAU 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	P40 N	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	P41 N	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	23	P42* N	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	P81* N	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> BUREAU 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 2	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 2	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
RDC -> BUREAU 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 2	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 2	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 2	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> BUREAU 3	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 3	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 3	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
RDC -> BUREAU 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 3	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 3	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 3	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 4	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 4	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 4	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 4	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> BUREAU 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 4	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 4	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 4	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 5	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 5	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 5	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 5	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
RDC -> BUREAU 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 5	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> BUREAU 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 5	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 5	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL MENAGE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL MENAGE	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL MENAGE	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL MENAGE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
RDC -> LOCAL MENAGE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL MENAGE	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL MENAGE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL MENAGE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL MENAGE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> LOCAL MENAGE	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL MENAGE	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
RDC -> TERRASSE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE PAUSE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE PAUSE	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE PAUSE	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE PAUSE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
RDC -> SALLE DE PAUSE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE PAUSE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE PAUSE	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE PAUSE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE PAUSE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE PAUSE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE PAUSE	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> SALLE DE PAUSE	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
RDC -> RGT	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> RGT	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> RGT	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> RGT	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
RDC -> RGT	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> RGT	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> RGT	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
RDC -> RGT	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> RGT	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> RGT	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> RGT	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
RDC -> RGT	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> ACCUEIL	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
RDC -> ACCUEIL	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> ACCUEIL	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> ACCUEIL	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
RDC -> ACCUEIL	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
RDC -> ACCUEIL	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
RDC -> ACCUEIL	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
RDC -> ACCUEIL	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> ACCUEIL	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> ACCUEIL	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
RDC -> ACCUEIL	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
RDC -> ACCUEIL	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	23	P53 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> BUREAU 1	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	14	P54 N	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	P51 N	/	AN	lino	Non
R+1 -> BUREAU 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	P52 N	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 1	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	P82 N	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 1	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 1	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> BUREAU 2	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 2	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
R+1 -> BUREAU 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 2	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 2	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 2	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 3	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 3	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 3	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> BUREAU 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 3	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 3	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 3	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 4	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 4	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 4	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 4	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
R+1 -> BUREAU 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 4	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> BUREAU 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 4	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 4	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 5	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 5	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 5	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 5	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
R+1 -> BUREAU 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 5	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 5	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> BUREAU 5	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 6	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 6	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 6	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 6	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
R+1 -> BUREAU 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 6	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 6	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 6	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 7	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> BUREAU 7	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 7	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 7	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
R+1 -> BUREAU 7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 7	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 7	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 7	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 7	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+1 -> ELEVATEUR	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> ELEVATEUR	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> ELEVATEUR	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> ELEVATEUR	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
R+1 -> ELEVATEUR	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
R+1 -> ELEVATEUR	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+1 -> ELEVATEUR	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+1 -> ELEVATEUR	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> ELEVATEUR	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> ELEVATEUR	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+1 -> ELEVATEUR	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
R+1 -> ELEVATEUR	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+1 -> ESC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	6	P55 N	/	AN	/	Non
R+1 -> ESC	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> ESC	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> ESC	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> ESC	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
R+1 -> ESC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
R+1 -> ESC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+1 -> ESC	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+1 -> ESC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> ESC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> ESC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+1 -> ESC	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
R+1 -> ESC	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+1 -> CIRC	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	P56 N	/	AN	lino	Non
R+1 -> CIRC	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	P83* N	/	AN	/	Non
R+1 -> CIRC	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> CIRC	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> CIRC	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> CIRC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+1 -> CIRC	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+1 -> CIRC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> CIRC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> CIRC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+1 -> CIRC	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
R+1 -> TISANERIE	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	21	P50 N	/	AN	/	Non
R+1 -> TISANERIE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	16	P46 N	/	AN	30x30 beige	Non
R+1 -> TISANERIE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	17	P47 N	/	AN	30x10 beige	Non
R+1 -> TISANERIE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	P48 N	/	AN	/	Non
R+1 -> TISANERIE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	24	P49* N	/	AN	/	Non
R+1 -> TISANERIE	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	Epais	Blanc	25	P57* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> TISANERIE	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	Epais	Blanc	25	P58 N	/	AN	/	Non
R+1 -> TISANERIE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> TISANERIE	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> TISANERIE	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+1 -> TISANERIE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
R+1 -> TISANERIE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+1 -> TISANERIE	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+1 -> TISANERIE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> TISANERIE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> TISANERIE	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
R+1 -> TISANERIE	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+1 -> TERRASSE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+1 -> TOITURE TERRASSE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> BUREAU 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
R+2 -> BUREAU 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 1	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 1	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 1	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 2	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	14	P68 N	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	P65 N	/	AN	lino	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> BUREAU 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	P66 N	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	23	P67 N	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 2	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 2	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 2	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 2	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 2	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 3	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 3	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 3	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> BUREAU 3	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
R+2 -> BUREAU 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 3	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 3	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 3	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 4	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 4	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 4	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 4	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
R+2 -> BUREAU 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> BUREAU 4	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 4	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 4	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 5	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 5	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 5	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 5	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
R+2 -> BUREAU 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 5	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> BUREAU 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 5	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 5	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 6	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 6	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 6	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 6	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
R+2 -> BUREAU 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 6	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 6	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> BUREAU 6	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+2 -> ELEVATEUR	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+2 -> ELEVATEUR	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> ELEVATEUR	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> ELEVATEUR	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
R+2 -> ELEVATEUR	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+2 -> ELEVATEUR	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+2 -> ELEVATEUR	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+2 -> ELEVATEUR	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+2 -> ELEVATEUR	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+2 -> ELEVATEUR	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
R+2 -> ELEVATEUR	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+2 -> ESC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	6	P70 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> ESC	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+2 -> ESC	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> ESC	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> ESC	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	Idem P 17	/	AN	lino	Non
R+2 -> ESC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
R+2 -> ESC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+2 -> ESC	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+2 -> ESC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+2 -> ESC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+2 -> ESC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+2 -> ESC	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non
R+2 -> ESC	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+2 -> SANIT	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	16	P59 N	/	AN	30x30 beige	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> SANIT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	17	P60 N	/	AN	30x10 beige	Non
R+2 -> SANIT	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	18	P61 N	/	AN	2x2	Non
R+2 -> SANIT	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	24	P62 N	/	AN	/	Non
R+2 -> SANIT	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	P63 N	/	AN	/	Non
R+2 -> SANIT	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	P64 N	/	AN	/	Non
R+2 -> SANIT	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+2 -> SANIT	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> SANIT	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> SANIT	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	3	Idem P 3	/	AN	/	Non
R+2 -> SANIT	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+2 -> SANIT	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+2 -> SANIT	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> SANIT	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	Idem P 83	/	AN	/	Non
R+2 -> CIRC	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	14	P71 N	/	AN	/	Non
R+2 -> CIRC	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Jaune	11	P69 N	/	AN	lino	Non
R+2 -> CIRC	Radiateurs gaz modulables	Dispositifs anti condensation	Peinture	Beige	31	P84 N	/	AN	/	Non
R+2 -> CIRC	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
R+2 -> CIRC	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> CIRC	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	15	Idem P 23	/	AN	/	Non
R+2 -> CIRC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	7	Idem P 24	/	AN	/	Non
R+2 -> CIRC	Plinthes	Peintures	Décoratif	Blanc, Orange	10	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+2 -> CIRC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+2 -> CIRC	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Plâtre	Blanc	13	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+2 -> CIRC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	19	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+2 -> CIRC	Portes	Peintures	Décoratif	Jaune	30	Idem P 81	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> TOITURE TERRASSE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	4	Idem P 5	/	AN	/	Non
EXTERIEUR	Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales	Fibres-ciment	Gris	32	P85* P	/	AN	/	Oui
EXTERIEUR -> FACADES	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	26	P72* N	/	AN	2x2	Non
EXTERIEUR -> FACADES	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	26	P73 N	/	AN	2x2	Non
EXTERIEUR -> FACADES	Façades lourdes y compris poteaux	Colles de faïence	Ciment	Gris	27	P74* N	/	AN	30x30	Non
EXTERIEUR -> FACADES	Façades lourdes y compris poteaux	Colles de faïence	Ciment	Gris	27	P75 N	/	AN	30x30	Non
EXTERIEUR -> FACADES	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment	Bleu	28	P76* N	/	AN	/	Non
EXTERIEUR -> FACADES	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment	Bleu	28	P77 N	/	AN	/	Non
EXTERIEUR -> FACADES	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Peinture	Décoratif	Blanc	29	P78* N	/	AN	/	Non
EXTERIEUR -> FACADES	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Peinture	Décoratif	Blanc	29	P79 N	/	AN	/	Non
EXTERIEUR -> Toiture	Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales	Fibres-ciment	Gris	32	Idem P 85	/	AN	/	Oui

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
1	Conduits	Conduits	1 U
32	Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales	3 U

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
SS	/
SS -> CHAUFFERIE	/
SS -> RESERVE	/
SS -> CIRC 1	/
SS -> ESC	/
SS -> ARCHIVES	/
SS -> CIRC 2	/
SS -> CIRC 3	/
SS -> RGT 1	/
SS -> RGT 2	/
SS -> ESC 2	/
SS -> CUISINE	/
SS -> LT INFO	/
SS -> SALLE REUNION	/
RDC	/
RDC -> HALL 1	/
RDC -> ELEVATEUR	/
RDC -> ESC	/
RDC -> SANIT	/
RDC -> HALL 2	/
RDC -> CIRC	/
RDC -> BUREAU 1	/
RDC -> BUREAU 2	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC -> BUREAU 3	/
RDC -> BUREAU 4	/
RDC -> BUREAU 5	/
RDC -> LOCAL MENAGE	/
RDC -> TERRASSE	/
RDC -> SALLE DE PAUSE	/
RDC -> RGT	/
RDC -> ACCUEIL	/
R+1	/
R+1 -> BUREAU 1	/
R+1 -> BUREAU 2	/
R+1 -> BUREAU 3	/
R+1 -> BUREAU 4	/
R+1 -> BUREAU 5	/
R+1 -> BUREAU 6	/
R+1 -> BUREAU 7	/
R+1 -> ELEVATEUR	/
R+1 -> ESC	/
R+1 -> CIRC	/
R+1 -> TISANERIE	/
R+1 -> TERRASSE	/
R+1 -> TOITURE TERRASSE	/
R+2	/
R+2 -> BUREAU 1	/
R+2 -> BUREAU 2	/
R+2 -> BUREAU 3	/
R+2 -> BUREAU 4	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+2 -> BUREAU 5	/
R+2 -> BUREAU 6	/
R+2 -> ELEVATEUR	/
R+2 -> ESC	/
R+2 -> SANIT	/
R+2 -> CIRC	/
R+2 -> TOITURE TERRASSE	/
EXTERIEUR	/
EXTERIEUR -> FACADES	/
EXTERIEUR -> Toiture	/

7.2. Photos prélèvements

P5	ZPSO 4
SS -> CHAUFFERIE	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P6	ZPSO 4
SS -> CHAUFFERIE	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P1	ZPSO 1
SS -> CHAUFFERIE	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P3	ZPSO 3
SS -> CHAUFFERIE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P4	ZPSO 3
SS -> CHAUFFERIE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P2	ZPSO 2
SS -> CHAUFFERIE	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	


P7	ZPSO 5
SS -> CHAUFFERIE	
	
Chaudières (mixtes, collectives) -> Bourre	

P27	ZPSO 16
SS -> RESERVE	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P29	ZPSO 17
SS -> RESERVE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P17	ZPSO 11
SS -> ARCHIVES	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P10	ZPSO 8
SS -> CIRC 2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

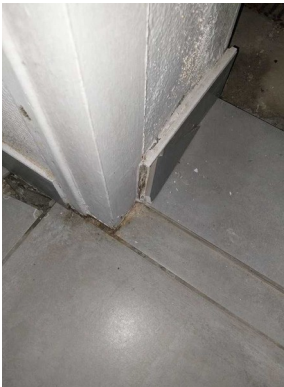P12	ZPSO 9
SS -> CIRC 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P14	ZPSO 10
SS -> CIRC 2	
	
Plinthes -> Peintures	

P26	ZPSO 14
SS -> CIRC 3	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P16	ZPSO 11
SS -> RGT 1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P24	ZPSO 7
SS -> RGT 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P25	ZPSO 7
SS -> RGT 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P18	ZPSO 12
SS -> CUISINE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	


P19	ZPSO 12
SS -> CUISINE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P8	ZPSO 6
SS -> LT INFO	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P9	ZPSO 7
SS -> LT INFO	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P22	ZPSO 14
SS -> SALLE REUNION	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P23	ZPSO 15
SS -> SALLE REUNION	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

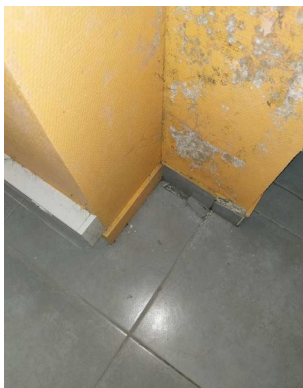P11	ZPSO 8
SS -> SALLE REUNION	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P13	ZPSO 9
SS -> SALLE REUNION	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

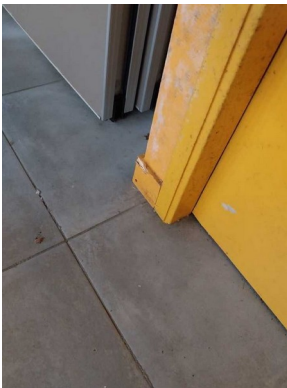P15	ZPSO 10
SS -> SALLE REUNION	
	
Plinthes -> Peintures	

P20	ZPSO 13
SS -> SALLE REUNION	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P21	ZPSO 6
SS -> SALLE REUNION	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P28	ZPSO 16
RDC -> ESC	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P30	ZPSO 17
RDC -> ESC	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P44	ZPSO 6
RDC -> ESC	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P36	ZPSO 21
RDC -> SANIT	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P37	ZPSO 22
RDC -> SANIT	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P31	ZPSO 12
RDC -> SANIT	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P32	ZPSO 18
RDC -> SANIT	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P33	ZPSO 18
RDC -> SANIT	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P34	ZPSO 19
RDC -> SANIT	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P35	ZPSO 20
RDC -> SANIT	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P38	ZPSO 13
RDC -> SANIT	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P45	ZPSO 11
RDC -> HALL 2	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P43	ZPSO 14
RDC -> BUREAU 1	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P39	ZPSO 11
RDC -> BUREAU 1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P40	ZPSO 13
RDC -> BUREAU 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P41	ZPSO 7
RDC -> BUREAU 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P42	ZPSO 23
RDC -> BUREAU 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P81	ZPSO 30
RDC -> BUREAU 1	
	
Portes -> Peintures	

P53	ZPSO 23
R+1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P54	ZPSO 14
R+1 -> BUREAU 1	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P51	ZPSO 11
R+1 -> BUREAU 1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P52	ZPSO 13
R+1 -> BUREAU 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P55	ZPSO 6
R+1 -> ESC	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P56	ZPSO 11
R+1 -> CIRC	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P50	ZPSO 21
R+1 -> TISANERIE	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P46	ZPSO 16
R+1 -> TISANERIE	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P47	ZPSO 17
R+1 -> TISANERIE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P48	ZPSO 19
R+1 -> TISANERIE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P49	ZPSO 24
R+1 -> TISANERIE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P57	ZPSO 25
R+1 -> TISANERIE	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

P58	ZPSO 25
R+1 -> TISANERIE	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

P68	ZPSO 14
R+2 -> BUREAU 2	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P65	ZPSO 11
R+2 -> BUREAU 2	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P66	ZPSO 13
R+2 -> BUREAU 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P67	ZPSO 23
R+2 -> BUREAU 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P70	ZPSO 6
R+2 -> ESC	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P59	ZPSO 16
R+2 -> SANIT	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P60	ZPSO 17
R+2 -> SANIT	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P61	ZPSO 18
R+2 -> SANIT	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P62	ZPSO 24
R+2 -> SANIT	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P63	ZPSO 19
R+2 -> SANIT	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P64	ZPSO 13
R+2 -> SANIT	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P71	ZPSO 14
R+2 -> CIRC	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P69	ZPSO 11
R+2 -> CIRC	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P85	ZPSO 32
EXTERIEUR	
	
Conduits en façade -> Conduits d'eaux pluviales (Liste B)	

P72	ZPSO 26
EXTERIEUR -> FACADES	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P73	ZPSO 26
EXTERIEUR -> FACADES	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P74	ZPSO 27
EXTERIEUR -> FACADES	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Colles de faïence	

P75	ZPSO 27
EXTERIEUR -> FACADES	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Colles de faïence	

P76	ZPSO 28
EXTERIEUR -> FACADES	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P77	ZPSO 28
EXTERIEUR -> FACADES	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P78	ZPSO 29
EXTERIEUR -> FACADES	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Peinture	

P79	ZPSO 29
EXTERIEUR -> FACADES	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Peinture	

RDC -> HALL 1		IA 7
3- Parois verticales intérieures		
Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	gaine Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

RDC -> ELEVATEUR		IA 1
7- Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques		
Machinerie ascenseur, investigations destructives requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 pour mise à l'arrêt de l'installation et démontage de parties d'équipements.	

RDC -> SANIT		IA 6
3- Parois verticales intérieures		
Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	gaine Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

RDC -> BUREAU 3		IA 8
3- Parois verticales intérieures		
Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	gaine Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

RDC -> BUREAU 4		IA 9
3- Parois verticales intérieures		
Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	gaine Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+1 -> BUREAU 1		IA 10
3- Parois verticales intérieures		
Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	gaine Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+1 -> BUREAU 4		IA 12
3- Parois verticales intérieures		
Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	gaine Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+1 -> CIRC		IA 13
3- Parois verticales intérieures		
Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	gaine Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+1 -> TISANERIE		IA 4
3- Parois verticales intérieures		
Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Gaine à démonter Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+1 -> TISANERIE		IA 11
3- Parois verticales intérieures		
Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	gaine Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+1 -> TOITURE TERRASSE		IA 3
1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités		
Investigations destructives sur couverture requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	prévoir étanchéité Faire intervenir un étancheur qualifié pour rebouchage des investigations destructives	

R+2 -> BUREAU 1		IA 14
3- Parois verticales intérieures		
Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	gaine Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+2 -> BUREAU 4		IA 16
3- Parois verticales intérieures		
Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	gaine Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+2 -> SANIT		IA 5
2- Parois verticales extérieures et façades		
Inspection de(s) garniture(s) de friction de fenêtre(s) basculante(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	hauteur trop importante pour accéder aux mastics de vitrage Faire procéder au démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

R+2 -> SANIT		IA 15
3- Parois verticales intérieures		
Démontage de coffre de volet roulant requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	gaine Faire réaliser le démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

EXTERIEUR -> FACADES		IA 2
2- Parois verticales extérieures et façades		
Refus de réalisation d'investigations approfondies destructives		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	joints precadres Permettre la réalisation des investigations approfondies destructives	

7.4. Attestation d'assurance



Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



- ERP
 - Neuf
 - Mise à jour du DPE,
 - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
 - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
 - Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
 - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
 - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
 - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
 - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
 - Etat des lieux,
 - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
 - Millièmes de copropriété,
 - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
 - Sécurité piscine,
 - Diagnostic technique Loi SRU,
 - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.
- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
 - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 69009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.5. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
 Attribué à
Andréas LEROUX


Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	11/09/2022	10/09/2029
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	11/09/2022	10/09/2029

Date : 05/09/2022

Laurent Croguennec, Président



Numéro de certificat : 15042964



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
 Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



7.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Ancien SPIP de la Vendée 53 rue de Verdun 85000 LA ROCHE SUR YON	
Localisation SS	Date visite	Du 24/09/2024 au 24/09/2024
	Auteur	Andreas LEROUX
	N° dossier	23620468/s2/3
	Planche	1 / 6
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : ● Conduits (Liste B)		
LEGENDE		
● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation		

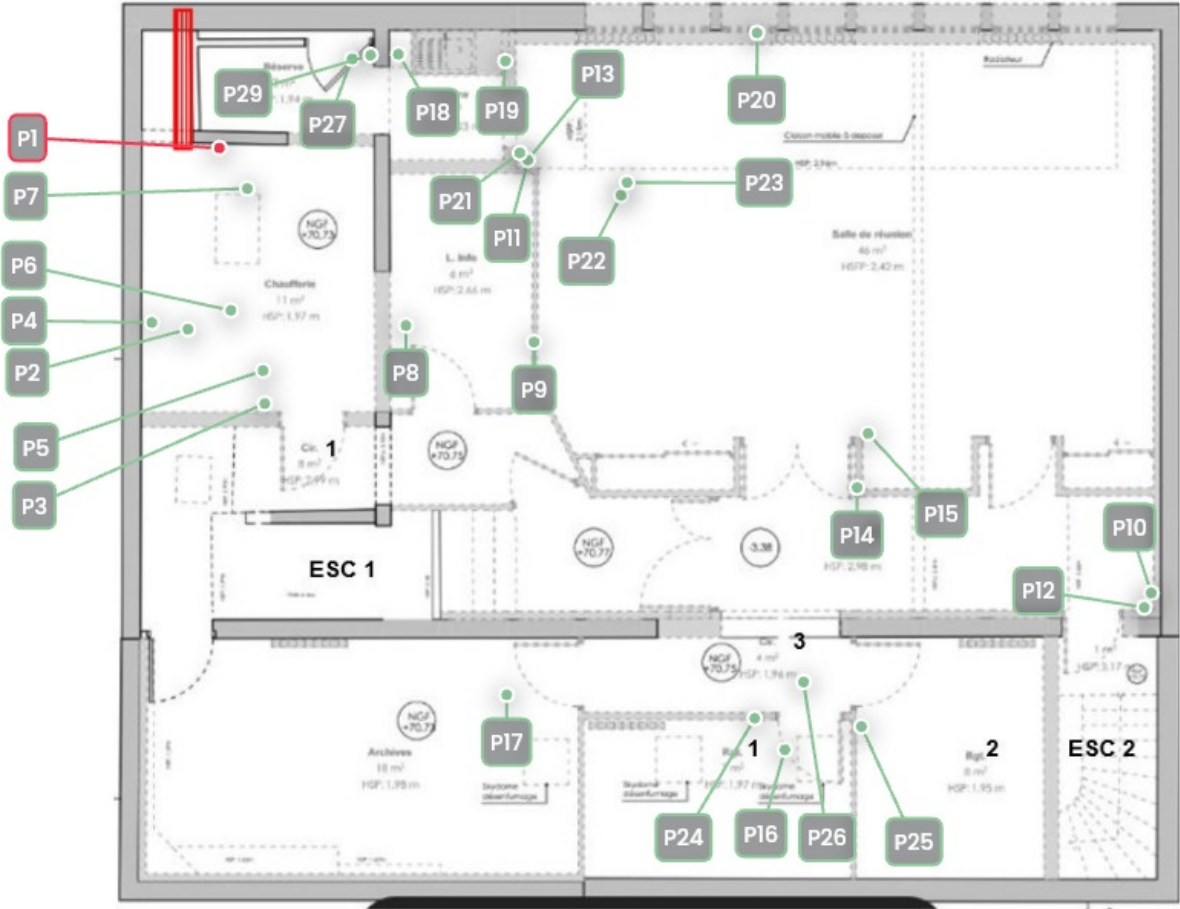



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	Ancien SPIP de la Vendée 53 rue de Verdun 85000 LA ROCHE SUR YON	
Localisation	Date visite	Du 24/09/2024 au 24/09/2024
RDC	Auteur	Andreas LEROUX
	N° dossier	23620468/S2/3
	Planche	2 / 6
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

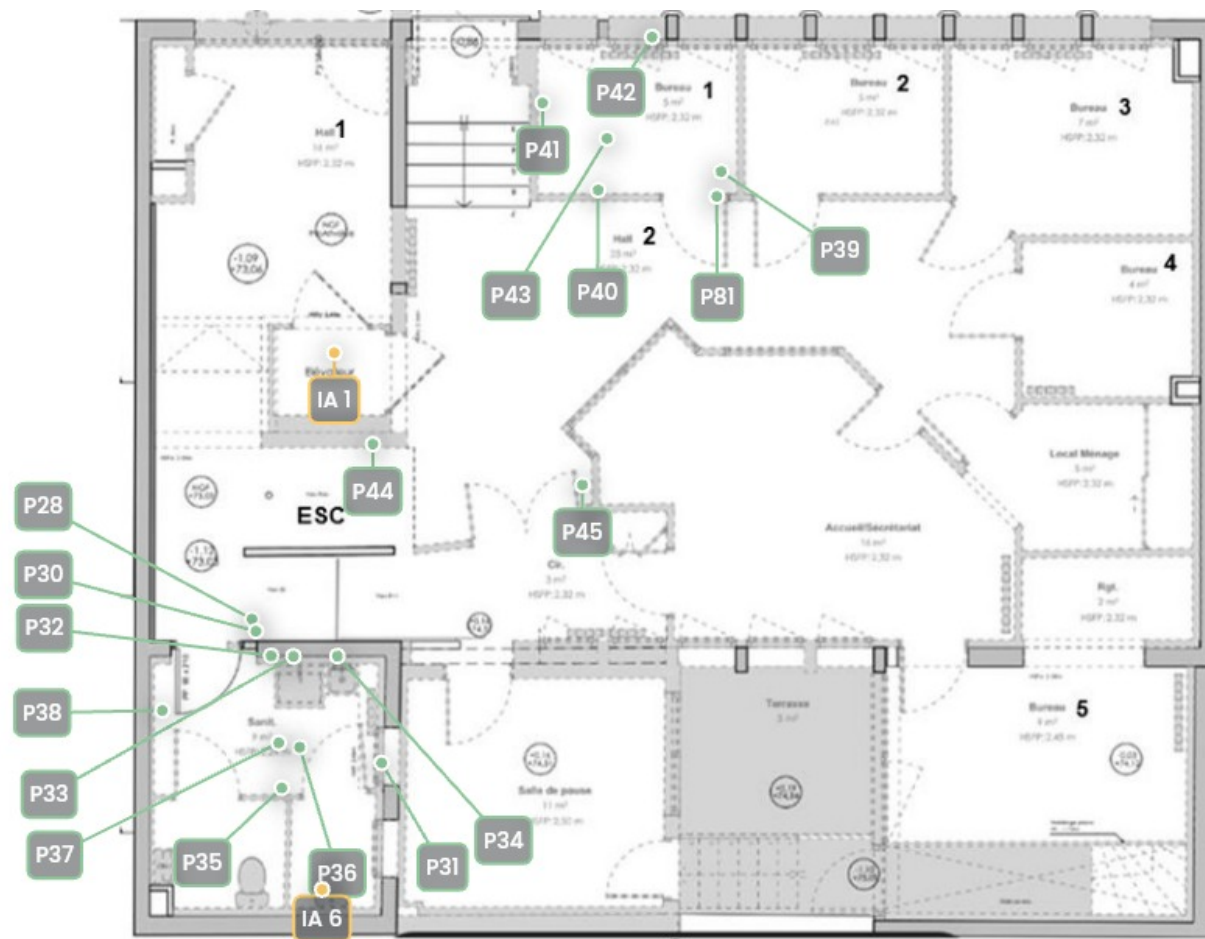

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
----------------	---	---	---	---	---

LEGENDE	 Prélèvement positif	 Prélèvement négatif	 Sondage	 Inaccessibilité	 Observation
----------------	---	---	---	---	---

LEGENDE	 Prélèvement positif	 Prélèvement négatif	 Sondage	 Inaccessibilité	 Observation
----------------	---	---	---	---	---

LEGENDE	 Prélèvement positif	 Prélèvement négatif	 Sondage	 Inaccessibilité	 Observation
----------------	---	---	---	---	---

LEGENDE	 Prélèvement positif	 Prélèvement négatif	 Sondage	 Inaccessibilité	 Observation
----------------	---	---	---	---	---

LEGENDE	 Prélèvement positif	 Prélèvement négatif	 Sondage	 Inaccessibilité	 Observation
----------------	---	---	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Ancien SPIP de la Vendée 53 rue de Verdun 85000 LA ROCHE SUR YON	
Localisation R+2	Date visite	Du 24/09/2024 au 24/09/2024
	Auteur	Andreas LEROUX
	N° dossier	23620468/s2/3
	Planche	4 / 6
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		


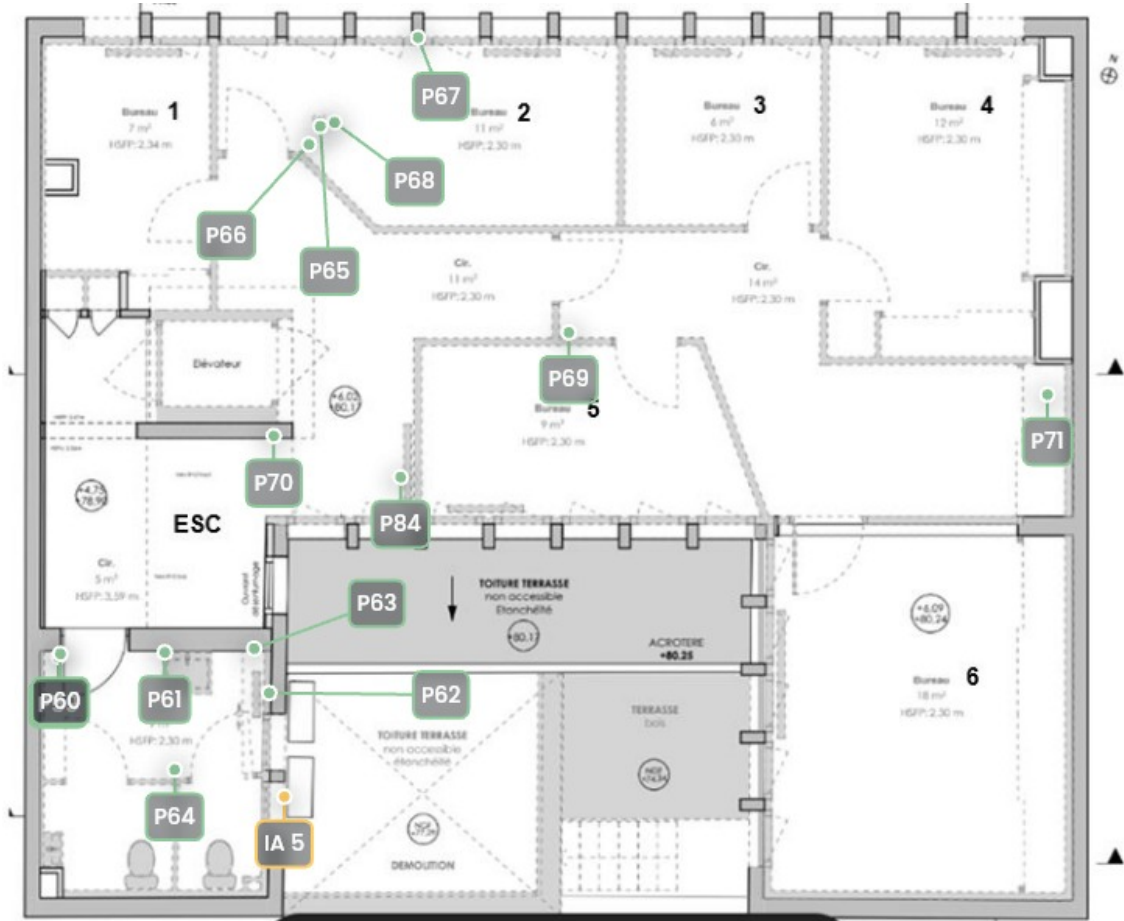


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Ancien SPIP de la Vendée 53 rue de Verdun 85000 LA ROCHE SUR YON	
Localisation EXTERIEUR	Date visite	Du 24/09/2024 au 24/09/2024
	Auteur	Andreas LEROUX
	N° dossier	23620468/s2/3
	Planche	5 / 6
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	Ancien SPIP de la Vendée 53 rue de Verdun 85000 LA ROCHE SUR YON	
Localisation EXTERIEUR > Toiture	Date visite	Du 24/09/2024 au 24/09/2024
	Auteur	Andreas LEROUX
	N° dossier	23620468/S2/3
	Planche	6 / 6
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Conduits d'eaux pluviales (Liste B)		

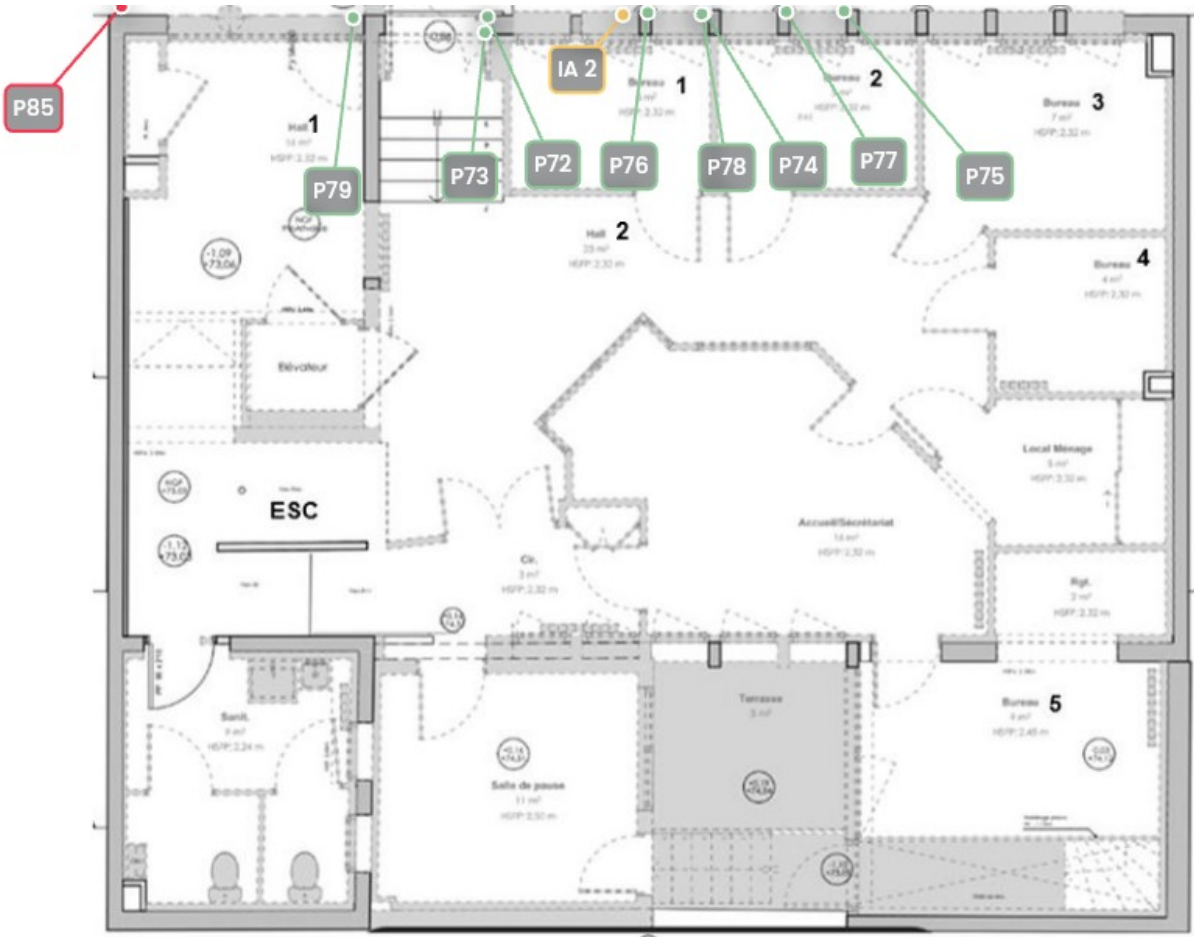

LEGENDE

Prélèvement positif

Prélèvement négatif

Sondage

Inaccessibilité

Observation

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

Il n'y a pas de rapport d'analyse annexé au rapport.

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Andreas LEROUX
Bâtiment OXANE – 4, rue Duguay Trouin
44800 SAINT HERBLAIN

Notre référence : AR-24-NS-055435-01

Numéro de dossier : 24W025670

Référence de dossier : 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24W025670-001 - Référence *BV3ML5571* Réf. Prel : *P1 SS - CHAUFFERIE/Conduits - (Fibres-ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-002 - Référence *BV3ML5572* Réf. Prel : *P2 SS - CHAUFFERIE/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-003 - Référence *BV3ML5573* Réf. Prel : *P3 SS - CHAUFFERIE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-004 - Référence *BV3ML5574* Réf. Prel : *P4 SS - CHAUFFERIE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-005 - Référence *BV3ML5575* Réf. Prel : *P5 SS - CHAUFFERIE/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-006 - Référence *BV3ML5576* Réf. Prel : *P6 SS - CHAUFFERIE/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-007 - Référence *BV3ML5577* Réf. Prel : *P7 SS - CHAUFFERIE/Chaudières (mixtes, collectives) - (Laineux/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-008 - Référence *BV3ML5578 Réf. Prel : P8 SS - LT INFO/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-009 - Référence *BV3ML5579 Réf. Prel : P9 SS - LT INFO/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-010 - Référence *BV3ML5580 Réf. Prel : P10 SS - CIRC 2/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-011 - Référence *BV3ML5581 Réf. Prel : P11 SS - SALLE REUNION/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-012 - Référence *BV3ML5582 Réf. Prel : P12 SS - CIRC 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-013 - Référence *BV3ML5583 Réf. Prel : P13 SS - SALLE REUNION/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-014 - Référence *BV3ML5584 Réf. Prel : P14 SS - CIRC 2/Plinthes - (Décoratif/Blanc, Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-015 - Référence *BV3ML5585 Réf. Prel : P15 SS - SALLE REUNION/Plinthes - (Décoratif/Blanc, Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-016 - Référence *BV3ML5586 Réf. Prel : P16 SS - RGT 1/Revêtements de sol - (Ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-017 - Référence *BV3ML5587 Réf. Prel : P17 SS - ARCHIVES/Revêtements de sol - (Ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-018 - Référence *BV3ML5588 Réf. Prel : P18 SS - CUISINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-019 - Référence BV3ML5589 Réf. Prel : P19 SS - CUISINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-020 - Référence BV3ML5590 Réf. Prel : P20 SS - SALLE REUNION/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-021 - Référence BV3ML5591 Réf. Prel : P21 SS - SALLE REUNION/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-022 - Référence BV3ML5592 Réf. Prel : P22 SS - SALLE REUNION/Plafonds - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-023 - Référence BV3ML5593 Réf. Prel : P23 SS - SALLE REUNION/Faux plafonds - (Fibreux/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-024 - Référence BV3ML5594 Réf. Prel : P24 SS - RGT 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-025 - Référence BV3ML5595 Réf. Prel : P25 SS - RGT 2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-026 - Référence BV3ML5596 Réf. Prel : P26 SS - CIRC 3/Plafonds - (Plâtre/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-027 - Référence BV3ML5597 Réf. Prel : P27 SS - RESERVE/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-028 - Référence BV3ML5598 Réf. Prel : P28 RDC - ESC/Revêtements de sol - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-029 - Référence BV3ML5599 Réf. Prel : P29 SS - RESERVE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-030 - Référence *BV3ML5600 Réf. Prel : P30 RDC - ESC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-031 - Référence *BV3ML5601 Réf. Prel : P31 RDC - SANIT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-032 - Référence *BV3ML5602 Réf. Prel : P32 RDC - SANIT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-033 - Référence *BV3ML5603 Réf. Prel : P33 RDC - SANIT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-034 - Référence *BV3ML5604 Réf. Prel : P34 RDC - SANIT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-035 - Référence *BV3ML5605 Réf. Prel : P35 RDC - SANIT/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-036 - Référence *BV3ML5606 Réf. Prel : P36 RDC - SANIT/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-037 - Référence *BV3ML5607 Réf. Prel : P37 RDC - SANIT/Faux plafonds - (Fibreux/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-038 - Référence *BV3ML5608 Réf. Prel : P38 RDC - SANIT/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-039 - Référence *BV3ML5609 Réf. Prel : P39 RDC - BUREAU 1/Revêtements de sol - (Ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-040 - Référence *BV3ML5610 Réf. Prel : P40 RDC - BUREAU 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-041 - Référence *BV3ML5611 Réf. Prel : P41 RDC - BUREAU 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-042 - Référence *BV3ML5612 Réf. Prel : P42 RDC - BUREAU 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-043 - Référence *BV3ML5613 Réf. Prel : P43 RDC - BUREAU 1/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-044 - Référence *BV3ML5614 Réf. Prel : P44 RDC - ESC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-045 - Référence *BV3ML5615 Réf. Prel : P45 RDC - HALL 2/Revêtements de sol - (Ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-046 - Référence *BV3ML5616 Réf. Prel : P46 R+1 - TISANERIE/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-047 - Référence *BV3ML5617 Réf. Prel : P47 R+1 - TISANERIE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-048 - Référence *BV3ML5618 Réf. Prel : P48 R+1 - TISANERIE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-049 - Référence *BV3ML5619 Réf. Prel : P49 R+1 - TISANERIE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-050 - Référence *BV3ML5620 Réf. Prel : P50 R+1 - TISANERIE/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-051 - Référence *BV3ML5621 Réf. Prel : P51 R+1 - BUREAU 1/Revêtements de sol - (Ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-052 - Référence *BV3ML5622 Réf. Prel : P52 R+1 - BUREAU 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-053 - Référence *BV3ML5623 Réf. Prel : P53 R+1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-054 - Référence *BV3ML5624 Réf. Prel : P54 R+1 - BUREAU 1/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-055 - Référence *BV3ML5625 Réf. Prel : P55 R+1 - ESC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-056 - Référence *BV3ML5626 Réf. Prel : P56 R+1 - CIRC/Revêtements de sol - (Ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-057 - Référence *BV3ML5627 Réf. Prel : P57 R+1 - TISANERIE/Menuiseries extérieures - (Epais/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-058 - Référence *BV3ML5628 Réf. Prel : P58 R+1 - TISANERIE/Menuiseries extérieures - (Epais/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-059 - Référence *BV3ML5629 Réf. Prel : P59 R+2 - SANIT/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-060 - Référence *BV3ML5630 Réf. Prel : P60 R+2 - SANIT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-061 - Référence *BV3ML5631 Réf. Prel : P61 R+2 - SANIT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W025670-062 - Référence *BV3ML5632 Réf. Prel : P62 R+2 - SANIT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-063 - Référence *BV3ML5633 Réf. Prel : P63 R+2 - SANIT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-064 - Référence *BV3ML5634 Réf. Prel : P64 R+2 - SANIT/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-065 - Référence *BV3ML5635 Réf. Prel : P65 R+2 - BUREAU 2/Revêtements de sol - (Ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-066 - Référence *BV3ML5636 Réf. Prel : P66 R+2 - BUREAU 2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-067 - Référence *BV3ML5637 Réf. Prel : P67 R+2 - BUREAU 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-068 - Référence *BV3ML5638 Réf. Prel : P68 R+2 - BUREAU 2/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-069 - Référence *BV3ML5639 Réf. Prel : P69 R+2 - CIRC/Revêtements de sol - (Ciment/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-070 - Référence *BV3ML5640 Réf. Prel : P70 R+2 - ESC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-071 - Référence *BV3ML5641 Réf. Prel : P71 R+2 - CIRC/Plafonds - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-072 - Référence *BV3ML5642 Réf. Prel : P72 EXTERIEUR - FACADES/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-073 - Référence *BV3ML5643 Réf. Prel : P73 EXTERIEUR - FACADES/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-074 - Référence *BV3ML5644 Réf. Prel : P74 EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-075 - Référence *BV3ML5645 Réf. Prel : P75 EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-076 - Référence *BV3ML5646 Réf. Prel : P76 EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-077 - Référence *BV3ML5647 Réf. Prel : P77 EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-078 - Référence *BV3ML5648 Réf. Prel : P78 EXTERIEUR - FACADES/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Décoratif/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-079 - Référence *BV3ML5649 Réf. Prel : P79 EXTERIEUR - FACADES/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Décoratif/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-080 - Référence *BV3ML5650 Réf. Prel : P81 RDC - BUREAU 1/Portes - (Décoratif/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-081 - Référence *BV3ML5651 Réf. Prel : P82 R+1 - BUREAU 1/Portes - (Décoratif/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-082 - Référence *BV3ML5652 Réf. Prel : P83 R+1 - CIRC/Radiateurs gaz modulables - (Peinture/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-083 - Référence *BV3ML5653 Réf. Prel : P84 R+2 - CIRC/Radiateurs gaz modulables - (Peinture/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W025670-084 - Référence *BV3ML5654 Réf. Prel : P85 EXTERIEUR/Conduits en façade - (Fibres-ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre

F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS

Sous-traitance Bâtiment Nantes

EUROFINS ABO

Site de la Géraudière

Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827

44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page1/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client:1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24W025670-001 - BV3ML5571 Réf . Prel : P1 SS - CHAUFFERIE/Conduits - (Fibres-ciment/Gris)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	24W025670-002 - BV3ML5572 Réf . Prel : P2 SS - CHAUFFERIE/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 2/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	24W025670-003 - BV3ML5573 Réf . Prel : P3 SS - CHAUFFERIE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	24W025670-004 - BV3ML5574 Réf . Prel : P4 SS - CHAUFFERIE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	24W025670-005 - BV3ML5575 Réf . Prel : P5 SS - CHAUFFERIE/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	24W025670-006 - BV3ML5576 Réf . Prel : P6 SS - CHAUFFERIE/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 3/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	24W025670-007 - BV3ML5577 Réf . Prel : P7 SS - CHAUFFERIE/Chaudières (mixtes, collectives) - (Laineux/Jaune)	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1)	24W025670-008 - BV3ML5578 Réf . Prel : P8 SS - LT INFO/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) + (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	24W025670-009 - BV3ML5579 Réf . Prel : P9 SS - LT INFO/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	24W025670-010 - BV3ML5580 Réf . Prel : P10 SS - CIRC 2/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01
 Dossier N° : 24GE009326
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client:1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13
 Date de réception : 30/09/2024
 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Date de réception : 27/09/2024

Page4/31
Date d'analyse : 02/10/2024

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	24W025670-011 - BV3ML5581 Réf . Prel : P11 SS - SALLE REUNION/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	24W025670-012 - BV3ML5582 Réf . Prel : P12 SS - CIRC 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	24W025670-013 - BV3ML5583 Réf . Prel : P13 SS - SALLE REUNION/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 5/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau souple (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	24W025670-014 - BV3ML5584 Réf . Prel : P14 SS - CIRC 2/Plinthes - (Décoratif/Blanc, Orange)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	24W025670-015 - BV3ML5585 Réf . Prel : P15 SS - SALLE REUNION/Plinthes - (Décoratif/Blanc, Orange)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	24W025670-016 - BV3ML5586 Réf . Prel : P16 SS - RGT 1/Revêtements de sol - (Ciment/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 6/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	24W025670-017 - BV3ML5587 Réf . Prel : P17 SS - ARCHIVES/Revêtements de sol - (Ciment/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (marbré) (vert)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (gris) en traces ; matériau semi-dur (rouge)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	24W025670-018 - BV3ML5588 Réf . Prel : P18 SS - CUISINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 7/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	24W025670-019 - BV3ML5589 Réf . Prel : P19 SS - CUISINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	24W025670-020 - BV3ML5590 Réf . Prel : P20 SS - SALLE REUNION/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (gris) (clair)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021 (1)	24W025670-021 - BV3ML5591 Réf . Prel : P21 SS - SALLE REUNION/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	24W025670-022 - BV3ML5592 Réf . Prel : P22 SS - SALLE REUNION/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 8/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	24W025670-023 - BV3ML5593 Réf . Prel : P23 SS - SALLE REUNION/Faux plafonds - (Fibreux/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	24W025670-024 - BV3ML5594 Réf . Prel : P24 SS - RGT 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / MF7K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
025	24W025670-025 - BV3ML5595 Réf . Prel : P25 SS - RGT 2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page9/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client:1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	24W025670-026 - BV3ML5596 Réf . Prel : P26 SS - CIRC 3/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	24W025670-027 - BV3ML5597 Réf . Prel : P27 SS - RESERVE/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type joint ciment (gris) (clair)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	24W025670-028 - BV3ML5598 Réf . Prel : P28 RDC - ESC/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 10/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	24W025670-029 - BV3ML5599 Réf . Prel : P29 SS - RESERVE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	24W025670-030 - BV3ML5600 Réf . Prel : P30 RDC - ESC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 11/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	24W025670-031 - BV3ML5601 Réf . Prel : P31 RDC - SANIT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	24W025670-032 - BV3ML5602 Réf . Prel : P32 RDC - SANIT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	24W025670-033 - BV3ML5603 Réf . Prel : P33 RDC - SANIT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 12/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	24W025670-034 - BV3ML5604 Réf . Prel : P34 RDC - SANIT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	24W025670-035 - BV3ML5605 Réf . Prel : P35 RDC - SANIT/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	24W025670-036 - BV3ML5606 Réf . Prel : P36 RDC - SANIT/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 13/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	24W025670-037 - BV3ML5607 Réf . Prel : P37 RDC - SANIT/Faux plafonds - (Fibreux/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) (clair)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	24W025670-038 - BV3ML5608 Réf . Prel : P38 RDC - SANIT/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	24W025670-039 - BV3ML5609 Réf . Prel : P39 RDC - BUREAU 1/Revêtements de sol - (Ciment/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (clair)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 14/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	24W025670-040 - BV3ML5610 Réf . Prel : P40 RDC - BUREAU 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit n°1	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)	MOLP * / WV7V	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) n°2	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	24W025670-041 - BV3ML5611 Réf . Prel : P41 RDC - BUREAU 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 15/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	24W025670-042 - BV3ML5612 Réf . Prel : P42 RDC - BUREAU 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	24W025670-043 - BV3ML5613 Réf . Prel : P43 RDC - BUREAU 1/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	24W025670-044 - BV3ML5614 Réf . Prel : P44 RDC - ESC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	24W025670-045 - BV3ML5615 Réf . Prel : P45 RDC - HALL 2/Revêtements de sol - (Ciment/Jaune)	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 16/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	24W025670-046 - BV3ML5616 Réf . Prel : P46 R+1 - TISANERIE/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (vert) en traces	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type tresse de fibres (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 17/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	24W025670-047 - BV3ML5617 Réf . Prel : P47 R+1 - TISANERIE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (de différentes couleurs) (i)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	24W025670-048 - BV3ML5618 Réf . Prel : P48 R+1 - TISANERIE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type tresse de fibres (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (cimenteux) (gris)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 18/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	24W025670-049 - BV3ML5619 Réf . Prel : P49 R+1 - TISANERIE/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	24W025670-050 - BV3ML5620 Réf . Prel : P50 R+1 - TISANERIE/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	24W025670-051 - BV3ML5621 Réf . Prel : P51 R+1 - BUREAU 1/Revêtements de sol - (Ciment/Jaune)	Matériau souple de type dalle de sol (rouge)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 19/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	24W025670-052 - BV3ML5622 Réf . Prel : P52 R+1 - BUREAU 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	24W025670-053 - BV3ML5623 Réf . Prel : P53 R+1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	24W025670-054 - BV3ML5624 Réf . Prel : P54 R+1 - BUREAU 1/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page20/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client:1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055	24W025670-055 - BV3ML5625 Réf . Prel : P55 R+1 - ESC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type tresse de fibres (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056	24W025670-056 - BV3ML5626 Réf . Prel : P56 R+1 - CIRC/Revêtements de sol - (Ciment/Jaune)	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 21/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057	24W025670-057 - BV3ML5627 Réf . Prel : P57 R+1 - TISANERIE/Menuiseries extérieures - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux en traces	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
058	24W025670-058 - BV3ML5628 Réf . Prel : P58 R+1 - TISANERIE/Menuiseries extérieures - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux en traces	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
059	24W025670-059 - BV3ML5629 Réf . Prel : P59 R+2 - SANIT/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (vert) en traces	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 22/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
060	24W025670-060 - BV3ML5630 Réf . Prel : P60 R+2 - SANIT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) (ii)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01	Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13	Page 23/31
Dossier N° : 24GE009326	Date de réception : 30/09/2024	Date d'analyse : 02/10/2024
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326	Référence de suivi du dossier N° : 24W025670	
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024	Date de réception : 27/09/2024	
Date d'analyse : 02/10/2024		
Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5		

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	24W025670-061 - BV3ML5631 Réf . Prel : P61 R+2 - SANIT/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	24W025670-062 - BV3ML5632 Réf . Prel : P62 R+2 - SANIT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063 (1)	24W025670-063 - BV3ML5633 Réf . Prel : P63 R+2 - SANIT/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 24/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	24W025670-064 - BV3ML5634 Réf . Prel : P64 R+2 - SANIT/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	24W025670-065 - BV3ML5635 Réf . Prel : P65 R+2 - BUREAU 2/Revêtements de sol - (Ciment/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (rouge) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	24W025670-066 - BV3ML5636 Réf . Prel : P66 R+2 - BUREAU 2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / WV7V	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
067	24W025670-067 - BV3ML5637 Réf . Prel : P67 R+2 - BUREAU 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 25/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068	24W025670-068 - BV3ML5638 Réf . Prel : P68 R+2 - BUREAU 2/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
069	24W025670-069 - BV3ML5639 Réf . Prel : P69 R+2 - CIRC/Revêtements de sol - (Ciment/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	24W025670-070 - BV3ML5640 Réf . Prel : P70 R+2 - ESC/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071	24W025670-071 - BV3ML5641 Réf . Prel : P71 R+2 - CIRC/Plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / MA4T	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 26/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072	24W025670-072 - BV3ML5642 Réf . Prel : P72 EXTERIEUR - FACADES/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073	24W025670-073 - BV3ML5643 Réf . Prel : P73 EXTERIEUR - FACADES/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
074	24W025670-074 - BV3ML5644 Réf . Prel : P74 EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 27/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
075	24W025670-075 - BV3ML5645 Réf . Prel : P75 EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (granulaire) (gris) (foncé)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur (gris) (clair)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
076	24W025670-076 - BV3ML5646 Réf . Prel : P76 EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Bleu)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 28/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
077	24W025670-077 - BV3ML5647 Réf . Prel : P77 EXTERIEUR - FACADES/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Bleu)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
078	24W025670-078 - BV3ML5648 Réf . Prel : P78 EXTERIEUR - FACADES/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Décoratif/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 29/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	24W025670-079 - BV3ML5649 Réf . Prel : P79 EXTERIEUR - FACADES/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Décoratif/Blanc)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
080	24W025670-080 - BV3ML5650 Réf . Prel : P81 RDC - BUREAU 1/Portes - (Décoratif/Jaune)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux en traces	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
081	24W025670-081 - BV3ML5651 Réf . Prel : P82 R+1 - BUREAU 1/Portes - (Décoratif/Jaune)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux en traces	MET * / NH6R	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux	MOLP * / YD8K	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page30/31
 Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
 Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
 Date d'analyse : 02/10/2024
 Référence dossier Client:1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
082	24W025670-082 - BV3ML5652 Réf . Prel : P83 R+1 - CIRC/Radiateurs gaz modulables - (Peinture/Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
083 (1)	24W025670-083 - BV3ML5653 Réf . Prel : P84 R+2 - CIRC/Radiateurs gaz modulables - (Peinture/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
084	24W025670-084 - BV3ML5654 Réf . Prel : P85 EXTERIEUR/Conduits en façade - (Fibres-ciment/Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MET * / Q2FS	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) La totalité du matériau dur de type ciment-colle gris clair a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-028382-01 Date d'émission de rapport : 04/10/2024 19:13 Page 31/31
Dossier N° : 24GE009326 Date de réception : 30/09/2024 Date d'analyse : 02/10/2024
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009326 Référence de suivi du dossier N° : 24W025670
Reçu au laboratoire le : 30/09/2024 Date de réception : 27/09/2024
Date d'analyse : 02/10/2024
Référence dossier Client: 1510797435/23620468/S2/3/1_23620468/4/5
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Guillaume Batt
Technicien Analyste Microscopie
Technicien MOLP

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
