

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 **Norme NF X 46-020 d'août 2017**



Nature du bâtiment	CPAM
Adresse	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX
Cat. du bâtiment	
Réf. Cadastre	NC
Permis de construire	Avant 1997
Propriétaire	CPAM DE L'ARTOIS
Adresse	11 Boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX
Donneur d'ordre	CPAM DE L'ARTOIS
Adresse	11 Boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX
Téléphone(s)	

Numéro de rapport	132530 CPAM DE L'ARTOIS A		
Date de la commande	20/02/2026	Date du repérage	05/03/2026 au 05/03/2026
Date d'émission du rapport de repérage	16/03/2026		
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Remplacement du système de ventilation		

SIGNATAIRE DU RAPPORT

Signature et Visa	Opérateur de repérage :
	MAGUET David EXIM EXPERTISES IMMOBILIERES Le 16/03/2026

Rapport(s) précédemment réalisé(s) :

Aucun

Rappel de la conclusion ([détails, voir chapitre 4](#))

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PAGE DE GARDE	
SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
SOMMAIRE	2
TERMES ET DÉFINITIONS	3
DESCRIPTION DE LA MISSION	5
OBJET DE LA MISSION	5
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES	5
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE	5
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE	5
PROGRAMME DE TRAVAUX	5
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	6
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION)	6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	8
CONCLUSIONS	9
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE REPERES	9
INVESTIGATIONS APPROFONDIES ET/OU MOYENS D'ACCÈS SPÉCIFIQUES À METTRE EN ŒUVRE	9
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	9
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020	9
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	9
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES (ZPSO)	9
RESULTATS DU REPERAGE	17
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE	17
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	18
COMMENTAIRE SUR LA MISSION	22
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	22
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	23
PRELEVEMENT : P001	23
PRELEVEMENT : P002	23
PRELEVEMENT : P003	23
PRELEVEMENT : P004	24
PRELEVEMENT : P005	24
PRELEVEMENT : P006	24
PRELEVEMENT : P007	25
PRELEVEMENT : P008	25
PRELEVEMENT : P009	25
PRELEVEMENT : P010	25
PRELEVEMENT : P011	26
PRELEVEMENT : P012	26
PRELEVEMENT : P013	26
PRELEVEMENT : P014	27
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	28
CROQUIS N°1	29
CROQUIS N°2	30
CROQUIS N°3	31
CROQUIS N°4	32
CROQUIS N°5	33
CROQUIS N°6	34
CROQUIS N°7	35
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE	37
PV_01820260301774117	37
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	41
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	42

TERMES ET DÉFINITIONS

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. (Source : Norme NF X 46-020)

Couche d'un produit ou d'un matériau	Élément d'un matériau ou produit pouvant être distingué des autres éléments par l'examen visuel ou par l'analyse
Démolition	Opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment
Donneur d'ordre	Toute personne physique ou morale qui commande une mission de repérage de l'amiante dans un immeuble bâti. Cette personne peut être le propriétaire, le syndic, un locataire, une entreprise, un maître d'ouvrage, un chef d'établissement, etc.
Échantillon	Partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x) résultant d'un prélèvement, et ayant vocation à être analysée en laboratoire Partie limitée d'un ouvrage de référence qui est utilisée pour le représenter et le cas échéant, comparer ses propriétés à celles d'autres parties d'ouvrage, en vue de caractériser une zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)
Inspection visuelle	Recherche visuelle en vue d'identifier, parmi les parties d'ouvrages présentes dans l'immeuble, les matériaux ou produits prévus par le programme de repérage de la mission
Investigation approfondie	Action nécessaire à l'inspection visuelle de la composition externe ou interne d'un ouvrage ou d'un volume. Les investigations approfondies sont de deux types : - investigation approfondie destructive qui nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de matériau ou qui fait perdre sa fonction à l'ouvrage
Investigation approfondie non destructive Investigation approfondie complémentaire	Investigation devant être réalisée juste avant ou entre les différentes étapes des travaux y compris démolition. Ce type d'investigation est très exceptionnel et doit être justifié. Dans ce cas l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs dans son rapport
Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante	Matériau ou produit dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et pour lequel la présence ou l'absence d'amiante n'a pas été démontrée NOTE 1 Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante. NOTE 2 On distingue les matériaux et les produits comme suit : Produit : manufacturé, standardisé, mis en oeuvre en l'état (exemple : dalles de sol, dalles de FP...) ; Matériau : réalisé in situ, selon des règles de mise en oeuvre, suite à une préparation à pied d'œuvre (exemple : flocage, enduits, peintures, revêtements bitumineux...)
Matériau ou produit contenant de l'amiante	Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante NOTE Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit contenant de l'amiante.
Opérateur de repérage	Personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un immeuble bâti dans le cadre d'une commande
Ouvrage	Résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique dans un immeuble bâti. Un ouvrage peut comporter une ou plusieurs parties NOTE 1 Les ouvrages à considérer sont les composants de la construction, classés en listes. NOTE 2 Au titre du code de la santé publique, un ouvrage est désigné comme un composant
Partie d'ouvrage	Matériau ou produit dont la destination est d'être incorporé à l'immeuble bâti selon des méthodes ou des montages prédéterminés et dont la présence est indispensable pour qualifier la constitution d'un ouvrage NOTE Au titre du code de la santé publique, une partie d'ouvrage est désignée comme une partie de composant.
Périmètre de repérage	Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage
Prélèvement	Acte de prélever une partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x)

Programme de repérage	Liste des ouvrages et parties d'ouvrages à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage dépend des exigences de la réglementation, des objectifs du donneur d'ordre et locaux impactés de façon directe ou indirecte (zones de stockage, cheminements, locaux adjacents...)
Programme de travaux	Document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de la zone d'intervention : zone de travaux effectifs
Repérage	Mission visant à rechercher, dans les immeubles bâtis, les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, puis à identifier et localiser ceux qui en contiennent NOTE Selon la mission, le repérage peut comprendre également l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
Sondage	Action qui permet de s'assurer que des matériaux ou produits sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage NOTE 1 Au moment du sondage, la présence ou l'absence d'amiante dans les matériaux ne sont pas nécessairement connues. NOTE 2 Le sondage n'est pas un prélèvement.
Zone présentant des similitudes d'ouvrage (« ZPSO »)	Partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d'ouvrage sont semblables

1

DESCRIPTION DE LA MISSION



1.1 OBJET DE LA MISSION

Références de l'ordre de mission : **132530 CPAM DE L'ARTOIS**

1.2 IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES

Propriétaire de l'immeuble	CPAM DE L'ARTOIS
Demeurant	11 Boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX
Représenté par	Madame MASSETTI SABRINA
Commanditaire du repérage	CPAM DE L'ARTOIS
Opérateur ayant réalisé le repérage	M. MAGUET David
Nom et adresse de l'entreprise	EXIM EXPERTISES IMMOBILIERES 23 rue Uriane Sorriaux 62300 LENS
N° de Siret	48453313800034
RCP-compagnie-n° de police	LSN -n°10583929904A057

1.3 IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE

Dénomination	
Adresse complète	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX
Référence Cadastre	NC

1.4 IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE

Date du PC	Avant 1997	Date de construction	Non communiquée
Type et Fonction principale du bien	CPAM		Tertiaire
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné	Aucun		
Historique du site	Non communiqué		

2

PROGRAMME DE TRAVAUX



Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit

Référence	Remplacement du système de ventilation
Description succincte	Remplacement du système de ventilation

3

CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE



3.1 PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION)



Parties d'immeuble concernées

N° local	Parties d'immeuble visitées	Etage	Statut
1	Réserve informatique	-1	Concernée
2	Archive gestion du patrimoine	-1	Concernée
3	Salle serveurs et autocom	-1	Concernée
4	Local	-1	Concernée
5	Archives	-1	Concernée
6	Réserve prestataire nettoyage	-1	Concernée
7	Réserve prévention	-1	Concernée
8	Gestion du patrimoine mobilier	-1	Concernée
9	Réserve CSE	-1	Concernée
10	Réserve prévention	-1	Concernée
11	Réserve com	-1	Concernée
12	Poste transformateur	-1	Concernée
13	Réserve patrimoine (fournitures)	-1	Concernée
14	Réserve gestion du patrimoine	-1	Concernée
15	Local serveurs	-1	Concernée
16	Local technique	-1	Concernée
17	Réserve gestion du patrimoine	-1	Concernée
18	Archives	-1	Concernée
19	Douche	-1	Concernée
20	Douche	-1	Concernée
21	Réserve	-1	Concernée
22	Gestion du patrimoine maintenance	-1	Concernée
23	Réserve matériel	-1	Concernée
24	Garage	-1	Concernée
25	PFS plateau A	1	Concernée
26	PFS plateau B	1	Concernée
27	RU PFS	1	Concernée
28	Sanitaires F	1	Concernée
29	Sanitaires H/F	1	Concernée
30	Sanitaires	1	Concernée
31	Local de stockage	1	Concernée
32	Chirurgien Dentiste Conseil	1	Concernée
33	Pharmacien Conseil	1	Concernée
34	Secrétariat Service Médical	1	Concernée
35	Service Médical	1	Concernée
36	Médecin Conseil Chef	1	Concernée
37	Resp. PFS	1	Concernée
38	Superviseurs PFS	1	Concernée
39	Salle de pause Artésienne	1	Concernée
40	Back Office Accueil	1	Concernée
41	DAM	1	Concernée
42	Service Social	1	Concernée
43	Assistants Sociales	1	Concernée
44	Resp. Service Social	1	Concernée
45	Secrétariat Service Social	1	Concernée
46	PFS	1	Concernée
47	Patio	1	Concernée
48	Relations Professionnels de Santé	2	Concernée
49	Resp. Prestations AS Maladies	2	Concernée
50	Prestations Espèces AS Maladies	2	Concernée
51	Resp. Vérificateurs	2	Concernée

Amiante

N° local	Parties d'immeuble visitées	Etage	Statut
52	Contrôle	2	Concernée
53	Resp. Accueil	2	Concernée
54	Délégués Numériques en Santé	2	Concernée
55	Sanitaires	2	Concernée
56	Sanitaires H	2	Concernée
57	Sanitaires F	2	Concernée
58	Contentieux / TASS	2	Concernée
59	Contentieux	2	Concernée
60	Resp. Adjoint Resp. Phares IJ AT	2	Concernée
61	Phares IJ	2	Concernée
62	IJ AT	2	Concernée
63	Salle de Formation E. F. Vidocq	2	Concernée
64	Infirmierie	2	Concernée
65	Salle de Formation E. F. Vidocq (annexe)	2	Concernée
66	Patio	2	Concernée
67	Directrice	3	Concernée
68	Salle de Réunion Directrice	3	Concernée
69	Bureau itinérant Direction	3	Concernée
70	Directrice Adjointe	3	Concernée
71	Président du Conseil	3	Concernée
72	Salle de réunion Maximilien Robespierre	3	Concernée
73	Secrétariat de Direction	3	Concernée
74	Sanitaires mixtes	3	Concernée
75	Sanitaires F	3	Concernée
76	Sanitaires H	3	Concernée
77	Sous Directrice Direction des Ressources	3	Concernée
78	Resp. Gestion des Ressources Humaines	3	Concernée
79	Resp. GPEC	3	Concernée
80	Formation Professionnelle	3	Concernée
81	Juriste en Droit Social	3	Concernée
82	GPEC Recrutement	3	Concernée
83	RH Chef de projet	3	Concernée
84	Attachée de Direction	3	Concernée
85	Communication Marketing	3	Concernée
86	Gestion du Personnel	3	Concernée
87	Resp. Gestion Immobilière	3	Concernée
88	Resp. Relation Clients	3	Concernée
89	Local Syndical	3	Concernée
90	Resp. Adjoint	3	Concernée
91	DPO PCA PSSI	3	Concernée
92	Resp. Bureau d'Étude Informatique	3	Concernée
93	Maintenance Informatique	3	Concernée
94	Prévention	3	Concernée
95	Réserve	3	Concernée
96	Partenariat accès aux soins et à la santé	3	Concernée
97	Patio	3	Concernée
98	Resp. PHARE CSS	4	Concernée
99	Précarité	4	Concernée
100	Comité Social Economique	4	Concernée
101	Sanitaires F	4	Concernée
102	Sanitaires H	4	Concernée
103	Phare Eptica	4	Concernée
104	Superviseur Phare Eptica	4	Concernée
105	Resp. TRAM FSP Télétransmissions Réclamations PS	4	Concernée
106	Salle de Restauration	4	Concernée
107	Frais de Santé	4	Concernée
108	Resp. Unité Pôle Frais de Santé	4	Concernée
109	MAD Flux Tiers	4	Concernée

Amiante

N° local	Parties d'immeuble visitées	Etage	Statut
110	Sanitaires mixtes	4	Concernée
111	Circulation	4	Concernée
112	Réserve	4	Concernée
113	Local RIA	4	Concernée
114	Patio	4	Concernée
115	Service Médical	0	Concernée
116	Sanitaires mixtes	0	Concernée
117	Sanitaires	0	Concernée
118	Service Médical Administratif	0	Concernée
119	Bureau Service Médical Administratif	0	Concernée
120	Accueil médical	0	Concernée
121	Accueil sur rendez-vous services	0	Concernée
122	Libre Service	0	Concernée
123	Accueil	0	Concernée
124	Attente	0	Concernée
125	Médecin Conseil 1	0	Concernée
126	Médecin Conseil 2	0	Concernée
127	Médecin Conseil 3	0	Concernée
128	Médecin Conseil 4	0	Concernée
129	Médecin Conseil 5	0	Concernée
130	Médecin Conseil 6	0	Concernée
131	Accueil 1	0	Concernée
132	Accueil 2	0	Concernée
133	Accueil 3	0	Concernée
134	Accueil 4	0	Concernée
135	Cellule CNASSSM	0	Concernée
136	Resp. Numérisation Archives Courrier Imprimerie	0	Concernée
137	Cellule DITADEME	0	Concernée
138	Salle de Réunion	0	Concernée
139	Sanitaires H/F	0	Concernée
140	Archives Synergie	0	Concernée
141	Synergie	0	Concernée
142	Service Courrier	0	Concernée
143	Resp Courrier	0	Concernée
144	Accueil Professionnel Santé	0	Concernée
145	Entrée Sortie	0	Concernée
146	Patio	0	Concernée



Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 et du tableau A.1 de la norme NFX 46-020 de 2017 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
6 - Conduits et accessoires intérieurs			
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M	

3.2 RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES

Néant

Amiante

4

CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante



LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE REPRES

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Réf ZPSO	Réf. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
74	Sanitaires mixtes	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Z004	S004	Résultat d'analyse	0,2 m²	
110	Sanitaires mixtes	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Z001	S001	Résultat d'analyse	0,2 m²	



INVESTIGATIONS APPROFONDIES ET/OU MOYENS D'ACCÈS SPÉCIFIQUES À METTRE EN ŒUVRE



Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti non accessibles

Aucun

5

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1 DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE

Date	Objet
05/03/2026	Visite et prélèvements

5.2 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020

Aucun

5.3 CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES

Néant

5.4 LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES (ZPSO)

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les **Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages** suivantes :



Zones présentant des similitudes d'ouvrage avec présence d'amiante

Z001 - Conduit de fluide Dépôt de poussière fibreuse - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée : 0,2 m²

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Ref. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
110	Sanitaires mixtes	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	X	S001	Résultat d'analyse	0,2 m ²	

Z004 - Conduit de fluide Dépôt de poussière fibreuse - (Zone continue : NON)

Quantité totale d'amiante estimée : 0,2 m²

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Ref. Sondage	Critères(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
74	Sanitaires mixtes	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	X	S004	Résultat d'analyse	0,2 m ²	



Zones présentant des similitudes d'ouvrage sans présence d'amiante

Z002 - Conduit de fluide Dépôt de poussière fibreuse - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
101	Sanitaires F	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
102	Sanitaires H	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	X	S002	P002	

Z003 - Conduit de fluide Dépôt de poussière fibreuse - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
75	Sanitaires F	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
76	Sanitaires H	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	X	S003	P003	

Amiante

Z005 - Conduit de fluide Dépôt de poussière fibreuse - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
56	Sanitaires H	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	X	S005	P005	
57	Sanitaires F	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				

Z006 - Conduit de fluide Dépôt de poussière fibreuse - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
55	Sanitaires	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	X	S006	P006	

Z007 - Conduit de fluide Dépôt de poussière fibreuse - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
29	Sanitaires H/F	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
30	Sanitaires	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	X	S007	P007	

Z008 - Conduit de fluide Dépôt de poussière fibreuse - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
28	Sanitaires F	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	X	S008	P008	

Z009 - Conduit de fluide Dépôt de poussière fibreuse - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
139	Sanitaires H/F	0	Conduit de fluide n°1 - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	X	S009	P009	

Amiante

2010 - Conduit de fluide Dépôt de poussière fibreuse - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
116	Sanitaires mixtes	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	X	S010	P010	

2011 - Conduit de fluide Dépôt de poussière fibreuse - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
117	Sanitaires	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	X	S011	P011	

2012 - Conduit de fluide Dépôt de poussière fibreuse - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
1	Réserve informatique	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
2	Archive gestion du patrimoine	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
3	Salle serveurs et autocom	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
4	Local	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
5	Archives	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	X	S012	P012	
6	Réserve prestataire nettoyage	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
7	Réserve prévention	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
8	Gestion du patrimoine mobilier	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
9	Réserve CSE	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
10	Réserve prévention	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
11	Réserve com	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
12	Poste transformateur	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
13	Réserve patrimoine (fournitures)	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
14	Réserve gestion du patrimoine	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
15	Local serveurs	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
16	Local technique	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
17	Réserve gestion du patrimoine	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
18	Archives	-1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
19	Douche	-1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
20	Douche	-1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
21	Réserve	-1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
22	Gestion du patrimoine maintenance	-1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
23	Réserve matériel	-1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
24	Garage	-1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
25	PFS plateau A	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
26	PFS plateau B	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
27	RU PFS	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
31	Local de stockage	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
32	Chirurgien Dentiste Conseil	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
33	Pharmacien Conseil	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
34	Secrétariat Service Médical	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
35	Service Médical	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
36	Médecin Conseil Chef	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
37	Resp. PFS	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
38	Superviseurs PFS	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
39	Salle de pause Artésienne	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
40	Back Office Accueil	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
41	DAM	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
42	Service Social	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse		S014	P014	
43	Assistantes Sociales	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
44	Resp. Service Social	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
45	Secrétariat Service Social	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
46	PFS	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
47	Patio	1	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
48	Relations Professionnels de Santé	2	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
49	Resp. Prestations AS	2	Conduit de fluide- Toutes zones -				

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
	Maladies		Dépôt de poussière fibreuse				
50	Prestations Espèces AS Maladies	2	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
51	Resp. Vérificateurs	2	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
52	Contrôle	2	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
53	Resp. Accueil	2	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
54	Délégués Numériques en Santé	2	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
58	Contentieux / TASS	2	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
59	Contentieux	2	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
60	Resp. Adjoint Resp. Phares IJ AT	2	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
61	Phares IJ	2	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
62	IJ AT	2	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
63	Salle de Formation E. F. Vidocq	2	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
64	Infirmierie	2	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
65	Salle de Formation E. F. Vidocq (annexe)	2	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
66	Patio	2	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
67	Directrice	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
68	Salle de Réunion Directrice	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
69	Bureau itinérant Direction	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
70	Directrice Adjointe	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
71	Président du Conseil	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
72	Salle de réunion Maximilien Robespierre	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
73	Secrétariat de Direction	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
77	Sous Directrice Direction des Ressources	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
78	Resp. Gestion des Ressources Humaines	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
79	Resp. GPEC	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
80	Formation Professionnelle	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
81	Juriste en Droit Social	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
82	GPEC Recrutement	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
83	RH Chef de projet	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
84	Attachée de Direction	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
85	Communication Marketing	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
86	Gestion du Personnel	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
87	Resp. Gestion Immobilière	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
88	Resp. Relation Clients	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
89	Local Syndical	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
90	Resp. Adjoint	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
91	DPO PCA PSSI	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
92	Resp. Bureau d'Étude Informatique	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
93	Maintenance Informatique	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
94	Prévention	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
95	Réserve	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
96	Partenariat accès aux soins et à la santé	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
97	Patio	3	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
98	Resp. PHARE CSS	4	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
99	Précarité	4	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
100	Comité Social Economique	4	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
103	Phare Eptica	4	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
104	Superviseur Phare Eptica	4	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
105	Resp. TRAM FSP Télétransmissions Réclamations PS	4	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
106	Salle de Restauration	4	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
107	Frais de Santé	4	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
108	Resp. Unité Pôle Frais de Santé	4	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
109	MAD Flux Tiers	4	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
111	Circulation	4	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
112	Réserve	4	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
113	Local RIA	4	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
114	Patio	4	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
115	Service Médical	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
118	Service Médical Administratif	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
119	Bureau Service Médical Administratif	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
120	Accueil médical	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
121	Accueil sur rendez-vous services	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
122	Libre Service	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
123	Accueil	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
124	Attente	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
125	Médecin Conseil 1	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
126	Médecin Conseil 2	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
127	Médecin Conseil 3	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
128	Médecin Conseil 4	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
129	Médecin Conseil 5	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
130	Médecin Conseil 6	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
131	Accueil 1	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
132	Accueil 2	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
133	Accueil 3	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
134	Accueil 4	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
135	Cellule CNASSSM	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
136	Resp. Numérisation Archives Courrier Imprimerie	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
137	Cellule DITADEME	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
138	Salle de Réunion	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse		S013	P013	
139	Sanitaires H/F	0	Conduit de fluide n°2 - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
140	Archives Synergie	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
141	Synergie	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
142	Service Courrier	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
143	Resp Courrier	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
144	Accueil Professionnel Santé	0	Conduit de fluide- Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				
145	Entrée Sortie	0	Conduit de fluide- Toutes zones -				

Amiante

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoïn	Sondage	Prélèvement	Photo
			Dépôt de poussière fibreuse				
146	Patio	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse				

6

RESULTATS DU REPERAGE

6.1 RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE

Type de document	Statut	Document	Référence	Commentaire
Programme de travaux	remis	Programme de travaux	Remplacement du système de ventilation	Remplacement du système de ventilation

6.2 LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
1	Réserve informatique	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
2	Archive gestion du patrimoine	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
3	Salle serveurs et autocom	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
4	Local	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
5	Archives	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
6	Réserve prestataire nettoyage	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
7	Réserve prévention	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
8	Gestion du patrimoine mobilier	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
9	Réserve CSE	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
10	Réserve prévention	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
11	Réserve com	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
12	Poste transformateur	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
13	Réserve patrimoine (fournitures)	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
14	Réserve gestion du patrimoine	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
15	Local serveurs	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
16	Local technique	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
17	Réserve gestion du patrimoine	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
18	Archives	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
19	Douche	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
20	Douche	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
21	Réserve	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
22	Gestion du patrimoine maintenance	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
23	Réserve matériel	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
24	Garage	-1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
25	PFS plateau A	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
26	PFS plateau B	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
27	RU PFS	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
28	Sanitaires F	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
29	Sanitaires H/F	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
30	Sanitaires	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
31	Local de stockage	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
32	Chirurgien Dentiste Conseil	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
33	Pharmacien Conseil	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
34	Secrétariat Service Médical	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
35	Service Médical	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
36	Médecin Conseil Chef	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
37	Resp. PFS	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
38	Superviseurs PFS	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
39	Salle de pause Artésienne	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
40	Back Office Accueil	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
41	DAM	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
42	Service Social	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
43	Assistants Sociales	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
44	Resp. Service Social	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
45	Secrétariat Service Social	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
46	PFS	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
47	Patio	1	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
48	Relations Professionnels de Santé	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
49	Resp. Prestations AS Maladies	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
50	Prestations Espèces AS Maladies	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
51	Resp. Vérificateurs	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
52	Contrôle	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
53	Resp. Accueil	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
54	Délégués Numériques en Santé	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
55	Sanitaires	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
56	Sanitaires H	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
57	Sanitaires F	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
58	Contentieux / TASS	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
59	Contentieux	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
60	Resp. Adjoint Resp. Phares IJ AT	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
61	Phares IJ	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
62	IJ AT	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
63	Salle de Formation E. F. Vidocq	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
64	Infirmierie	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
65	Salle de Formation E. F. Vidocq (annexe)	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
66	Patio	2	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
67	Directrice	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
68	Salle de Réunion Directrice	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
69	Bureau itinérant Direction	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
70	Directrice Adjointe	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
71	Président du Conseil	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
72	Salle de réunion Maximilien Robespierre	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
73	Secrétariat de Direction	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
74	Sanitaires mixtes	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Oui
75	Sanitaires F	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
76	Sanitaires H	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
77	Sous Directrice Direction des Ressources	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
78	Resp. Gestion des Ressources Humaines	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
79	Resp. GPEC	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
80	Formation Professionnelle	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
81	Juriste en Droit Social	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
82	GPEC Recrutement	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
83	RH Chef de projet	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
84	Attachée de Direction	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
85	Communication Marketing	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
86	Gestion du Personnel	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
87	Resp. Gestion Immobilière	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
88	Resp. Relation Clients	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
89	Local Syndical	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
90	Resp. Adjoint	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
91	DPO PCA PSSI	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
92	Resp. Bureau d'Étude Informatique	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
93	Maintenance Informatique	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
94	Prévention	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
95	Réserve	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
96	Partenariat accès aux soins et à la santé	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
97	Patio	3	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
98	Resp. PHARE CSS	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
99	Précarité	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
100	Comité Social Economique	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
101	Sanitaires F	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de	Résultat d'analyse	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
			poussière fibreuse		
102	Sanitaires H	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
103	Phare Eptica	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
104	Superviseur Phare Eptica	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
105	Resp. TRAM FSP Télétransmissions Réclamations PS	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
106	Salle de Restauration	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
107	Frais de Santé	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
108	Resp. Unité Pôle Frais de Santé	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
109	MAD Flux Tiers	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
110	Sanitaires mixtes	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Oui
111	Circulation	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
112	Réserve	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
113	Local RIA	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
114	Patio	4	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
115	Service Médical	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
116	Sanitaires mixtes	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
117	Sanitaires	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
118	Service Médical Administratif	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
119	Bureau Service Médical Administratif	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
120	Accueil médical	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
121	Accueil sur rendez-vous services	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
122	Libre Service	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
123	Accueil	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
124	Attente	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
125	Médecin Conseil 1	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
126	Médecin Conseil 2	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
127	Médecin Conseil 3	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
128	Médecin Conseil 4	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
129	Médecin Conseil 5	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
130	Médecin Conseil 6	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
131	Accueil 1	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
132	Accueil 2	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
133	Accueil 3	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
134	Accueil 4	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non

Amiante

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
135	Cellule CNASSSM	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
136	Resp. Numérisation Archives Courrier Imprimerie	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
137	Cellule DITADEME	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
138	Salle de Réunion	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
139	Sanitaires H/F	0	Conduit de fluide n°1 - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
			Conduit de fluide n°2 - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
140	Archives Synergie	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
141	Synergie	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
142	Service Courrier	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
143	Resp Courrier	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
144	Accueil Professionnel Santé	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
145	Entrée Sortie	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non
146	Patio	0	Conduit de fluide - Toutes zones - Dépôt de poussière fibreuse	Résultat d'analyse	Non

6.3 COMMENTAIRE SUR LA MISSION

Néant

6.4 RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION



PRELEVEMENT : P001

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	MAGUET David
Numéro de dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	05/03/2026
Pièce ou local	4 - Sanitaires mixtes	Référence du sondage	S001
Matériau	Dépôt de poussière fibreuse	Localisation	Conduit de fluide - Toutes zones
Résultat amiante	 PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dépôt de poussière fibreuse		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-015646-01	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P002

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	MAGUET David
Numéro de dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	05/03/2026
Pièce ou local	4 - Sanitaires H	Référence du sondage	S002
Matériau	Dépôt de poussière fibreuse	Localisation	Conduit de fluide - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dépôt de poussière fibreuse		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-015646-01	Matériau de type poussières (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P003

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	MAGUET David
Numéro de dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	05/03/2026
Pièce ou local	3 - Sanitaires H	Référence du sondage	S003
Matériau	Dépôt de poussière fibreuse	Localisation	Conduit de fluide - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dépôt de poussière fibreuse		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-015646-01	Matériau semi-dur (noir) ; matériau (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P004

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	MAGUET David
Numéro de dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	05/03/2026
Pièce ou local	3 - Sanitaires mixtes	Référence du sondage	S004
Matériau	Dépôt de poussière fibreuse	Localisation	Conduit de fluide - Toutes zones

Résultat amiante



PRÉSENCE D'AMIANTE Fibres d'amiante de type chrysotile

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dépôt de poussière fibreuse		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-015646-01	Matériau semi-dur (noir) ; matériau (fibreuse) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P005

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	MAGUET David
Numéro de dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	05/03/2026
Pièce ou local	2 - Sanitaires H	Référence du sondage	S005
Matériau	Dépôt de poussière fibreuse	Localisation	Conduit de fluide - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dépôt de poussière fibreuse		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-015646-01	Matériau de type poussières (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P006

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	MAGUET David
Numéro de dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	05/03/2026
Pièce ou local	2 - Sanitaires	Référence du sondage	S006
Matériau	Dépôt de poussière fibreuse	Localisation	Conduit de fluide - Toutes zones

Résultat amiante

ABSENCE D'AMIANTE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dépôt de poussière fibreuse		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-015646-01	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P007

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	MAGUET David
Numéro de dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	05/03/2026
Pièce ou local	1 - Sanitaires	Référence du sondage	S007
Matériau	Dépôt de poussière fibreuse	Localisation	Conduit de fluide - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dépôt de poussière fibreuse		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-015646-01	Matériau de type poussières (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P008

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	MAGUET David
Numéro de dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	05/03/2026
Pièce ou local	1 - Sanitaires F	Référence du sondage	S008
Matériau	Dépôt de poussière fibreuse	Localisation	Conduit de fluide - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dépôt de poussière fibreuse		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-015646-01	Matériau de type poussières (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P009

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	MAGUET David
Numéro de dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	05/03/2026
Pièce ou local	0 - Sanitaires H/F	Référence du sondage	S009
Matériau	Dépôt de poussière fibreuse	Localisation	Conduit de fluide n°1 - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dépôt de poussière fibreuse		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-015646-01	Matériau de type poussières (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P010

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	MAGUET David
Numéro de dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	05/03/2026
Pièce ou local	0 - Sanitaires mixtes	Référence du sondage	S010
Matériau	Dépôt de poussière fibreuse	Localisation	Conduit de fluide - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dépôt de poussière fibreuse		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-015646-01	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

Amiante



PRELEVEMENT : P011

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	MAGUET David
Numéro de dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	05/03/2026
Pièce ou local	0 - Sanitaires	Référence du sondage	S011
Matériau	Dépôt de poussière fibreuse	Localisation	Conduit de fluide - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dépôt de poussière fibreuse		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-015646-01	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P012

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	MAGUET David
Numéro de dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	05/03/2026
Pièce ou local	-1 - Archives	Référence du sondage	S012
Matériau	Dépôt de poussière fibreuse	Localisation	Conduit de fluide - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dépôt de poussière fibreuse		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-015646-01	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P013

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	MAGUET David
Numéro de dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	05/03/2026
Pièce ou local	0 - Salle de Réunion	Référence du sondage	S013
Matériau	Dépôt de poussière fibreuse	Localisation	Conduit de fluide - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dépôt de poussière fibreuse		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-015646-01	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)



PRELEVEMENT : P014

Nom du client	CPAM DE L'ARTOIS	Nom de l'opérateur	MAGUET David
Numéro de dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS	Date de prélèvement	05/03/2026
Pièce ou local	1 - Service Social	Référence du sondage	S014
Matériau	Dépôt de poussière fibreuse	Localisation	Conduit de fluide - Toutes zones
Résultat amiante	ABSENCE D'AMIANTE		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	Taille
Dépôt de poussière fibreuse		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Epaisseur (cm)	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-26-RI-015646-01	Matériau de type poussières sur papier adhésif (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées	Microscopie Electronique à Transmission (MET)

ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS


Croquis N°1

Client	CPAM DE L'ARTOIS		
N° dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS		
N° planche	1/7	Version	0
Date	16/03/2026		
Intervenant	MAGUET David		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics		
Type	Croquis		
Adresse	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX		
Bâtiment			
Etage	1er SS	N° lot	
Commentaire			

Légende

☐ Indicateur prélèvements (P) / sondages (S)

Plan de masse

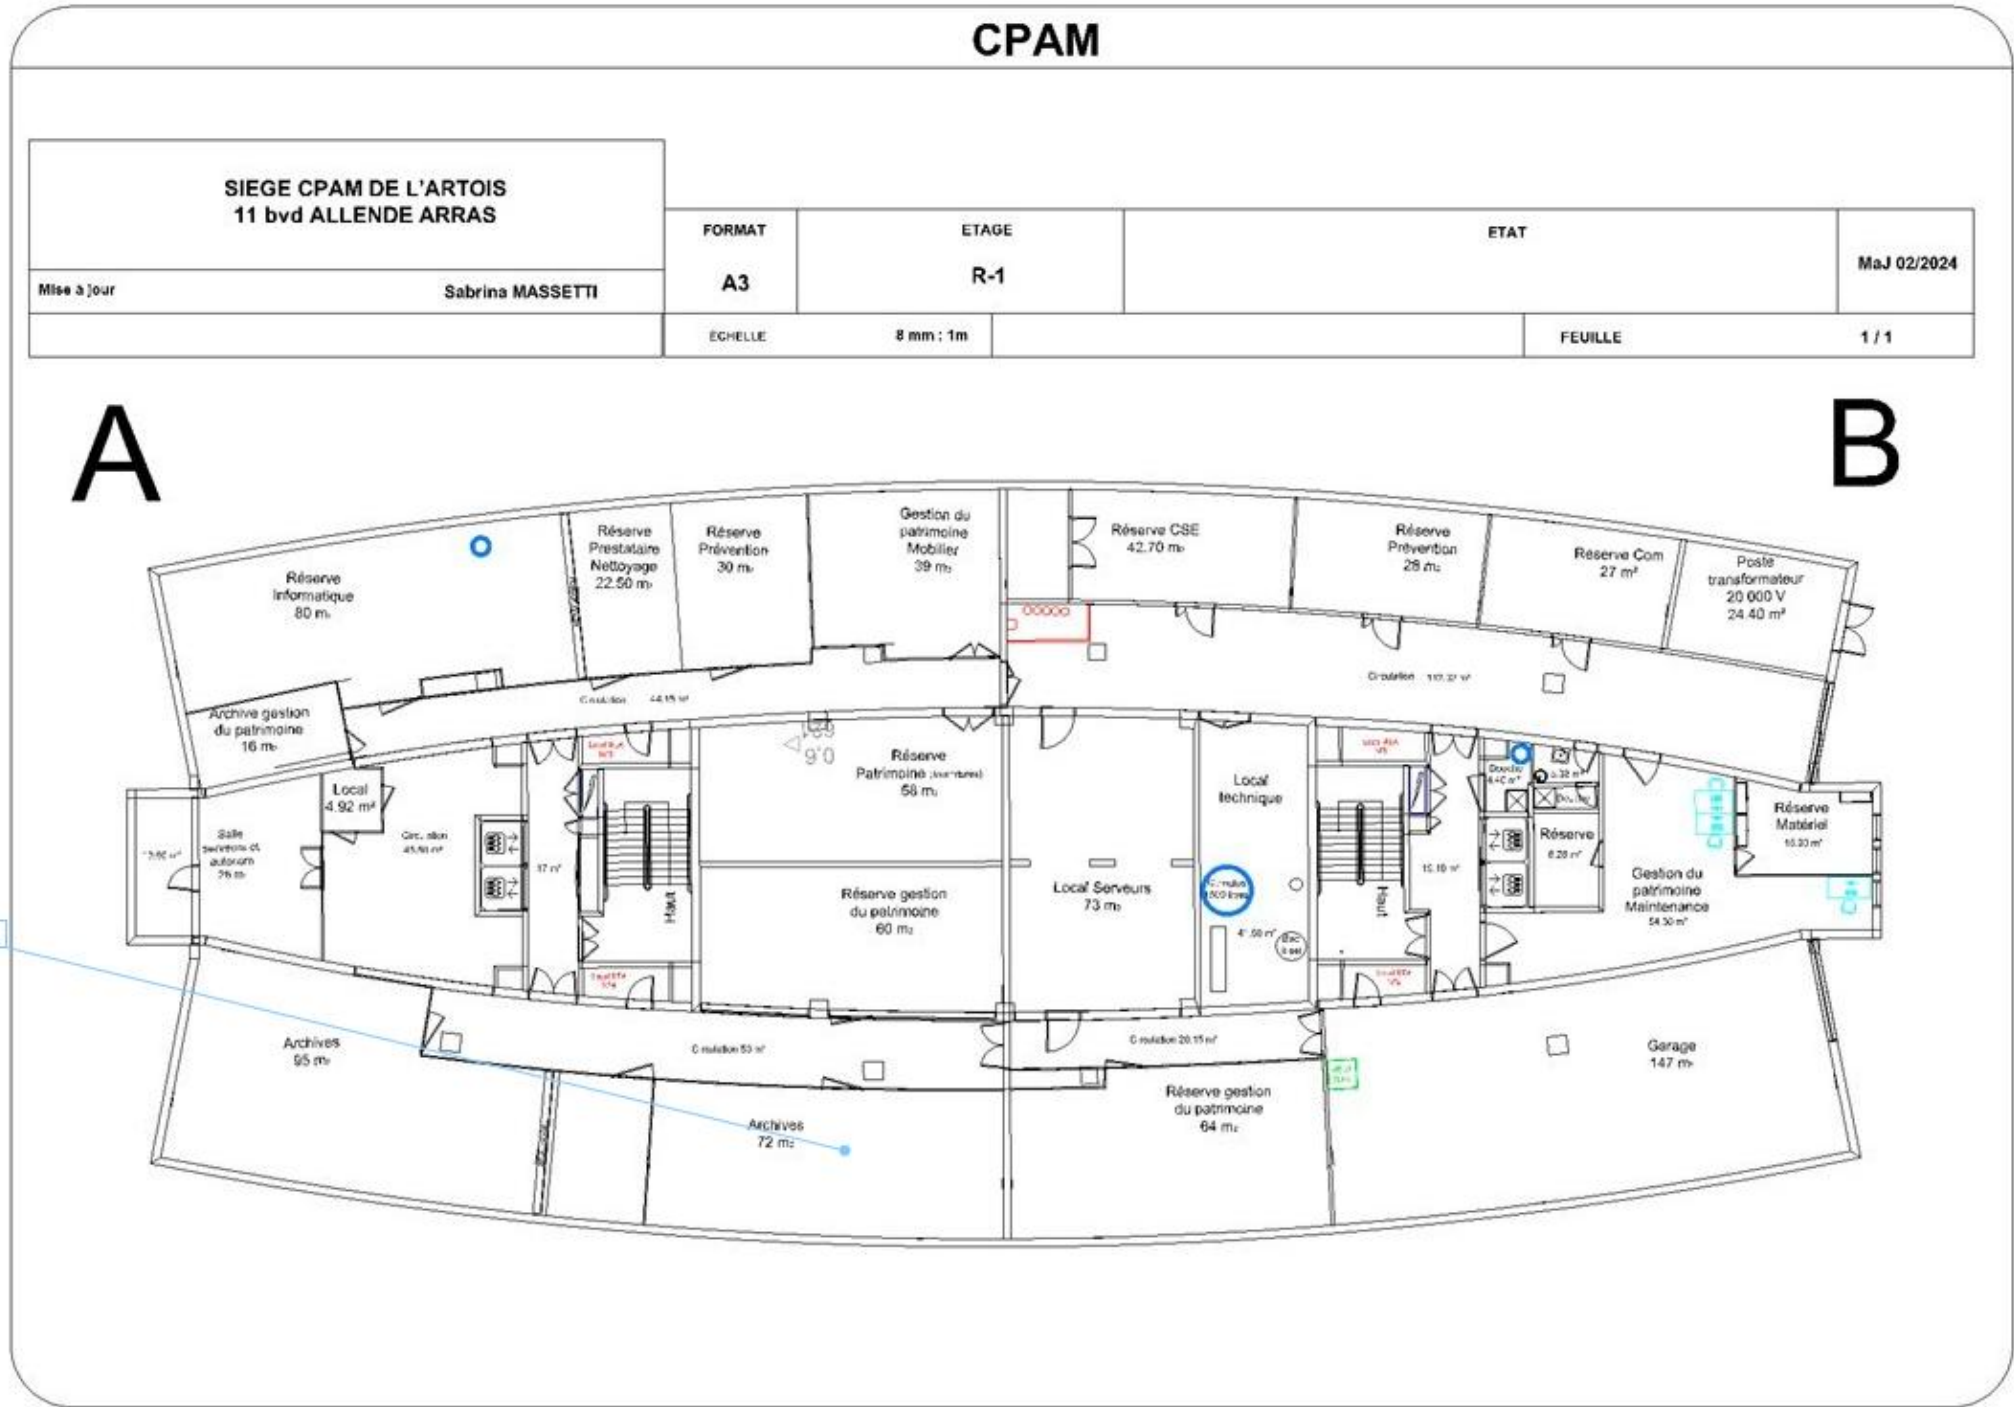


Croquis N°2

Client	CPAM DE L'ARTOIS		
N° dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS		
N° planche	2/7	Version	0
Date	16/03/2026		
Intervenant	MAGUET David		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics		
Type	Croquis		
Adresse	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX		
Bâtiment			
Etage	RDC	N° lot	
Commentaire			

Légende

Indicateur prélèvements (P) / sondages (S)

Plan de masse

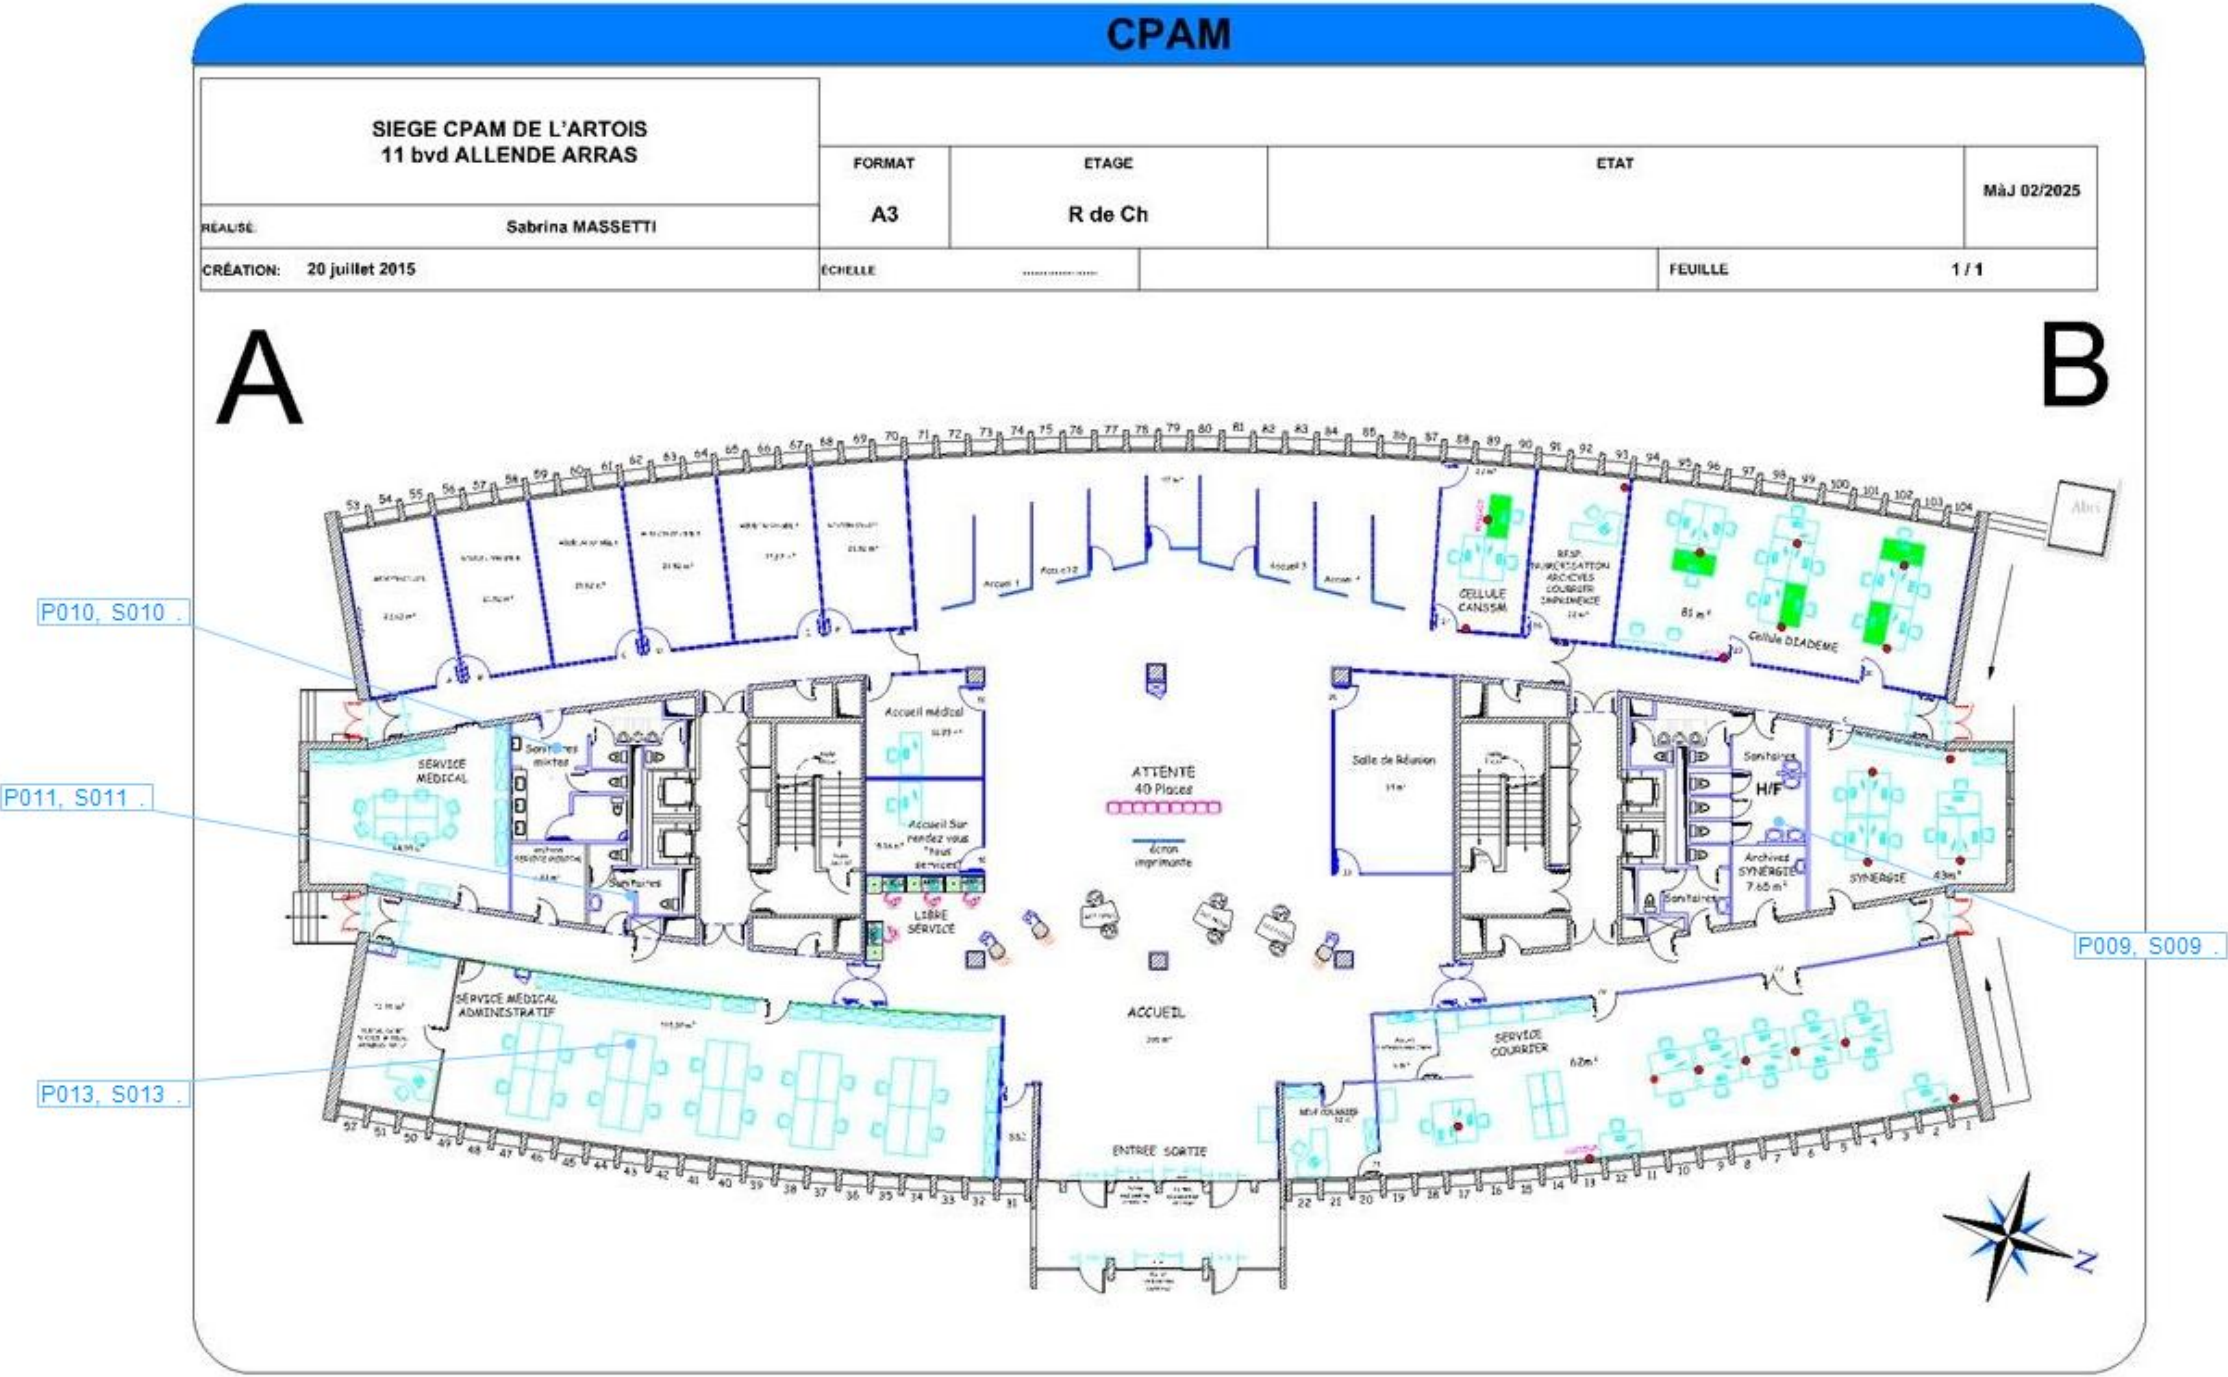


Croquis N°1

Client	CPAM DE L'ARTOIS		
N° dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS		
N° planche	3/7	Version	0
Date	16/03/2026		
Intervenant	MAGUET David		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics		
Type	Croquis		
Adresse	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX		
Bâtiment			
Etage	1er	N° lot	
Commentaire			

Légende

☐ Indicateur prélèvements (P) / sondages (S)

Plan de masse

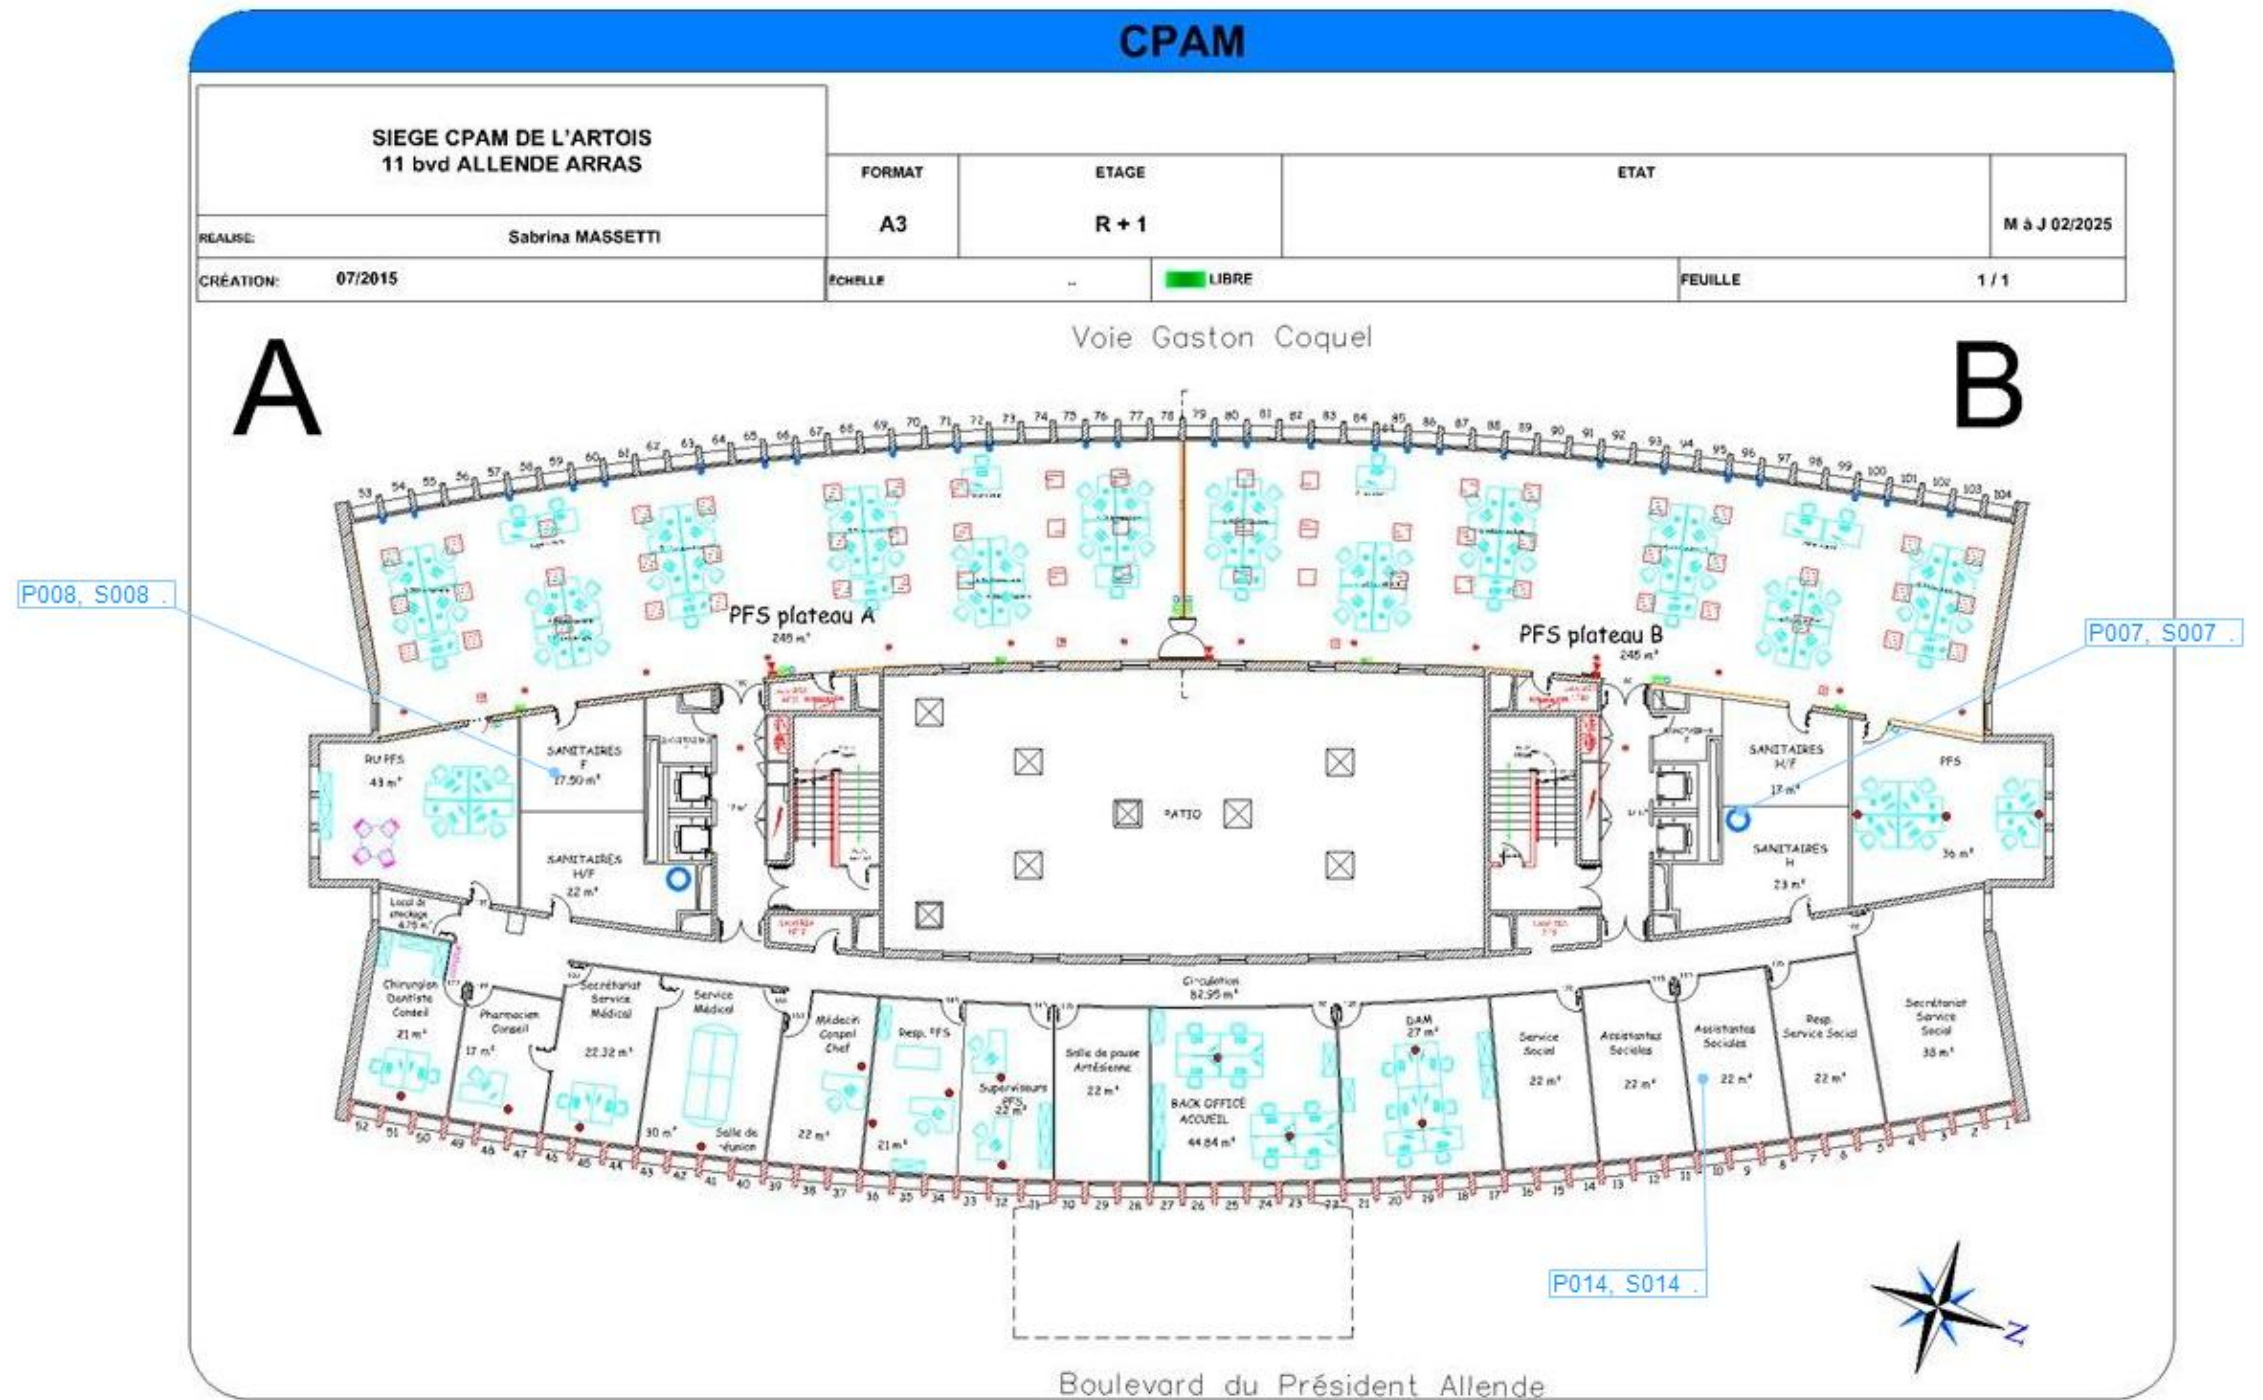


Croquis N°4

Client	CPAM DE L'ARTOIS		
N° dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS		
N° planche	4/7	Version	0
Date	16/03/2026		
Intervenant	MAGUET David		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics		
Type	Croquis		
Adresse	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX		
Bâtiment			
Etage	2ème	N° lot	
Commentaire			

Légende

☐ Indicateur prélèvements (P) / sondages (S)

Plan de masse

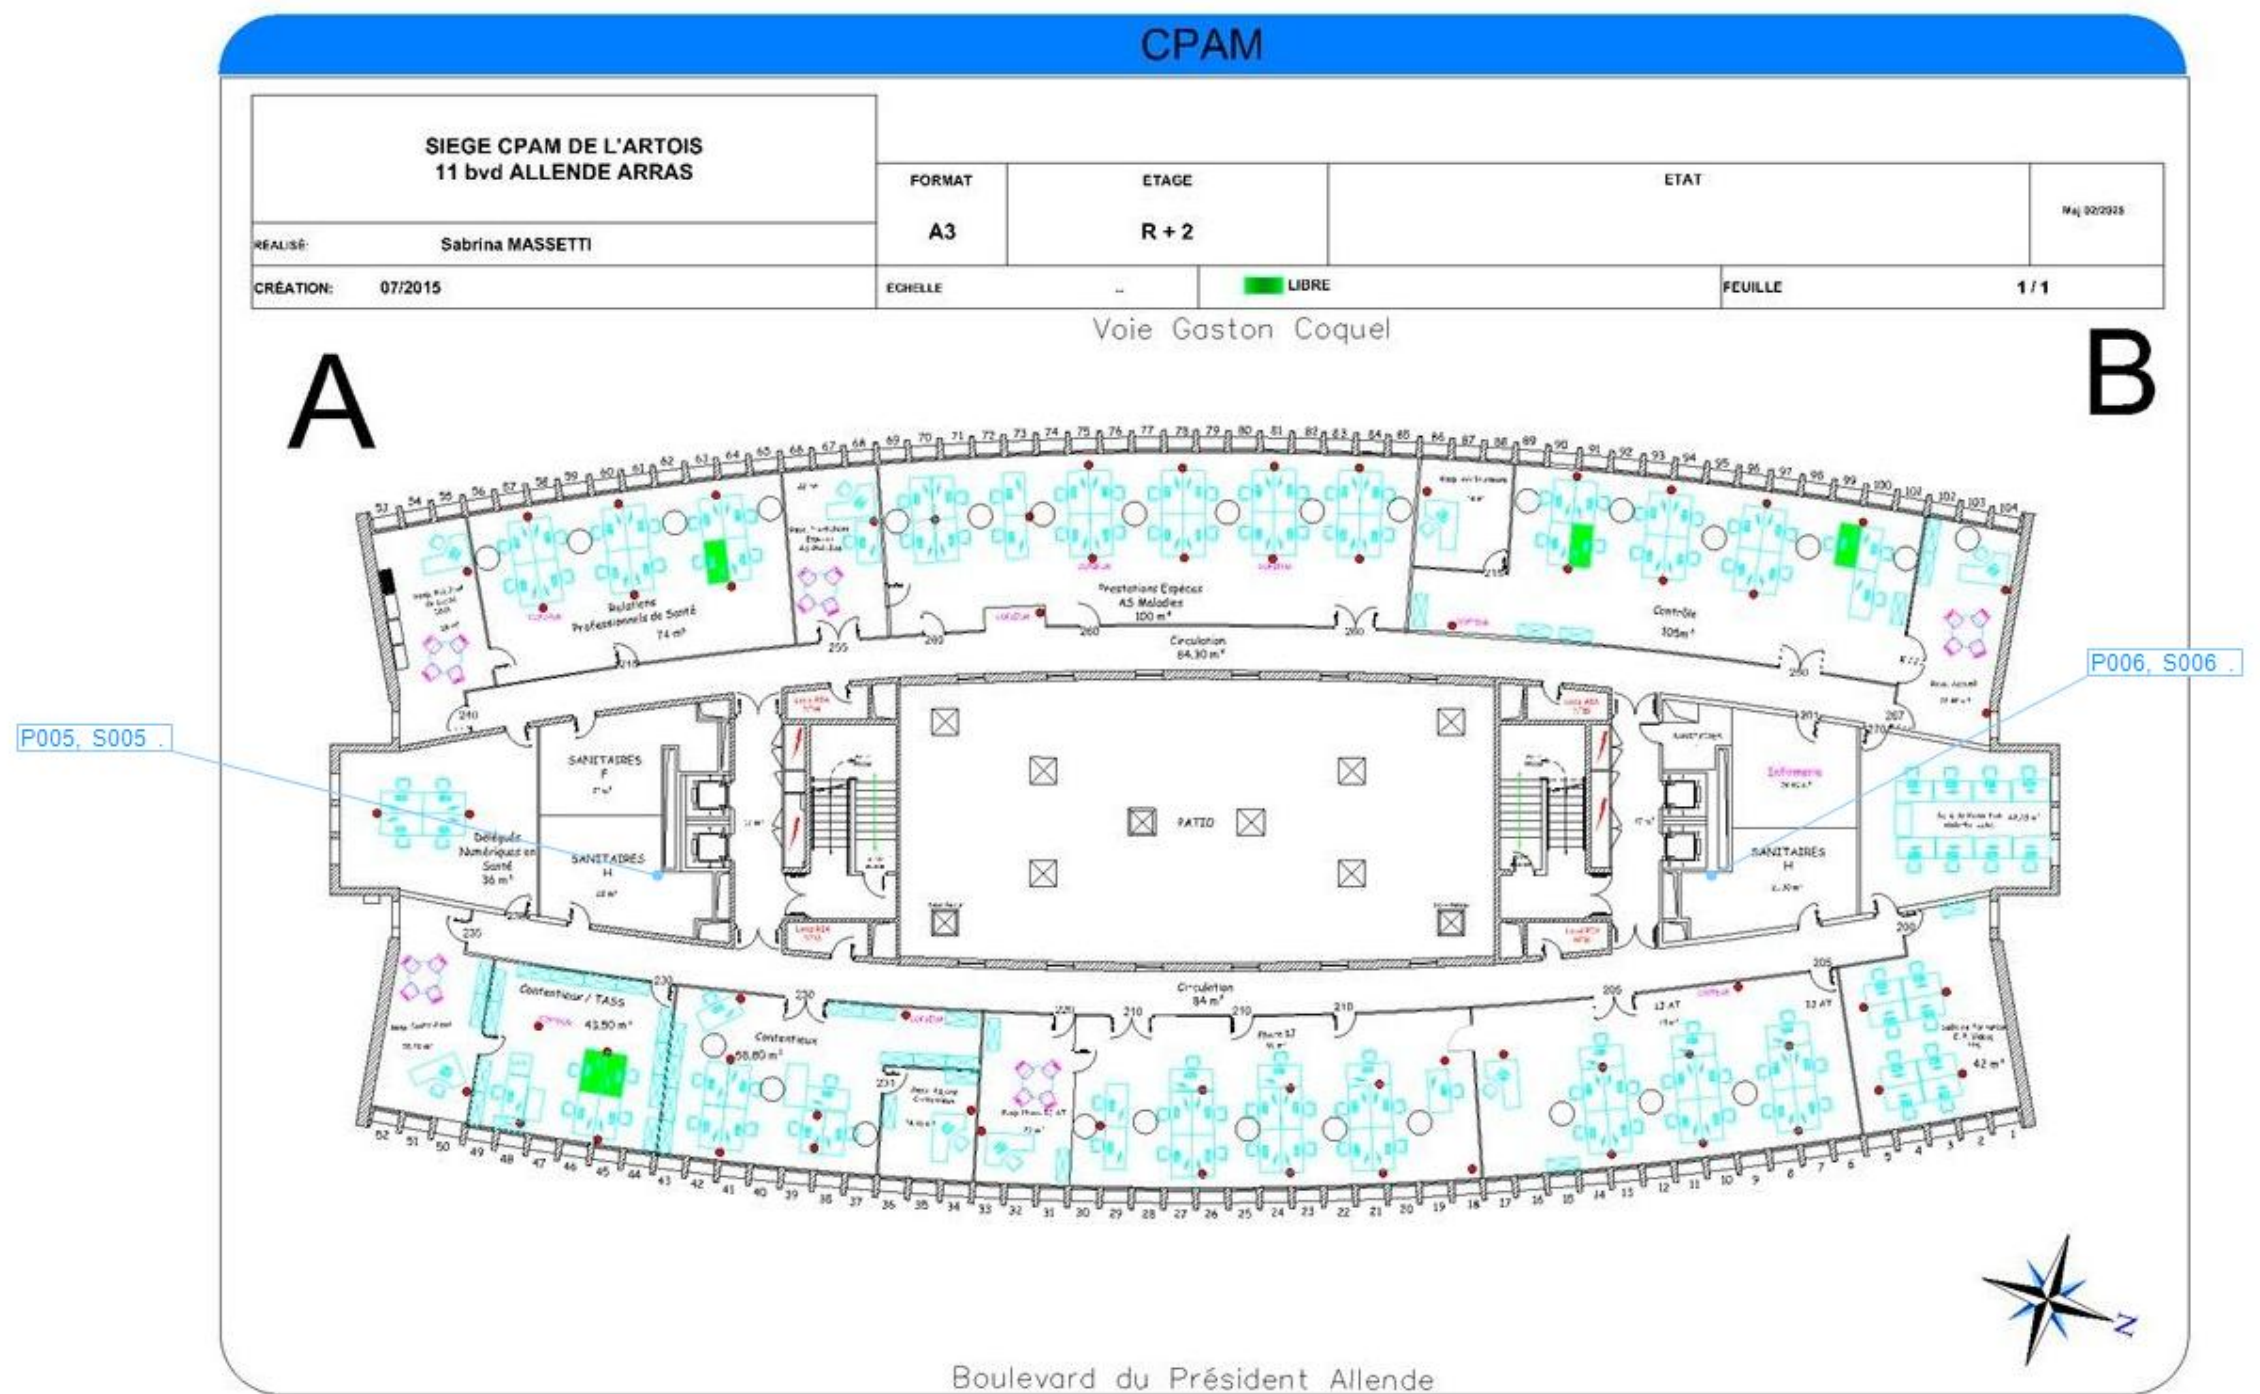

Croquis N°5


Client	CPAM DE L'ARTOIS		
N° dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS		
N° planche	5/7	Version	0
Date	16/03/2026		
Intervenant	MAGUET David		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics		
Type	Croquis		
Adresse	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX		
Bâtiment			
Etage	3ème	N° lot	
Commentaire			

Légende

☐ Indicateur prélèvements (P) / sondages (S)

 Présence de produits et/ou matériaux contenant de l'amiante

Plan de masse

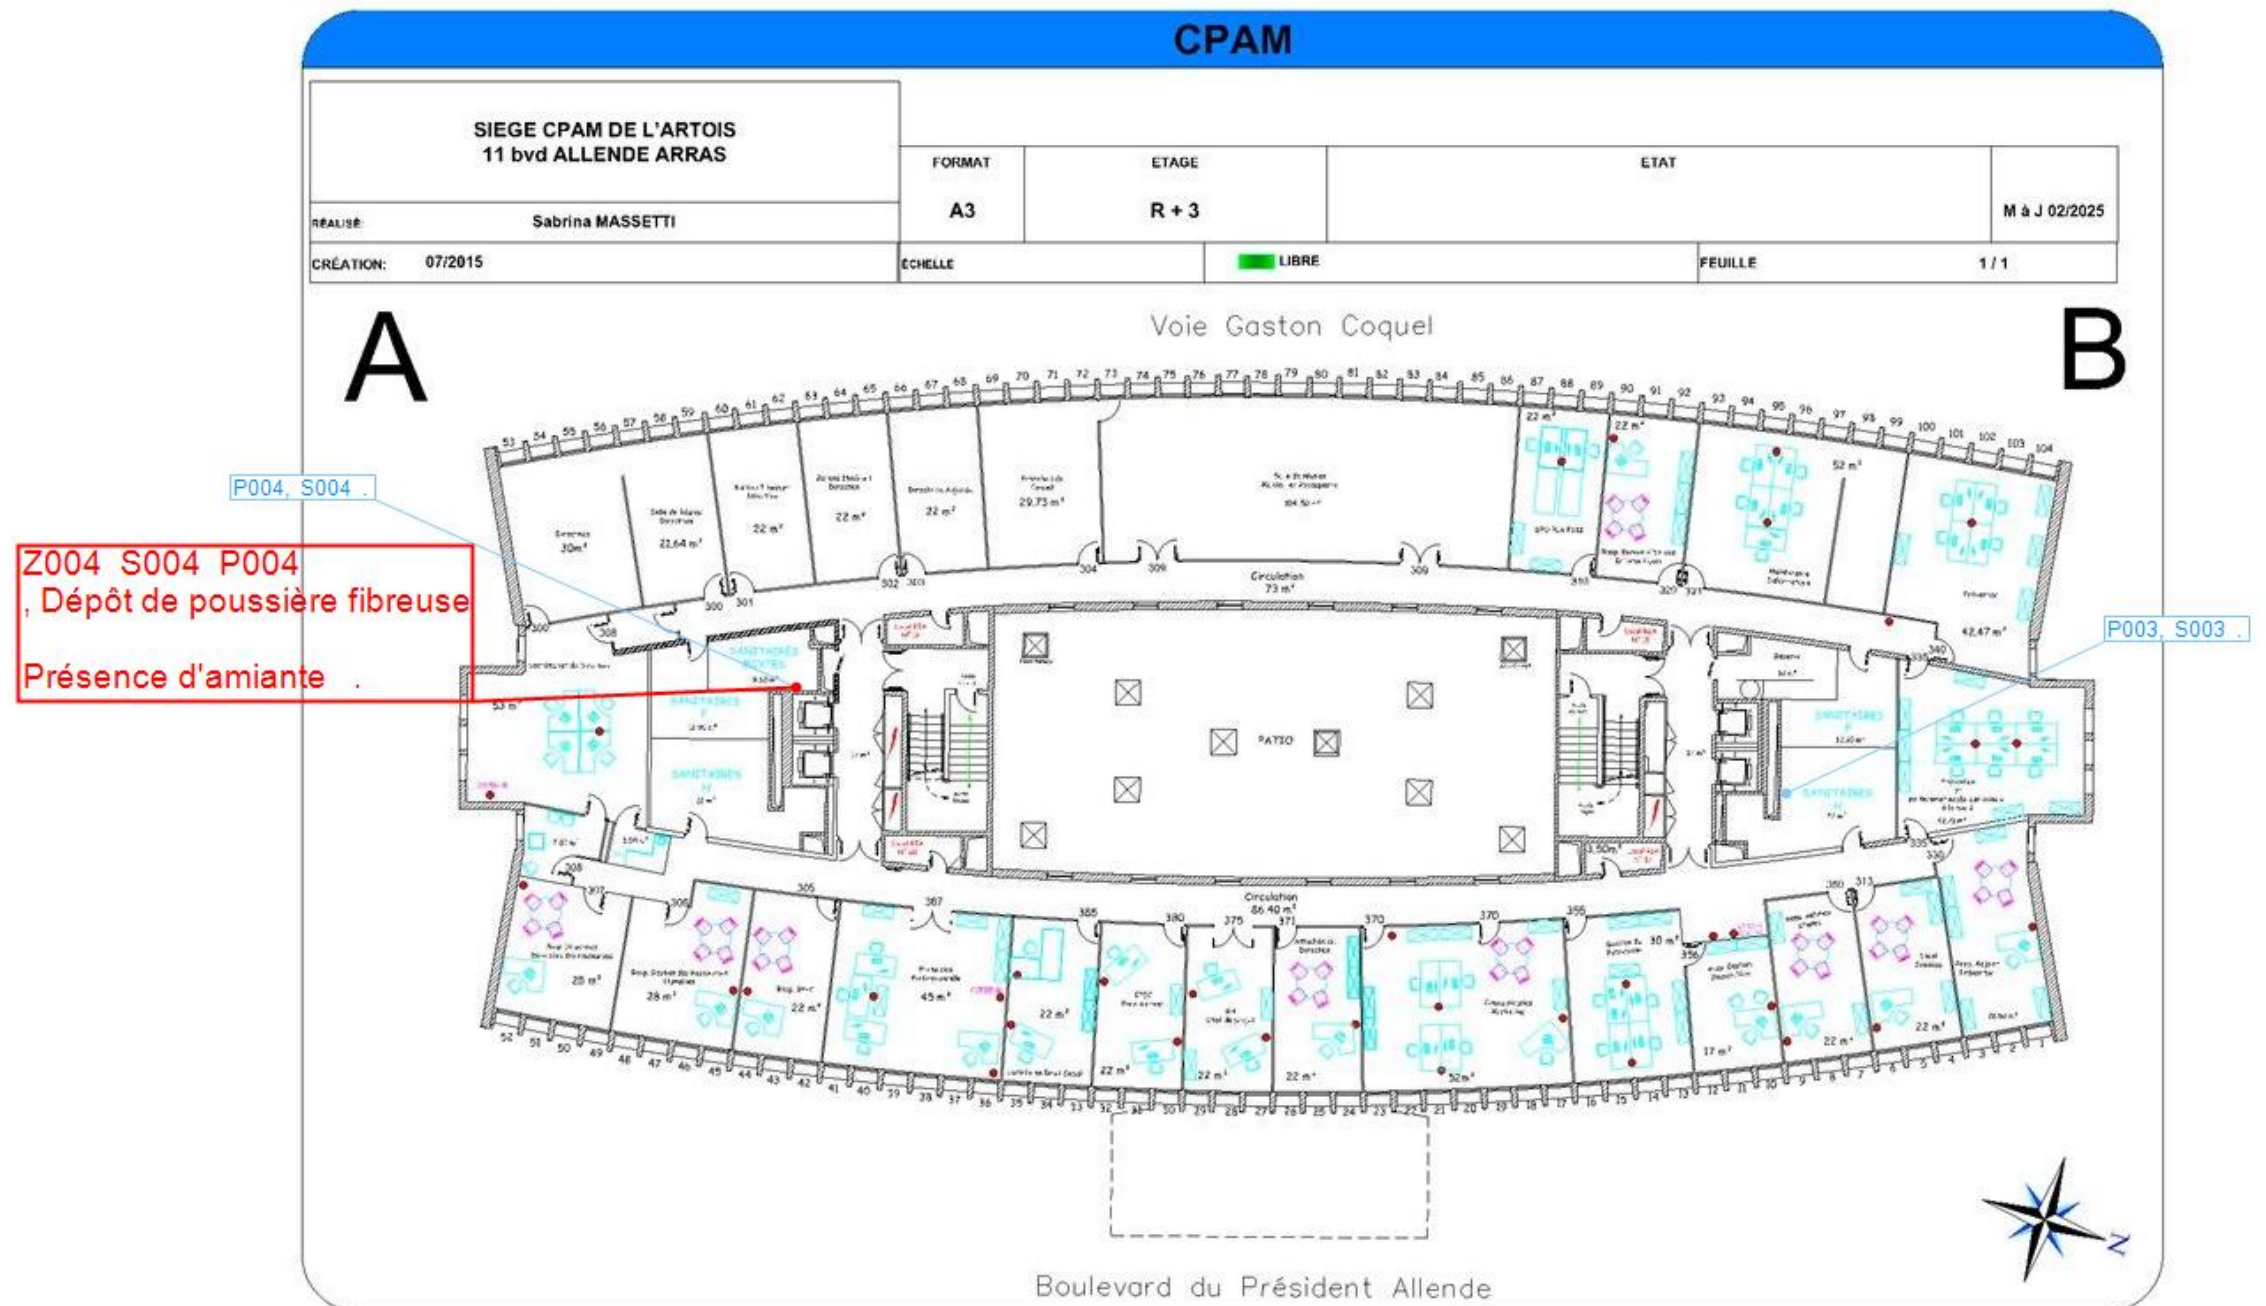

Croquis N°6


Client	CPAM DE L'ARTOIS		
N° dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS		
N° planche	6/7	Version	0
Date	16/03/2026		
Intervenant	MAGUET David		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics		
Type	Croquis		
Adresse	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX		
Bâtiment			
Etage	4ème	N° lot	
Commentaire			

Légende

☐ Indicateur prélèvements (P) / sondages (S)

 Présence de produits et/ou matériaux contenant de l'amiante

Plan de masse

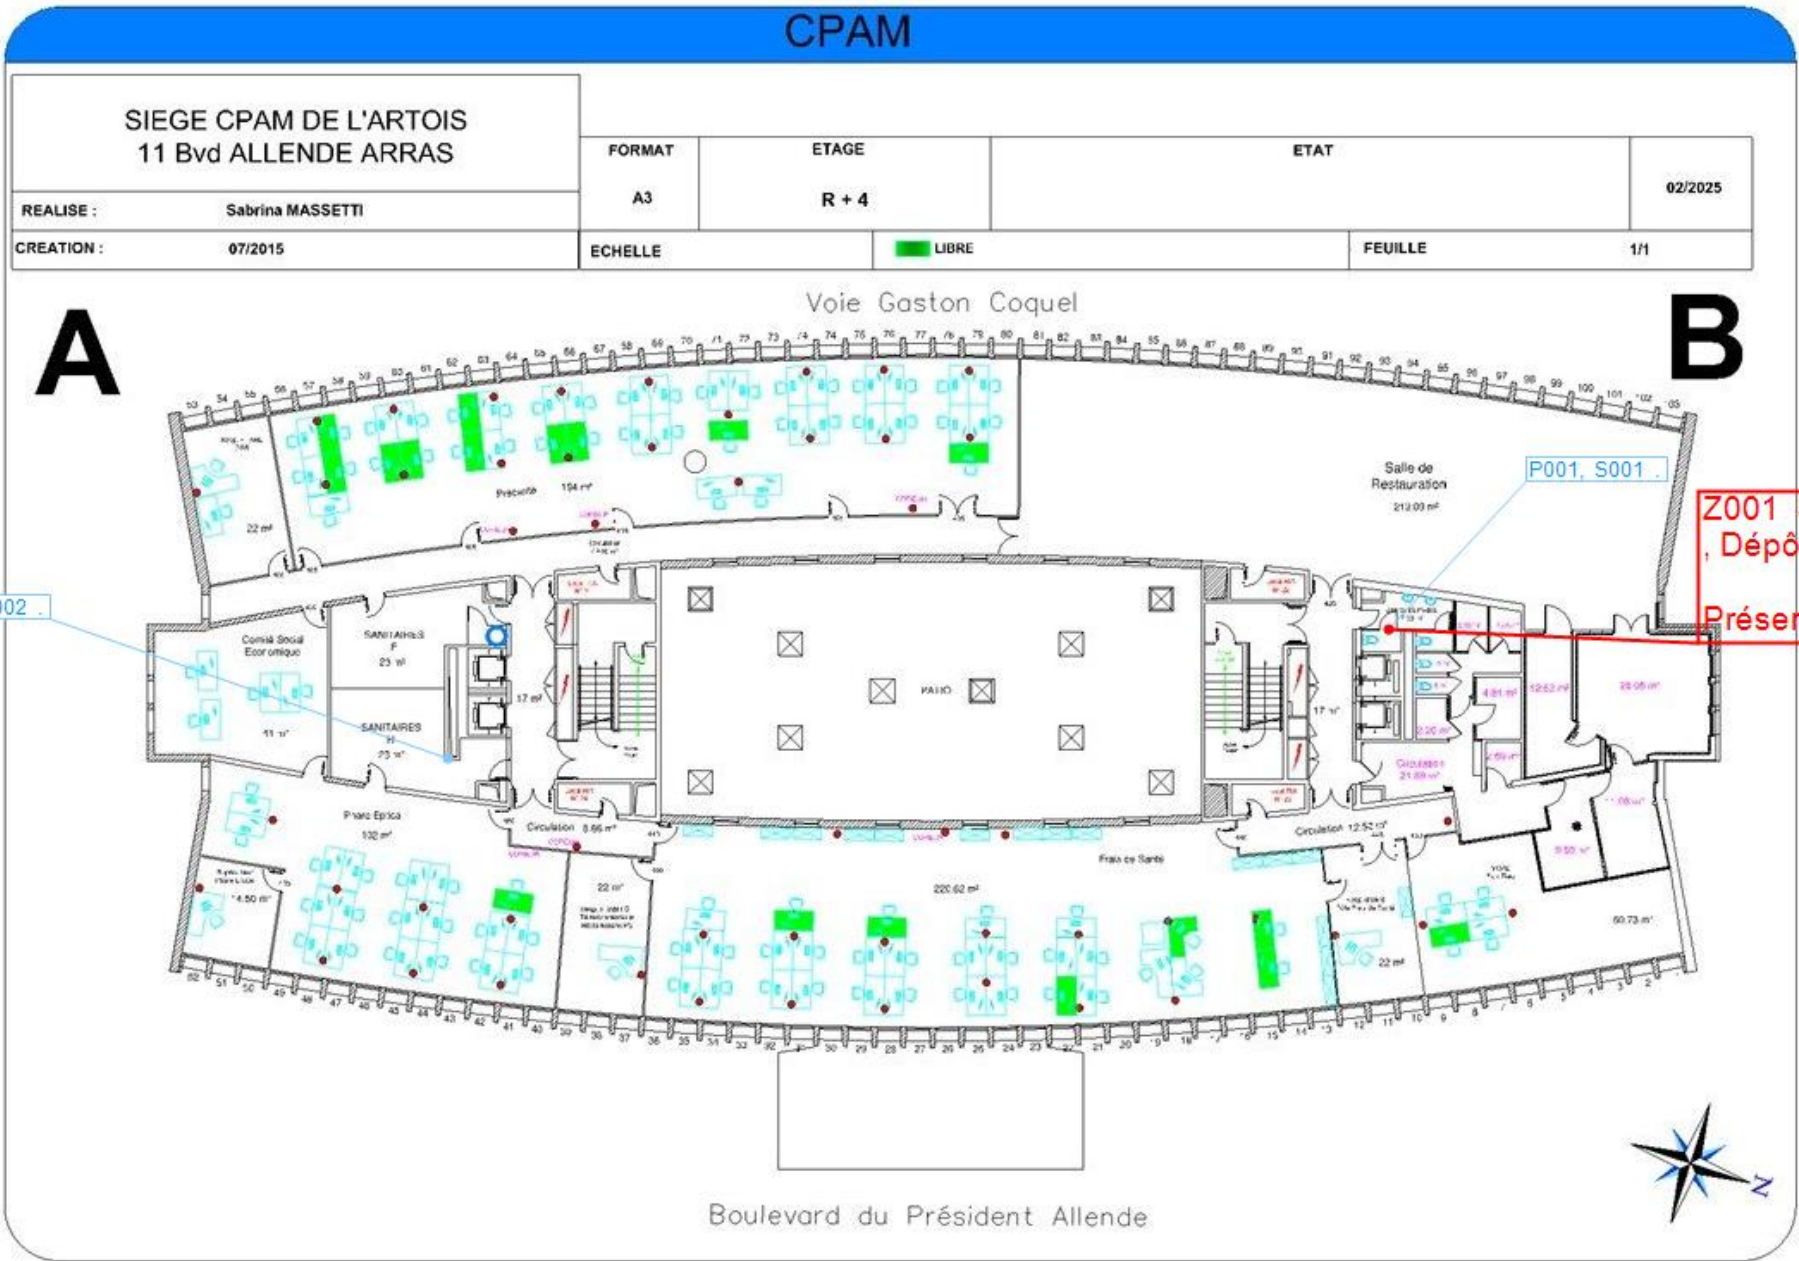


Croquis N°7

Client	CPAM DE L'ARTOIS		
N° dossier	132530 CPAM DE L'ARTOIS		
N° planche	7/7	Version	0
Date	16/03/2026		
Intervenant	MAGUET David		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics		
Type	Croquis		
Adresse	11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX		
Bâtiment			
Etage	5ème	N° lot	
Commentaire			

Légende

Indicateur prélèvements (P) / sondages (S)

Plan de masse

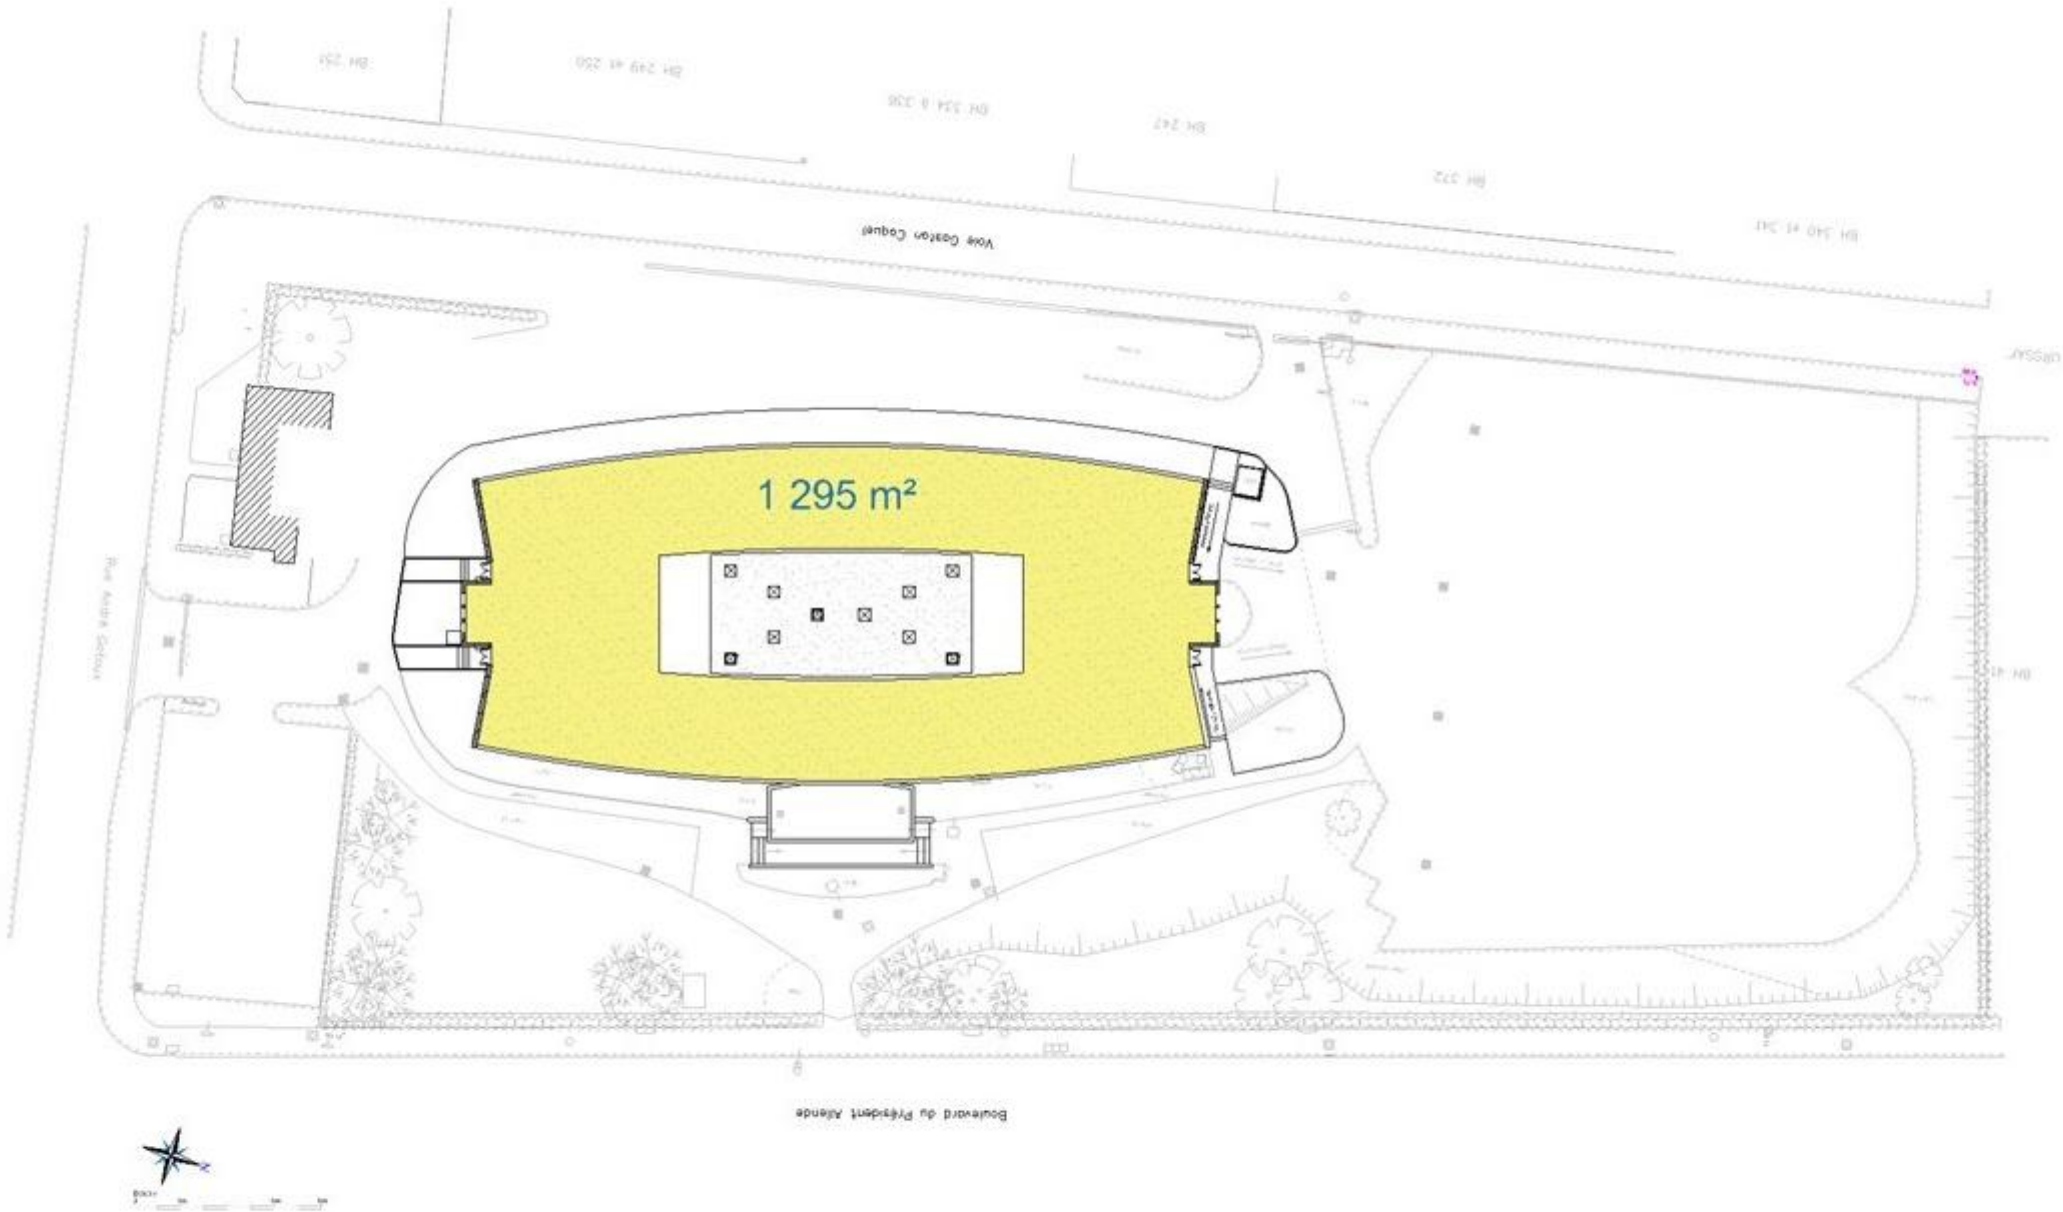



ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE



PV_01820260301774117



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES

David MAGUET

Rue Uriane Sorriaux 23

62300 LENS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-015646-01

Date d'émission de rapport : 16/03/2026 12:08

Référence dossier Client:01820260301774117TMP_20260305144423 A - 11 boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX - CPAM DE L'ARTOIS
Référence dossier N° : 26UV019224
Référence laboratoire N° : 26RI015697

Reçu par MyEasyLab le : 10/03/2026 15:23

Reçu par le laboratoire le : 10/03/2026

Date d'analyse : 13/03/2026

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1) (2)	P001-4 - Sanitaires mixtes - Toutes zones - Conduit de fluide - Dépôt de poussière fibreuse	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
002 (1)	P002-4 - Sanitaires H - Toutes zones - Conduit de fluide - Dépôt de poussière fibreuse	Matériau de type poussières (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1) (3)	P003-3 - Sanitaires H - Toutes zones - Conduit de fluide - Dépôt de poussière fibreuse	Matériau semi-dur (noir) ; matériau (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 (1) (3)	P004-3 - Sanitaires mixtes - Toutes zones - Conduit de fluide - Dépôt de poussière fibreuse	Matériau semi-dur (noir) ; matériau (fibreuse) (gris)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

1/4

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-015646-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (1)	P005-2 - Sanitaires H - Toutes zones - Conduit de fluide - Dépôt de poussière fibreuse	Matériau de type poussières (gris)	MET / C4H5	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1)	P006-2 - Sanitaires - Toutes zones - Conduit de fluide - Dépôt de poussière fibreuse	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	MET / C4H5	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007 (1)	P007-1 - Sanitaires - Toutes zones - Conduit de fluide - Dépôt de poussière fibreuse	Matériau de type poussières (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008 (1)	P008-1 - Sanitaires F - Toutes zones - Conduit de fluide - Dépôt de poussière fibreuse	Matériau de type poussières (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	P009-0 - Sanitaires H/F - Toutes zones - Conduit de fluide n°1 - Dépôt de poussière fibreuse	Matériau de type poussières (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010 (1)	P010-0 - Sanitaires mixtes - Toutes zones - Conduit de fluide - Dépôt de poussière fibreuse	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (1)	P011-0 - Sanitaires - Toutes zones - Conduit de fluide - Dépôt de poussière fibreuse	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

2/4

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-015646-01

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (1)	P012-1 - Archives - Toutes zones - Conduit de fluide - Dépôt de poussière fibreuse	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	MET / C4H5	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1)	P013-0 - Salle de Réunion - Toutes zones - Conduit de fluide - Dépôt de poussière fibreuse	Matériau de type poussières sur lingettes (noir)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (1)	P014-1 - Service Social - Toutes zones - Conduit de fluide - Dépôt de poussière fibreuse	Matériau de type poussières sur papier adhésif (noir)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)	
(1)	Les prélèvements surfaciques (notamment par lingettes) ne sont pas prévus dans la liste des essais accrédités mentionnés dans l'arrêté du 1er octobre 2019. Les essais d'identification de fibres d'amiante sur des prélèvements surfaciques peuvent servir de comparatif mais ils ne peuvent se substituer aux essais réglementaires définis en matière de contrôles d'empoussièrement d'amiante.
(2)	La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection.
(3)	Description client non cohérente avec l'échantillon physiquement présent.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

3/4

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-015646-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLF et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLF, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 6 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORF n°0152 du 2 juillet 2025 texte n° 8). - 7 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :



Weronika Grzesiak
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

4/4

ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI6045 Version 007

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MAGUET David

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 26/04/2021 - Date d'expiration : 25/04/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 26/04/2021 - Date d'expiration : 25/04/2028
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 24/09/2024 - Date d'expiration : 23/09/2031
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 18/07/2024 - Date d'expiration : 17/07/2031
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (3) Date d'effet : 24/09/2024 - Date d'expiration : 23/09/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 18/07/2024 - Date d'expiration : 17/07/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 24/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2022 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
(3) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.



I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE



Adhésion
N° A057

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583929904

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

EX'IM ARTOIS EXPERTISES IMMOBILIERES
23 RUE URIAN SORRIAUX
62300 LENS

A adhéré par l'intermédiaire de **LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17**, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° **10583929904A057**.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, **sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.**


Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

500 000 € PAR SINISTRE ET 1 000 000 € PAR ANNEE D'ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2026 AU 31/12/2026 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 9 décembre 2025
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :


LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 75017 PARIS
RCS Paris 308 123 000 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1 / 3



Police N° 10583929904A057

Activités assurées

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification :

- **AMIANTE** sans mention
- **AMIANTE** avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- **DPE** avec ou sans mention
- **ELECTRICITE**
- **GAZ**
- **PLOMB** (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- **TERMITE**

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- L'état des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
- Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- Recherche Plomb avant démolition (C avec ou sans mention)
- Diagnostic Plomb dans l'eau
- Recherche des métaux lourds
- Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- Assainissement Collectif et non Collectif
- Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- Diagnostic Mérieux (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
- Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n° 2022-663 du 25 avril 2022 »
- Diagnostic Eco Prêt
- Diagnostic Pollution des sols
- Diagnostic Radon
- Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement" (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.
- Missions d'Infiltrométrie, Thermographie

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2 / 3



Police N° 10583929904A057

- Missions de contrôle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l'air des lieux de travail, hors amiante, consistant à calculer la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP). Cette activité s'inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de l'accréditation COFFRAC.
Cette activité est couverte sous réserve de l'absence de renonciation à recours contre le laboratoire d'analyse.
- Mission de coordination SPS
- RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- Audit énergétique pour les maisons individuelles ou les bâtiments monopropriété (C)
- Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques
- Audit sécurité piscine
- Evaluation immobilière
- Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- Diagnostic légionnelle
- Diagnostic incendie
- Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
- Diagnostic de décence du logement
- Expertise judiciaire et para judiciaire
- Expertise extra juridictionnelle
- Contrôle des combles
- Etat des lieux des biens neuf
- Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, **à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones**
- Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- Repérage Amiante dans le Ferroviaire
- Repérage Amiante dans le Maritime
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB
- Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- Bilan aérodynamique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aérodynamique de chantier)
- Le carnet d'information du logement (CIL)
- Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)
- Diagnostic Structure, **F BAC+S** dans le domaine Technique du Bâtiment ou **VAE équivalente** (**Minimum de garanties légales requis : 1 000 000 € par sinistre et 1 500 000 € par année d'assurance**)

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3 / 3
