

BUREAU VERITAS SA

PAPEETE

Immeuble Petropol - 2ème étage

Zone Papeava - Fare Ute

Boîte Postale 58

98713 Papeete Polynésie française

Téléphone : +689 40545747

Mail : fabien.guillermard@bureauveritas.com

A l'attention de M. MARI

HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN PO

GENDARMERIE DE HUAHINE

FARE

98731 FARE-HUAHINE

Rapport de vérification électricité visite périodique

Gendarmerie de Huahine

**Intervention du 23/09/2024** (0.5 jour)**Coordonnées du site :****Nom du site :** HAUT COMMISSARIAT DE LA
REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE**Lieu d'intervention :** GENDARMERIE HUAHINE

GENDARMERIE DE HUAHINE

FARE

98731 FARE-HUAHINE

Référence du rapport : 317161860.1.P**Rédigé le :** 27/09/2024**Par :** Fabien GUILLERMARD

Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : Gendarmerie

Préambule.....	3
Rappel des obligations de l'employeur.....	3
Actions à mener.....	3
Liste récapitulative des observations issues de la vérification.....	4
GENDARMERIE (Faré / Huahine).....	4
Informations générales.....	14
Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client.....	14
Personne chargée de la surveillance de l'installation.....	14
Installations vérifiées.....	14
Eléments de l'installation non vérifiables.....	14
Modifications apportées aux installations.....	15
Vérification relative à la protection des travailleurs.....	16
Information documentaire.....	16
Textes de référence.....	16
Modalité de vérification.....	16
Registre de sécurité.....	17
Condition de mise hors tension.....	17
Résultats des mesures et essais.....	18
Conditions de mesure.....	18
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure.....	18
Appareils de mesure utilisés.....	19
Prises de terre.....	19
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT.....	19
Synoptique de l'installation électrique Basse Tension.....	21
VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE.....	22
.....	23
OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5.....	23
Informations générales.....	25
Textes de référence.....	25
Modalité de vérification.....	25
Registre de sécurité.....	25
Classement de l'établissement.....	25
Effectif maximum du public admissible.....	25
Description sommaire de l'établissement.....	25
Historique des principales modifications.....	25
Installations de sécurité.....	26
ECLAIRAGE DE SECURITE.....	26
GENDARMERIE (Faré / Huahine).....	26
Circuits de sécurité autres que l'éclairage.....	26
Avis sur articles (ERP5).....	27

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et mentionnées dans le rapport, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents,...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport. Notamment l'exécution de certaines vérifications sur les installations du domaine de la haute tension nécessite la mise hors tension de l'installation sous la responsabilité de l'employeur.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification. La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des coupures réalisées	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés			
✓ 100 % des locaux vérifiés			

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Périmètre vérifié dans le rapport | HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE

GENDARMERIE (Faré / Huahine)

Installations Basse et Très Basse Tension

Bâtiment administratif

↳ Circulation principale bureaux

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	1	Compléter l'éclairage de sécurité d'évacuation.
Code Obs. : FG/230924/082115/0		Date de 1 ^{er} signalement : 23/09/2024 Art. Réf. : CDT R.4215-17 Arrêté A.14/12/2011 art 5
Locaux et recepteurs electriques	2	Reprendre le type de pictogramme sur les appareils d'éclairage de sécurité.
Code Obs. : FG/230924/081951/0		Date de 1 ^{er} signalement : 23/09/2024 Art. Réf. : CDT R.4215-17 Arrêté A.14/12/2011 art 5
Locaux et recepteurs electriques	3	Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité.
Code Obs. : FG/230924/083513/0		Date de 1 ^{er} signalement : 23/09/2024 Art. Réf. : CDT R.4226-13 Arrêté A.14/12/2011 art 11



Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS)

Prises de terre	4	Installer ou localiser la barrette de mesure sur le conducteur de terre.
Code Obs. : FG/270924/172605/0		Date de 1 ^{er} signalement : 23/09/2024 Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.543

Bâtiment administratif

↳ Circulation principale bureaux

↳ Bureau copieur

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	5	Refermer la goulotte
Code Obs. : FG/230924/082524/0		Date de 1 ^{er} signalement : 23/09/2024 Art. Réf. : CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Locaux et recepteurs electriques **6** **Refixer plusieurs prises de courant.**

Code Obs. :

FG/230924/082428/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530



Locaux et recepteurs electriques **7** **Supprimer les mises en série de blocs multiples**

Code Obs. :

FG/230924/082500/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559



TGBT : Général normal

Dispositifs bt **8** **Remplacer l'interrupteur différentiel par un modèle de courant nominal 63 ampères**

Code Obs. :


FG/230924/091619/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.524-535



TGBT : Général normal/Secours

Dispositifs bt **9** **Remplacer l'interrupteur différentiel par un modèle de courant nominal 63 ampères**

Code Obs. :

FG/230924/092341/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.524-535



TGBT : non repéré

Dispositifs bt **10** **Remplacer l'interrupteur différentiel par un disjoncteur différentiel type "C16" 30mA**

Code Obs. :

FG/230924/093630/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.524-535



Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TGBT : Non repéré

Dispositifs bt

- 11 Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.**

Code Obs. :

FG/230924/093817/1

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.612.6



TGBT

Coffrets et armoires
electriques

- 12 Mettre à disposition le schémas électrique du TGBT pour avis complémentaires.
Préciser les caractéristiques des disjoncteurs, section des câbles, tenants et aboutissants....
Câblage du TGBT confus**

Code Obs. :

FG/160322/095441/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



TGBT

Coffrets et armoires
electriques

- 13 Respecter les couleurs conventionnelles des conducteurs (neutre, conducteur de protection....)**

Code Obs. :


FG/230924/094145/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.3



TGBT

Coffrets et armoires
electriques

- 14 Réaliser un resserrage de l'ensemble des connexions du coffret**

Code Obs. :

FG/080724/113527/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559



TGBT

Coffrets et armoires
electriques

- 15 Limiter le nombre de connexions en amont des dispositifs**

Code Obs. :

FG/230924/094306/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559



Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TGBT

- Coffrets et armoires électriques **16** **Proscrire les repiquages en amont et aval des dispositifs avec des conducteurs ayant plus d'une section d'écart**

Code Obs. :


FG/230924/094324/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559



TGBT

- Coffrets et armoires électriques **17** **Prévoir le remplacement du coffret (coffret surchargé)**

Code Obs. :

FG/230924/094434/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.430-533



TGBT

- Coffrets et armoires électriques **18** **Placer des embouts de câblage à l'extrémité de tous les conducteurs souples**

Code Obs. :


FG/230924/094104/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559



TGBT

- Coffrets et armoires électriques **19** **Installer un dispositif de coupure générale en tête du coffret**

Code Obs. :


FG/230924/094517/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-7 NF C 15-100 Art.462-536



Bâtiment administratif

- ↳ Circulation principale bureaux
- ↳ **Bureau 2**

Liste récapitulative
des observations issues de la
vérification

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Prises de courant

Recepteurs / points lumineux / prises de courant 20 Supprimer les fiches multiples.

Code Obs. : Date de 1^{er} signalement : Art. Réf. :
FG/230924/082747/0 23/09/2024 NOUVEAU CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559



Bâtiment administratif
↳ Circulation principale bureaux
↳ **Garage**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Prises de courant

Recepteurs / points lumineux / prises de courant 21 Remplacer le matériel détérioré: prise de courant

Code Obs. : Date de 1^{er} signalement : Art. Réf. :
FG/230924/083403/0 23/09/2024 NOUVEAU CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



Bâtiment administratif
↳ **Coursive extérieure couverte**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Locaux et recepteurs electriques 22 Refaire la pénétration des câbles dans les boîtes de dérivation

Code Obs. : Date de 1^{er} signalement : Art. Réf. :
FG/230924/083733/0 23/09/2024 NOUVEAU CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



Locaux et recepteurs electriques 23 Reprendre le mode de pose des canalisations

Code Obs. : Date de 1^{er} signalement : Art. Réf. :
FG/230924/083811/0 23/09/2024 NOUVEAU CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.521- 529



Liste récapitulative
des observations issues de la
vérification

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TD logement de passage

Coffrets et armoires électriques	24	Compléter l'identification des départs et installer un schéma d'installation. Préciser la provenance de l'alimentation du coffret pour avis complémentaire
----------------------------------	----	---

Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
FG/230924/100138/0	23/09/2024 NOUVEAU	CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1

Bâtiment administratif

↳ Coursive extérieure couverte

↳ Logement 1 et office

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Locaux et recepteurs électriques	25	Fixer la prise de courant (office)
----------------------------------	----	------------------------------------

Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
FG/230924/101407/0	23/09/2024 NOUVEAU	CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530

Locaux et recepteurs électriques	26	Réaliser la liaison équipotentielle des éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique (salle de bain)
----------------------------------	----	--

Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
FG/230924/101344/0	23/09/2024 NOUVEAU	CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.411.3

Bâtiment administratif

↳ Coursive extérieure couverte

↳ Logement 2

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Locaux et recepteurs électriques	27	Refaire la pénétration du câble au niveau de la prise de courant
----------------------------------	----	--

Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
FG/230924/102144/0	23/09/2024 NOUVEAU	CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	28	Réaliser la liaison équipotentielle des éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique (salle de bain)
Code Obs. : FG/230924/102042/0	Date de 1 ^{er} signalement : 23/09/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3



Brasseur d'air

Recepteurs / points lumineux / prises de courant	29	Améliorer ou réaliser la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 Ohms).
Code Obs. : FG/230924/101943/1	Date de 1 ^{er} signalement : 23/09/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3



Bâtiment technique ↳ Hall couvert

Point vérifié	N°	Observation(s)
Points lumineux	30	Remplacer le matériel détérioré: appareil d'éclairage
Recepteurs / points lumineux / prises de courant		
Code Obs. : FG/230924/084146/0	Date de 1 ^{er} signalement : 23/09/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



Prises de courant

Recepteurs / points lumineux / prises de courant	31	Refaire la pénétration du câble dans la prise de courant
Code Obs. : FG/230924/084051/0	Date de 1 ^{er} signalement : 23/09/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



Prises de courant

Recepteurs / points lumineux / prises de courant	32	Remplacer le matériel détérioré: prise de courant
Code Obs. : FG/230924/084211/0	Date de 1 ^{er} signalement : 23/09/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



Liste récapitulative
des observations issues de la
vérification

Bâtiment technique

↳ Hall couvert

↳ Local G.E

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité

Recepteurs / points lumineux / prises de courant 33 Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité.


Code Obs. : FG/080724/125128/0 Date de 1^{er} signalement : 23/09/2024 NOUVEAU Art. Réf. : CDT R.4226-13 Arrêté A.14/12/2011 art 11



TD Bâtiment tech

Coffrets et armoires électriques 34 Compléter l'identification des départs ou installer un schéma d'installation.

Code Obs. : FG/230924/085415/0 Date de 1^{er} signalement : 23/09/2024 NOUVEAU Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



TD Bâtiment tech

Coffrets et armoires électriques 35 Identifier la provenance de l'alimentation du coffret pour avis complémentaires.
NOTA: Section d'alimentation du coffret 2,5mm²

Code Obs. : FG/230924/085452/0 Date de 1^{er} signalement : 23/09/2024 NOUVEAU Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



TD Bâtiment tech

Coffrets et armoires électriques 36 Isoler les extrémités des conducteurs inutilisés

Code Obs. : FG/230924/085557/0 Date de 1^{er} signalement : 23/09/2024 NOUVEAU Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.410



Extérieur

Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Moteur

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **37** Améliorer ou réaliser la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 Ohms).

Code Obs. :

FG/230924/081041/1

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3



Extérieur

↳ Logette EDT

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Locaux et recepteurs electriques **38** Supprimer le dominos volant et conducteurs volants. Reprendre les alimentations dans les règles de l'art

Code Obs. :

FG/230924/081337/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559



Branchement EDT

Coffrets et armoires electriques **39** Apposer le sigle conventionnel.

Code Obs. :

FG/230924/081141/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



Branchement EDT

Coffrets et armoires electriques **40** Améliorer l'état des connexions en aval du disjoncteur de branchement

Code Obs. :

FG/230924/081109/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559



Branchement EDT : Disjoncteur de branchement

Dispositifs bt **41** Refaire la pénétration du câble au niveau du disjoncteur de branchement

Code Obs. :

FG/230924/080448/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Branchement EDT : Disjoncteur de branchement

Dispositifs bt **42** Protéger contre les contacts directs les pièces nues sous tension accessibles;
Replacer le cache borne

Code Obs. :

FG/230924/080528/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.2



Branchement EDT : Non repéré

Dispositifs bt **43** Compléter l'identification du départ

Code Obs. :

FG/230924/080757/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



Branchement EDT : Non repéré

Dispositifs bt **44** Placer des embouts de câblage à l'extrémité des conducteurs souples

Code Obs. :

FG/230924/080829/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559



Prises de courant

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **45** Améliorer ou réaliser la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 Ohms).

Code Obs. :

FG/230924/080945/1

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3



Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client

Aucun rapport ne nous a été remis

Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. CREMONESE, Responsable brigade

Installations vérifiées

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées

Nota : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit préalablement, à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

Origine de l'installation vérifiée : Local comptage Basse Tension

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Éléments de l'installation non vérifiables

GENDARMERIE>Faré > Huahine

Bâtiment administratif > Coursive extérieure couverte

RÉCEPTEURS : Points lumineux

Inaccessible

Bâtiment technique > Hall couvert > Local G.E

RÉCEPTEURS : Points lumineux

Inaccessible

Bâtiment administratif > Coursive extérieure couverte

RÉCEPTEURS : Points lumineux

Inaccessible

Bâtiment technique > Hall couvert

RÉCEPTEURS : Points lumineux

Inaccessible

Bâtiment technique > Hall couvert > Local technique

RÉCEPTEURS : Points lumineux

Inaccessible

Bâtiment administratif > Circulation principale bureaux > Cellule (X2)

RÉCEPTEURS : Points lumineux

Inaccessible

Bâtiment technique > Hall couvert > Local G.E

ARMOIRE : Coffret G.E

non alimenté lors de notre passage

Modifications apportées aux installations

Sans objet

Vérification relative à la protection des travailleurs

Information documentaire

Les informations documentaires sont nécessaires à la réalisation de la vérification, elles sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.

En l'absence d'éléments d'information Bureau Veritas peut être amené à réaliser des mesures compensatoires ou à établir des hypothèses, la vérification peut alors conduire à des conclusions excessives. Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

Présence des documents dans le dossier technique du client		Avis
Dossier Technique		
1- Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, notamment risque d'incendie et risque d'explosion**		Absent
2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre		Absent
2b - Plan de masse à l'échelle d'implantation des canalisations électriques enterrées		Absent
3 - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations		Absent
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques)		Absent
5 - Carnets de câbles		Absent
6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection		Absent
9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité		Absent
10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL)		Sans objet
DRPE		
Plan de zonage DRPE	Référence :	Sans Objet
ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques		
Document RVRAT	Référence :	Sans Objet

**Si un DRPE existe s'y reporter,

La numérotation des points du dossier technique est celle de l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011. Les point 7 et 8 de l'annexe III sont traités dans les chapitres « Précédents rapports » et « DRPE » du présent rapport.

Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

GENDARMERIE

Arrêtés :

- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité
- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles

Normes :

- NF C 15-100 : installation électrique à basse tension

Modalité de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par

M. CREMONESE, Responsable brigade

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :

Vérification relative à la protection des travailleurs

M. CREMONESE, Responsable brigade

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Condition de mise hors tension

En Basse Tension :

Mise hors tension totale de l'installation

Dans le cadre des vérifications et conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26/12/2011, Bureau Veritas doit réaliser des coupures sur les installations électriques BT et le cas échéant HT.

L'objectif des coupures est de vérifier, de façon exhaustive, la protection des personnes contre les risques de chocs électriques.

Pour information, les coupures sont nécessaires pour vérifier :

- o le fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels BT,
- o le fonctionnement des éclairages de sécurité,
- o les caractéristiques et l'état de certains équipements BT et HT accessibles qu'après coupure,
- o le fonctionnement des coupures d'urgence s'il y a doute sur les circuits concernés,
- o les dispositifs d'inter-verrouillages HT et le cas échéant BT,
- o le cas échéant, l'isolement des circuit BT.

Si, par suite de votre refus ou d'une impossibilité technique, les coupures totales n'ont pas été réalisées alors, l'étendue de la vérification de Bureau Veritas est limitée et peut conduire à des conclusions erronées.

Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de réaliser ces coupures dans le cadre d'une mission complémentaire.

Résultats des mesures et essais

Conditions de mesure

MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure à 2 Ohms.

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION

Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

ESSAIS DE DECLenchement DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre $0,5 \Delta n$ et Δn . (Δn : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval. En l'absence de testeur de calibre adapté et avec l'autorisation du client, les dispositifs différentiels de sensibilité supérieure à 1A peuvent être testés à la valeur 1A. L'application de cette procédure est signalée par un * dans le tableau « Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT ».

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesurée $R \leq \frac{UL}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n : sensibilité du différentiel principal). Cette méthode donne un résultat par excès.

- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

MESURE DU SOL ANTISTATIQUE

La mesure est réalisée à l'aide d'un mégohmmètre entre la barrette de liaison équipotentielle du local et le sol par l'intermédiaire d'un trépied métallique tel que défini au titre 6 de la NF C 15-100.

Cinq mesures sont effectuées dans les quatre angles et au centre du local. La valeur la plus élevée des moyennes des mesures réalisées est retenue et considérée comme satisfaisante si elle est inférieure à 25 M. ohms.

Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure

PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre	Ceinturage à fond de fouille	Ensemble de prises de terre interconnectées	Piquet de terre	Nature indéterminée
Repère	FF	EI	PT	IND

Méthode de mesure	Par résistance de boucle	Par telluromètre
Repère	RB	T

Code mesure	Barrette ouverte	Barrette fermée	Ensemble interconnecté
Repère	A	B	C

RÉCEPTEURS ELECTRIQUES :

PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)

AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

Appareils de mesure utilisés

Mesure de la résistance de prises de terre : **MFT 18-35 (MEGGER)**

Mesure de l'isolement : **MFT 18-35 (MEGGER)**

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielle : **MFT 18-35 (MEGGER)**

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **MFT 18-35 (MEGGER)**

Mesure des impédances de boucle : **Sans objet**

Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans objet**

Prises de terre

Emplacement et désignation	Résistance de prise de terre				Commentaires	N° d'obs (*)
	Nature prise de terre (1)	Méthode de mesure (1)	Valeur mesurée (Ohms)	Code mesure (1)		
GENDARMERIE(Faré / Huahine)						
Bâtiment administratif > Circulation principale bureaux						
Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS)	FF	RB	2	C		4
Bâtiment technique > Hall couvert						
Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS)	FF	RB	2	C		

(1) Consulter la liste des abréviations

Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
GENDARMERIE(Faré / Huahine)					
Bâtiment administratif > Circulation principale bureaux > Bureau copieur					
TGBT					
Général normal	30		1		8
Non repéré	300		0	24	11
Général normal/Secours	30		1		9
Général portail	30		1		
non repéré	30		1		10
Bâtiment administratif > Coursive extérieure couverte					
TD logement de passage					
Général diff	30		1		
Bâtiment technique > Hall couvert > Local G.E					
TD Bâtiment tech					
Général diff	30		1		
Coffret G.E					
Général	300		1		
Extérieur > Logette EDT					
Branchement EDT					
Disjoncteur de branchement	500		1		42 / 41
Non repéré	30		1		43 / 44

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 19/27

rapport n° : 317161860.1.P

en date du 27/09/2024


Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		

(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.
La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement
L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

GENDARMERIE

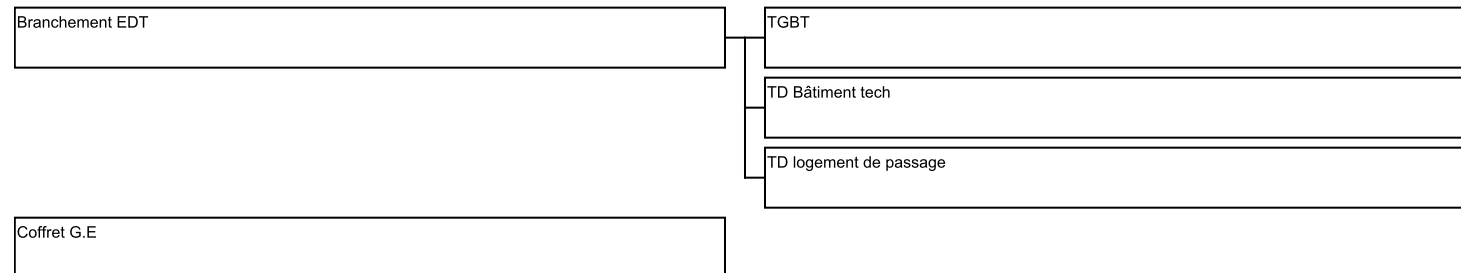

VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE 5ème CATEGORIE

Gendarmerie de Huahine

Référence du rapport : 317161860.1.P
Rédigé le : 27/09/2024

Ce document a été validé par son auteur

Nota : Le présent rapport prend en compte les dispositions relatives aux établissements recevant du public au regard du règlement de sécurité. Ce document ne saurait en aucun cas se substituer en tout ou partie à notre rapport de vérification réglementaire établi au titre de la protection des travailleurs.

Activité de l'établissement : Gendarmerie

Périmètre vérifié dans le rapport | HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE

GENDARMERIE (Faré / Huahine)

OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5

Bâtiment administratif

↳ Circulation principale bureaux

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	1	Reprendre le type de pictogramme sur les appareils d'éclairage de sécurité.
Code Obs. : FG/230924/081951/0		Date de 1 ^{er} signalement : 23/09/2024 Art. Réf. : PE24.2
		NOUVEAU
Locaux et recepteurs electriques	2	Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité.
Code Obs. : FG/230924/083513/0		Date de 1 ^{er} signalement : 23/09/2024 Art. Réf. : PE24.2
		NOUVEAU



Bâtiment administratif

↳ Circulation principale bureaux

↳ Bureau copieur

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	3	Refixer plusieurs prises de courant.
Code Obs. : FG/230924/082428/0		Date de 1 ^{er} signalement : 23/09/2024 Art. Réf. : PE24.1
		NOUVEAU
Locaux et recepteurs electriques	4	Supprimer les mises en série de blocs multiples
Code Obs. : FG/230924/082500/0		Date de 1 ^{er} signalement : 23/09/2024 Art. Réf. : PE24.1
		NOUVEAU



Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TGBT

Coffrets et armoires électriques **5** Placer des embouts de câblage à l'extrémité de tous les conducteurs souples

Code Obs. :


FG/230924/094104/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

PE24.3



Bâtiment administratif

↳ Coursive extérieure couverte

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Locaux et recepteurs électriques **6** Reprendre le mode de pose des canalisations électriques

Code Obs. :

FG/230924/083811/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

PE24.1



Bâtiment administratif

↳ Coursive extérieure couverte

↳ Logement 1 et office

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Locaux et recepteurs électriques **7** Fixer la prise de courant (office)

Code Obs. :

FG/230924/101407/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

PE24.1



Extérieur

↳ Logette EDT

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Branchement EDT : Non repéré

Dispositifs bt **8** Fixer le dispositif de protection.
Reprendre l'alimentation de celui-ci depuis le TGBT

Code Obs. :

FG/230924/080732/0

Date de 1^{er} signalement :

23/09/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

PE24.1



Informations générales

Nota : Notre vérification relative au code de la construction et de l'habitation ne porte que sur les exigences réglementaires concernant les installations électriques et d'éclairage. S'agissant des installations de sécurité, seul l'éclairage de sécurité fait l'objet d'un avis.

Textes de référence

ARRETE DU 22/06/90 modifié - ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC de 5ème Catégorie.

Modalité de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par
M. CREMONESE, Responsable brigade
A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. CREMONESE, Responsable brigade

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Tenue du registre : Mise à jour

Classement de l'établissement

GENDARMERIE (Faré / Huahine)

Aucun

Désignation	Activité de type	Catégorie
GENDARMERIE		5

TYPES	NATURE	TYPES	NATURE
PE	Petits établissements.	PU	Petits établissements de soins
PO	Petits établissements hôteliers.	PX	Petits établissements sportifs.

CATEGORIE	EFFECTIF
5 ^{ème}	Effectif inférieur au seuil d'assujettissement propre à chaque type d'exploitation.

Effectif maximum du public admissible

Effectif maximum du public admissible : 10

Description sommaire de l'établissement

GENDARMERIE

Description bâtiment :

Activité :

Historique des principales modifications

GENDARMERIE

ECLAIRAGE DE SECURITE

GENDARMERIE (Faré / Huahine)

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type Luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs (*)
Bâtiment administratif > Circulation principale bureaux	Inférieur ou égal à 50	Evacuation (balisage)	Bloc autonome	Oui		Diode électroluminescente	C2	

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

Circuits de sécurité autres que l'éclairage

GENDARMERIE (Faré / Huahine)

Avis sur articles (ERP5)

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

ARRETE DU 22/06/1990 modifié – REGLEMENT DE SECURITE – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE.

S : Satisfaisant **NS** : Non Satisfaisant **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

Articles	Libellé	Avis	N° d'obs. (*)
REGLE COMPLEMENTAIRE POUR LES ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX RESERVES AU SOMMEIL			
PE36	Choix du type d'éclairage de sécurité	SO	
REGLE GENERALE A TOUS LES ERP DU 2ème GROUPE			
PE24.1	Conformité aux normes ; câbles C2 ; fiches multiples interdites ; canalisations mobiles ne doivent pas faire obstacles à la circulation.	NS	7 / 6 / 3 / 4 / 8
PE24.2	Installation d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les escaliers protégés, les circulations de plus de 10 m et les salles de surface à 100 m2.	NS	2 / 1
PE24.3	les locaux présentant des risques d'incendie à l'exception de ceux renfermant du matériel électrique doivent respecter les conditions d'influence externe BE2 de la norme NF C 15-100	NS	5
