

# Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

## REFERENCES MISSION

**Rapport N° : 27321885/S1/1/AM-RTV\_V1****Rédigé le : 26/08/2025****Référence au programme de travaux :**Descriptifs des travaux par courriel de M.BOURDY du  
21/05 REF 24107APD -PLAN réalisé le 12/06/2025 par  
Atelier Bulle Architectes

## DONNEUR D'ORDRE

**DIRA****M. Hervé BOUDRY**Cité administrative 2 rue Jules Ferry  
33000 BORDEAUX

## SITE D'INTERVENTION

**District de Gironde**1 rue du Marechal Gallieni  
33140 VILLENAVE D ORNON**District de Gironde**

Latitude : 44.774400 / Longitude : -0.558000

**Date(s) d'intervention(s) :**

Le 25/07/2025



## SYNTHESE DE CONCLUSION



## OPERATEUR(S) DE REPERAGE

| Prénom Nom        | Fonction       | Compétence                | Signataire du rapport                                                                 |
|-------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vincent MONTAGNON | Diagnostiqueur | Certification N° C2031    | Vincent MONTAGNON                                                                     |
| Frédéric COURTOIS | Diagnostiqueur | Certification N° 14302146 |  |

Le présent rapport comporte 64 pages, dont 40 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

## SOMMAIRE

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION</b>                               | <b>3</b>  |
| 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre                       | 3         |
| 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage                 | 3         |
| 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage                 | 5         |
| <b>2. CONCLUSIONS</b>                                                         | <b>6</b>  |
| 2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante                             | 6         |
| 2.2. Obligations réglementaires                                               | 9         |
| <b>3. INFORMATIONS GENERALES</b>                                              | <b>10</b> |
| 3.1. Immeuble bâti objet de la mission                                        | 10        |
| 3.2. Parties prenantes                                                        | 10        |
| <b>4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE</b>                               | <b>10</b> |
| 4.1. Références réglementaires                                                | 10        |
| <b>5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE</b>                               | <b>11</b> |
| 5.1. Date(s) de visite(s)                                                     | 11        |
| 5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020                 | 11        |
| 5.3. Conditions spécifiques                                                   | 11        |
| 5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite  | 11        |
| <b>6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b>                                     | <b>12</b> |
| 6.1. Matériaux et produits repérés                                            | 12        |
| 6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante | 24        |
| <b>7. ANNEXES</b>                                                             | <b>25</b> |
| 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées                                         | 25        |
| 7.2. Photos prélèvements                                                      | 27        |
| 7.3. Attestation d'assurance                                                  | 36        |
| 7.4. Certificat de compétence                                                 | 38        |
| 7.5. Croquis de repérage                                                      | 39        |
| 7.6. Rapport d'analyse du laboratoire                                         | 46        |

*BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets*



# 1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

## 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

| Description succincte du programme des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remplacement des menuiseries extérieures.<br>Remplacement de l'isolant dans les combles<br>Dépose de l'ensemble des faux plafonds<br>Dépose des radiateurs<br>Dépose du système de climatisation<br>Dépose de la production du chauffage et de ECS<br>Création d'un vestiaire chef d'équipe<br>Réfection des sanitaires homme et femme |

## 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

*Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus*

| Ouvrages de la construction                             | Parties d'ouvrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>02 - Parois verticales extérieures et façades</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conduits en façade                                      | Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Éléments associés à la façade                           | Conduits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Façades lourdes y compris poteaux                       | Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaire d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE) |
| Menuiseries extérieures                                 | Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>03 - Parois verticales intérieures</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cloisons (légères et préfabriquées)                     | Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Sous couches des tissus muraux                                                                                                                                                                                                                  |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur"                     | Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Plinthes                                                | Peintures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaire d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles                                                                                                                                                                                                   |
| <b>04 - Plafonds et faux plafonds</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Faux plafonds                                           | Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Ouvrages de la construction                    | Parties d'ouvrages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>05 - Planchers et planchers techniques</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Revêtements de sol                             | Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples |
| <b>06 - Conduits et accessoires intérieurs</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conduits                                       | Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>08 - Equipements divers et accessoires</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Chaudières (mixtes, collectives)               | Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses                                                                                                                                                                                                                     |
| Tuyauteries                                    | Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Tresses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

## 2. CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

### 2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

**Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante**

| N°ZPSO | Localisation                                    | Ouvrage                             | Partie d'ouvrage                     | Aspect                    | Couleur |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|
| 3      | Bâtiment A et B -> RDC                          | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 31     | Bâtiment A et B -> RDC -> Entrée 1 / dégagement | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 31     | Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 1              | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 31     | Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 2              | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 31     | Bâtiment A et B -> RDC -> Sanitaire 1           | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 31     | Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 3              | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 31     | Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 4              | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 31     | Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 5              | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 3      | Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 6              | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 31     | Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 6              | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 31     | Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 7              | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |

| N°ZPSO | Localisation                                    | Ouvrage                             | Partie d'ouvrage                     | Aspect                    | Couleur |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|
| 31     | Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 8              | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 31     | Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 9              | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 3      | Bâtiment A et B -> RDC -> SAS                   | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 29     | Bâtiment A et B -> RDC -> SAS                   | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 3      | Bâtiment A et B -> RDC -> SAS                   | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 29     | Bâtiment A et B -> RDC -> Entrée 2 / dégagement | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 29     | Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 10             | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 29     | Bâtiment A et B -> RDC -> Vestiaire Homme       | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 29     | Bâtiment A et B -> RDC -> Sanitaire 2           | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 29     | Bâtiment A et B -> RDC -> Réfectoire            | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 29     | Bâtiment A et B -> RDC -> Vestiaire Femme       | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 29     | Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 11             | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 29     | Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 12             | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 29     | Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 13             | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 29     | Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 15             | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 29     | Bâtiment A et B -> RDC -> Archives              | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |
| 29     | Bâtiment A et B -> RDC -> Espace détente        | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   |

| N°ZPSO | Localisation                                 | Ouvrage                                | Partie d'ouvrage                           | Aspect                       | Couleur |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------|
| 29     | Bâtiment A et B -><br>RDC -> Local info      | Cloisons (légères et<br>préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou<br>talochés    | Fin, Lissé, Peint,<br>Plâtre | Blanc   |
| 25     | Bâtiment A et B -><br>RDC -> Chauffage       | Conduits                               | Joints entre éléments, joints de<br>brides | Rigide                       | Beige   |
| 29     | Bâtiment A et B -><br>RDC -><br>Degagement 2 | Cloisons (légères et<br>préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou<br>talochés    | Fin, Lissé, Peint,<br>Plâtre | Blanc   |
| 31     | Bâtiment A et B -><br>RDC -><br>Degagement 1 | Cloisons (légères et<br>préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou<br>talochés    | Fin, Lissé, Peint,<br>Plâtre | Blanc   |
| 29     | Bâtiment A et B -><br>RDC -> Bureau 14       | Cloisons (légères et<br>préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou<br>talochés    | Fin, Lissé, Peint,<br>Plâtre | Blanc   |

## 2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

### 3. INFORMATIONS GENERALES

#### 3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : District de Gironde  
1 rue du Marechal Gallieni  
33140 VILLENAVE D ORNON

| Bâtiment            | Fonction principale      | Classement | Date permis de construire ou année de construction                                                                                            | Année de réhabilitation ou description des modifications |
|---------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| District de Gironde | Administrations, bureaux | Autres     | Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997 | Non-communicué                                           |

#### 3.2. Parties prenantes

| Contact             | Qualité         | Société | Adresse                                                 | Coordonnées |
|---------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------|-------------|
| M. Hervé BOUDRY     | Donneur d'ordre | DIRA    | Cité administrative 2 rue Jules Ferry<br>33000 BORDEAUX | /           |
| Jen-Claude DARROMAN | Accompagnateur  | DIRAI   | 1 rue du Maréchal Gallieni<br>33140 VILLENAVE D'ORNON   | /           |

### 4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

#### 4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### 5.1. Date(s) de visite(s)

Le 25/07/2025

### 5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires

### 5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

### 5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

| Objet / Type de document                                                          | Auteur                    | Date       | Référence           | Conclusions<br>(si rapport de repérage) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Avant projet détaillé / Descriptifs des travaux par courriel de M.BOURDY du 21/05 | Atelier Bulle Architectes | 12/06/2025 | REF 24107APD - PLAN | /                                       |
| Plans / Plan Demol                                                                | Atelier Bulle Architectes | 12/06/2025 | 24107 APD           | /                                       |

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

## 6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### 6.1. Matériaux et produits repérés

#### Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage  
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante  
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante  
xx\_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur  
Sxx = Sondage n°xx  
xx\* = élément témoin de la ZPSO  
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

#### Critères de décision :

AN = Analyse  
DC = Document consulté  
MA = Marquage  
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.  
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

| Localisation                                       | Ouvrage                             | Matériau / Produit                                                 | Aspect                    | Couleur | N° ZPSO | N° Prél.  | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|-----------|----------|---------------------|-------------|------------------|
| Bâtiment A et B -> RDC                             | Cloisons (légères et préfabriquées) | Panneaux de cloisons                                               | Plaque de plâtre          | Blanc   | 3       | Idem P 48 | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC                             | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés                               | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 3       | Idem P 48 | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Entrée 1 / dégagement | Façades lourdes y compris poteaux   | Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs | Ciment                    | Gris    | 14      | /         | S16      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Entrée 1 / dégagement | Revêtements de sol                  | Sous-couches des revêtements souples                               | Lé                        | Gris    | 1       | /         | S1       | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Entrée 1 / dégagement | Revêtements de sol                  | Ragréages                                                          | Ciment                    | Rose    | 2       | /         | S3       | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Entrée 1 / dégagement | Revêtements de sol                  | Colles de carrelage                                                | Mortier                   | Gris    | 10      | P16* N    | /        | AN                  | /           | Non              |

| Localisation                                          | Ouvrage                             | Matériau / Produit                   | Aspect                    | Couleur | N° ZPSO | N° Prél.     | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|---------|--------------|----------|---------------------|-------------|------------------|
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Entrée 1 /<br>dégagement | Revêtements de sol                  | Joints de carrelage                  | Ciment                    | Gris    | 13      | P21*<br>N    | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Entrée 1 /<br>dégagement | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 31      | Idem<br>P 58 | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 1                 | Revêtements de sol                  | Ragréages                            | Ciment                    | Rose    | 2       | /            | S2       | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 1                 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 31      | Idem<br>P 58 | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 2                 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Peinture                             | Goutelette                | Blanc   | 17      | /            | S20      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 2                 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | /                         | Blanc   | 17      | /            | S20      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 2                 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 31      | Idem<br>P 58 | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Sanitaire 1              | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 31      | Idem<br>P 58 | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 3                 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 31      | /            | S29      | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 3                 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 31 (i)  | P57*<br>N    | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 3                 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Bandes calicot                       | Papier, Plâtre            | Blanc   | 32      | P59*<br>N    | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 4                 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 31      | Idem<br>P 58 | /        | AN                  | /           | Oui              |

| Localisation                          | Ouvrage                             | Matériau / Produit                   | Aspect                    | Couleur | N° ZPSO | N° Prél.  | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|---------|-----------|----------|---------------------|-------------|------------------|
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 5 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 31      | Idem P 58 | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 6 | Revêtements de sol                  | Sous-couches des revêtements souples | Lé                        | Gris    | 1       | P1* N     | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 6 | Revêtements de sol                  | Ragréages                            | Ciment                    | Rose    | 2       | P3* N     | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 6 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Panneaux de cloisons                 | Plaque de plâtre          | Blanc   | 3       | P4* N     | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 6 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 3 (I)   | P4* N     | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 6 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 31      | Idem P 58 | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 7 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 31      | /         | S30      | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 8 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 31      | Idem P 58 | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 9 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 31      | P58 P     | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> SAS      | Cloisons (légères et préfabriquées) | Panneaux de cloisons                 | Plaque de plâtre          | Blanc   | 3       | P48 N     | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> SAS      | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 3       | P48 P     | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> SAS      | Revêtements de sol                  | Sous-couches des revêtements souples | Lé                        | Gris    | 1       | P8 N      | /        | AN                  | /           | Non              |

| Localisation                                       | Ouvrage                             | Matériau / Produit                                                 | Aspect                    | Couleur      | N° ZPSO | N° Prél.     | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|--------------|----------|---------------------|-------------|------------------|
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> SAS                   | Revêtements de sol                  | Ragréages                                                          | Ciment                    | Rose         | 2       | P9<br>N      | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> SAS                   | Cloisons (légères et préfabriquées) | Panneaux de cloisons                                               | Plaque de plâtre          | Blanc        | 3       | P50<br>N     | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> SAS                   | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés                               | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc        | 3 (i)   | P50<br>N     | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> SAS                   | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés                               | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc        | 29 (i)  | P53*<br>N    | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> SAS                   | Tuyauteries                         | Joints d'étanchéité                                                | Fibreux                   | Beige        | 7       | P13*<br>N    | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> SAS                   | Equipements                         | Peintures                                                          | Epais                     | Blanc        | 8       | P14*<br>N    | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> SAS                   | Equipements                         | Peintures                                                          | Epais                     | Blanc        | 9       | P15*<br>N    | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> SAS                   | Façades lourdes y compris poteaux   | Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs | Ciment                    | Gris         | 14      | Idem<br>P 22 | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Entrée 2 / dégagement | Faux plafonds                       | Panneaux                                                           | Laine de verre            | Jaune, Blanc | 21      | P38*<br>N    | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Entrée 2 / dégagement | Revêtements de sol                  | Colles de carrelage                                                | Mortier                   | Gris         | 10      | P17<br>N     | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Entrée 2 / dégagement | Revêtements de sol                  | Colles de carrelage                                                | Mortier                   | Gris         | 11      | P18*<br>N    | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Entrée 2 / dégagement | Revêtements de sol                  | Joints de carrelage                                                | Ciment                    | Gris         | 12      | P19*<br>N    | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Entrée 2 / dégagement | Revêtements de sol                  | Joints de carrelage                                                | Ciment                    | Gris         | 13      | P20<br>N     | /        | AN                  | /           | Non              |

| Localisation                                       | Ouvrage                             | Matériau / Produit                                                 | Aspect                    | Couleur | N° ZPSO | N° Prél.  | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|-----------|----------|---------------------|-------------|------------------|
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Entrée 2 / dégagement | Façades lourdes y compris poteaux   | Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs | Ciment                    | Gris    | 14      | /         | S17      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Entrée 2 / dégagement | Equipements                         | Peintures                                                          | Epais                     | Blanc   | 9       | /         | S11      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Entrée 2 / dégagement | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés                               | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 29      | Idem P 54 | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Entrée 2 / dégagement | Tuyauteries                         | Joints d'étanchéité                                                | Fibreux                   | Beige   | 7       | Idem P 13 | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 10             | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés                               | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 29      | Idem P 54 | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Homme       | Cloisons (légères et préfabriquées) | Peinture                                                           | Goutelette                | Blanc   | 17      | /         | S19      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Homme       | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés                               | /                         | Blanc   | 17      | /         | S19      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Homme       | Cloisons (légères et préfabriquées) | Bandes calicot                                                     | Toile                     | Blanc   | 20      | /         | S28      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Homme       | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés                               | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 29      | /         | S32      | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Homme       | Faux plafonds                       | Panneaux                                                           | Rigide                    | Blanc   | 18      | /         | S21      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Homme       | Faux plafonds                       | Panneaux                                                           | Rigide                    | Blanc   | 18      | /         | S22      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Homme       | Equipements                         | Peintures                                                          | Epais                     | Blanc   | 9       | P39 N     | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Homme       | Revêtements de sol                  | Colles de carrelage                                                | Mortier                   | Gris    | 11      | Idem P 18 | /        | AN                  | /           | Non              |

| Localisation                                 | Ouvrage                             | Matériau / Produit                   | Aspect                    | Couleur      | N° ZPSO | N° Prél.  | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|-----------|----------|---------------------|-------------|------------------|
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Homme | Tuyauteries                         | Joints d'étanchéité                  | Fibreux                   | Beige        | 7       | Idem P 13 | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Sanitaire 2     | Faux plafonds                       | Panneaux                             | Laine de verre            | Jaune, Blanc | 21      | Idem P 38 | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Sanitaire 2     | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc        | 29      | Idem P 54 | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Sanitaire 2     | Revêtements de sol                  | Colles de carrelage                  | Mortier                   | Gris         | 11      | Idem P 18 | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Réfectoire      | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc        | 29      | /         | S33      | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Réfectoire      | Tuyauteries                         | Joints d'étanchéité                  | Fibreux                   | Beige        | 7       | /         | S10      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Réfectoire      | Equipements                         | Peintures                            | Epais                     | Blanc        | 9       | /         | S12      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Réfectoire      | Revêtements de sol                  | Colles de carrelage                  | Mortier                   | Gris         | 11      | /         | S13      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Réfectoire      | Revêtements de sol                  | Joints de carrelage                  | Ciment                    | Gris         | 12      | /         | S14      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Réfectoire      | Faux plafonds                       | Panneaux                             | Laine de verre            | Jaune, Blanc | 21      | /         | S24      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Faux plafonds                       | Panneaux                             | Rigide                    | Blanc        | 18      | P33* N    | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Revêtements de sol                  | Colles de carrelage                  | Mortier                   | Gris         | 11      | P24 N     | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Revêtements de sol                  | Joints de carrelage                  | Ciment                    | Gris         | 12      | P27 N     | /        | AN                  | /           | Non              |

| Localisation                                 | Ouvrage                                                 | Matériau / Produit                   | Aspect     | Couleur | N° ZPSO | N° Prél.  | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|----------|---------------------|-------------|------------------|
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles de plinthe                    | Mortier    | Blanc   | 15      | P25*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles de plinthe                    | Mortier    | Blanc   | 15      | P26<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Joints de plinthe                    | /          | Gris    | 16      | P28*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Joints de plinthe                    | /          | Gris    | 16      | P29<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Cloisons (légères et préfabriquées)                     | Peinture                             | Goutelette | Blanc   | 17      | P30*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Cloisons (légères et préfabriquées)                     | Enduits lissés, projetés ou talochés | /          | Blanc   | 17      | P30*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Cloisons (légères et préfabriquées)                     | Peinture                             | Goutelette | Blanc   | 17      | P31<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Cloisons (légères et préfabriquées)                     | Enduits lissés, projetés ou talochés | /          | Blanc   | 17      | P31<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles de faïence                    | Ciment     | Blanc   | 19      | P34*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | Colles de faïence                    | Ciment     | Blanc   | 19      | P35<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Cloisons (légères et préfabriquées)                     | Bandes calicot                       | Toile      | Blanc   | 20      | P36*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Cloisons (légères et préfabriquées)                     | Bandes calicot                       | Toile      | Blanc   | 20      | P37<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |

| Localisation                                 | Ouvrage                             | Matériau / Produit                   | Aspect                    | Couleur      | N° ZPSO | N° Prél.     | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|--------------|----------|---------------------|-------------|------------------|
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Tuyauteries                         | Joints d'étanchéité                  | Fibreux                   | Beige        | 7       | P32<br>N     | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc        | 29      | Idem<br>P 54 | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Vestiaire Femme | Equipements                         | Peintures                            | Epais                     | Blanc        | 9       | Idem<br>P 15 | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 11       | Faux plafonds                       | Panneaux                             | Laine de verre            | Jaune, Blanc | 21      | Idem<br>P 38 | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 11       | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc        | 29      | Idem<br>P 54 | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 12       | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc        | 29      | P54<br>P     | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 12       | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc        | 29 (i)  | P55<br>N     | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 12       | Faux plafonds                       | Panneaux                             | Laine de verre            | Jaune, Blanc | 21      | Idem<br>P 38 | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 13       | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc        | 29      | /            | S31      | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 13       | Faux plafonds                       | Panneaux                             | Laine de verre            | Jaune, Blanc | 21      | /            | S23      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 13       | Tuyauteries                         | Joints d'étanchéité                  | Fibreux                   | Beige        | 7       | Idem<br>P 13 | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 15       | Faux plafonds                       | Panneaux                             | Laine de verre            | Jaune, Blanc | 21      | Idem<br>P 38 | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 15       | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc        | 29      | Idem<br>P 54 | /        | AN                  | /           | Oui              |

| Localisation                                | Ouvrage                             | Matériau / Produit                      | Aspect                    | Couleur      | N° ZPSO | N° Prél.  | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|-----------|----------|---------------------|-------------|------------------|
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 15      | Tuyauteries                         | Joints d'étanchéité                     | Fibreux                   | Beige        | 7       | Idem P 13 | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Archives       | Cloisons (légères et préfabriquées) | Peinture                                | Goutelette                | Blanc        | 17      | /         | S18      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Archives       | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés    | /                         | Blanc        | 17      | /         | S18      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Archives       | Tuyauteries                         | Joints d'étanchéité                     | Fibreux                   | Beige        | 7       | /         | S9       | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Archives       | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés    | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc        | 29      | Idem P 54 | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Espace détente | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés    | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc        | 29      | /         | S35      | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Espace détente | Faux plafonds                       | Panneaux                                | Laine de verre            | Jaune, Blanc | 21      | Idem P 38 | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Espace détente | Revêtements de sol                  | Colles de carrelage                     | Mortier                   | Gris         | 11      | Idem P 18 | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Espace détente | Revêtements de sol                  | Joints de carrelage                     | Ciment                    | Gris         | 12      | Idem P 19 | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Espace détente | Tuyauteries                         | Joints d'étanchéité                     | Fibreux                   | Beige        | 7       | Idem P 13 | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Local info     | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés    | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc        | 29      | Idem P 54 | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Local info     | Tuyauteries                         | Joints d'étanchéité                     | Fibreux                   | Beige        | 7       | Idem P 13 | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Chaufferie     | Conduits                            | Joints entre éléments, joints de brides | Rigide                    | Beige        | 25      | P49* P    | /        | AN                  | /           | Oui              |

| Localisation                              | Ouvrage                             | Matériau / Produit                      | Aspect                    | Couleur | N° ZPSO | N° Prél.  | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------|---------|-----------|----------|---------------------|-------------|------------------|
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Chauffage    | Revêtements de sol                  | Sols coulés à base ciment               | Chape, Ciment             | Gris    | 23      | P42*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Chauffage    | Revêtements de sol                  | Sols coulés à base ciment               | Chape, Ciment             | Gris    | 23      | P43<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Chauffage    | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits lissés, projetés ou talochés    | Ciment                    | Gris    | 22      | P40*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Chauffage    | Murs et cloisons maçonnées "en dur" | Enduits lissés, projetés ou talochés    | Ciment                    | Gris    | 22      | P41<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Chauffage    | Conduits                            | Joints entre éléments, joints de brides | Compact                   | /       | 24      | P44*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Chauffage    | Equipements                         | Peintures                               | Epais                     | Jaune   | 26      | P45*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Chauffage    | Equipements                         | Peintures                               | Epais                     | Jaune   | 26      | P46<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Chauffage    | Conduits                            | Calorifugeages                          | Laine de verre            | Jaune   | 27      | P47*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Chauffage    | Conduits                            | Enveloppes de calorifuges               | PVC                       | Gris    | 27      | P47*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Degagement 2 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Bandes calicot                          | Toile                     | Blanc   | 20      | /         | S27      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Degagement 2 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés    | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 29      | P52<br>P  | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Degagement 2 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés    | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 29 (i)  | P51<br>N  | /        | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Degagement 1 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés    | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc   | 31 (i)  | P56<br>N  | /        | AN                  | /           | Oui              |

| Localisation                              | Ouvrage                             | Matériau / Produit                                                 | Aspect                    | Couleur      | N° ZPSO | N° Prél.  | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|-----------|----------|---------------------|-------------|------------------|
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Degagement 1 | Cloisons (légères et préfabriquées) | Bandes calicot                                                     | Papier, Plâtre            | Blanc        | 32      | P60<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> RDC<br>-> Bureau 14    | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés                               | Fin, Lissé, Peint, Plâtre | Blanc        | 29      | /         | S34      | AN                  | /           | Oui              |
| Bâtiment A et B -> Plénum bâtiment A et B | Faux plafonds                       | Pare-vapeur                                                        | Papier, Bitumé            | Marron, Noir | 4       | P5*<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> Plénum bâtiment A et B | Conduits                            | Rubans adhésifs                                                    | Epais                     | Gris         | 5       | P6*<br>N  | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> Plénum bâtiment A et B | Conduits                            | Rubans adhésifs                                                    | Epais                     | Gris         | 5       | P7<br>N   | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> Plénum bâtiment A et B | Conduits                            | Calorifugeages                                                     | Laine de verre            | Jaune        | 27      | /         | S25      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> Plénum bâtiment A et B | Conduits                            | Enveloppes de calorifuges                                          | PVC                       | Gris         | 27      | /         | S25      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> Plénum bâtiment A et B | Conduits                            | Calorifugeages                                                     | Laine de verre            | Jaune        | 27      | /         | S26      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> Plénum bâtiment A et B | Conduits                            | Enveloppes de calorifuges                                          | PVC                       | Gris         | 27      | /         | S26      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> Plénum bâtiment A et B | Faux plafonds                       | Pare-vapeur                                                        | Papier, Bitumé            | Marron, Noir | 4       | /         | S7       | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> Extérieur Façades      | Façades lourdes y compris poteaux   | Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs | Ciment                    | Gris         | 14      | /         | S15      | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> Extérieur Façades      | Façades lourdes y compris poteaux   | Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs | Ciment                    | Gris         | 14      | P22*<br>N | /        | AN                  | /           | Non              |

| Localisation                         | Ouvrage                           | Matériau / Produit                                                 | Aspect | Couleur | N° ZPSO | N° Prél. | N° Sond. | Critère de décision | Observation | Présence amiante |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|---------------------|-------------|------------------|
| Bâtiment A et B -> Extérieur Façades | Façades lourdes y compris poteaux | Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs | Ciment | Gris    | 14      | P23 N    | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> Extérieur Façades | Menuiseries extérieures           | Joints d'étanchéité                                                | Mastic | Gris    | 6       | P11* N   | /        | AN                  | /           | Non              |
| Bâtiment A et B -> Extérieur Façades | Menuiseries extérieures           | Joints d'étanchéité                                                | Mastic | Gris    | 6       | P12 N    | /        | AN                  | /           | Non              |

## 6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

| N°ZPSO | Ouvrage                             | Partie d'ouvrage                        | Estimation quantitative |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 3      | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés    | 10 m <sup>2</sup>       |
| 29     | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés    | 380 m <sup>2</sup>      |
| 31     | Cloisons (légères et préfabriquées) | Enduits lissés, projetés ou talochés    | 360 m <sup>2</sup>      |
| 25     | Conduits                            | Joints entre éléments, joints de brides | 3 U                     |

## 7. ANNEXES

### 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.


| Localisation                                    | Descriptif sol / mur / plafond |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bâtiment A et B                                 | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC                          | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Entrée 1 / dégagement | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 1              | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 2              | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Sanitaire 1           | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 3              | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 4              | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 5              | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 6              | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 7              | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 8              | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 9              | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> SAS                   | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Entrée 2 / dégagement | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 10             | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Vestiaire Homme       | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Sanitaire 2           | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Réfectoire            | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Vestiaire Femme       | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 11             | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 12             | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 13             | /                              |

| Localisation                              | Descriptif sol / mur / plafond |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 15       | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Archives        | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Espace détente  | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Local info      | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Chaufferie      | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Degagement 2    | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Degagement 1    | /                              |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 14       | /                              |
| Bâtiment A et B -> Plénum bâtiment A et B | /                              |
| Bâtiment A et B -> Extérieur Façades      | /                              |

## 7.2. Photos prélèvements

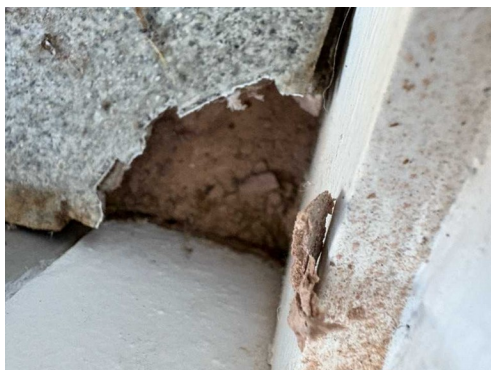
|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P16                                                                               | ZPSO 10 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Entrée 1 / dégagement                                   |         |
|  |         |
| Revêtements de sol -> Colles de carrelage                                         |         |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P21                                                                                | ZPSO 13 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Entrée 1 / dégagement                                    |         |
|  |         |
| Revêtements de sol -> Joints de carrelage                                          |         |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P57                                                                                | ZPSO 31 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 3                                                 |         |
|  |         |
| Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés        |         |

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P59                                                                                 | ZPSO 32 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 3                                                  |         |
|  |         |
| Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot                               |         |

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P1                                                                                  | ZPSO 1 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 6                                                  |        |
|  |        |
| Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples                          |        |

|                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P3                                                                                   | ZPSO 2 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 6                                                   |        |
|  |        |
| Revêtements de sol -> Ragréages                                                      |        |

|                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P4                                                                                                           | ZPSO 3 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 6                                                                           |        |
|                             |        |
| Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B)   Enduits lissés, projetés ou talochés |        |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P58                                                                                | ZPSO 31 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 9                                                 |         |
|  |         |
| Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés        |         |

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P48                                                                                | ZPSO 3 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> SAS                                                      |        |
|  |        |
| Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés        |        |

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P8                                                                                  | ZPSO 1 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> SAS                                                       |        |
|  |        |
| Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples                          |        |

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P9                                                                                  | ZPSO 2 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> SAS                                                       |        |
|  |        |
| Revêtements de sol -> Ragréages                                                     |        |

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P53                                                                                  | ZPSO 29 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> SAS                                                        |         |
|  |         |
| Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés          |         |

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P13                                                                               | ZPSO 7 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> SAS                                                     |        |
|  |        |
| Tuyauteries -> Joints d'étanchéité                                                |        |

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P14                                                                                | ZPSO 8 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> SAS                                                      |        |
|  |        |
| Equipements -> Peintures                                                           |        |

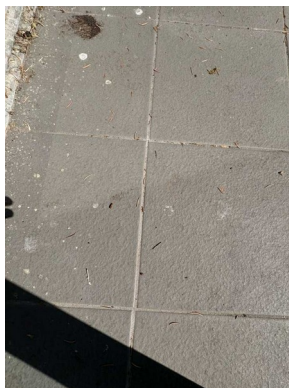
|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P15                                                                                | ZPSO 9 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> SAS                                                      |        |
|  |        |
| Equipements -> Peintures                                                           |        |

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P38                                                                                 | ZPSO 21 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Entrée 2 / dégagement                                     |         |
|  |         |
| Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)                                                 |         |

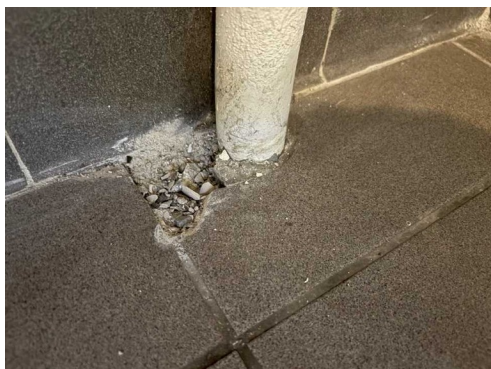
|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P17                                                                                 | ZPSO 10 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Entrée 2 / dégagement                                     |         |
|  |         |
| Revêtements de sol -> Colles de carrelage                                           |         |

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P18                                                                                  | ZPSO 11 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Entrée 2 / dégagement                                      |         |
|  |         |
| Revêtements de sol -> Colles de carrelage                                            |         |

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P19                                                                               | ZPSO 12 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Entrée 2 / dégagement                                   |         |
|  |         |
| Revêtements de sol -> Joints de carrelage                                         |         |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P20                                                                                | ZPSO 13 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Entrée 2 / dégagement                                    |         |
|  |         |
| Revêtements de sol -> Joints de carrelage                                          |         |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P33                                                                                | ZPSO 18 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Vestiaire Femme                                          |         |
|  |         |
| Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)                                                |         |

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P24                                                                                 | ZPSO 11 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Vestiaire Femme                                           |         |
|  |         |
| Revêtements de sol -> Colles de carrelage                                           |         |

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P25                                                                                 | ZPSO 15 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Vestiaire Femme                                           |         |
|  |         |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe        |         |

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P28                                                                                  | ZPSO 16 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Vestiaire Femme                                            |         |
|  |         |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Joints de plinthe         |         |

|                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P30                                                                                    | ZPSO 17 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Vestiaire Femme                                              |         |
|       |         |
| Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture   Enduits lissés, projetés ou talochés |         |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P34                                                                                | ZPSO 19 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Vestiaire Femme                                          |         |
|  |         |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence       |         |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P35                                                                                | ZPSO 19 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Vestiaire Femme                                          |         |
|  |         |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence       |         |

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P36                                                                                 | ZPSO 20 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Vestiaire Femme                                           |         |
|  |         |
| Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot                               |         |

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P37                                                                                 | ZPSO 20 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Vestiaire Femme                                           |         |
|  |         |
| Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot                               |         |

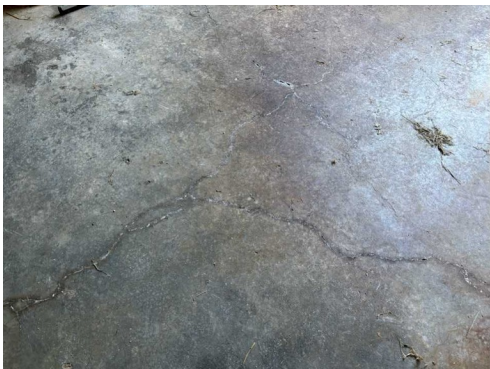
|                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P32                                                                                  | ZPSO 7 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Vestiaire Femme                                            |        |
|  |        |
| Tuyauteries -> Joints d'étanchéité                                                   |        |

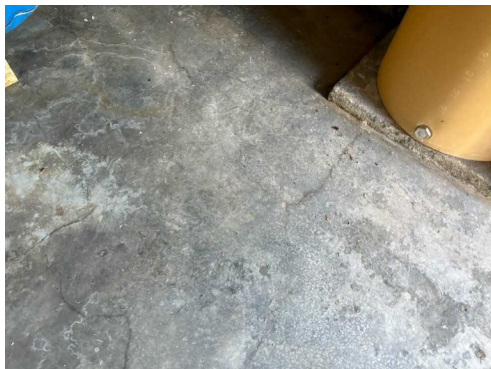
|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P54                                                                               | ZPSO 29 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 12                                               |         |
|  |         |
| Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés       |         |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P55                                                                                | ZPSO 29 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Bureau 12                                                |         |
|  |         |
| Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés        |         |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P49                                                                                | ZPSO 25 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Chaufferie                                               |         |
|  |         |
| Conduits -> Joints entre éléments, joints de brides                                |         |

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P49                                                                                 | ZPSO 25 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Chaufferie                                                |         |
|  |         |
| Conduits -> Joints entre éléments, joints de brides                                 |         |

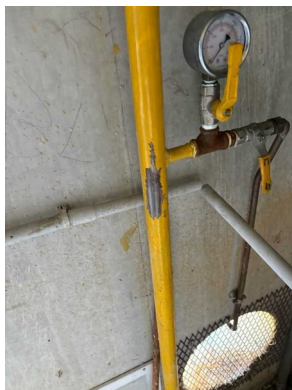
|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P42                                                                                 | ZPSO 23 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Chaufferie                                                |         |
|  |         |
| Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment                                     |         |

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P43                                                                                  | ZPSO 23 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Chaufferie                                                 |         |
|  |         |
| Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment                                      |         |

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P40                                                                               | ZPSO 22 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Chaufferie                                              |         |
|  |         |
| Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés       |         |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P44                                                                                | ZPSO 24 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Chaufferie                                               |         |
|  |         |
| Conduits -> Joints entre éléments, joints de brides                                |         |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P45                                                                                | ZPSO 26 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Chaufferie                                               |         |
|  |         |
| Equipements -> Peintures                                                           |         |

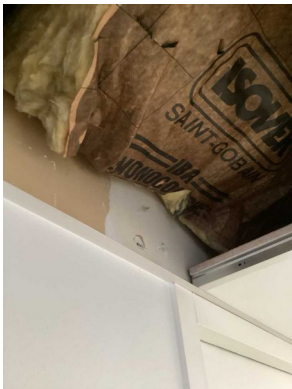
|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P46                                                                                 | ZPSO 26 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Chaufferie                                                |         |
|  |         |
| Equipements -> Peintures                                                            |         |

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P47                                                                                 | ZPSO 27 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Chaufferie                                                |         |
|  |         |
| Conduits -> Calorifugeages (Liste A)   Enveloppes de calorifuges                    |         |

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P52                                                                                  | ZPSO 29 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Degagement 2                                               |         |
|  |         |
| Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés          |         |

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P51                                                                               | ZPSO 29 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Degagement 2                                            |         |
|  |         |
| Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés       |         |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P56                                                                                | ZPSO 31 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Degagement 1                                             |         |
|  |         |
| Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés        |         |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P60                                                                                | ZPSO 32 |
| Bâtiment A et B -> RDC -> Degagement 1                                             |         |
|  |         |
| Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot                              |         |

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P5                                                                                  | ZPSO 4 |
| Bâtiment A et B -> Plénum bâtiment A et B                                           |        |
|  |        |
| Faux plafonds -> Pare-vapeur                                                        |        |

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P6                                                                                  | ZPSO 5 |
| Bâtiment A et B -> Plénum bâtiment A et B                                           |        |
|  |        |
| Conduits -> Rubans adhésifs                                                         |        |

|                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P7                                                                                   | ZPSO 5 |
| Bâtiment A et B -> Plénum bâtiment A et B                                            |        |
|  |        |
| Conduits -> Rubans adhésifs                                                          |        |

|                                                                                                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P22                                                                                                     | ZPSO 14 |
| Bâtiment A et B -> Extérieur Façades                                                                    |         |
|                        |         |
| Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs |         |

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P11                                                                                | ZPSO 6 |
| Bâtiment A et B -> Extérieur Façades                                               |        |
|  |        |
| Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité                                     |        |

### 7.3. Attestation d'assurance



#### Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

**Bureau Veritas S.A.**  
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc  
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

**Bureau Veritas Exploitation S.A.S.**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

##### Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

##### Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

##### Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
1 cours Michelet - CS 30051  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Siège social :  
Königinstrasse 28  
80802 Munich  
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312  
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne  
[www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

**RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:**

Tous dommages confondus  
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et  
par année d'assurance

**Période d'assurance :** du 1<sup>er</sup> janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.  
Pour la compagnie

  
Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
1 cours Michelet - CS 30051  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR 00 487 424 608

Signé par : Juliette Allavoine  
E-mail : juliette.allavoine@allianz.com  
Heure de signature : 2025-01-07 10:12:02  
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Succursale en France  
1 cours Michelet - CS 30051  
92076 Paris La Défense Cedex  
487 424 608 RCS Nanterre  
N° TVA intracommunautaire FR  
00 487 424 608

Siège social :  
Königinstrasse 28  
80802 Munich  
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312  
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne  
[www.agcs.allianz.com](http://www.agcs.allianz.com)

## 7.4. Certificat de compétence



Certificat N° C2031

Monsieur Vincent MONTAGNON

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com) conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :



|                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etat des installations intérieures d'électricité                                      | Certificat valable<br>Du 14/01/2024<br>au 13/01/2030 | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification. |
| Amiante avec mention                                                                  | Certificat valable<br>Du 26/07/2022<br>au 25/07/2029 | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification. |
| Constat de risque d'exposition au plomb                                               | Certificat valable<br>Du 07/11/2022<br>au 06/11/2029 | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification. |
| Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine | Certificat valable<br>Du 07/11/2022<br>au 06/11/2029 | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification. |
| Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments                         | Certificat valable<br>Du 01/11/2022<br>au 31/10/2029 | Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.                                                                                                                     |
| Etat des installations intérieures de gaz                                             | Certificat valable<br>Du 01/11/2022<br>au 31/10/2029 | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification. |

Date d'établissement le dimanche 01 septembre 2024

Marjorie ALBERT



Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.

Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com).

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17 rue Borel - 81100 Castres  
Tél. : 05 63 73 06 13 - [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com)  
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

## 7.5. Croquis de repérage

| PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE                       |                                                                              |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| La planche de repérage est indissociable du rapport |                                                                              |                   |
| ADRESSE                                             | District de Gironde<br>1 rue du Marechal Gallieni<br>33140 VILLENAVE D ORNON |                   |
| Localisation<br><br>Bâtiment A et B > RDC           | Date visite                                                                  | Le 25/07/2025     |
|                                                     | Auteur                                                                       | Vincent MONTAGNON |
|                                                     | N° dossier                                                                   | 27321885/S1/1     |
|                                                     | Planche                                                                      | 1 / 6             |
| Index<br>1                                          |                                                                              |                   |
| Vue utilisée :                                      |                                                                              |                   |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante :      |                                                                              |                   |



LEGENDE

● Prélèvement positif

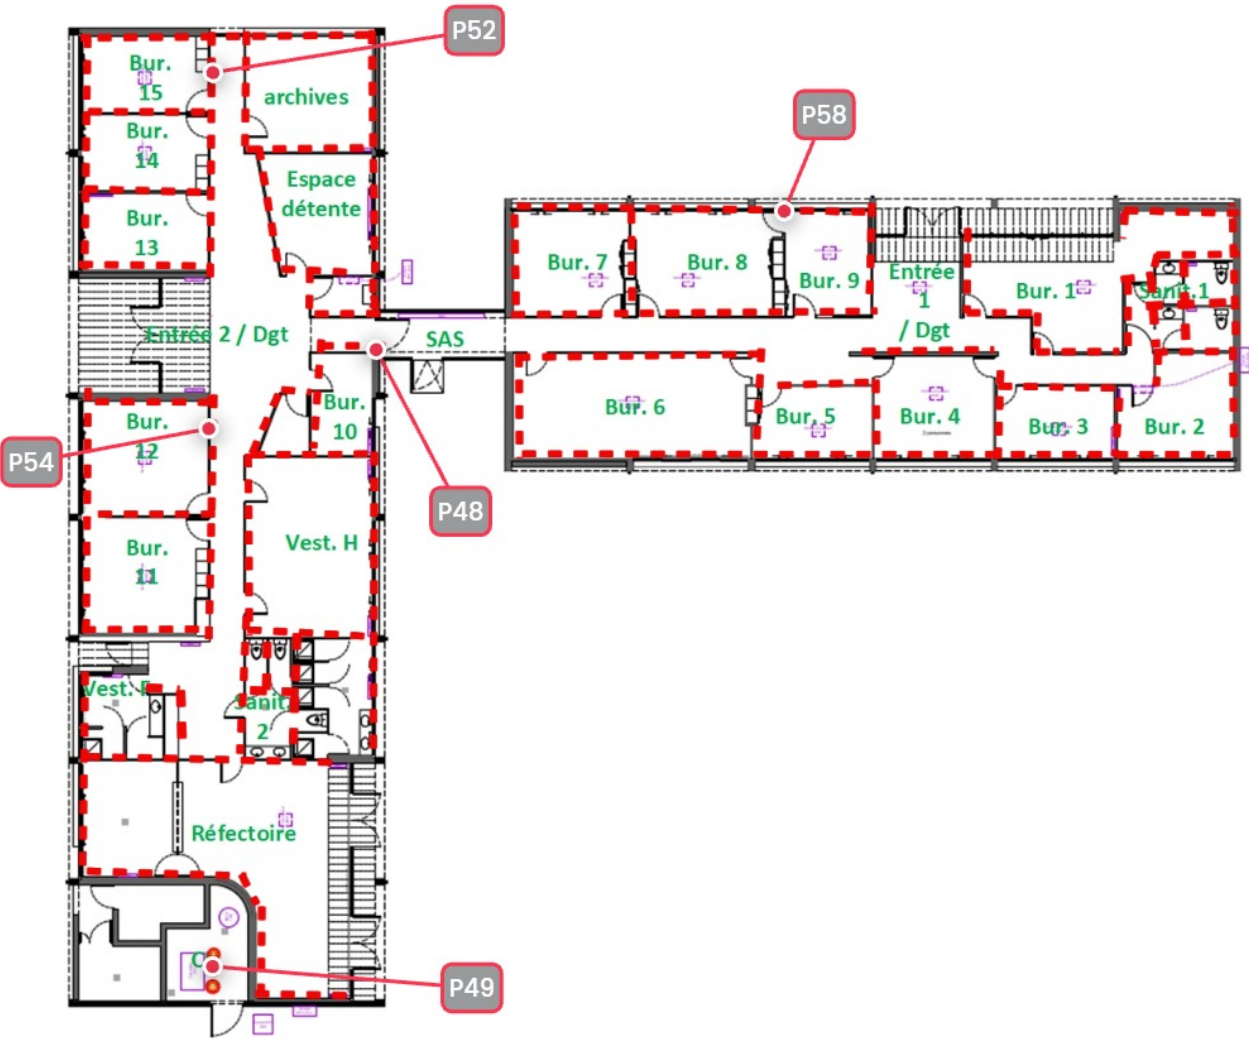
● Prélèvement négatif

● Sondage

● Inaccessibilité

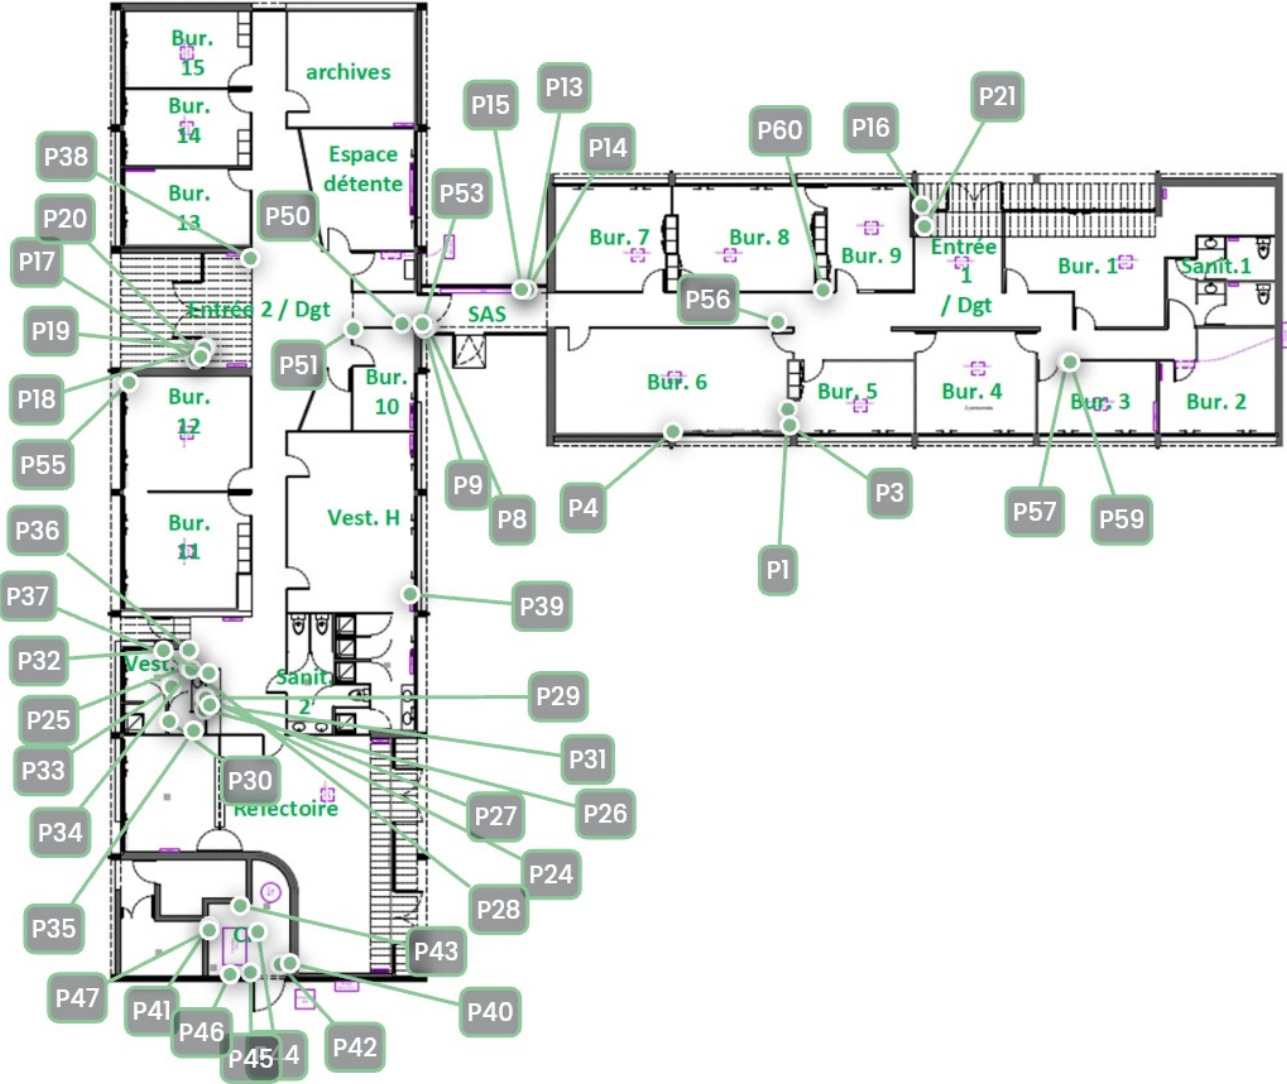
● Observation

| PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE                                                                                                                                 |                                                                              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| La planche de repérage est indissociable du rapport                                                                                                           |                                                                              |                   |
| ADRESSE                                                                                                                                                       | District de Gironde<br>1 rue du Marechal Gallieni<br>33140 VILLENAVE D ORNON |                   |
| Localisation<br><br>Bâtiment A et B › RDC                                                                                                                     | Date visite                                                                  | Le 25/07/2025     |
|                                                                                                                                                               | Auteur                                                                       | Vincent MONTAGNON |
|                                                                                                                                                               | N° dossier                                                                   | 27321885/S1/1     |
|                                                                                                                                                               | Planche                                                                      | 2 / 6             |
|                                                                                                                                                               | Indice                                                                       | 1                 |
| <b><u>Vue utilisée :</u></b><br><br>Prélèvement positif                                                                                                       |                                                                              |                   |
| <b><u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u></b><br><br>--- Enduits lissés, projetés ou talochés<br><br>● Joints entre éléments, joints de brides |                                                                              |                   |



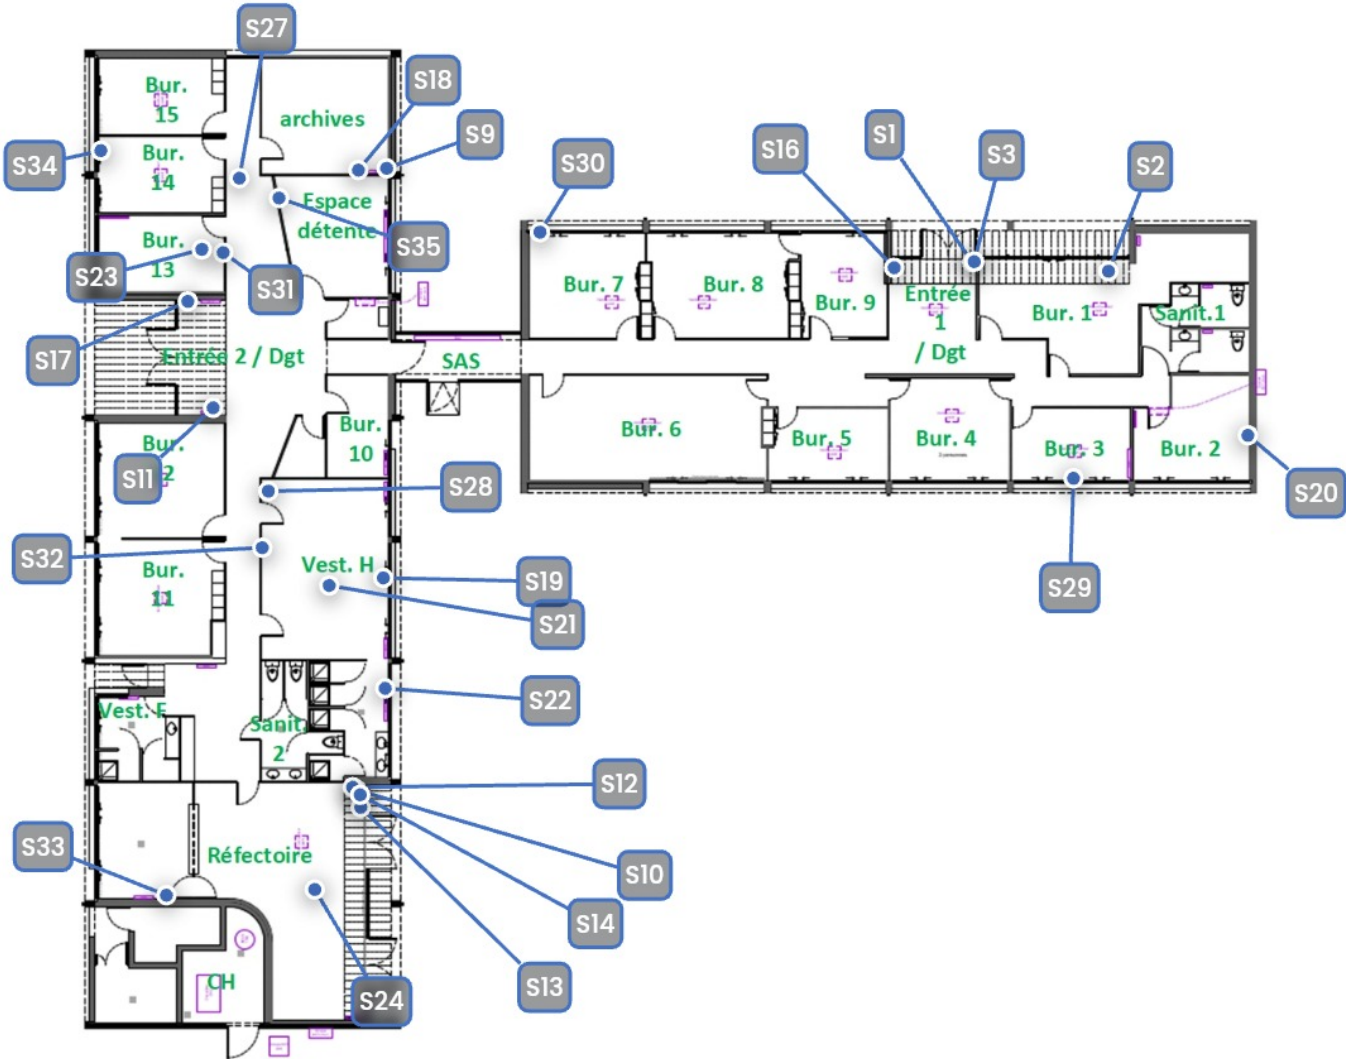
| LEGENDE | ● Prélèvement positif | ● Prélèvement négatif | ● Sondage | ● Inaccessibilité | ● Observation |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|

| PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE                                |                                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| La planche de repérage est indissociable du rapport          |                                                                              |                   |
| ADRESSE                                                      | District de Gironde<br>1 rue du Marechal Gallieni<br>33140 VILLENAVE D ORNON |                   |
| Localisation<br><br>Bâtiment A et B > RDC                    | Date visite                                                                  | Le 25/07/2025     |
|                                                              | Auteur                                                                       | Vincent MONTAGNON |
|                                                              | N° dossier                                                                   | 27321885/S1/1     |
|                                                              | Planche                                                                      | 3 / 6             |
|                                                              | Indice                                                                       | 1                 |
| <b><u>Vue utilisée :</u></b><br>Prélèvement négatif          |                                                                              |                   |
| <b><u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u></b> |                                                                              |                   |



| LEGENDE | ● Prélèvement positif | ● Prélèvement négatif | ● Sondage | ● Inaccessibilité | ● Observation |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|

| PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE                                |                                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| La planche de repérage est indissociable du rapport          |                                                                              |                   |
| ADRESSE                                                      | District de Gironde<br>1 rue du Marechal Gallieni<br>33140 VILLENAVE D ORNON |                   |
| Localisation<br><br>Bâtiment A et B › RDC                    | Date visite                                                                  | Le 25/07/2025     |
|                                                              | Auteur                                                                       | Vincent MONTAGNON |
|                                                              | N° dossier                                                                   | 27321885/S1/1     |
|                                                              | Planche                                                                      | 4 / 6             |
|                                                              | Indice                                                                       | 1                 |
| <b><u>Vue utilisée :</u></b><br><br>Sondage                  |                                                                              |                   |
| <b><u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u></b> |                                                                              |                   |

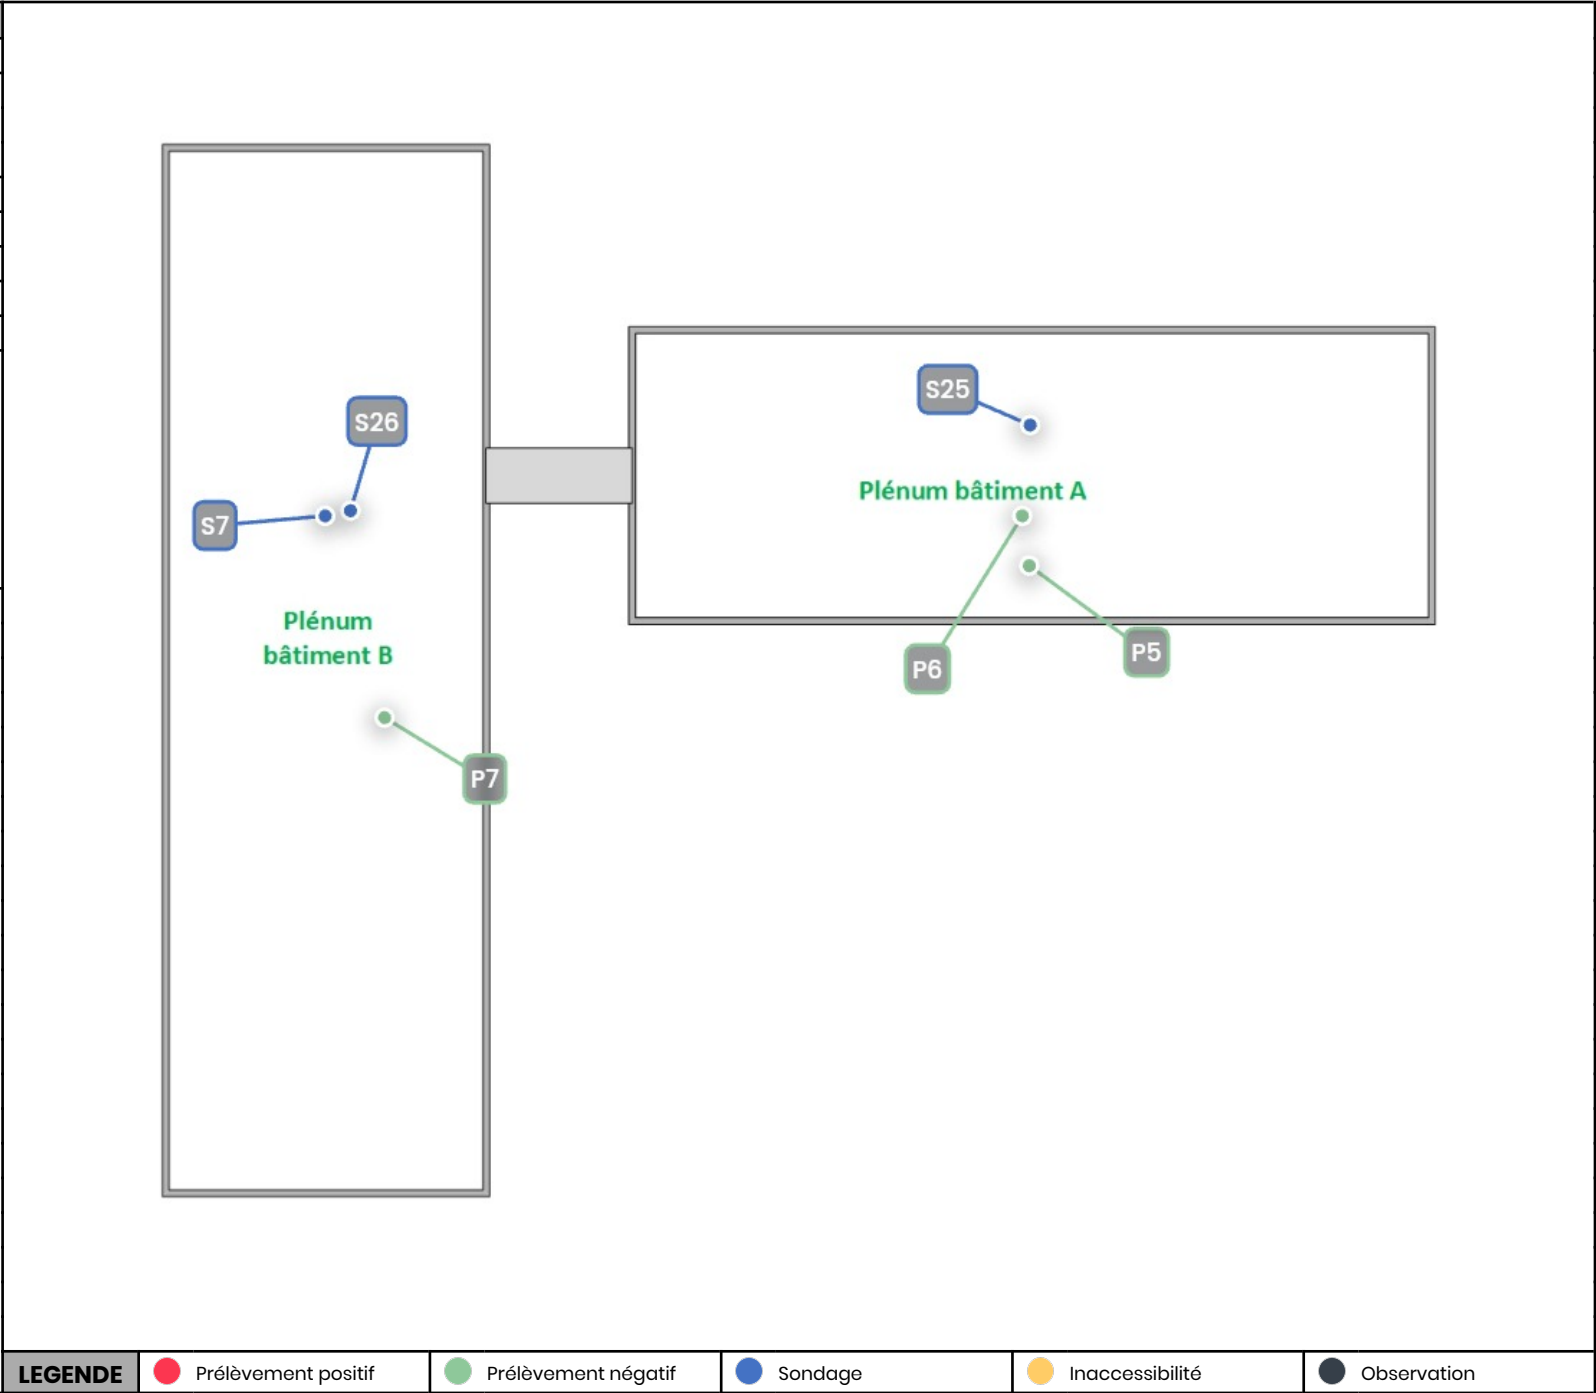


| LEGENDE | <span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif | <span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif | <span style="color: blue;">●</span> Sondage | <span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité | <span style="color: black;">●</span> Observation |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE                                   |                                                                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| La planche de repérage est indissociable du rapport             |                                                                              |                   |
| ADRESSE                                                         | District de Gironde<br>1 rue du Marechal Gallieni<br>33140 VILLENAVE D ORNON |                   |
| Localisation<br><br>Bâtiment A et B ><br>Plénum bâtiment A et B | Date visite                                                                  | Le 25/07/2025     |
|                                                                 | Auteur                                                                       | Vincent MONTAGNON |
|                                                                 | N° dossier                                                                   | 27321885/S1/1     |
|                                                                 | Planche                                                                      | 5 / 6             |
|                                                                 | Indice                                                                       | 1                 |

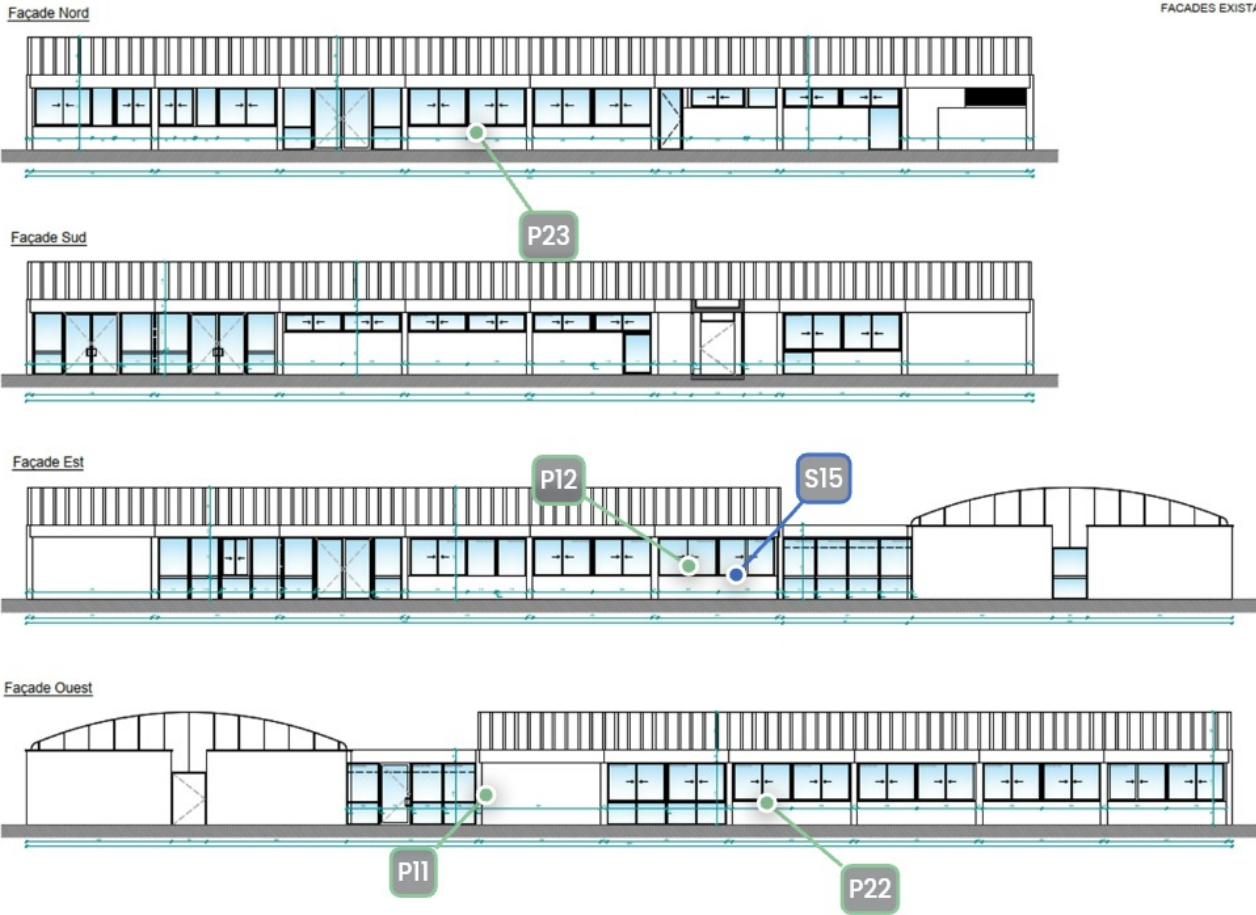
**Vue utilisée :**

**Matériaux et produits contenant de l'amiante :**



| PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE                              |                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| La planche de repérage est indissociable du rapport        |                                                                              |                   |
| ADRESSE                                                    | District de Gironde<br>1 rue du Marechal Gallieni<br>33140 VILLENAVE D ORNON |                   |
| Localisation<br><br>Bâtiment A et B ><br>Extérieur Façades | Date visite                                                                  | Le 25/07/2025     |
|                                                            | Auteur                                                                       | Vincent MONTAGNON |
|                                                            | N° dossier                                                                   | 27321885/S1/1     |
|                                                            | Planche                                                                      | 6 / 6             |
|                                                            | Indice                                                                       | 1                 |
| <u><b>Vue utilisée :</b></u>                               |                                                                              |                   |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Matériaux et produits contenant de l'amiante : |
|------------------------------------------------|



## 7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065719-01

Date d'émission de rapport : 02/08/2025 1:17

Page 1/13

Dossier N° : 25K025072

Date de réception : 29/07/2025

Date d'analyse : 30/07/2025

Référence dossier Client: 1510797383/27321885/S1/1/2\_27321885/1/1

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                             | Description visuelle                                                                                                                                   | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                               | Résultats                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                          |                                     |
| 001     | EUROFINS24000008<br>9355 Réf. Prel<br>: P1 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Bureau<br>6/Revêtements de<br>sol - (Lé/Gris)                                       | Matériau souple de type<br>revêtement de sol (gris)                                                                                                    | <b>MET *</b><br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
|         |                                                                                                                                                              | Matériau (gris) ; matériau<br>de type colle (jaune) ;<br>matériau semi-dur de<br>type ragréage (rose) ;<br>matériau de type mousse<br>(gris) en traces | <b>MET *</b><br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 002     | EUROFINS24000008<br>9354 Réf. Prel<br>: P3 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Bureau<br>6/Revêtements de<br>sol - (Ciment/Rose)                                   | Matériau semi-dur de<br>type ragréage (rouge) ;<br>matériau semi-dur<br>(marron)                                                                       | <b>MET *</b><br>/ U3GB        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 003     | EUROFINS24000008<br>9356 Réf. Prel<br>: P4 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Bureau 6/Cloisons<br>(légères et<br>préfabriquées) -<br>(Plaque de<br>plâtre/Blanc) | Matériau de type peinture<br>(blanc) ; matériau<br>semi-dur de type enduit<br>(blanc) ; matériau<br>semi-dur de type plâtre<br>(blanc)                 | <b>MET *</b><br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**

4 Chemin des Maures ,CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065719-01      Date d'émission de rapport : 02/08/2025 1:17      Page 2/13  
Dossier N° : 25K025072      Date de réception : 29/07/2025      Date d'analyse : 30/07/2025  
Référence dossier Client: 1510797383/27321885/S1/1/2\_27321885/1/1

| N° éch.    | Référence client                                                                                                               | Description visuelle                                                                                                                          | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                         | Résultats                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|            |                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                    |                                  |
| 004<br>(1) | EUROFINS24000008<br>9353 Réf. Prel : P5 Bâtiment A et B - Plénum bâtiment A et B/Faux plafonds - (Papier, Bitumé/Noir, Marron) | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|            |                                                                                                                                | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                       | <b>MOLP</b> *<br>/ Z2J2       | 2 / 2 *                       | - *                                                                                     | Fibres d'amiante non détectées * |
|            |                                                                                                                                | Matériau fibreux de type isolant (jaune)                                                                                                      | <b>MOLP</b> *<br>/ Z2J2       | 2 / 2 *                       | - *                                                                                     | Fibres d'amiante non détectées * |
| 005        | EUROFINS24000008<br>9351 Réf. Prel : P6 Bâtiment A et B - Plénum bâtiment A et B/Conduits - (Epais/Gris)                       | Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle (transparent)                                                                      | <b>MET</b> *<br>/ U3GB        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|            |                                                                                                                                | Matériau de type aluminium (gris)                                                                                                             | <b>MOLP</b> *<br>/ Z2J2       | 2 / 2 *                       | - *                                                                                     | Fibres d'amiante non détectées * |
| 006        | EUROFINS24000008<br>9352 Réf. Prel : P7 Bâtiment A et B - Plénum bâtiment A et B/Conduits - (Epais/Gris)                       | Matériau de type aluminium (gris) ; matériau de type colle (transparent)                                                                      | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|            |                                                                                                                                | Matériau de type aluminium (gris)                                                                                                             | <b>MOLP</b> *<br>/ Z2J2       | 2 / 2 *                       | - *                                                                                     | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)  
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065719-01      Date d'émission de rapport : 02/08/2025 1:17      Page 3/13  
 Dossier N° : 25K025072      Date de réception : 29/07/2025      Date d'analyse : 30/07/2025  
 Référence dossier Client: 1510797383/27321885/S1/1/2\_27321885/1/1

| N° éch. | Référence client                                                                                                     | Description visuelle                                                        | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                      | Résultats                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                      |                                                                             |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                 |                                  |
| 007     | EUROFINS24000008<br>9349 Réf. Prel : P8 Bâtiment A et B - RDC - SAS/Revêtements de sol - (Lé/Gris)                   | Matériau souple de type revêtement de sol (gris)                            | <b>MET</b> * / CF6U           | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|         |                                                                                                                      | Matériau (gris) ; matériau de type colle (jaune) (foncé)                    | <b>MET</b> * / CF6U           | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 008     | EUROFINS24000008<br>9348 Réf. Prel : P9 Bâtiment A et B - RDC - SAS/Revêtements de sol - (Ciment/Rose)               | Matériau semi-dur (marron) (beige) ; matériau de type polystyrène           | <b>MET</b> * / CF6U           | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 009     | EUROFINS24000008<br>9347 Réf. Prel : P11 Bâtiment A et B - Extérieur Façades/Menuiseries extérieures - (Mastic/Gris) | Matériau souple de type joint (gris)                                        | <b>MET</b> * / CF6U           | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 010     | EUROFINS24000008<br>9345 Réf. Prel : P12 Bâtiment A et B - Extérieur Façades/Menuiseries extérieures - (Mastic/Gris) | Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces | <b>MET</b> * / CF6U           | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)  
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065719-01      Date d'émission de rapport : 02/08/2025 1:17      Page 4/13  
 Dossier N° : 25K025072      Date de réception : 29/07/2025      Date d'analyse : 30/07/2025  
 Référence dossier Client: 1510797383/27321885/S1/1/2\_27321885/1/1

| N° éch. | Référence client                                                                                                                              | Description visuelle                                                                                    | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                               | Résultats                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                                                               |                                                                                                         |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                          |                                     |
| 011     | EUROFINS24000008<br>9344 Réf. Prel<br>: P13 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>SAS/Tuyauteries -<br>(Fibreux/Beige)                                | Matériau (gris) (fibreux) ;<br>matériau de type<br>poussières en traces                                 | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 012     | EUROFINS24000008<br>9342 Réf. Prel<br>: P14 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>SAS/Equipements -<br>(Epais/Blanc)                                  | Matériau de type peinture<br>(blanc) + (vert)                                                           | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 013     | EUROFINS24000008<br>9341 Réf. Prel<br>: P15 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>SAS/Equipements -<br>(Epais/Blanc)                                  | Matériau de type peinture<br>(de différentes couleurs)<br>(i)                                           | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 014     | EUROFINS24000008<br>9340 Réf. Prel<br>: P16 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Entrée 1 /<br>dégagement/Revête<br>ments de sol -<br>(Mortier/Gris) | Matériau dur de type<br>carrelage, faïence (gris) ;<br>matériau dur de type<br>ciment-colle (blanc)(ii) | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 015     | EUROFINS24000008<br>9338 Réf. Prel<br>: P17 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Entrée 2 /<br>dégagement/Revête<br>ments de sol -<br>(Mortier/Gris) | Matériau semi-dur<br>(blanc)                                                                            | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)  
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations  
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065719-01      Date d'émission de rapport : 02/08/2025 1:17      Page 5/13  
 Dossier N° : 25K025072      Date de réception : 29/07/2025      Date d'analyse : 30/07/2025  
 Référence dossier Client: 1510797383/27321885/S1/1/2\_27321885/1/1

| N° éch. | Référence client                                                                                                                              | Description visuelle                                                                                                                  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                               | Résultats                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                          |                                     |
| 016     | EUROFINS24000008<br>9339 Réf. Prel<br>: P18 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Entrée 2 /<br>dégagement/Revête<br>ments de sol -<br>(Mortier/Gris) | Matériau dur de type<br>carrelage, faïence<br>(beige) ; matériau dur de<br>type ciment-colle (gris) ;<br>matériau semi-dur<br>(blanc) | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 017     | EUROFINS24000008<br>9337 Réf. Prel<br>: P19 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Entrée 2 /<br>dégagement/Revête<br>ments de sol -<br>(Ciment/Gris)  | Matériau dur (noir)                                                                                                                   | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 018     | EUROFINS24000008<br>9336 Réf. Prel<br>: P20 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Entrée 2 /<br>dégagement/Revête<br>ments de sol -<br>(Ciment/Gris)  | Matériau semi-dur (gris)                                                                                                              | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 019     | EUROFINS24000008<br>9334 Réf. Prel<br>: P21 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Entrée 1 /<br>dégagement/Revête<br>ments de sol -<br>(Ciment/Gris)  | Matériau semi-dur (gris)<br>+ (blanc)                                                                                                 | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)  
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations  
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065719-01      Date d'émission de rapport : 02/08/2025 1:17      Page 6/13  
 Dossier N° : 25K025072      Date de réception : 29/07/2025      Date d'analyse : 30/07/2025  
 Référence dossier Client: 1510797383/27321885/S1/1/2\_27321885/1/1

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                                                   | Description visuelle                                                                               | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                               | Résultats                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                          |                                     |
| 020     | EUROFINS24000008<br>9333 Réf. Prel<br>: P22 Bâtiment<br>A et B - Extérieur<br>Façades/Façades<br>lourdes y compris<br>poteaux -<br>(Ciment/Gris)                                   | Matériau semi-dur de<br>type ciment (gris)<br>(granulaire)                                         | <b>MET</b> *<br>/ U3GB        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 021     | EUROFINS24000008<br>9343 Réf. Prel<br>: P23 Bâtiment<br>A et B - Extérieur<br>Façades/Façades<br>lourdes y compris<br>poteaux -<br>(Ciment/Gris)                                   | Matériau semi-dur (gris)                                                                           | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
|         |                                                                                                                                                                                    | Matériau souple (blanc)<br>(iii)                                                                   | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 022     | EUROFINS24000008<br>9291 Réf. Prel<br>: P24 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Vestiaire<br>Femme/Revêtements<br>de sol - (Mortier/Gris)                                                | Matériau dur de type<br>carrelage, faïence (gris) ;<br>matériau dur de type<br>ciment-colle (gris) | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 023     | EUROFINS24000008<br>9322 Réf. Prel<br>: P25 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Vestiaire<br>Femme/Revêtements<br>de murs, poteaux,<br>cloisons, gaines,<br>coffres -<br>(Mortier/Blanc) | Matériau dur de type<br>mortier, béton, chape<br>(blanc) (gris)                                    | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)  
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations  
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065719-01      Date d'émission de rapport : 02/08/2025 1:17      Page 7/13  
 Dossier N° : 25K025072      Date de réception : 29/07/2025      Date d'analyse : 30/07/2025  
 Référence dossier Client: 1510797383/27321885/S1/1/2\_27321885/1/1

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                                    | Description visuelle                                                                                              | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                         | Résultats                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                    |                                  |
| 024     | EUROFINS24000008<br>9320 Réf. Prel<br>: P26 Bâtiment<br>A et B - RDC - Vestiaire<br>Femme/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/Blanc) | Matériau semi-dur (gris)                                                                                          | <b>MET</b> *<br>/ U3GB        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 025     | EUROFINS24000008<br>9319 Réf. Prel<br>: P27 Bâtiment<br>A et B - RDC - Vestiaire<br>Femme/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)                                        | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (noir) | <b>MET</b> *<br>/ U3GB        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 026     | EUROFINS24000008<br>9318 Réf. Prel<br>: P28 Bâtiment<br>A et B - RDC - Vestiaire<br>Femme/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)          | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)                                                      | <b>MET</b> *<br>/ U3GB        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 027     | EUROFINS24000008<br>9317 Réf. Prel<br>: P29 Bâtiment<br>A et B - RDC - Vestiaire<br>Femme/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)          | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)                                                      | <b>MET</b> *<br>/ U3GB        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065719-01      Date d'émission de rapport : 02/08/2025 1:17      Page 8/13  
 Dossier N° : 25K025072      Date de réception : 29/07/2025      Date d'analyse : 30/07/2025  
 Référence dossier Client: 1510797383/27321885/S1/1/2\_27321885/1/1

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                   | Description visuelle                                                                       | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                      | Résultats                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                                                    |                                                                                            |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                 |                                  |
| 028     | EUROFINS24000008<br>9324 Réf. Prel<br>: P30 Bâtiment<br>A et B - RDC - Vestiaire<br>Femme/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Goutelette/Blanc) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(ii)           | <b>MET</b> *<br>/ U3GB        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 029     | EUROFINS24000008<br>9325 Réf. Prel<br>: P31 Bâtiment<br>A et B - RDC - Vestiaire<br>Femme/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Goutelette/Blanc) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)               | <b>MET</b> *<br>/ U3GB        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 030     | EUROFINS24000008<br>9316 Réf. Prel<br>: P32 Bâtiment<br>A et B - RDC - Vestiaire<br>Femme/Tuyauteries - (Fibreux/Beige)                            | Matériau de type maillage de fibres et liant (gris)                                        | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 031     | EUROFINS24000008<br>9315 Réf. Prel<br>: P33 Bâtiment<br>A et B - RDC - Vestiaire<br>Femme/Faux plafonds - (Rigide/Blanc)                           | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)  
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065719-01      Date d'émission de rapport : 02/08/2025 1:17      Page 9/13  
 Dossier N° : 25K025072      Date de réception : 29/07/2025      Date d'analyse : 30/07/2025  
 Référence dossier Client: 1510797383/27321885/S1/1/2\_27321885/1/1

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                                   | Description visuelle                                                                                                                          | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                      | Résultats                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                 |                                  |
| 032     | EUROFINS24000008<br>9314 Réf. Prel<br>: P34 Bâtiment<br>A et B - RDC - Vestiaire<br>Femme/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc) | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)                                                   | <b>MET</b> *<br>/ U3GB        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 033     | EUROFINS24000008<br>9313 Réf. Prel<br>: P35 Bâtiment<br>A et B - RDC - Vestiaire<br>Femme/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Blanc) | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)                                                   | <b>MET</b> *<br>/ U3GB        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 034     | EUROFINS24000008<br>9311 Réf. Prel<br>: P36 Bâtiment<br>A et B - RDC - Vestiaire<br>Femme/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Toile/Blanc)                      | Matériau de type peinture (blanc) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 035     | EUROFINS24000008<br>9312 Réf. Prel<br>: P37 Bâtiment<br>A et B - RDC - Vestiaire<br>Femme/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Toile/Blanc)                      | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (fibreuse)                                                       | <b>MET</b> *<br>/ U3GB        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)  
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065719-01      Date d'émission de rapport : 02/08/2025 1:17      Page 10/13  
 Dossier N° : 25K025072      Date de réception : 29/07/2025      Date d'analyse : 30/07/2025  
 Référence dossier Client: 1510797383/27321885/S1/1/2\_27321885/1/1

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                       | Description visuelle                                                                                 | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                               | Résultats                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                          |                                     |
| 036     | EUROFINS24000008<br>9310 Réf. Prel<br>: P38 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Entrée 2 /<br>dégagement/Faux<br>plafonds - (Laine de<br>verre/Blanc, Jaune) | Matériau de type peinture<br>(blanc) ; matériau<br>semi-dur fibreux de type<br>faux-plafonds (jaune) | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 037     | EUROFINS24000008<br>9309 Réf. Prel<br>: P39 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Vestiaire<br>Homme/Equipement<br>s - (Epais/Blanc)                           | Matériau semi-dur<br>(blanc) + (noir)                                                                | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 038     | EUROFINS24000008<br>9307 Réf. Prel<br>: P40 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Chaudière/Murs et<br>cloisons maçonnées<br>"en dur" -<br>(Ciment/Gris)       | Matériau semi-dur (gris)<br>(blanc)                                                                  | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 039     | EUROFINS24000008<br>9305 Réf. Prel<br>: P41 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Chaudière/Murs et<br>cloisons maçonnées<br>"en dur" -<br>(Ciment/Gris)       | Matériau semi-dur (gris)                                                                             | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)  
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations  
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065719-01      Date d'émission de rapport : 02/08/2025 1:17      Page 11/13  
 Dossier N° : 25K025072      Date de réception : 29/07/2025      Date d'analyse : 30/07/2025  
 Référence dossier Client: 1510797383/27321885/S1/1/2\_27321885/1/1

| N° éch. | Référence client                                                                                                                     | Description visuelle                                   | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                               | Résultats                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                                                      |                                                        |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                          |                                     |
| 040     | EUROFINS24000008<br>9304 Réf. Prel<br>: P42 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Chaufferie/Revêtem<br>nts de sol - (Ciment,<br>Chape/Gris) | Matériau semi-dur<br>(blanc) (marron)                  | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 041     | EUROFINS24000008<br>9303 Réf. Prel<br>: P43 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Chaufferie/Revêtem<br>nts de sol - (Ciment,<br>Chape/Gris) | Matériau semi-dur (gris)<br>(marron)                   | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 042     | EUROFINS24000008<br>9302 Réf. Prel<br>: P44 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Chaufferie/Conduits -<br>(Compact/)                        | Matériau semi-dur<br>(marron)                          | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 043     | EUROFINS24000008<br>9299 Réf. Prel<br>: P45 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Chaufferie/Equipeme<br>nts - (Epais/Jaune)                 | Matériau de type peinture<br>(jaune) + (orange)        | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |
| 044     | EUROFINS24000008<br>9298 Réf. Prel<br>: P46 Bâtiment<br>A et B - RDC -<br>Chaufferie/Equipeme<br>nts - (Epais/Jaune)                 | Matériau de type peinture<br>(de différentes couleurs) | <b>MET</b> *<br>/ UGT2        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)  
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations  
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065719-01      Date d'émission de rapport : 02/08/2025 1:17      Page 12/13  
 Dossier N° : 25K025072      Date de réception : 29/07/2025      Date d'analyse : 30/07/2025  
 Référence dossier Client: 1510797383/27321885/S1/1/2\_27321885/1/1

| N° éch. | Référence client                                                                                                                    | Description visuelle                                                         | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                      | Résultats                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|         |                                                                                                                                     |                                                                              |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                 |                                       |
| 045     | EUROFINS24000008<br>9306 Réf. Prel : P47 Bâtiment A et B - RDC - Chaufferie/Conduits - (Laine de verre/Jaune)                       | Matériau souple (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)            | <b>MET</b> * / CF6U           | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
|         |                                                                                                                                     | Matériau fibreux de type isolant (jaune)(iv)                                 | <b>MOLP</b> * / Z2J2          | 2 / 2 *                       | - *                                                                                  | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 046     | EUROFINS24000008<br>9346 Réf. Prel : P48 Bâtiment A et B - RDC - SAS/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plaque de plâtre/Blanc) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) | <b>MET</b> * / UGT2           | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
| 047     | EUROFINS24000008<br>9301 Réf. Prel : P49 Bâtiment A et B - RDC - Chaufferie/Conduits - (Rigide/Beige)                               | Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)                            | <b>MOLP</b> * / Z2J2          | 2 / 2 *                       | - *                                                                                  | Fibres d'amiante de type chrysotile * |

### Observation(s) échantillon(s)

- (1) Des fibres minérales ont été détectées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 micromètres), ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification optique

### Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.  
 (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.  
 (iii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.  
 (iv) Des fibres minérales ont été détectées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 micromètres), ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification optique

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s)  
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**

4 Chemin des Maures ,CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-065719-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2025 1:17 Page13/13  
Dossier N° : 25K025072 Date de réception : 29/07/2025 Date d'analyse : 30/07/2025  
Référence dossier Client:1510797383/27321885/S1/1/2\_27321885/1/1

### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre ( $\mu\text{m}$ )"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), ), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Nathan Pouquette  
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS**

**Monsieur Vincent MONTAGNON**

30 Avenue Gustave Eiffel

33615 PESSAC CEDEX

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-067901-01

Date d'émission de rapport : 15/08/2025 3:42

Page1/5

Dossier N° : 25K026524

Date de réception : 11/08/2025

Date d'analyse : 14/08/2025

Référence dossier Client:1510797383/27321885/S1/1/3\_27321885/1/1

| N° éch. | Référence client                                                                                                                               | Description visuelle                                                                                                                                                                         | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                         | Résultats                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                    |                                  |
| 001     | EUROFINS24000001<br>6421 Réf. Prel : P50 Bâtiment A et B - RDC - SAS/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Plaque de plâtre/Blanc)            | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|         |                                                                                                                                                | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                                                                      | <b>MOLP</b> *<br>/ Z2J2       | 2 / 2 *                       | - *                                                                                     | Fibres d'amiante non détectées * |
| 002     | EUROFINS24000008<br>7221 Réf. Prel : P51 Bâtiment A et B - RDC - Degagement 2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Peint, Plâtre, Fin/Blanc) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)            | <b>MET</b> *<br>/ CF6U        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|         |                                                                                                                                                | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                                                                      | <b>MOLP</b> *<br>/ Z2J2       | 2 / 2 *                       | - *                                                                                     | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**

4 Chemin des Maures ,CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-067901-01      Date d'émission de rapport : 15/08/2025 3:42      Page 2/5  
 Dossier N° : 25K026524      Date de réception : 11/08/2025      Date d'analyse : 14/08/2025  
 Référence dossier Client: 1510797383/27321885/S1/1/3\_27321885/1/1

| N° éch.    | Référence client                                                                                                                               | Description visuelle                                                                                                                                                                                         | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                         | Résultats                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                    |                                       |
| 003        | EUROFINS24000008<br>7224 Réf. Prel : P52 Bâtiment A et B - RDC - Degagement 2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Peint, Plâtre, Fin/Blanc) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)                            | <b>MET *</b> / CF6U           | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
|            |                                                                                                                                                | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                                                                                      | <b>MOLP *</b> / Z2J2          | 2 / 2 *                       | - *                                                                                     | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 004        | EUROFINS24000008<br>7225 Réf. Prel : P53 Bâtiment A et B - RDC - SAS/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Peint, Plâtre, Fin/Blanc)          | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) en traces | <b>MET *</b> / U3GB           | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
|            |                                                                                                                                                | Matériau souple fibreux de type papier, carton                                                                                                                                                               | <b>MOLP *</b> / Z2J2          | 2 / 2 *                       | - *                                                                                     | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 005<br>(1) | EUROFINS24000008<br>7222 Réf. Prel : P54 Bâtiment A et B - RDC - Bureau 12/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Peint, Plâtre, Fin/Blanc)    | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (blanc) (plâtres)                                                                                                             | <b>MET *</b> / U3GB           | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-067901-01      Date d'émission de rapport : 15/08/2025 3:42      Page 3/5  
 Dossier N° : 25K026524      Date de réception : 11/08/2025      Date d'analyse : 14/08/2025  
 Référence dossier Client: 1510797383/27321885/S1/1/3\_27321885/1/1

| N° éch.    | Référence client                                                                                                                            | Description visuelle                                                                                                                                                              | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                         | Résultats                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                    |                                  |
| 006<br>(1) | EUROFINS24000008<br>7226 Réf. Prel : P55 Bâtiment A et B - RDC - Bureau 12/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Peint, Plâtre, Fin/Blanc) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | <b>MET *</b><br>/ U3GB        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|            |                                                                                                                                             | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                                                           | <b>MOLP *</b><br>/ Z2J2       | 2 / 2 *                       | - *                                                                                     | Fibres d'amiante non détectées * |
| 007<br>(1) | EUROFINS24000008<br>7223 Réf. Prel : P56 Bâtiment A et B - RDC - Degagement 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Peint, Plâtre, Mince/) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | <b>MET *</b><br>/ EU83        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 008<br>(1) | EUROFINS24000008<br>7228 Réf. Prel : P57 Bâtiment A et B - RDC - Bureau 3/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Peint, Plâtre, Mince/)     | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | <b>MET *</b><br>/ EU83        | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
|            |                                                                                                                                             | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                                                           | <b>MOLP *</b><br>/ Z2J2       | 2 / 2 *                       | - *                                                                                     | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-067901-01      Date d'émission de rapport : 15/08/2025 3:42      Page4/5  
 Dossier N° : 25K026524      Date de réception : 11/08/2025      Date d'analyse : 14/08/2025  
 Référence dossier Client:1510797383/27321885/S1/1/3\_27321885/1/1

| N° éch.    | Référence client                                                                                                                           | Description visuelle                                                                                                                                                                                               | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                                         | Résultats                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                                                    |                                       |
| 009<br>(1) | EUROFINS24000008<br>7318 Réf. Prel : P58 Bâtiment A et B - RDC - Bureau 9/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Peint, Plâtre, Mince/)    | Matériau de type peinture (gris) + (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)                                                                    | <b>MET</b> * / EU83           | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile * |
|            |                                                                                                                                            | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                                                                                            | <b>MOLP</b> * / Z2J2          | 2 / 2 *                       | - *                                                                                     | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 010        | EUROFINS24000008<br>7229 Réf. Prel : P59 Bâtiment A et B - RDC - Bureau 3/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Blanc)     | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)   | <b>MET</b> * / U3GB           | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
|            |                                                                                                                                            | Matériau souple fibreux de type papier, carton                                                                                                                                                                     | <b>MOLP</b> * / Z2J2          | 2 / 2 *                       | - *                                                                                     | Fibres d'amiante non détectées *      |
| 011        | EUROFINS24000008<br>7227 Réf. Prel : P60 Bâtiment A et B - RDC - Degagement 1/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Blanc) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron)(i) | <b>MET</b> * / CF6U           | 1 / 1 *                       | Calcination<br>attaque acide<br>broyage<br>mécanique<br>(méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées *      |
|            |                                                                                                                                            | Matériau souple fibreux de type papier, carton                                                                                                                                                                     | <b>MOLP</b> * / Z2J2          | 2 / 2 *                       | - *                                                                                     | Fibres d'amiante non détectées *      |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-067901-01 Date d'émission de rapport : 15/08/2025 3:42 Page5/5  
Dossier N° : 25K026524 Date de réception : 11/08/2025 Date d'analyse : 14/08/2025  
Référence dossier Client:1510797383/27321885/S1/1/3\_27321885/1/1

### Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

### Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), ), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Nathan Pouquette  
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**

4 Chemin des Maures ,CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

