



DETACHEMENT D'INFRASTRUCTURE DE
LA DEFENSE DE GUADELOUPE
CS 70011 BAIE MAHAULT

97189 JARRY CEDEX
A l'attention de M RAPHAEL LACOUR

**REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT
TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI**

Code prestation : CDAM0160-3



RAPPORT N°:

**A418880GUA02005.VILLA-
21_20062018_VILLA21**

Ce rapport annule et remplace le rapport N° : LA
VERSION DU 02/07/2018

Lieu d'intervention :

**VILLA21
Site militaire
MARIGOT**

97133 SAINT BARTH

N° D'AFFAIRE :A418880GUA02005.VILLA-21 / 20062018

RAPPORT ETABLI LE : 02/07/2018



Agence de Guadeloupe
Immeuble Manattan, Impasse des Palétuviers
Voie Verte, Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT - GUADELOUPE
N° SIRET : 39316827300232
Tél : 05 90 26 87 05 - Fax : 05 90 26 86 84

Agence de Guadeloupe
Immeuble Manattan, Impasse des Palétuviers
Voie Verte, Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT - GUADELOUPE

VILLA21
Site militaire
MARIGOT
97133 SAINT BARTH

Tél. : 05 90 26 87 05
Fax : 05 90 26 86 84
SIRET : 39316827300232

Date d'intervention : 20/06/2018

REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Ce rapport annule et remplace le rapport N° : LA VERSION DU 02/07/2018

**Adresse d'expédition : DETACHEMENT D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE GUADELOUPE
CS 70011 BAIE MAHAULT
97189 JARRY CEDEX**

A l'attention de M RAPHAEL LACOUR

Intervenant :
M Frédéric FAVRY

Accompagné par :
Absence d'accompagnant

Signature :



Ce rapport comprend 20 pages.
Il est remis contre accusé de réception.

Avertissement : Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité

SOMMAIRE

1. SYNTHESE DES RESULTATS	4
1.1. Conclusions	4
1.2. Synthèse du repérage	4
1.3. Investigations non réalisées	4
1.4. Préconisations	5
2. GENERALITES	6
2.1. Objectif de la prestation	6
2.2. Références réglementaires	6
2.3. Compétence de l'opérateur	6
2.4. Analyse des échantillons	6
2.5. Commentaires relatifs au déroulement de la prestation	6
2.6. Rapport(s) précédent(s)	6
3. DESCRIPTION DU OU DES IMMEUBLES BATIS	7
3.1. Donneur d'ordre	7
3.2. Périmètre de la prestation	7
3.3. périmètre des travaux	7
4. SCHEMA DE LOCALISATION	8
5. BULLETIN D'ANALYSE DES MATERIAUX	9
6. CERTIFICAT DE COMPETENCE	16
7. ATTESTATION D'ASSURANCE	17
8. ALBUM PHOTO	19

1. SYNTHESE DES RESULTATS

1.1. Conclusions

➤ **Nous avons recensé des matériaux et produits contenant de l'amiante** selon le programme de repérage figurant dans le tableau A1 de la norme NF X 46 020, dans le périmètre des travaux défini dans le paragraphe 3.2 et pour ce qui concerne **les parties de l'immeuble rendues accessibles lors de notre intervention.**

1.2. Synthèse du repérage

a) MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE:

LOCALISATION ETAGE, LOCAUX OU ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	MATERIAUX ET PRODUITS	CRITERES AYANT PERMIS DE CONCLURE
Rez de chaussée Murs interieur VILLA 21	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de ciment projetés, lissés ou talochés chambre 01	Analyse prélèvement Réf PV : AMI1806-9299 -P1/21 - 1/7_1
Rez de chaussée Murs interieur VILLA 21	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de ciment projetés, lissés ou talochés chambre 02	Analyse prélèvement Réf PV : AMI1806-9300 -P2/21 - 2/7_2
Rez de chaussée Murs interieur VILLA 21	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de ciment projetés, lissés ou talochés cuisine	Analyse prélèvement Réf PV : AMI1806-9301 -P3/21 - 3/7_3
Rez de chaussée Murs interieur VILLA 21	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de ciment projetés, lissés ou talochés cellier	Analyse prélèvement Réf PV : AMI1806-9303 -P5/21 - 5/7_5
Rez de chaussée Murs interieur VILLA 21	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de ciment projetés, lissés ou talochés SDB	Analyse prélèvement Réf PV : AMI1806-9305 -P7/21 - 7/7_7

b) MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE :

ETAGE, LOCAUX OU ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	MATERIAUX ET PRODUITS	CRITERES AYANT PERMIS DE CONCLURE
Rez de chaussée Murs interieur VILLA 21	Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des faïences cuisine	Analyse prélèvement Réf PV : AMI1806-9302 -P4/21 - 4/7_4
Rez de chaussée Murs interieur VILLA 21	Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de ciment projetés, lissés ou talochés wc	Analyse prélèvement Réf PV : AMI1806-9304 -P6/21 - 6/7_6

1.3. Investigations non réalisées

a) Composants de la construction nécessitant des investigations approfondies

La localisation des investigations approfondies à réaliser avec le nombre et les caractéristiques des sondages pour chaque composant de la construction est précisée dans le tableau ci-dessous.

LOCALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	PARTIE DU COMPOSANT A SONDER	NOMBRE ET CARACTERISTIQUES DES SONDAGES A REALISER
néant		

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété,

- à l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités**
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées**

1.4. Préconisations

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modifications du périmètre ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'une investigation complémentaire appropriée dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

2. GENERALITES

2.1. Objectif de la prestation

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante dont le donneur d'ordre doit disposer avant réalisation de travaux dans un immeuble.

2.2. Références réglementaires

- Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,
- Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
- Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Articles L 4412-2, 4531-1, L4121-3 et R4412-97 du Code du travail
- Tableau A1 de la Norme NF X 46 020 d'Août 2017.

2.3. Compétence de l'opérateur

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

APAVE CERTIFICATION
191 RUE DE VAUGIRARD
75738 PARIS CEDEX15

2.4. Analyse des échantillons

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

Nom et Adresse du laboratoire :

CARSO : 4 Avenue Jean Moulin - 69200 VENISSIEUX
Numéro Accréditation : 1-1531

2.5. Commentaires relatifs au déroulement de la prestation

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les principaux éléments de la construction et dans le cadre des travaux réalisés dans l'immeuble cité en page de garde.

Ces informations sont nécessaires pour la définition des zones présentant des similitudes d'ouvrage (les parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables) car elles correspondent à la base de nos investigations.

Les résultats d'analyses des prélèvements effectués sont alors, par hypothèse, généralisés sur l'ensemble des composants, types de matériaux et produits ayant les mêmes caractéristiques.

En cas d'omissions ou d'imprécisions dans les informations fournies à l'opérateur ou de modifications du périmètre de repérage des investigations complémentaires pourraient s'avérer nécessaires ultérieurement.

reperage effectué dans le cadre de prévision de travaux remplacement menuiserie et remplacement meuble cuisine

2.6. Rapport(s) précédent(s)

Néant

Notre rapport prend en compte les documents techniques fournis en l'état.

3. DESCRIPTION DU OU DES IMMEUBLES BATIS

Villa de plain pied en béton toiture bac aciers

3.1. Donneur d'ordre

Nom ou raison sociale : DETACHEMENT D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE GUADELOUPE
Adresse : CS 70011 BAIE MAHAULT
Code postal : 97189
Ville : JARRY CEDEX

3.2. Périmètre de la prestation

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité.

a) Liste des locaux visités

L'objet du présent rapport concerne la ou les partie(s) d'immeubles bâtis décrite(s) dans le tableau suivant :

PARTIE D'IMMEUBLE	LOCAUX
Rez de chaussée	Murs interieur / VILLA 21

Le donneur d'ordre nous a communiqué les documents et informations suivants :

- Fonction principale du bâtiment : Habitation (maisons individuelles)
- Le périmètre de repérage : murs intérieur de l'ensemble de la villa
- Les plans des immeubles : plan de la villa
- La date de délivrance du permis de construire ou années de construction et de réhabilitation : <01/07/1997
- Les bulletins de caractérisation des matériaux et produits suivants : Néant
- Le programme détaillé des travaux : oui

En cas d'omissions ou d'imprécisions dans les informations fournies à l'opérateur, des investigations complémentaires pourraient s'avérer nécessaires ultérieurement.

3.3. périmètre des travaux

a. Programme de travaux


Le programme des travaux (en pièces jointes) à l'origine de ce repérage, a été défini par le document de référence Remplacement menuiseries et aménagement cuisine rédigé par DETSID le 20/06/2018

b. Nature et la localisation des travaux antérieurs de rénovation ou de réaménagement

Absence de travaux antérieurs signalés par l'accompagnateur représentant désigné par l'exploitant et/ou le maître d'ouvrage et/ou le donneur d'ordre.

4. SCHEMA DE LOCALISATION

LOCALISATION

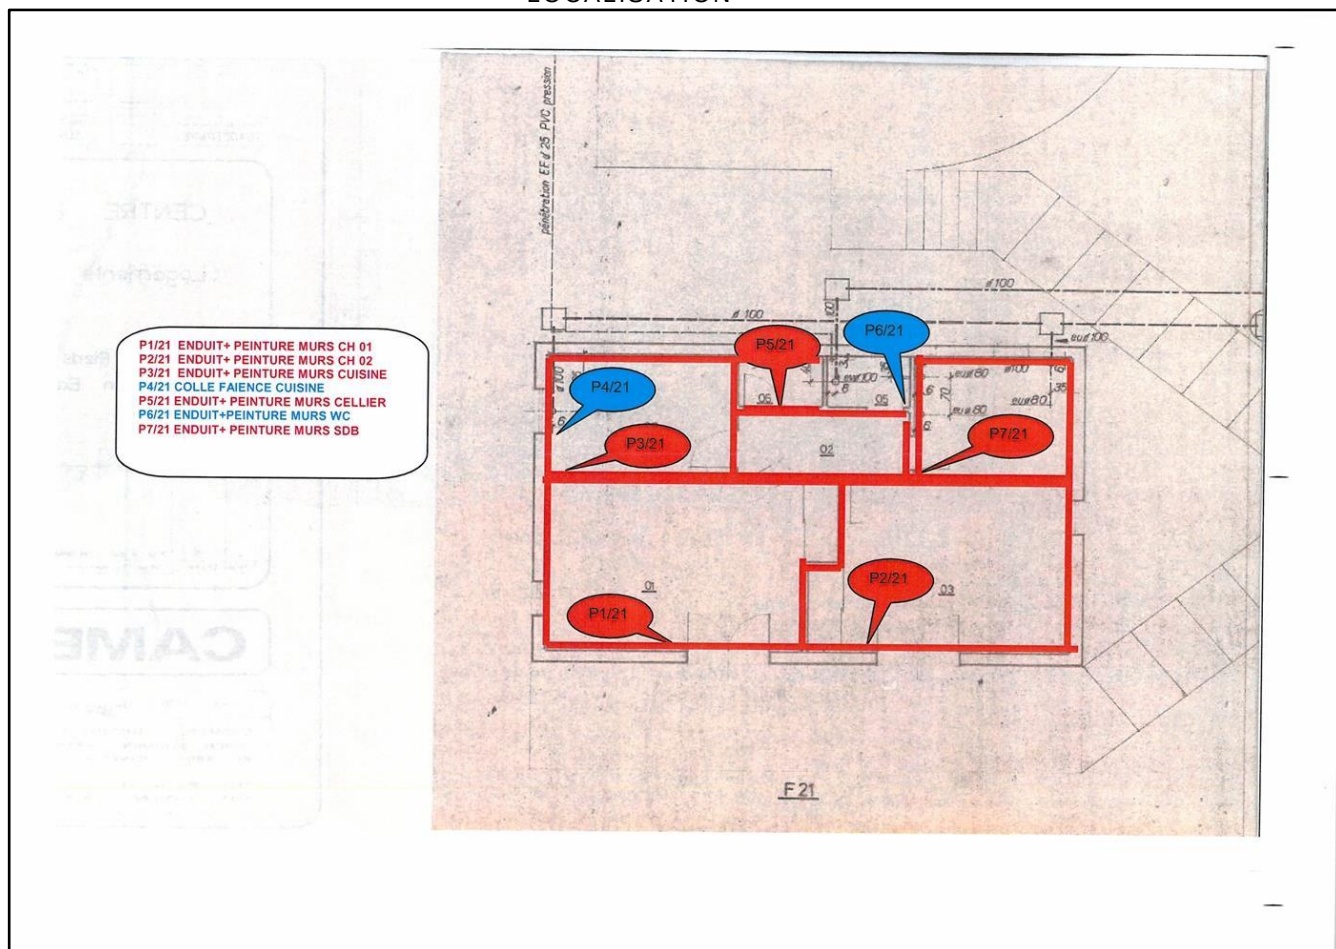

5. BULLETIN D'ANALYSE DES MATERIAUX

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Département Amiante
4, avenue Jean Moulin - CS 30228
69633 VENISSIEUX CEDEX
Tél. : (33) 04 72 76 16 39
Fax : (33) 04 78 72 00 67

Rapport d'analyse Page 1 / 1
Edité le : 29/06/2018



APAVE PARSIEUNE SAS
Frédéric FAVRY
Immeuble Manathan - Imp. des Palétuviers
Voie Verte - ZI de Jarry
97122 BAIE MAHAULT - GUADELOUPE

Identification dossier :	AMI18-7667	Référence contrat :	AMIC11-24
Identification échantillon :	AMI1806-9299 -1		
Enregistré le :	26/06/2018		
Doc Adm Client :	1042740		
Référence client :	18880GUA02005001 / P1/21 - 1/7		
Site :	Non spécifié		
Localisation :	murs CH 01 villa 21		
Nature de l'échantillon :	enduit+peinture		

Paramètres analytiques	Données	COFRAC
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit		
Paramètres généraux		
Description de l'échantillon reçu	Matériau granuleux dur gris + peinture blanche	
AMIANTE par META (Microscopie Electronique à Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050		
Résultat final		
Phase analysée	Matériau granuleux dur gris + peinture blanche (indissociables)	
Présence/Absence d'AMIANTE	POSITIF	#
Variété d'amiante	Chrysotile	#
Paramètres analytiques		
Nombre de préparations	1	#

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les données concernant la réception, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Mickael CARREIRA
Responsable adjoint de Laboratoire



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Département Amiante
4, avenue Jean Moulin - CS 30228
69633 VENISSIEUX CEDEX
Tél. : (33) 04 72 76 16 39
Fax : (33) 04 78 72 00 67



Rapport d'analyse Page 1 / 1

Edité le : 29/06/2018

APAVE PARSIIENNE SAS
Frédéric FAVRY
Immeuble Manathan - Imp. des Palétuviers
Voie Verte - ZI de Jarry
97122 BAIE MAHAULT - GUADELOUPE

Identification dossier :	AMI18-7667	Référence contrat :	AMIC11-24
Identification échantillon :	AMI1806-9300 -1		
Enregistré le :	26/06/2018		
Doc Adm Client :	1042740		
Référence client :	18880GUA02005001 / P2/21 - 2/7		
Site :	Non spécifié		
Localisation :	mursCH02 villa 21		
Nature de l'échantillon :	enduit+peinture		

Paramètres analytiques	Données	COFRAC
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit		
Paramètres généraux		
Description de l'échantillon reçu	Matériau granuleux dur gris + peinture blanche	
AMIANTE par META (Microscopie Electronique à Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050		
Résultat final		
Phase analysée	Matériau granuleux dur gris + peinture blanche (indissociables)	
Présence/Absence d'AMIANTE	POSITIF	#
Variété d'amiante	Chrysotile	#
Paramètres analytiques		
Nombre de préparations	1	#

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les données concernant la réception, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Mickael CARREIRA
Responsable adjoint de Laboratoire



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Département Amiante
4, avenue Jean Moulin - CS 30228
69633 VENISSIEUX CEDEX
Tél. : (33) 04 72 76 16 39
Fax : (33) 04 78 72 00 67

Rapport d'analyse Page 1 / 1

Edité le : 29/06/2018



APAVE PARSIIENNE SAS
Frédéric FAVRY
Immeuble Manathan - Imp. des Palétuviers
Voie Verte - ZI de Jarry
97122 BAIE MAHAULT - GUADELOUPE

Identification dossier :	AMI18-7667	Référence contrat :	AMIC11-24
Identification échantillon :	AMI1806-9301 -1		
Enregistré le :	26/06/2018		
Doc Adm Client :	1042740		
Référence client :	18880GUA02005001 / P3/21 - 3/7		
Site :	Non spécifié		
Localisation :	murs cuisine villa 21		
Nature de l'échantillon :	enduit+peinture		

Paramètres analytiques	Données	COFRAC
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit		
Paramètres généraux		
Description de l'échantillon reçu	Matériau granuleux dur gris + peinture blanche	
AMIANTE par META (Microscopie Electronique à Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050		
Résultat final		
Phase analysée	Matériau granuleux dur gris + peinture blanche (indissociables)	
Présence/Absence d'AMIANTE	POSITIF	#
Variété d'amiante	Chrysotile	#
Paramètres analytiques		
Nombre de préparations	1	#

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les données concernant la réception, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Mickael CARREIRA
Responsable adjoint de Laboratoire



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Département Amiante
4, avenue Jean Moulin - CS 30228
69633 VENISSIEUX CEDEX
Tél. : (33) 04 72 76 16 39
Fax : (33) 04 78 72 00 67

Rapport d'analyse Page 1 / 1

Edité le : 29/06/2018



APAVE PARSIIENNE SAS
Frédéric FAVRY
Immeuble Manathan - Imp. des Palétuviers
Voie Verte - ZI de Jarry
97122 BAIE MAHAULT - GUADELOUPE

Identification dossier :	AMI18-7667	Référence contrat :	AMIC11-24
Identification échantillon :	AMI1806-9302 -1		
Enregistré le :	26/06/2018		
Doc Adm Client :	1042740		
Référence client :	18880GUA02005001 / P4/21 - 4/7		
Site :	Non spécifié		
Localisation :	faïences cuisine villa 21		
Nature de l'échantillon :	colle		

Paramètres analytiques	Données	COFRAC
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit		
Paramètres généraux		
Description de l'échantillon reçu	Matériaux granuleux durs gris + peinture blanche + carrelage blanc	
AMIANTE par META (Microscopie Electronique à Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050		
Résultat final		
Phase analysée	Matériaux granuleux durs gris + peinture blanche indissociables	
Présence/Absence d'AMIANTE	NEGATIF	#
Paramètres analytiques		
Nombre de préparations	1	#

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les données concernant la réception, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Mickael CARREIRA
Responsable adjoint de Laboratoire



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Département Amiante
4, avenue Jean Moulin - CS 30228
69633 VENISSIEUX CEDEX
Tél. : (33) 04 72 76 16 39
Fax : (33) 04 78 72 00 67

Rapport d'analyse Page 1 / 1

Edité le : 29/06/2018



APAVE PARSIIENNE SAS
Frédéric FAVRY
Immeuble Manathan - Imp. des Palétuviers
Voie Verte - ZI de Jarry
97122 BAIE MAHAULT - GUADELOUPE

Identification dossier :	AMI18-7667	Référence contrat :	AMIC11-24
Identification échantillon :	AMI1806-9303 -1		
Enregistré le :	26/06/2018		
Doc Adm Client :	1042740		
Référence client :	18880GUA02005001 / P5/21 - 5/7		
Site :	Non spécifié		
Localisation :	murs debarras villa 21		
Nature de l'échantillon :	enduit+peinture		

Paramètres analytiques	Données	COFRAC
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit		
Paramètres généraux		
Description de l'échantillon reçu	Matériau granuleux dur gris + peinture blanche	
AMIANTE par META (Microscopie Electronique à Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050		
Résultat final		
Phase analysée	Matériau granuleux dur gris + peinture blanche (indissociables)	
Présence/Absence d'AMIANTE	POSITIF	#
Variété d'amiante	Chrysotile	#
Paramètres analytiques		
Nombre de préparations	1	#

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les données concernant la réception, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Mickael CARREIRA
Responsable adjoint de Laboratoire



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Département Amiante
4, avenue Jean Moulin - CS 30228
69633 VENISSIEUX CEDEX
Tél. : (33) 04 72 76 16 39
Fax : (33) 04 78 72 00 67



Rapport d'analyse Page 1 / 1

Edité le : 29/06/2018

APAVE PARSIIENNE SAS
Frédéric FAVRY
Immeuble Manathan - Imp. des Palétuviers
Voie Verte - ZI de Jarry
97122 BAIE MAHAULT - GUADELOUPE

Identification dossier :	AMI18-7667	Référence contrat :	AMIC11-24
Identification échantillon :	AMI1806-9304 -1		
Enregistré le :	26/06/2018		
Doc Adm Client :	1042740		
Référence client :	18880GUA02005001 / P6/21 - 6/7		
Site :	Non spécifié		
Localisation :	murs WC villa 21		
Nature de l'échantillon :	enduit+peinture		

Paramètres analytiques	Données	COFRAC
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit		
Paramètres généraux		
Description de l'échantillon reçu	Matériau granuleux dur gris + peinture blanche	
AMIANTE par META (Microscopie Electronique à Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050		
Résultat final		
Phase analysée	Matériau granuleux dur gris + peinture blanche (indissociables)	
Présence/Absence d'AMIANTE	NEGATIF	#
Paramètres analytiques		
Nombre de préparations	1	#

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les données concernant la réception, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Mickael CARREIRA
Responsable adjoint de Laboratoire



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Département Amiante
4, avenue Jean Moulin - CS 30228
69633 VENISSIEUX CEDEX
Tél. : (33) 04 72 76 16 39
Fax : (33) 04 78 72 00 67

Rapport d'analyse Page 1 / 1

Edité le : 29/06/2018



APAVE PARSIIENNE SAS
Frédéric FAVRY
Immeuble Manathan - Imp. des Palétuviers
Voie Verte - ZI de Jarry
97122 BAIE MAHAULT - GUADELOUPE

Identification dossier :	AMI18-7667	Référence contrat :	AMIC11-24
Identification échantillon :	AMI1806-9305 -1		
Enregistré le :	26/06/2018		
Doc Adm Client :	1042740		
Référence client :	18880GUA02005001 / P7/21 - 7/7		
Site :	Non spécifié		
Localisation :	murs SDB villa 21		
Nature de l'échantillon :	enduit+peinture		

Paramètres analytiques	Données	COFRAC
Recherche et identification qualitative d'amiante ou de FCR dans un matériau ou produit		
Paramètres généraux		
Description de l'échantillon reçu	Matériau granuleux dur gris + peinture blanche	
AMIANTE par META (Microscopie Electronique à Transmission) selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050		
Résultat final		
Phase analysée	Matériau granuleux dur gris + peinture blanche (indissociables)	
Présence/Absence d'AMIANTE	POSITIF	#
Variété d'amiante	Chrysotile	#
Paramètres analytiques		
Nombre de préparations	1	#

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 1 page.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les données concernant la réception, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire.

Mickael CARREIRA
Responsable adjoint de Laboratoire



6. CERTIFICAT DE COMPETENCE



CERTIFICAT DE COMPÉTENCES N°A/14-620v1

Apave Certification certifie que :

Monsieur Frédéric FAVRY

Possède les compétences techniques nécessaires à la certification suivant le référentiel :

Apave Certification AC-PRO-001-11

Conforme aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024 : 2012 et à l'arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification

Pour l'activité suivante :

DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER – AMIANTE

Sans mention ☐

Avec mention ☒

Emis le :

28 mars 2017

Ce certificat est valable jusqu'au :

21 octobre 2019

Directeur d'Apave Certification



JM VIONNET

AC-IMP-012-15



7. ATTESTATION D'ASSURANCE



Contrat RC n° 5271124804 1/2

AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, agissant en qualité d'apérateur en coassurance à 60% avec GENERALI, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE
191 rue Vaugirard
75015 PARIS

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale **APAVE PARISIENNE SAS**, et de sa filiale française :

- EDITIONS EUROPEENNES DE MULTIMEDIA (E.E.M)

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° **5271124804**, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces métiers, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore**



Contrat RC n° 5271124804 2/2

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

***Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2018 au 31/12/2018** inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 07/12/2017
Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :

VERLINGUE

COURTIER EN ASSURANCES

Adresse postale :

12, rue de Kerogan - CS 44012
29335 QUIMPER cedex

Tél. 0 820 260 260 10,118 € TTC/ans Fax 0 820 209 242
contact@verlingue.fr - www.verlingue.fr



8. ALBUM PHOTO

LOCALISATION	MATERIAUX ET/OU PRODUITS OBJET DES PRELEVEMENT
Echantillon n° : A418880GUA02005.VILLA-21_VILLA21_1 Rez de chaussée Murs interieur VILLA 21 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de ciment projetés, lissés ou talochés chambre 01 N° PV d'analyse : AMI1806-9299 -P1/21 - 1/7 P1/21 - 1/7 enduit+peinture RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE	
Echantillon n° : A418880GUA02005.VILLA-21_VILLA21_2 Rez de chaussée Murs interieur VILLA 21 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de ciment projetés, lissés ou talochés chambre 02 N° PV d'analyse : AMI1806-9300 -P2/21 - 2/7 P2/21 - 2/7 enduit+peinture RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE	
Echantillon n° : A418880GUA02005.VILLA-21_VILLA21_3 Rez de chaussée Murs interieur VILLA 21 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de ciment projetés, lissés ou talochés cuisine N° PV d'analyse : AMI1806-9301 -P3/21 - 3/7 P3/21 - 3/7 enduit+peinture RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE	
Echantillon n° : A418880GUA02005.VILLA-21_VILLA21_4 Rez de chaussée Murs interieur VILLA 21 Revêtements de sol et murs / Revêtements de murs / Colle des faïences cuisine N° PV d'analyse : AMI1806-9302 -P4/21 - 4/7 P4/21 - 4/7 colle faïences RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE	
Echantillon n° : A418880GUA02005.VILLA-21_VILLA21_5 Rez de chaussée Murs interieur VILLA 21 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de ciment projetés, lissés ou talochés cellier N° PV d'analyse : AMI1806-9303 -P5/21 - 5/7 P5/21 - 5/7 enduit+peinture RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE	

Echantillon n° : A418880GUA02005.VILLA-21_VILLA21_6 Rez de chaussée Murs intérieur VILLA 21 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de ciment projetés, lissés ou talochés wc N° PV d'analyse : AMI1806-9304 -P6/21 - 6/7 P6/21 - 6/7 enduit+peinture RESULTAT : ABSENCE D'AMIANTE	
Echantillon n° : A418880GUA02005.VILLA-21_VILLA21_7 Rez de chaussée Murs intérieur VILLA 21 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit à base de ciment projetés, lissés ou talochés SDB N° PV d'analyse : AMI1806-9305 -P7/21 - 7/7 P7/21 - 7/7 enduit+peinture RESULTAT : PRESENCE D'AMIANTE	
