

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom
INSTITUT DE RECHERCHE MONTABO - IRD

Adresse
Route de Montabo - 97300 CAYENNE

Type de construction
réhabilitation



PARTICIPANTS

P Présent R Retard A Absent E Excusé

PERSONNES RELATIVES AU PROJET

Rôle	Contact	Adresse	Email & Téléphone	Présence	Convoqué
Maitre d'ouvrage	Pascale THOUMAZOU IRD		pascale.thoumazou@ird.fr		
Maitre d'oeuvre VRD	Korentin FOUCAUT BETEG		korentin.foucaut@beteg.fr		
Maitre d'oeuvre STRUCTURE	Luckendy HERTELOU		luckendy.heurtelou@beteg.fr		
Maitre d'oeuvre FLUIDES	Michel BIRSAN ATTA		michel.birsan@atta-ingenierie.com		
Maitre d'oeuvre ARCHITECTE	Justin DUSSERE BRAM		justin.dussere@atelier-bram.com		

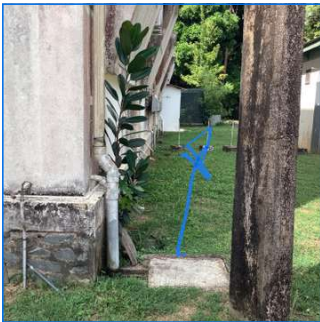
PLAN IRD PLANS TOPO + DETECTION

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
 1		TCE			
 2		TCE			
 3		TCE			
 4		TCE	Revêtement inexistant ou absent 		

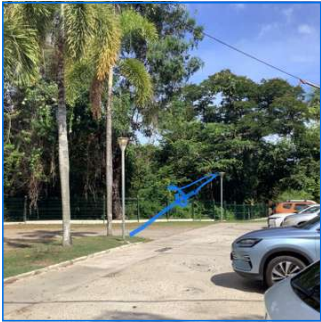
#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
5		TCE	Regard détérioré, canalisation Dn 315 ou 400 remplie de Gravats. Point bas		
					
6		TCE	Compteur AEP		
					
7		TCE	DEP existante		
					
8		TCE	Regard existant		
					

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
9		TCE	Compteur AEP		
					
11		TCE	Fossé EP extérieur le long de la route		
					
12		TCE	Noie à créer entre l'abris voiture et l'arrêt de bus pour rejet dans le fossé existant		
					
13		TCE	Pente voirie projet avec écoulement des EP vers fossé existant		
					

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
14		TCE	Arrêt des revêtements		
					
15		TCE			
					
16		TCE	Voire en grave		
					
17		TCE	Point bas dans le terrain, stagnation d'eau. Barbacane à prévoir.		
					

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
18		TCE	Point bas dans le terrain, stagnation d'eau. Barbacane à prévoir.		
					
19		TCE	DEP existante avec regard		
					
20		TCE	Regard EP		
					
21		TCE	DEP existante avec regard		
					

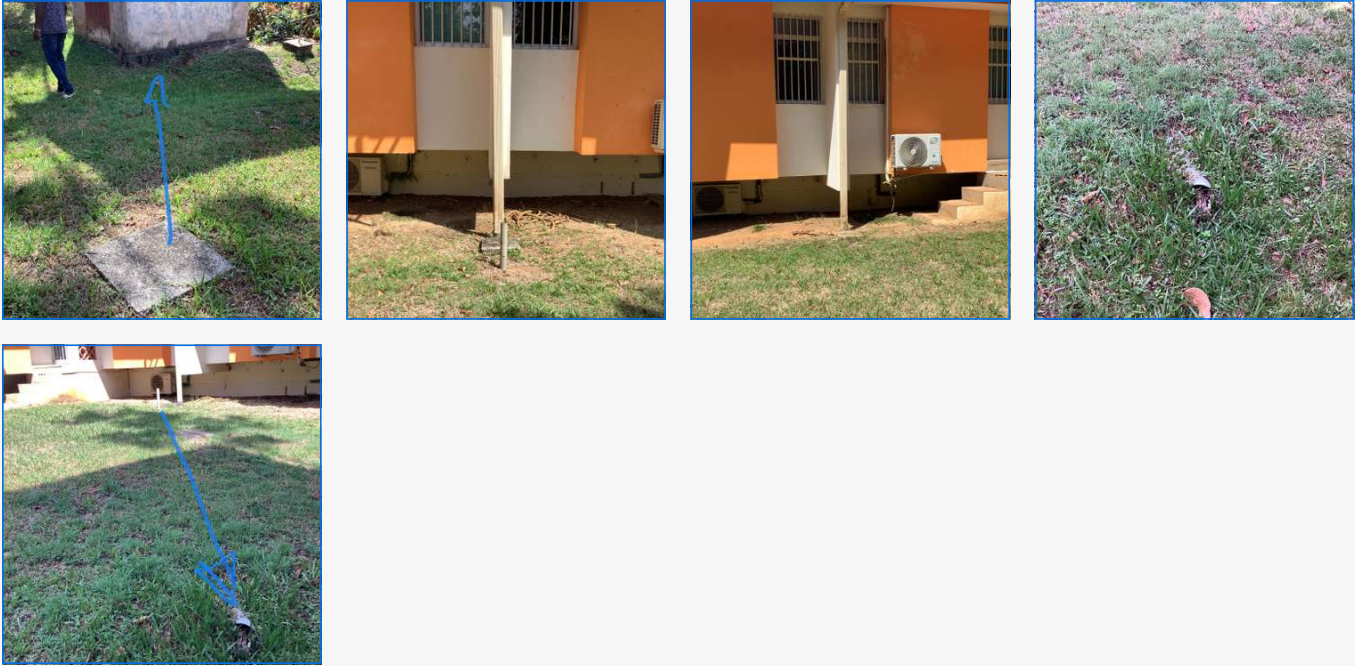
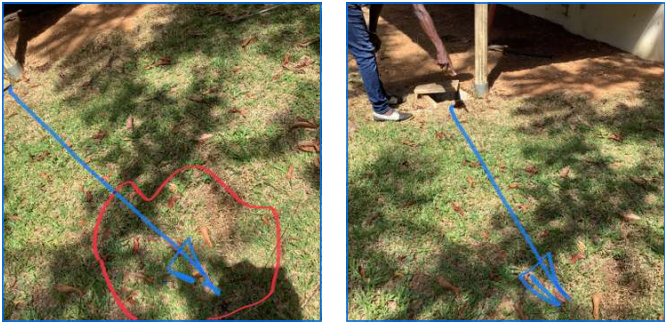
#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
 22		TCE	Voire en grave		
					
 23		TCE	Vestige béton en surface		
					
 24		TCE	Regard EP à sécuriser, bouché. Noue d'écoulement. Canalisatation exutoire à recréer.		
					
 25		TCE	Écoulement DEP à reprendre		
					

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
 26		TCE	DEP existante		
					
 27		TCE	Exutoire		
					
 28		TCE	Regard existant, mettre en place une grille à valoir		
					

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
29		TCE	Caniveau bouché		
					
30		TCE	Caniveau non raccordé		
					
31		TCE	Regard existant bouché.		
					

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
32		TCE	Point bas voire, stagnation, évacuation à prévoir		
					
33		TCE	Regard EP rempli de feuilles.		
					
34		TCE	Pas de tête de buse ou empiètement.		
					
35		TCE	3 sorties de DEP, absence de tête de buse ou d empièrrement		
					

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
 36		TCE	DEP existante avec regards de visite		
					
 37		TCE	Point bas stagnation en période de pluie		
					
 38		TCE	Possibilité de créer un exutoire vers fossé EP		
					
 39		TCE			
					

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
40		TCE			
					
41		TCE	Évacuation DEP non visible		
					
42		TCE	Canalisation obturée au 75% curage fossé à prévoir. Absence de tête de buse ou d enrochement		
					

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
 43		TCE	DEP existante avec regard		
					
 44		TCE			
					
 45		TCE	Je regard DEP et un regard abandonné		
					
 46		TCE	Absence de regard sur le plan mais regard visible sur place		
					

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
 47		TCE	DEP		
					
 48		TCE	DEP		
					
 49		TCE			
					
 50		TCE	Regard existant		
					

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
51		TCE	Exutoire caniveau		
					
52		TCE	DEP chéneau sans regard		
					
53		TCE			
					
54		TCE	DEP existante avec regard, raccordement DEP du chéneau		
					

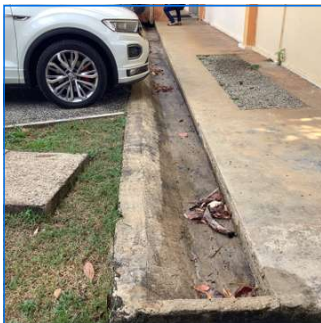
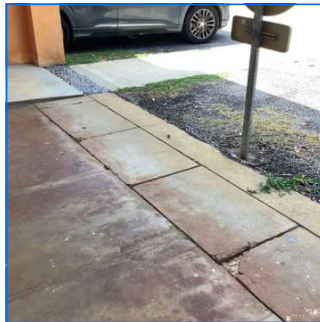
#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
55		TCE	2 DEP avec regards		



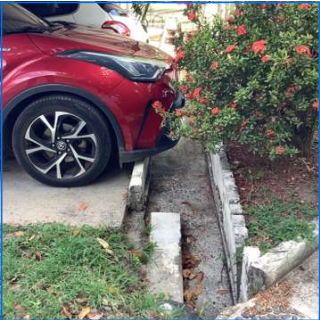
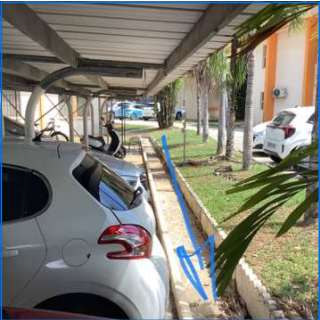
56	TCE	Regard à inspecter, prévoir l'ouverture.
----	-----	--



57	TCE	Caniveau, dalle à soulever. 2 canalisation DN 100 ou 160 non identifiées
----	-----	--



#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
58		TCE	Point bas caniveau, exutoire bouché, absence de grille anti branchages		
					
59		TCE	Noue d'écoulement		
					
60		TCE	Regard absence de grille, partiellement bouché. Prévoir l'ouverture et l'inspection.		
61		TCE	DEP sans regard, pas de problème d'écoulement.		
					
62		TCE	DEP non raccordée		
					

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
63		TCE	Remplacer canalisation existant car contre pente		
					
64		TCE	DEP sans regard, écoulement non identifié.		
					
65		TCE	Exutoire caniveau		
					
66		TCE	Zone de stagnation		
					

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
67		TCE	Zone de stagnation		
					
68		TCE	Raccordement DEP non identifié		
					
69		TCE	Regard et réseau à recréer		
					
70		TCE	Exutoire du fossé existant le long de la route		
					

#	Localisation	Lot	Description	Pour le	Levée le
 71		TCE	Exutoire existant		
					
 72		TCE	Exutoire EP garage		
					
73		TCE	3 exutoires non visibles autour des arbres		

PLAN TOPOGRAPHIQUE

Application du parcelaire en coordonnées sans consultation des titres
Coordonnées RGF95 UTM22

Echelle : 1/ 250		
Date	Ind	15 au 20/NOV/2023
MODIFICATIONS		
ORIGINAL		
DOSSIER : 3950		

IRD Plans TOPO + DETECTION

