




DIR SUD-OUEST

RD 1 - GLISSEMENT D'ARABAU
MAITRISE D'OEUVRE

PRO DU CONFORTEMENT

Planning des travaux

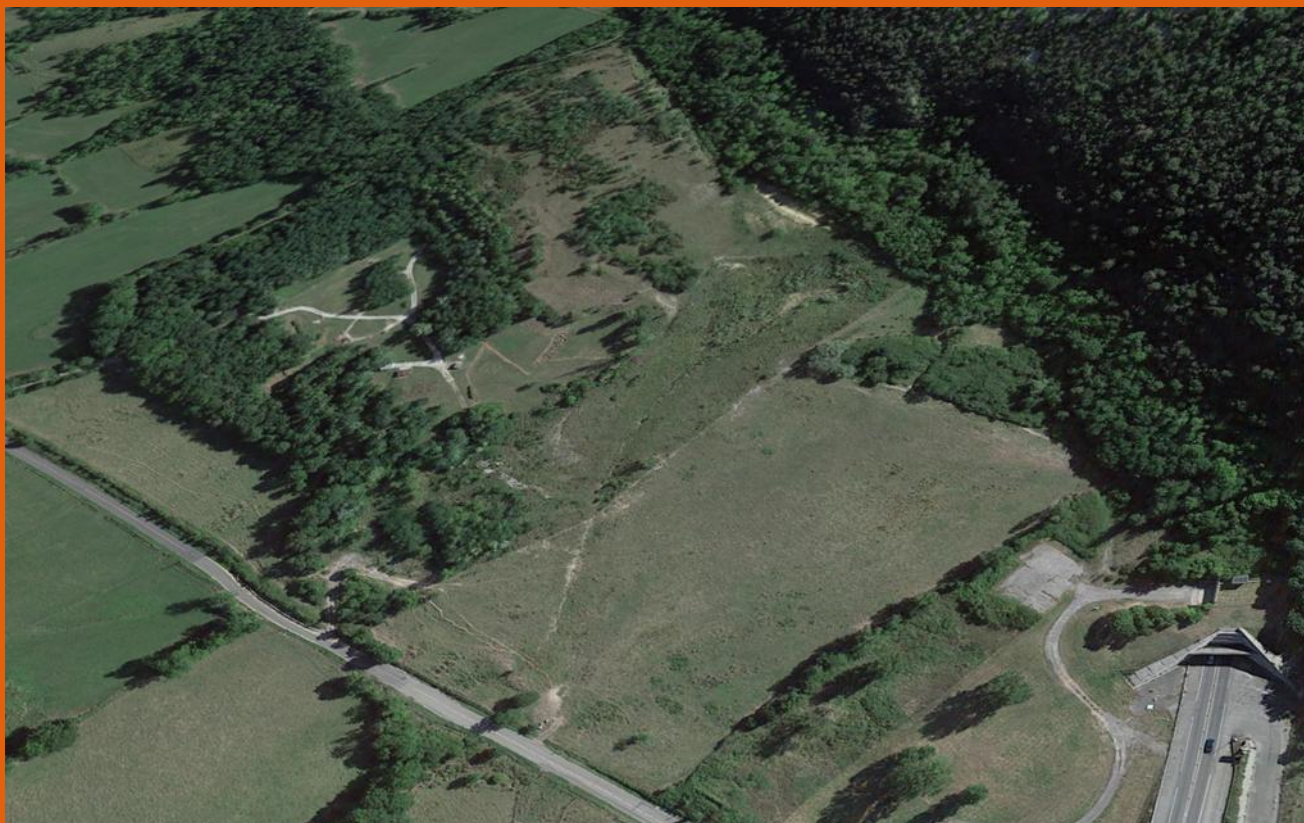

ARCADIS

5 Avenue Pierre-Georges Latécoère
31676 Labège Cedex
31520 Ramonville Saint-Agne
Tél. : +33 (0)5 62 24 53 53
toulouse@arcadis.com

30168253
Luc Moscone
Olivier Givet
3

Indice	Date	Objet de l'édition/révision	Etabli par	Vérifié par	Approuvé par
A	03/04/2026	Première diffusion	OG	LMO	LMO

DIR-ACS-PRO-0044-NOT

DIRSO - Confortement glissement RD1
PRO du confortement - Planning travaux

N°	Tâches	Cadences	Durée	M1				M2				M3				M4				M5				M6				M7				M8				M9	
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34
1	OS de démarrage des travaux			X																																	
2	Période de préparation		6 s.							Période de préparation																											
2.1	Etudes et méthodes		6 s.							Etudes et méthodes																											
2.2	Reconnaisances complémentaires		3 s.					Reconnaisances complémentaires																													
3	Installations de chantier et travaux préparatoires		4 s.							Installations de chantier et travaux préparatoires																											
3.1	Installations de chantier		2 s.					Installations de chantier																													
3.2	Dégagement des emprises		2 s.					Dégagement des emprises																													
3.3	Essais préalables de conformité (2 ancrages)	Forage/prise/essai/interp.	3 s.					Essais préalables de conformité (2 ancrages)																													
4	Travaux de Génie civil		17 s.							Travaux de Génie civil																											
4.1	Aménagement de la plateforme de travail (déblais, remblais, CdF)	100 m3/jour	3 s.					Aménagement de la plateforme de travail (déblais, remblais, CdF)																													
4.2	Réalisation des pieux	1 atelier ; 42 pieux ; 1 pieu/jour	9 s.					Réalisation des pieux																													
4.3	Réalisation des ancrages	1 atelier ; 41 ancrages ; 1,2 ancr./jour	7 s.					Réalisation des ancrages																													
4.4	Ferraillage poutre de couronnement		2 s.					Ferraillage poutre de couronnement																													
4.5	Coffrage poutre de couronnement		2 s.					Coffrage poutre de couronnement																													
4.6	Bétonnage poutre de couronnement		2 s.					Bétonnage poutre de couronnement																													
4.7	Pose des inclinomètres et cibles topo.		1 s.					Pose des inclinomètres et cibles topo.																													
4.8	Aléas travaux génie civil		2 s.					Aléas travaux génie civil																													
5	Remblaiement, remodelage et aménagement final		4 s.							Remblaiement, remodelage et aménagement final																											
5.1	Démontage plateforme		2 s.					Démontage plateforme																													
5.2	Remodelage		2 s.					Remodelage																													
5.3	Enrochement	5-10 ml/jour	3 s.					Enrochement																													
5.4	Ensemencement		1 s.					Ensemencement																													
6	Rectification de chaussée		4 s.							Rectification de chaussée																											
6.1	Terrassements							Terrassements																													
6.2	Fossés							Fossés																													
6.3	Réseaux							Réseaux																													
6.4	Chaussée							Chaussée																													
7	Repliement des installations									X																											
