



Boucle HT - Quartier la Madeleine

Proposition de Phasage des travaux

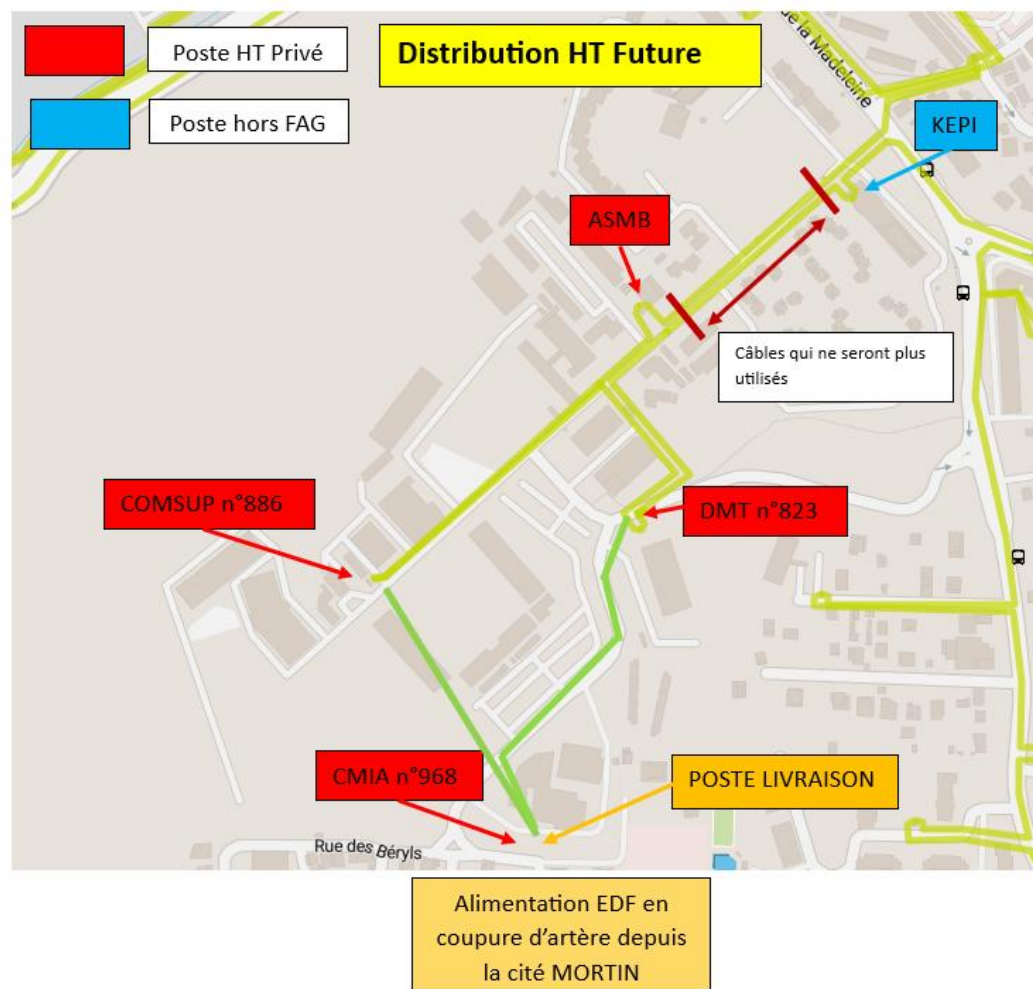

Etape 1

- ▶ Préparation de la surface où sera implanté le poste de livraison
- ▶ Réalisation du VRD entre le futur poste de livraison et le poste CMIA
- ▶ Mise en place du poste de livraison
- ▶ Passage du Consuel pour mise sous tension du poste de livraison

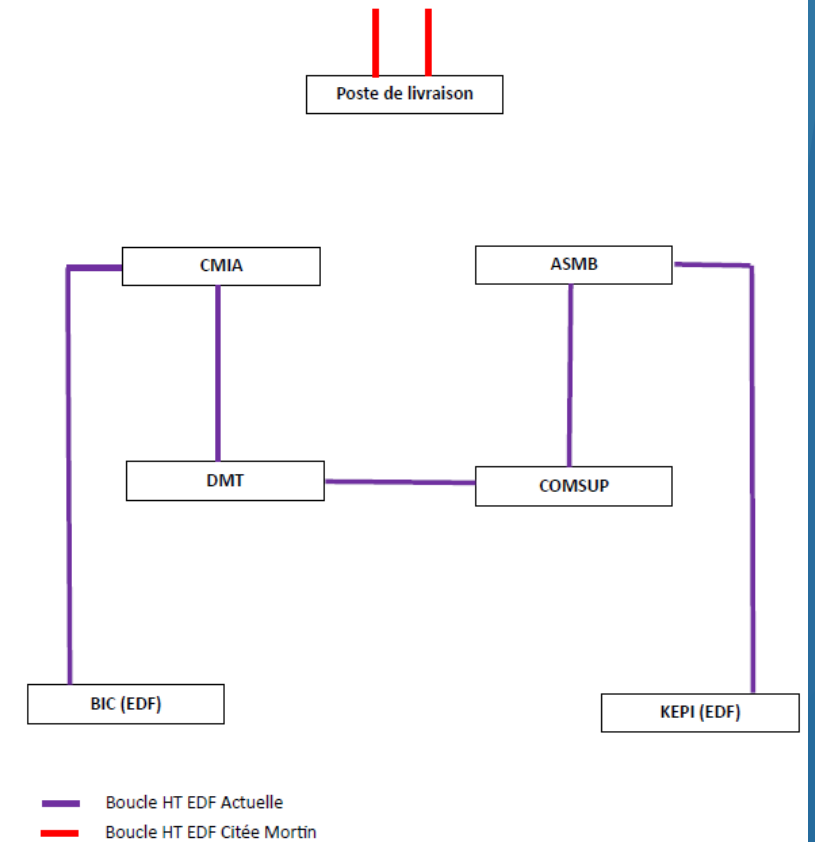


Etape 2

- ▶ Tirage des câbles HT entre Poste de livraison et CMIA
- ▶ Demande à EDF d'ouvrir l'interrupteur alimentant la boucle depuis BIC
- ▶ Déconnexion des câbles EDF arrivant de BIC
- ▶ Raccordement des câbles HT arrivant du poste de livraison au niveau de la cellule CMIA
- ▶ Ouverture de la cellule IM arrivant du poste BMT du poste CMIA (isolement de la liaison CMIA - BMT)
- ▶ Fermeture de l'interrupteur du poste de livraison alimentant le poste CMIA

L'alimentation HT des postes de la Madeleine sera réalisée de la manière suivante:

- Depuis le poste de livraison pour CMIA
- Depuis KEPI pour le reste des postes HT

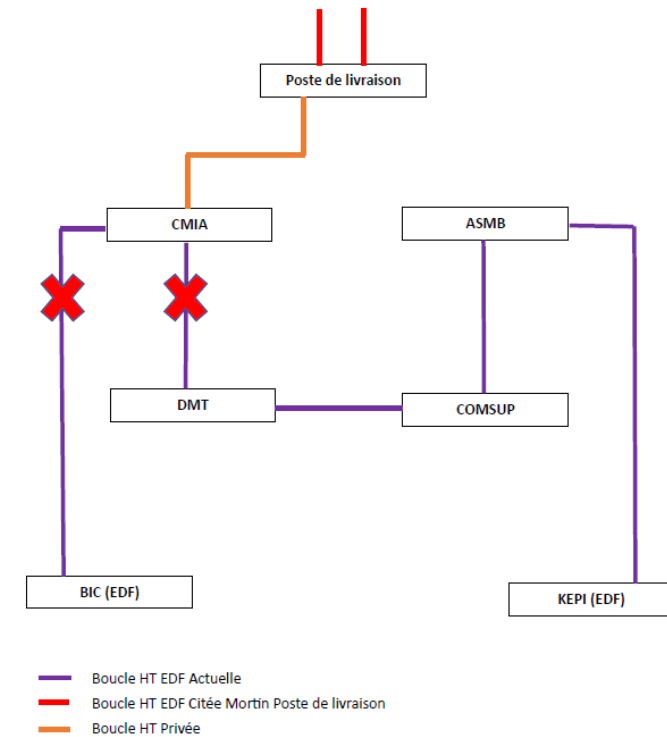


Etape 3

- ▶ Ouverture des interrupteurs HT Départ DMT (Poste CMIA) et Départ CMIA (Poste DMT)
 - Poste CMIA alimenté depuis poste de livraison
 - Poste DMT alimenté depuis COMSUP (boucle EDF)
- ▶ Ouverture de l'interrupteur COMSUP dans le poste DMT

L'alimentation HT des postes de la Madeleine sera réalisée de la manière suivante:

- Depuis le poste de livraison pour CMIA et DMT
- Depuis KEPI pour le reste des postes HT

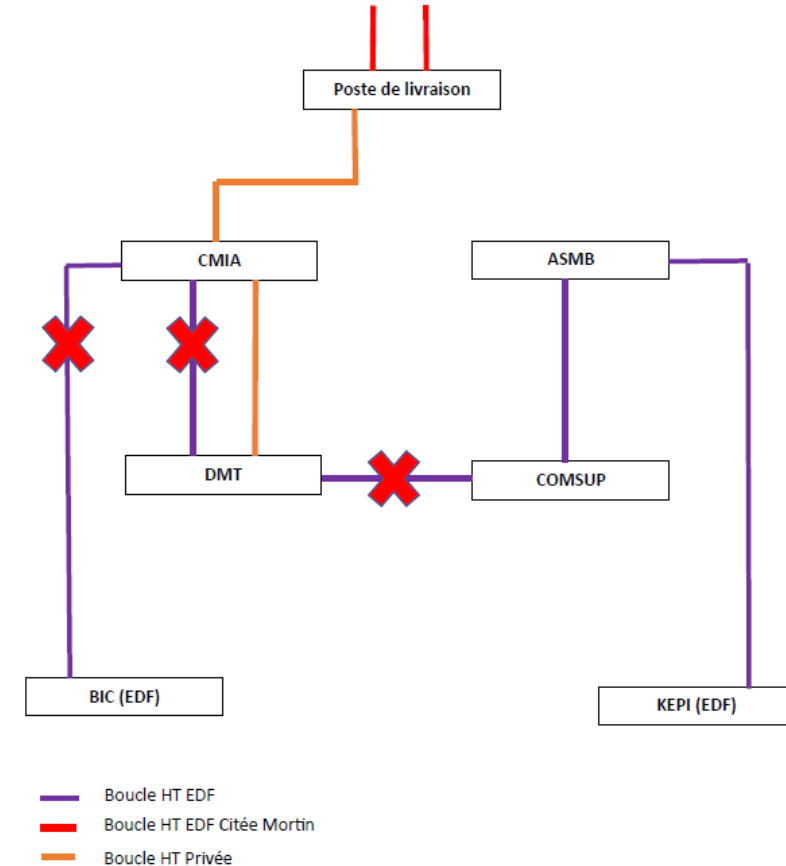


Etape 4

- ▶ Tirage des câbles de la liaison entre COMSUP et poste de livraison
- ▶ Raccordement des câbles HT au niveau de la cellule COMSUP
- ▶ Raccordement des câbles HT au niveau de la cellule Poste de livraison
- ▶ Ouverture de l'interrupteur HT Départ COMSUP (Poste ASMB)
- ▶ Fermeture de l'interrupteur HT Poste de livraison

L'alimentation HT des postes de la Madeleine sera réalisée de la manière suivante:


- Depuis le poste de livraison pour CMIA, DMT et COMSUP
- Depuis KEPI pour le poste ASMB

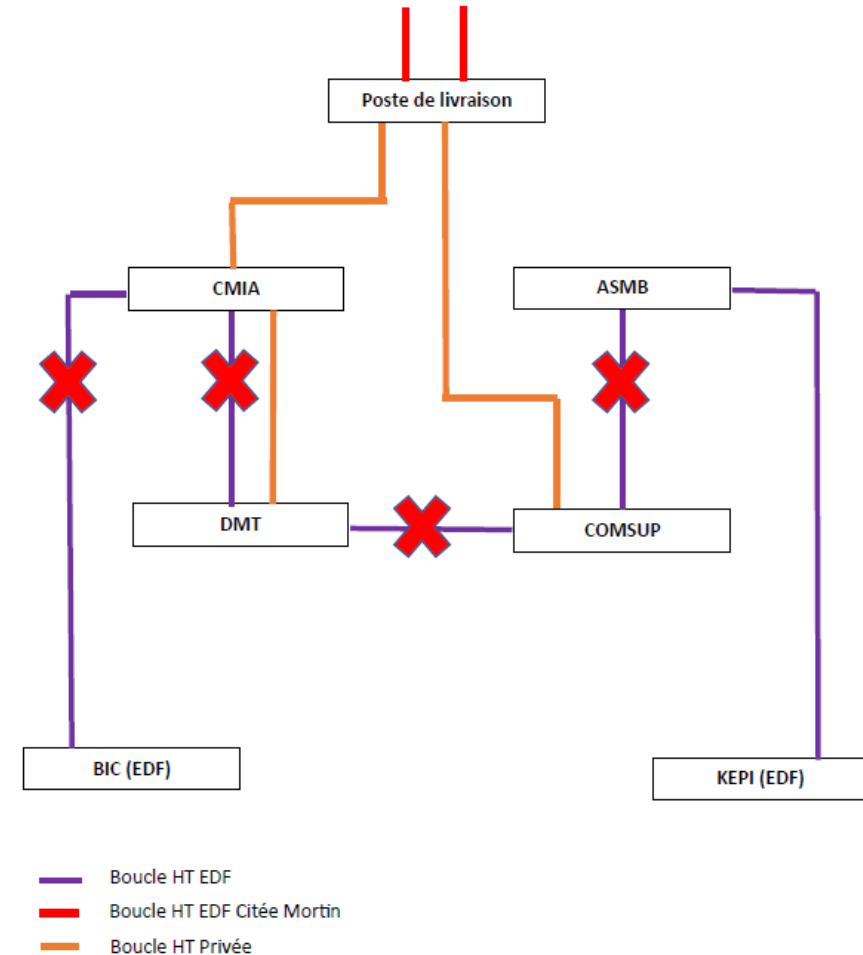

Etape 5

- ▶ Demande à EDF d'ouvrir l'interrupteur KEPI alimentant la boucle EDF
- ▶ Déconnexion du câble EDF arrivant de KEPI
- ▶ Fermeture de l'interrupteur HT départ ASMB au poste COMSUP et départ COMSUP au poste ASMB


L'alimentation de l'ensemble des postes HT de la Madeleine sera réalisée depuis le poste de livraison

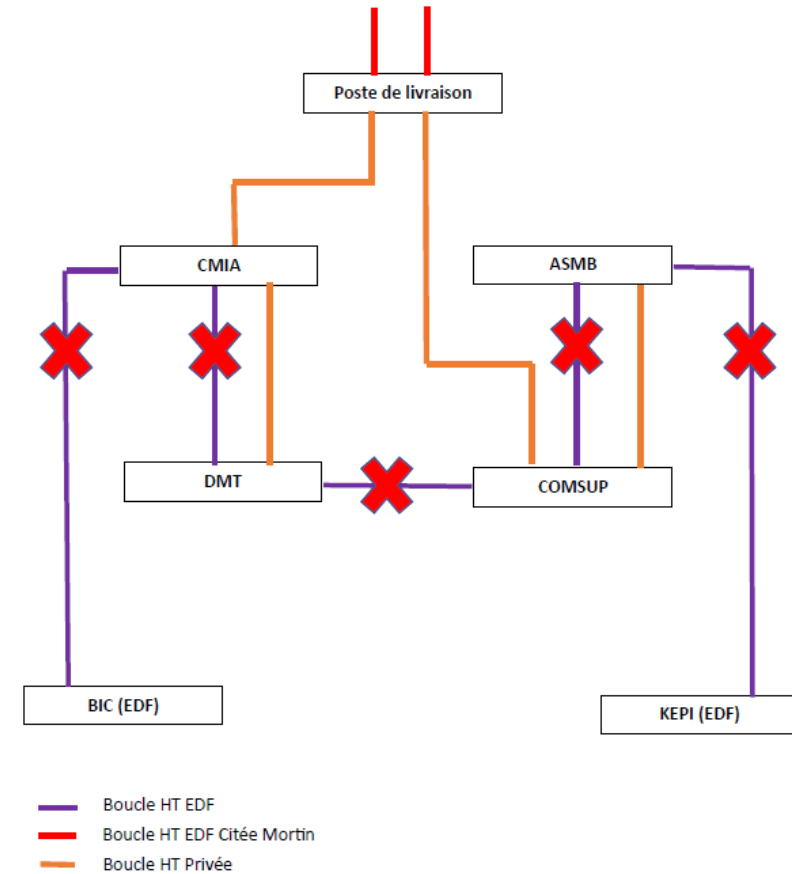

Etape 6

- ▶ Tirage des câbles de la liaison entre DMT et ASMB
- ▶ Raccordement des câbles HT au niveau de la cellule DMT
- ▶ Raccordement des câbles HT au niveau de la cellule ASMB
- ▶ Fermeture des interrupteurs HT pour fermer la boucle HT

L'alimentation de l'ensemble des postes HT de la Madeleine sera réalisée depuis le poste de livraison

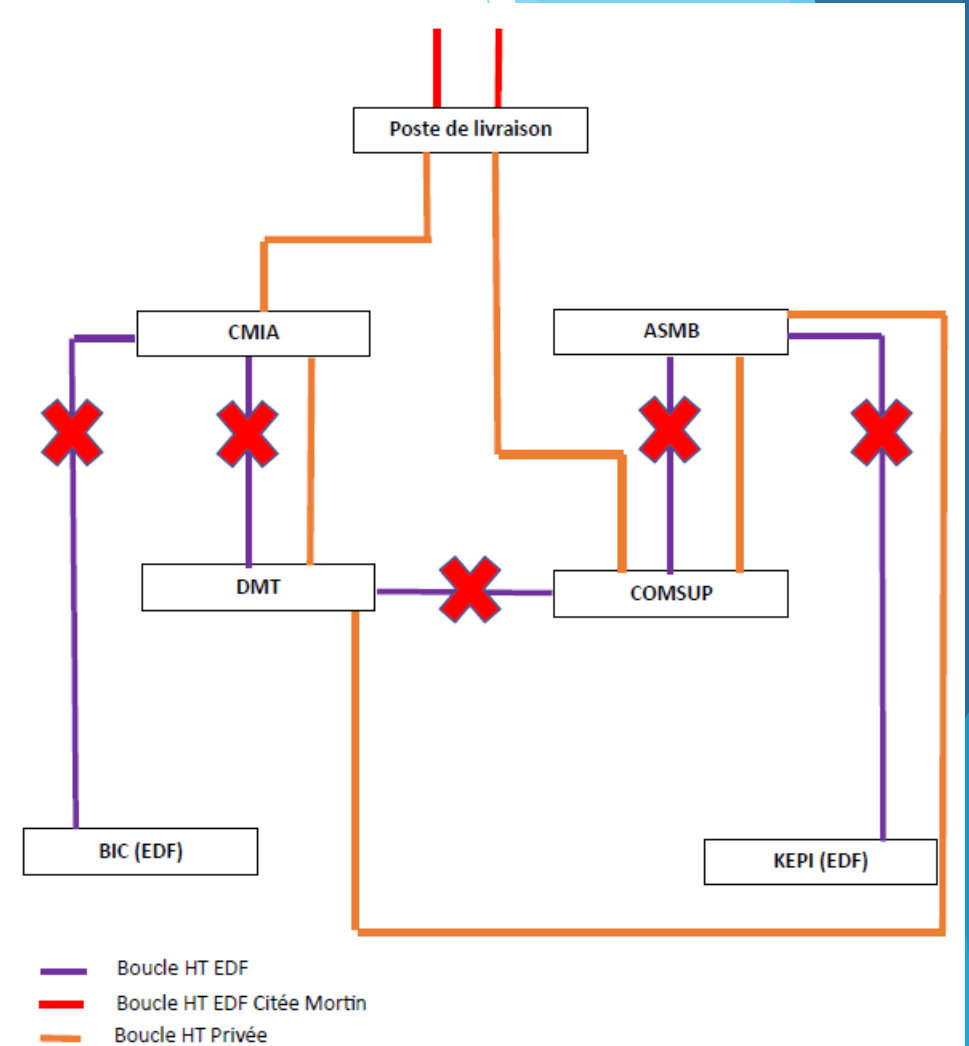

Etape 7

- ▶ Remplacement du poste COMSUP par un poste HT neuf conforme à la NFC13-200
- ▶ Mise en place du TGBT COMSUP
- ▶ Rétrocessions du poste HT COMSUP à EDF (Livraison dans les locaux EDF)



Etape 8

- ▶ Mise en conformité des postes HT de la boucle privée
 - Dépose des compteurs EDF
 - Dépose des tores de comptages
 - Mise en place de l'interverrouillage pour l'ensemble des cellules de la boucle
 - Mise en service des détecteurs de boucle HT
 - Mise en place des affichages dans les postes (fiches manœuvres, plans de boucle)
