



UNE SOCIÉTÉ EKIDUM GROUP

**5 allée des Droits de l'Homme
ZAC du Chêne - 69673 BRON
SERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS
TEL. 04 72 35 23 40
FAX 04 72 33 43 80**

50 AVENUE DAUMESNIL
75579 PARIS CEDEX 12
TEL. 01 78 78 50 01
FAX 01 43 09 54 42

20, LA CANEBIERE
13001 MARSEILLE
TEL. 04 91 33 44 04
FAX 04 91 33 44 06



Assistance Publique
Hôpitaux de Marseille

Direction du Patrimoine, des Travaux, des Services Techniques
et de la Sécurité des Sites

Hôpitaux de la Timone

***IGH 13 A
Self personnel***

Coordination SSI

-

Relevé d'écarts SSI

GLI

SAS AU CAPITAL DE 176 000 €
RCS LYON B 338 578 586

Réf. : Relevé d'écarts SSI IGH13A v1
Version 1
du 22/11/17

SOMMAIRE

1.	GENERALITES	4
2.	DOCUMENTS ANALYSES.....	4
3.	DOCUMENTS EN ATTENTE	7

1. GENERALITES

Ce document a pour objet de récapituler les remarques émises par GLI sur les documents établis dans le cadre des travaux d'aménagement d'un self au R+13 de l'Hôpital IGH ADULTES de la TIMONE.

Le document sera mis à jour suivant les diffusions de documents et l'établissement de nos remarques.


2. DOCUMENTS ANALYSES

Remis le 9 janvier 2018 par mail – version 1

- S2017012_Resto Adultes Timone_PRO_CVCPB-0-R+13a : examiné avec observations
 1. Représenter l'asservissement du caisson de désenfumage (attente élec orange en complément du celle rouge)
- S2017012_Resto Adultes Timone_PRO_CFO_CFA-R+13a-0 : examiné avec observations
 2. En IGH, les DM sont interdits. En revanche, prévoir des interphones de sécurité

DM

DECLENCHEUR MANUEL
 3. Sas 1302 : les volets présents les sas de la TIMONE entre deux CHC comprennent :
 - un volet de soufflage télécommandé à portillon ou tunnel à plus de 1,80m du sol (VST) = le VB du milieu est un VH
 - deux volets de transfert télécommandé à portillon à moins de 1 m du sol (VTT) = les deux VH sont des VB
 - deux volets de transfert autocommandé à guillotine à moins de 1m du sol (VTA)

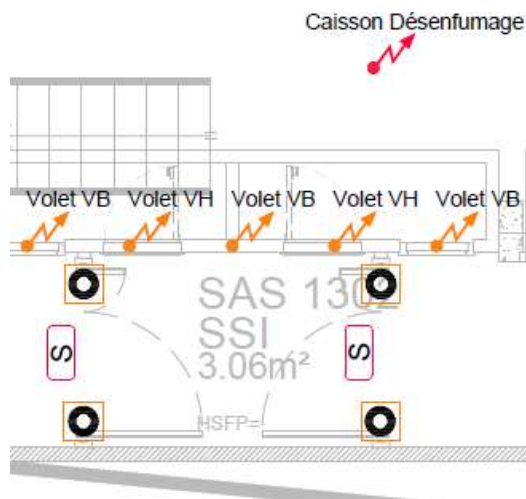

4. Représenter l'asservissement du caisson de désenfumage (attente élec orange en complément du celle rouge)
5. Sas 1301 et non sas 1308
6. Prévoir le remplacement de la détection sur dans la circulation menant aux ascenseurs
7. Prévoir un interphone sur le palier ascenseur entre les portes CF2h


- S2017012_Resto Adultes Timone_PRO_CVCPB-0-R+13a : examiné avec observations

14. Sas 1301 et non sas 1308

15. Sas 1301 : les volets présents les sas de la TIMONE entre CHC et escalier comprennent :


- un volet de soufflage télécommandé à portillon ou tunnel à plus de 1,80m du sol (VST)
- un volet de transfert autocommandé à guillotine à moins de 1m du sol (VTA) = supprimer le volet à portillon

16. (hors CSSI) confirmer que le conduit d'amenée d'air de désenfumage du sas 1301 sera dans la traversée du self CF1h type promat

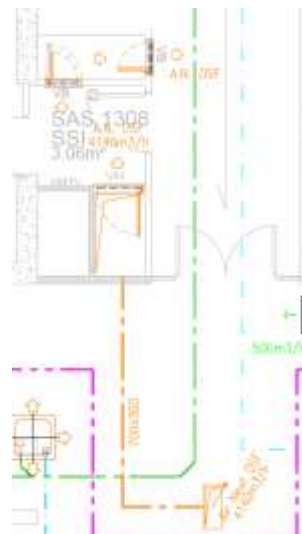

17. Sas 1302 : les volets présents les sas de la TIMONE entre deux CHC comprennent :

- un volet de soufflage télécommandé à portillon à plus de 1,80m du sol (VST)
- deux volets de transfert télécommandé à portillon à moins de 1 m du sol (VTT)
- deux volets de transfert autocommandé à guillotine à moins de 1m du sol (VTA)

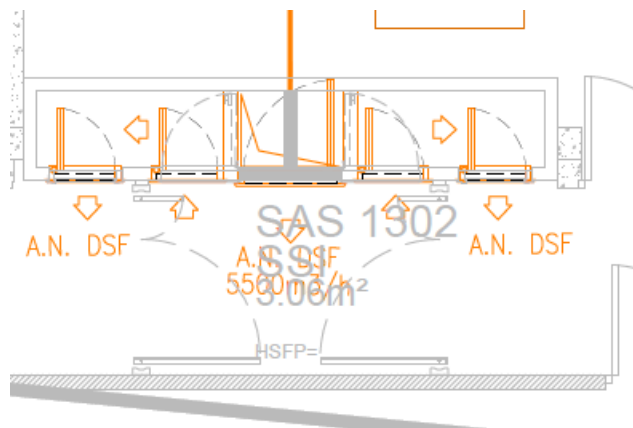

- S2017012_Resto Adultes Timone_PRO_CVCPB-0-TOIT

18. Confirmer la présence du coffret de relayage pour le ventilateur de soufflage de désenfumage

19. (hors CSSI) Représenter les extracteurs de désenfumage existants

- S2017012-PRO-LOT 05 - JRE1 : examiné avec observations

20. §0.5 ne pas prendre la règle R7 en référence et référencer la norme NFS 61-970

21. §2.1.1 et 2.1.2 les DM sont interdits en IGH

22. §2.1.4 la tension des portes DAS sera du 48V à rupture

23. Les interphones de sécurité ne sont pas décrits











- s2017012 -PRO- CVC -JMF-V0 : examiné avec observations

24. §1.6.4.3 où sont placés les clapets CF décrits ?

25. §4.11.1 voir observations 15 et 17

26. Prévoir motorisation de réarmement et commande de réarmement des volets dans la zone

- Fichiers reçus par mail : non examinés car hors mission

 Coupe A-A	17/01/2018 09:06	Adobe Acrobat D...	59 Ko
 E16020_PRO_CCTP Lot 00_V0.13.12.17	09/01/2018 13:36	Adobe Acrobat D...	315 Ko
 E16020_PRO_CCTP Lot 01_V0.13.12.17	15/12/2017 10:02	Adobe Acrobat D...	164 Ko
 E16020_PRO_CCTP Lot 03_V0.13.12.17	09/01/2018 13:36	Adobe Acrobat D...	329 Ko
 E16020_PRO_CDPGF LOT 03_RESTAURANT DU PERSONN...	15/12/2017 10:27	Adobe Acrobat D...	77 Ko
 E16020_PRO_Notice accessibilité Handicapé_V1.13.12.17	13/12/2017 14:42	Adobe Acrobat D...	155 Ko
 E16020_PRO_RESTAURANT DU PERSONNEL_IGH_R+13_TL...	13/12/2017 15:38	Adobe Acrobat D...	55 Ko
 S2017012_Resto Adultes Timone_PRO_CVCPB-0-R+12	14/12/2017 18:02	Adobe Acrobat D...	243 Ko
 S2017012-DCE-DPGF-LOT CVC-JMF-V1	15/12/2017 09:22	Microsoft Excel 97...	69 Ko
 Vue en plan structure métallique_décembre 2017	17/01/2018 09:06	Adobe Acrobat D...	182 Ko

3. DOCUMENTS EN ATTENTE

- Avis de la commission de sécurité sur modification du schéma directeur de mise en sécurité
