



RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BÂTI

Code du Travail – article R4412-97
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013
Décret n°2015-789 du 29 juin 2015
Norme NFX 46-020 – août 2017
Décret n°2017-899 du 9 mai 2017
Décret n°2019-251 du 27 mars 2019
Arrêté du 16 juillet 2019

Rapport N° 876146 établi le 20/09/2021

BAT 056 - INFIRMERIE CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE 72470 CHAMPAGNE

Programme de travaux : - Désembouage du réseau de chauffage; La régulation du bâtiment sera à reprendre et à affiner selon les besoins par locaux. Réajuster le positionnement et le nombre de radiateur suivant les températures demandées par locaux; Réajuster le positionnement, le nombre et le type de luminaire suivant les niveaux d'éclairages demandées - Reprendre le réseau électrique pour répondre aux besoins de puissance et augmenter le nombre de prise électrique comme demandé dans « les fiches techniques par local » - Ventilation par un système mécanique pour l'ensemble du bâtiment conformément aux spécifications stipulées dans les fiches techniques par local. Seuls les locaux techniques ou a pollution spécifique sans obligation de débit pourront être équipés d'un système de ventilation naturelle. - Dépose des menuiseries extérieures ; - Fourniture et pose de toutes les menuiseries extérieures ; - Création d'un local S.I.C dans les combles ; - Mise en place d'une isolation posée sur le sol des combles ; - Création d'un chemin technique dans les combles pour accéder aux différents moteurs d'extraction d'air de ventilation au profit des maintenanciers, et l'accès au local DIRISI. - Reprendre l'agencement du bâtiment comme demandé sur les plans états projetés. - Fourniture et pose de nouveaux revêtements sols dans 41 % (estimation) des locaux; - Mise aux normes pour accès handicapés du RDC ; Ref : Non fournis



Donneur d'ordre :
ETABLISSEMENT INFRASTRUCTURE - DE LA DEFENSE D ANGERS
RUE DES PETITES MUSSES
BP 14114 - 49041 ANGERS CEDEX 01

Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :

ITGA - Espace Performance - Bâtiment K - 35760 SAINT GREGOIRE - Numéro d'accréditation COFRAC : 1-5967

Opérateur de repérage : Xavier LEMAILLE

QUALICONSULT IMMOBILIER
355 Avenue Patton - CS 56613
49066 ANGERS
Tél. 02 41 48 72 86
angers.lesilites@qualiconsult.fr
SIRET 490 676 293 00460

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

355, avenue du Général Patton

CS 56613 49066 ANGERS CEDEX 1 - Tel./Fax. : 0241687286 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00460 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

SOMMAIRE

I.	CONCLUSIONS	3
II.	CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :	7
III.	OBSERVATIONS :	7
IV.	PREAMBULE	8
V.	BUT DE LA MISSION.....	8
VI.	TEXTES REGLEMENTAIRES.....	13
VII.	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC.....	15
	1. Obligations du donneur d'ordre	15
	2. Phase de repérage	15
	3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons	15
VIII.	LOCAUX VISITES ET NON VISITES.....	16
	1. Liste des locaux visités et non visités	16
	2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante	16
	3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante	16
IX.	RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE	20

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

ANNEXE 3 - PHOTOS

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : résultats en attente d'analyse.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
Mastic Vitrier Couche d'Intérêt Mastic Vitrier (Fenêtres)	Batiment 56 - Rdc Pièce 010	Résultat d'analyse	/	65 Fenêtres
Mastic Vitrier Grisatre Couche d'Intérêt Mastic Vitrier Grisatre (Fenêtre)	Batiment 56 - Rdc Pièce 033, Pièce 034, Pièce 035	Résultat d'analyse	/	
Faïence Murale Blanche Petite taille + Colle Couche d'Intérêt Colle (Murs et cloisons maçonnés)	Batiment 56 - 1er Etage Sanitaires Hommes	Résultat d'analyse	/	10 m²
Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intérêt Colle (Murs et cloisons maçonnés)	Batiment 56 - 1er Etage Pièce 021	Résultat d'analyse	/	10 m²
Panneaux et plaques (Faux plafonds)	Batiment 56 - 1er Etage Sanitaires Femmes	Résultat d'analyse	/	40 m²
Fibro Ciment (Conduit Vertical)	Batiment 56 - 2ème Etage Grenier	Sur jugement personnel de l'opérateur	/	1 U

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
Revêtement + Patre Couche d'Intérêt Revêtement + Platre (Murs et cloisons maçonnés)	Batiment 56 - Rdc Entrée, Pièce 004, Pièce 005, Pièce 007, Pièce 006, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 013, Pièce 012, Pièce 015, Pièce 014, Pièce 017, Pièce 016, Pièce 018	Résultat d'analyse	/	
Platre Couche d'Intérêt Platre (Murs et cloisons maçonnés)	Batiment 56 - Rdc Entrée, Pièce 004, Pièce 005, Pièce 007, Pièce 006, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 013, Pièce 012, Pièce 015, Pièce 014, Pièce 017, Pièce 016, Pièce 018, Pièce 023, Salle d'Attente, Pièce 030, Pièce 033, Pièce 034, Pièce 035 Batiment 56 - 1er Etage Palier, Pièce 002, Pièce 003, Sanitaires Hommes, Pièce 005, Pièce 006, Pièce 007, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 010, Pièce 011, Pièce 012, Pièce 015, Pièce 014, Pièce 016, Pièce 017, Pièce 018, Pièce 019/Pièce 020, Pièce 021, Pièce 022, Pièce 023,	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
	Sanitaires Femmes, Pièce 025, Pièce 026				
Dalles de sol Rosatre Couche d'Intérêt Dalle de sol Rosatre (Revêtements de sols)	Batiment 56 - Rdc Pièce 003, Pièce 036	Résultat d'analyse	/		
Ragréage Couche d'Intérêt Ragréage (Revêtements de sols)	Batiment 56 - Rdc Pièce 003, Pièce 036 Batiment 56 - 1er Etage Pièce 006, Pièce 007	Résultat d'analyse	/		
Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre (Murs et cloisons maçonnés)	Batiment 56 - Rdc Pièce 003, Pièce 023, Sanitaires, Salle d'Attente, Pièce 030, Pièce 033, Pièce 034, Pièce 035, Pièce 036 Batiment 56 - 1er Etage Palier, Pièce 002, Pièce 003, Sanitaires Hommes, Pièce 005, Pièce 006, Pièce 007, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 010, Pièce 011, Pièce 012, Pièce 015, Pièce 014, Pièce 016, Pièce 017, Pièce 018, Pièce 019/Pièce 020, Pièce 021, Pièce 022, Pièce 023, Sanitaires Femmes, Pièce 025, Pièce 026	Résultat d'analyse	/		
Faïence Murale + Coll Couche d'Intérêt Colle (Murs et cloisons maçonnés)	Batiment 56 - Rdc Pièce 003	Résultat d'analyse	/		
Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intérêt Joint d'étanchéité Blanchatre (Fenetre)	Batiment 56 - Rdc Pièce 003, Pièce 004, Pièce 005, Pièce 007, Pièce 006, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 013, Pièce 012, Pièce 015, Pièce 014, Pièce 017, Pièce 016, Pièce 018, Pièce 020, Pièce 021, Pièce 022, Pièce 023, Salle d'Attente, Pièce 030, Pièce 033, Pièce 034, Pièce 035, Pièce 036 Batiment 56 - 1er Etage Palier, Pièce 002, Pièce 003, Sanitaires Hommes, Pièce 005, Pièce 006, Pièce 007, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 010, Pièce 011, Pièce 012, Pièce 021, Sanitaires Femmes	Résultat d'analyse	/		
Panneaux et plaques (Faux plafonds)	Batiment 56 - Rdc Pièce 003, Pièce 004, Pièce 005, Pièce 007, Pièce 006, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 011, Pièce 010, Pièce 013, Pièce 012, Pièce 015, Pièce 014, Pièce 017, Pièce 016, Pièce 018, Pièce 020, Pièce 021, Pièce 022, Pièce 023, Sanitaires, Salle d'Attente, Pièce 030, Pièce 033, Pièce 034, Pièce 035, Pièce 036 Batiment 56 - 1er Etage Palier, Pièce 002, Pièce 003, Sanitaires Hommes, Pièce 005, Pièce 006, Pièce 007, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 010, Pièce 011, Pièce 012, Pièce 015, Pièce 014, Pièce	Résultat d'analyse	/		

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)
	016, Pièce 017, Pièce 018, Pièce 019/Pièce 020, Pièce 022, Pièce 023, Pièce 025, Pièce 026			
Dalles de sol Verdatre Couche d'Intérêt Dalles de Sol Verdatre (Revêtements de sols)	Batiment 56 - Rdc Pièce 011, Pièce 010, Pièce 018	Résultat d'analyse	/	
Ragréage + Colle Couche d'Intérêt Ragréage + Colle (Revêtements de sols)	Batiment 56 - Rdc Pièce 011, Pièce 010, Pièce 018	Résultat d'analyse	/	
Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre (Revêtements de sols)	Batiment 56 - Rdc Pièce 011, Pièce 010	Résultat d'analyse	/	
Plâtre (Revêtements de sols)	Batiment 56 - Rdc Pièce 011, Pièce 010	Résultat d'analyse	/	
Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intérêt Joint d'étanchéité Blanchâtre (Fenêtres)	Batiment 56 - Rdc Pièce 010	Résultat d'analyse	/	
Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre (Poteaux)	Batiment 56 - Rdc Pièce 020, Pièce 021, Pièce 022	Résultat d'analyse	/	
Plâtre (Poteaux)	Batiment 56 - Rdc Pièce 020, Pièce 021, Pièce 022	Résultat d'analyse	/	
Dalles de sol Grisatre Couche d'Intérêt Dalle de Sol Grisatre (Revêtements de sols)	Batiment 56 - Rdc Pièce 022	Résultat d'analyse	/	
Plâtre (Murs et cloisons maçonnés)	Batiment 56 - Rdc Sanitaires	Résultat d'analyse	/	
Faïence Murale + Colle Couche d'Intérêt Colle (Murs et cloisons maçonnés)	Batiment 56 - 1er Etage Pièce 002, Pièce 006, Pièce 007, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 010, Pièce 011, Pièce 012	Résultat d'analyse	/	
Plinthe Faïence + Colle Couche d'Intérêt Colle (Murs et cloisons maçonnés)	Batiment 56 - 1er Etage Sanitaires Hommes, Sanitaires Femmes	Résultat d'analyse	/	
Faïence Murale Rosatre + Colle Couche d'Intérêt Colle (Murs et cloisons maçonnés)	Batiment 56 - 1er Etage Sanitaires Hommes, Sanitaires Femmes	Résultat d'analyse	/	
Faïence Murale Blanche Grande Taille + Colle Couche d'Intérêt Colle (Murs et cloisons maçonnés)	Batiment 56 - 1er Etage Sanitaires Hommes	Résultat d'analyse	/	
Dalles de sol Bleue Couche d'Intérêt Dalle de sol Bleue (Revêtements de sols)	Batiment 56 - 1er Etage Pièce 006, Pièce 007	Résultat d'analyse	/	
Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intérêt Colle (Murs et cloisons maçonnés)	Batiment 56 - 1er Etage Pièce 015, Pièce 014, Pièce 016, Pièce 017, Pièce 018, Pièce 019/Pièce 020, Pièce	Résultat d'analyse	/	

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

MATERIAU	LOCALISATION	CRITERE DE CONCLUSION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS	QUANTITE (U, ml, m²)	
	022, Pièce 023, Pièce 025, Pièce 026				
Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intérêt Joint d'étanchéité Blanchatre (Fenetre)	Batiment 56 - 1er Etage Pièce 015, Pièce 014, Pièce 016, Pièce 017, Pièce 018, Pièce 019/Pièce 020, Pièce 022, Pièce 023, Pièce 025, Pièce 026	Résultat d'analyse	/		
Revêtement + Platre Couche d'Intérêt Revêtement + Platre (Plafonds)	Batiment 56 - 1er Etage Pièce 021	Résultat d'analyse	/		
Platre Couche d'Intérêt Platre (Plafonds)	Batiment 56 - 1er Etage Pièce 021	Résultat d'analyse	/		
Enduits projetés (Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage)	Batiment 56 - Extérieur Facade	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante	/		
Dalle Béton Couche d'Intérêt Dalle Béton (Revêtements de sols)	Batiment 56 - 2ème Etage Grenier	Résultat d'analyse	/		
Briques (Murs et cloisons maçonnés)	Batiment 56 - 2ème Etage Grenier	Par nature ne contient pas d'amiante	/		
Papier Cartonné + Isolant Couche d'Intérêt Papier Cartonné + Isolant (Toiture)	Batiment 56 - 2ème Etage Grenier	Résultat d'analyse	/		
Conduit de ventilation / aération Inox (Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides))	Batiment 56 - 2ème Etage Grenier	Par nature ne contient pas d'amiante	/		
Tuiles (Toiture)	Batiment 56 - 2ème Etage Grenier	Par nature ne contient pas d'amiante	/		

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

II. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

Liste des documents fournis par le donneur d'ordre	Observations	Voir annexe
Plans ou croquis		
Non		ANNEXE 2
Autres documents relatifs à la construction		
Non		/
Documents relatifs aux travaux projetés		
Non		/
Rapports de repérage antérieurs		
Non		/

III. OBSERVATIONS :

Intitulé de l'observation	OUI	NON	Sans Objet	Observations
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur site	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide d'occupants	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide de meubles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient en services	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient alimentés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le vide sanitaire était visitable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles et visitables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/
Observations :	Le Carrelage au Sol n'a pas été contrôlé car non impacté par les travaux. Joints de compression non accessible dans dégradation: non contrôlé Cave non impactée par les travaux donc non contrôlée			
Justificatif des écarts à la norme				

Propriétaire :

Administration ETABLISSEMENT INFRASTRUCTURE - DE LA DEFENSE D ANGERS
RUE DES PETITES MUSSES
BP 14114 - 49041 ANGERS CEDEX 01

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de ANGERS -

Contrat d'assurance : **MMA IARD - n°127.106.241** valide jusqu'au 31 décembre 2021

Opérateur de repérage : **Xavier LEMAILLE**

Certificat de compétence : **I.CERT - Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE (CPDI 3124)**

Date de réalisation de la mission : le 20/09/2021

Date de la visite complémentaire :

Date de la visite de reconnaissance : le 20/09/2021

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **des travaux de l'immeuble sis :**

**BAT 056 - INFIRMERIE
CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE
72470 CHAMPAGNE**

Date de délivrance du permis de construire : <1997

Destination présente et passé du local ou de l'immeuble bâti : Établissement de santé (Type U),

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

Néant

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux

Description des travaux :

Programme de travaux : - Désembouage du réseau de chauffage;
- La régulation du bâtiment sera à reprendre et à affiner selon les besoins par locaux.
- Réajuster le positionnement et le nombre de radiateur suivant les températures demandées par locaux;
- Réajuster le positionnement, le nombre et le type de luminaire suivant les niveaux d'éclairages demandées
- Reprendre le réseau électrique pour répondre aux besoins de puissance et augmenter le nombre de prise électrique comme demandé dans « les fiches techniques par local »
- Ventilation par un système mécanique pour l'ensemble du bâtiment conformément aux spécifications stipulées dans les fiches techniques par local. Seuls les locaux techniques ou a pollution spécifique sans obligation de débit pourront être équipés d'un système de ventilation naturelle.
- Dépose des menuiseries extérieures ;
- Fourniture et pose de toutes les menuiseries extérieures ;
- Création d'un local S.I.C dans les combles ;
- Mise en place d'une isolation posée sur le sol des combles ;
- Création d'un chemin technique dans les combles pour accéder aux différents moteurs d'extraction d'air de ventilation au profit des maintenanciers, et l'accès au local DIRISI.
- Reprendre l'agencement du bâtiment comme demandé sur les plans états projetés.
- Fourniture et pose de nouveaux revêtements sols dans 41 % (estimation) des locaux;
- Mise aux normes pour accès handicapés du RDC ;
Ref : Non fournis

Programme et périmètre de repérage

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Batiment 56 - 2ème Etage Grenier	Toiture / Papier Cartonné + Isolant Couche d'Intéret Papier Cartonné + Isolant Conduit Vertical / Fibro Ciment
Parois verticales extérieures et façades	
Batiment 56 - Extérieur Facade	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage / Enduits projetés
Parois verticales intérieures	
Batiment 56 - Rdc Entrée	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Patre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre
Batiment 56 - Rdc Pièce 003	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale + Coll Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 004	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Patre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 005	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Patre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 007	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Patre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 006	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Patre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 008	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Patre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 009	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Patre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 013	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Patre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 012	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Patre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 015	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Patre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 014	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Patre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 017	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Patre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 016	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Patre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 018	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Patre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 020	Poteaux / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Poteaux / Plâtre Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 021	Poteaux / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Poteaux / Plâtre Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 022	Poteaux / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Poteaux / Plâtre Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 023	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Sanitaires	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

355, avenue du Général Patton

CS 56613 49066 ANGERS CEDEX 1 - Tel./Fax : 0241687286 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00460 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 9 sur 92

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Batiment 56 - Rdc Salle d'Attente	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 030	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 033	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre
Batiment 56 - Rdc Pièce 034	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre
Batiment 56 - Rdc Pièce 035	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre
Batiment 56 - Rdc Pièce 036	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Palier	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 002	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 003	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Sanitaires Hommes	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plinthe Faïence + Colle Couche d'Intéret Colle Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale Rosatre + Colle Couche d'Intéret Colle Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale Blanche Petite taille + Colle Couche d'Intéret Colle Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale Blanche Grande Taille + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 005	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 006	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale + Colle Couche d'Intéret Colle
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 007	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale + Colle Couche d'Intéret Colle
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 008	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 009	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 010	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 011	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 012	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 015	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 014	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
	Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 016	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 017	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 018	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 019/Pièce 020	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 021	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 022	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 023	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Sanitaires Femmes	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plinthe Faïence + Colle Couche d'Intéret Colle Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale Rosatre + Colle Couche d'Intéret Colle Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale Blanche Petite Taille + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 025	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 026	Murs et cloisons maçonnés / Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Plâtre Couche d'Intéret Plâtre Murs et cloisons maçonnés / Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intéret Colle Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Batiment 56 - 2ème Etage Grenier	Murs et cloisons maçonnés / Briques
Plafonds et faux plafonds	
Batiment 56 - Rdc Pièce 003	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 004	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 005	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 007	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 006	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 008	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 009	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 011	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 010	Fenêtres / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre Faux plafonds / Panneaux et plaques

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Batiment 56 - Rdc Pièce 013	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 012	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 015	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 014	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 017	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 016	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 018	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 020	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 021	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 022	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 023	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Sanitaires	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Salle d'Attente	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 030	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - Rdc Pièce 033	Faux plafonds / Panneaux et plaques Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre Fenetre / Mastic Vitrier Grisatre Couche d'Intéret Mastic Vitrier Grisatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 034	Faux plafonds / Panneaux et plaques Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre Fenetre / Mastic Vitrier Grisatre Couche d'Intéret Mastic Vitrier Grisatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 035	Faux plafonds / Panneaux et plaques Fenetre / Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre Fenetre / Mastic Vitrier Grisatre Couche d'Intéret Mastic Vitrier Grisatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 036	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Palier	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 002	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 003	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Sanitaires Hommes	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 005	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 006	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 007	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 008	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 009	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 010	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 011	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 012	Faux plafonds / Panneaux et plaques

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

Locaux et parties d'immeuble concernés	Ouvrage et partie d'ouvrage inspecté
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 015	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 014	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 016	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 017	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 018	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 019/Pièce 020	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 021	Plafonds / Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre Plafonds / Plâtre Couche d'Intérêt Plâtre
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 022	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 023	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Sanitaires Femmes	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 025	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 026	Faux plafonds / Panneaux et plaques
Planchers et planchers techniques	
Batiment 56 - Rdc Pièce 003	Revêtements de sols / Dalles de sol Rosatre Couche d'Intérêt Dalle de sol Rosatre Revêtements de sols / Ragréage Couche d'Intérêt Ragréage
Batiment 56 - Rdc Pièce 011	Revêtements de sols / Dalles de sol Verdatre Couche d'Intérêt Dalles de Sol Verdatre Revêtements de sols / Ragréage + Colle Couche d'Intérêt Ragréage + Colle Revêtements de sols / Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre Revêtements de sols / Plâtre
Batiment 56 - Rdc Pièce 010	Revêtements de sols / Dalles de sol Verdatre Couche d'Intérêt Dalles de Sol Verdatre Revêtements de sols / Ragréage + Colle Couche d'Intérêt Ragréage + Colle Revêtements de sols / Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre Revêtements de sols / Plâtre Fenêtres / Mastic Vitrier Couche d'Intérêt Mastic Vitrier
Batiment 56 - Rdc Pièce 018	Revêtements de sols / Dalles de sol Verdatre Couche d'Intérêt Dalles de Sol Verdatre Revêtements de sols / Ragréage + Colle Couche d'Intérêt Ragréage + Colle
Batiment 56 - Rdc Pièce 022	Revêtements de sols / Dalles de sol Grisatre Couche d'Intérêt Dalle de Sol Grisatre
Batiment 56 - Rdc Pièce 036	Revêtements de sols / Dalles de sol Rosatre Couche d'Intérêt Dalle de sol Rosatre Revêtements de sols / Ragréage Couche d'Intérêt Ragréage
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 006	Revêtements de sols / Dalles de sol Bleue Couche d'Intérêt Dalle de sol Bleue Revêtements de sols / Ragréage Couche d'Intérêt Ragréage
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 007	Revêtements de sols / Dalles de sol Bleue Couche d'Intérêt Dalle de sol Bleue Revêtements de sols / Ragréage Couche d'Intérêt Ragréage
Batiment 56 - 2ème Etage Grenier	Revêtements de sols / Dalle Béton Couche d'Intérêt Dalle Béton
Conduits et accessoires intérieurs	
Batiment 56 - 2ème Etage Grenier	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Conduit de ventilation / aération Inox Toiture / Tuiles

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

VI. TEXTES REGLEMENTAIRES

- Code du travail – article R4412-97
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

- Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante
- Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NFX 46-020 – Août 2017 : Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie

VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d'ordre

Dans le cadre d'une mission de repérage avant réalisation de travaux, **le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER le programme détaillé des travaux** les plans du bâtiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmètre de l'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de repérage, celle-ci étant définie par la norme NF X 46-020. Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser. Le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être déterminé avant l'achèvement de la mission de repérage.

Le donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d'accès pour le bon déroulement de sa mission et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de tous les instruments d'accès nécessaires.

Le donneur d'ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. Le donneur d'ordre ou son représentant prend, à la demande de l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent ;

Le donneur d'ordre est tenu :

- de vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmètre et le programme de repérage proposés ;
- de fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisation ;
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage ;
- d'informer l'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

2. Phase de repérage

La phase de repérage comporte deux étapes :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble ; pour cela, il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage

Dans un second temps, il :

- recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;
- repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
- conclut sur la présence ou l'absence d'amiante.

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revêtements étant encore en place.

3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029. Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n°144 « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META).

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

1. Liste des locaux visités et non visités

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
Batiment 56 - Rdc	Entrée, Pièce 003, Pièce 004, Pièce 005, Pièce 007, Pièce 006, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 011, Pièce 010, Pièce 013, Pièce 012, Pièce 015, Pièce 014, Pièce 017, Pièce 016, Pièce 018, Pièce 020, Pièce 021, Pièce 022, Pièce 023, Sanitaires, Salle d'Attente, Pièce 030, Pièce 033, Pièce 034, Pièce 035, Pièce 036	/	/
Batiment 56 - 1er Etage	Palier, Pièce 002, Pièce 003, Sanitaires Hommes, Pièce 005, Pièce 006, Pièce 007, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 010, Pièce 011, Pièce 012, Pièce 015, Pièce 014, Pièce 016, Pièce 017, Pièce 018, Pièce 019/Pièce 020, Pièce 021, Pièce 022, Pièce 023, Sanitaires Femmes, Pièce 025, Pièce 026	/	/
Batiment 56 - Extérieur	Facade	/	/
Batiment 56 - 2ème Etage	Grenier	/	/

2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Batiment 56 - Rdc Pièce 010	Fenêtres	Mastic Vitrier Couche d'Intéret Mastic Vitrier	Résultat d'analyse P9
Batiment 56 - Rdc Pièce 033, Pièce 034, Pièce 035	Fenêtre	Mastic Vitrier Grisatre Couche d'Intéret Mastic Vitrier Grisatre	Résultat d'analyse P35
Batiment 56 - 1er Etage Sanitaires Hommes	Murs et cloisons maçonnés	Faïence Murale Blanche Petite taille + Colle Couche d'Intéret Colle	Résultat d'analyse P49
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 021	Murs et cloisons maçonnés	Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intéret Colle	Résultat d'analyse P62
Batiment 56 - 1er Etage Sanitaires Femmes	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse P72
Batiment 56 - 2ème Etage Grenier	Conduit Vertical	Fibro Ciment	Sur jugement personnel de l'opérateur

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification

3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Localisation - ZPSO	Composant	Partie de composant	Critère de conclusion
Batiment 56 - Rdc Entrée, Pièce 004, Pièce 005, Pièce 007, Pièce 006, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 013, Pièce 012, Pièce 015, Pièce 014, Pièce 017, Pièce 016, Pièce 018	Murs et cloisons maçonnés	Revêtement + Patre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse P1

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

<p>Batiment 56 - Rdc Entrée, Pièce 004, Pièce 005, Pièce 007, Pièce 006, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 013, Pièce 012, Pièce 015, Pièce 014, Pièce 017, Pièce 016, Pièce 018, Pièce 023, Salle d'Attente, Pièce 030, Pièce 033, Pièce 034, Pièce 035</p> <p>Batiment 56 - 1er Etage Palier, Pièce 002, Pièce 003, Sanitaires Hommes, Pièce 005, Pièce 006, Pièce 007, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 010, Pièce 011, Pièce 012, Pièce 015, Pièce 014, Pièce 016, Pièce 017, Pièce 018, Pièce 019/Pièce 020, Pièce 021, Pièce 022, Pièce 023, Sanitaires Femmes, Pièce 025, Pièce 026</p>	Murs et cloisons maçonnés	Platre Couche d'Intéret Platre	Résultat d'analyse P2, Résultat d'analyse P25, Résultat d'analyse P32, Résultat d'analyse P37, Résultat d'analyse P41, Résultat d'analyse P46, Résultat d'analyse P56, Résultat d'analyse P61, Résultat d'analyse P67
<p>Batiment 56 - Rdc Pièce 003, Pièce 036</p>	Revêtements de sols	Dalles de sol Rosatre Couche d'Intéret Dalle de sol Rosatre	Résultat d'analyse P13
<p>Batiment 56 - Rdc Pièce 003, Pièce 036</p> <p>Batiment 56 - 1er Etage Pièce 006, Pièce 007</p>	Revêtements de sols	Ragréage Couche d'Intéret Ragréage	Résultat d'analyse P14, Résultat d'analyse P54
<p>Batiment 56 - Rdc Pièce 003, Pièce 023, Sanitaires, Salle d'Attente, Pièce 030, Pièce 033, Pièce 034, Pièce 035, Pièce 036</p> <p>Batiment 56 - 1er Etage Palier, Pièce 002, Pièce 003, Sanitaires Hommes, Pièce 005, Pièce 006, Pièce 007, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 010, Pièce 011, Pièce 012, Pièce 015, Pièce 014, Pièce 016, Pièce 017, Pièce 018, Pièce 019/Pièce 020, Pièce 021, Pièce 022, Pièce 023, Sanitaires Femmes, Pièce 025, Pièce 026</p>	Murs et cloisons maçonnés	Revêtement + Platre Couche d'Intéret Revêtement + Platre	Résultat d'analyse P15, Résultat d'analyse P24, Résultat d'analyse P28, Résultat d'analyse P31, Résultat d'analyse P36, Résultat d'analyse P40, Résultat d'analyse P45, Résultat d'analyse P55, Résultat d'analyse P60, Résultat d'analyse P66
<p>Batiment 56 - Rdc Pièce 003</p>	Murs et cloisons maçonnés	Faïence Murale + Coll Couche d'Intéret Colle	Résultat d'analyse P16
<p>Batiment 56 - Rdc Pièce 003, Pièce 004, Pièce 005, Pièce 007, Pièce 006, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 013, Pièce 012, Pièce 015, Pièce 014, Pièce 017, Pièce 016, Pièce 018, Pièce 020, Pièce 021, Pièce 022, Pièce 023, Salle d'Attente, Pièce 030, Pièce 033, Pièce 034, Pièce 035, Pièce 036</p> <p>Batiment 56 - 1er Etage Palier, Pièce 002, Pièce 003, Sanitaires Hommes, Pièce 005, Pièce 006, Pièce 007, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 010, Pièce 011, Pièce 012, Pièce 021, Sanitaires Femmes</p>	Fenetre	Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre	Résultat d'analyse P17, Résultat d'analyse P3, Résultat d'analyse P21, Résultat d'analyse P26, Résultat d'analyse P34, Résultat d'analyse P38, Résultat d'analyse P43, Résultat d'analyse P51, Résultat d'analyse P63, Résultat d'analyse P71

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

Batiment 56 - Rdc Pièce 003, Pièce 004, Pièce 005, Pièce 007, Pièce 006, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 011, Pièce 010, Pièce 013, Pièce 012, Pièce 015, Pièce 014, Pièce 017, Pièce 016, Pièce 018, Pièce 020, Pièce 021, Pièce 022, Pièce 023, Sanitaires, Salle d'Attente, Pièce 030, Pièce 033, Pièce 034, Pièce 035, Pièce 036 Batiment 56 - 1er Etage Palier, Pièce 002, Pièce 003, Sanitaires Hommes, Pièce 005, Pièce 006, Pièce 007, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 010, Pièce 011, Pièce 012, Pièce 015, Pièce 014, Pièce 016, Pièce 017, Pièce 018, Pièce 019/Pièce 020, Pièce 022, Pièce 023, Pièce 025, Pièce 026	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse P18, Résultat d'analyse P4, Résultat d'analyse P11, Résultat d'analyse P12, Résultat d'analyse P22, Résultat d'analyse P27, Résultat d'analyse P30, Résultat d'analyse P33, Résultat d'analyse P39, Résultat d'analyse P44, Résultat d'analyse P52, Résultat d'analyse P59
Batiment 56 - Rdc Pièce 011, Pièce 010, Pièce 018	Revêtements de sols	Dalles de sol Verdâtre Couche d'Intéret Dalles de Sol Verdâtre	Résultat d'analyse P5
Batiment 56 - Rdc Pièce 011, Pièce 010, Pièce 018	Revêtements de sols	Ragréage + Colle Couche d'Intéret Ragréage + Colle	Résultat d'analyse P6
Batiment 56 - Rdc Pièce 011, Pièce 010	Revêtements de sols	Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse P7
Batiment 56 - Rdc Pièce 011, Pièce 010	Revêtements de sols	Plâtre	Résultat d'analyse P8
Batiment 56 - Rdc Pièce 010	Fenêtres	Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchâtre	Résultat d'analyse P10
Batiment 56 - Rdc Pièce 020, Pièce 021, Pièce 022	Poteaux	Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse P19
Batiment 56 - Rdc Pièce 020, Pièce 021, Pièce 022	Poteaux	Plâtre	Résultat d'analyse P20
Batiment 56 - Rdc Pièce 020	Revêtements de sols	Dalles de sol Grisâtre Couche d'Intéret Dalle de Sol Grisâtre	Résultat d'analyse P23
Batiment 56 - Rdc Sanitaires	Murs et cloisons maçonnés	Plâtre	Résultat d'analyse P29
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 002, Pièce 006, Pièce 007, Pièce 008, Pièce 009, Pièce 010, Pièce 011, Pièce 012	Murs et cloisons maçonnés	Faïence Murale + Colle Couche d'Intéret Colle	Résultat d'analyse P42
Batiment 56 - 1er Etage Sanitaires Hommes, Sanitaires Femmes	Murs et cloisons maçonnés	Plinthe Faïence + Colle Couche d'Intéret Colle	Résultat d'analyse P47, Résultat d'analyse P68
Batiment 56 - 1er Etage Sanitaires Hommes, Sanitaires Femmes	Murs et cloisons maçonnés	Faïence Murale Rosâtre + Colle Couche d'Intéret Colle	Résultat d'analyse P48, Résultat d'analyse P69
Batiment 56 - 1er Etage Sanitaires Hommes	Murs et cloisons maçonnés	Faïence Murale Blanche Grande Taille + Colle Couche d'Intéret Colle	Résultat d'analyse P50
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 006, Pièce 007	Revêtements de sols	Dalles de sol Bleue Couche d'Intéret Dalle de sol Bleue	Résultat d'analyse P53
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 015, Pièce 014, Pièce 016, Pièce 017, Pièce 018, Pièce 019/Pièce 020, Pièce 022, Pièce 023, Pièce 025, Pièce 026	Murs et cloisons maçonnés	Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intéret Colle	Résultat d'analyse P57
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 015, Pièce 014, Pièce 016, Pièce 017, Pièce 018, Pièce 019/Pièce 020, Pièce 022, Pièce 023, Pièce 025, Pièce 026	Fenêtre	Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchâtre	Résultat d'analyse P58
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 021	Plafonds	Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse P64
Batiment 56 - 1er Etage Pièce 021	Plafonds	Plâtre Couche d'Intéret Plâtre	Résultat d'analyse P65
Batiment 56 - Extérieur Facade	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Enduits projetés	Postérieur à 1997, non susceptible de contenir de l'amiante

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

Batiment 56 - 2ème Etage Grenier	Revêtements de sols	Dalle Béton Couche d'Intéret Dalle Béton	Résultat d'analyse P73
Batiment 56 - 2ème Etage Grenier	Murs et cloisons maçonnés	Briques	Par nature ne contient pas d'amiante
Batiment 56 - 2ème Etage Grenier	Toiture	Papier Cartonné + Isolant Couche d'Intéret Papier Cartonné + Isolant	Résultat d'analyse P74
Batiment 56 - 2ème Etage Grenier	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduit de ventilation / aération Inox	Par nature ne contient pas d'amiante
Batiment 56 - 2ème Etage Grenier	Toiture	Tuiles	Par nature ne contient pas d'amiante

La localisation des prélèvements sont à retrouver dans l'ANNEXE 1 - la fiche de cotation et d'indentification

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1^{er} juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1^{er} juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1^{er} janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P1	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre	Pièce 007 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P1	/
P2	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Plâtre Couche d'Intérêt Plâtre	Pièce 007 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P2	/
P3	20/09/2021	Fenetre	Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intérêt Joint d'etanchéité Blanchatre	Pièce 007 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P3	/
P4	20/09/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Pièce 006 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P4	/
P5	20/09/2021	Revêtements de sols	Dalles de sol Verdatre Couche d'Intérêt Dalles de Sol Verdatre	Pièce 010 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P5	/
P6	20/09/2021	Revêtements de sols	Ragréage + Colle Couche d'Intérêt Ragréage + Colle	Pièce 010 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P6	/
P7	20/09/2021	Revêtements de sols	Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre	Pièce 010 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P7	/
P8	20/09/2021	Revêtements de sols	Plâtre	Pièce 010 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P8	/
P9	20/09/2021	Fenêtres	Mastic Vitrier Couche d'Intérêt Mastic Vitrier	Pièce 010 - Batiment 56 - Rdc	Positif	/	Photo P9	/
P10	20/09/2021	Fenêtres	Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intérêt Joint d'etanchéité Blanchatre	Pièce 010 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P10	/
P11	20/09/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Pièce 010 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P11	/
P12	20/09/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Pièce 015 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P12	/
P13	20/09/2021	Revêtements de sols	Dalles de sol Rosatre Couche d'Intérêt Dalle de sol Rosatre	Pièce 003 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P13	/
P14	20/09/2021	Revêtements de sols	Ragréage Couche d'Intérêt Ragréage	Pièce 003 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P14	/
P15	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre	Pièce 003 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P15	/
P16	20/09/2021	Murs et cloisons	Faïence Murale + Coll	Pièce 003 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P16	/

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
		maçonnés	Couche d'Intérêt Colle					
P17	20/09/2021	Fenetre	Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intérêt Joint d'etanchéité Blanchatre	Pièce 003 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P17	/
P18	20/09/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Pièce 003 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P18	/
P19	20/09/2021	Poteaux	Revêtement + Platre Couche d'Intérêt Revêtement + Platre	Pièce 020 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P19	/
P20	20/09/2021	Poteaux	Platre	Pièce 020 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P20	/
P21	20/09/2021	Fenetre	Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intérêt Joint d'etanchéité Blanchatre	Pièce 020 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P21	/
P22	20/09/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Pièce 020 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P22	/
P23	20/09/2021	Revêtements de sols	Dalles de sol Grisatre Couche d'Intérêt Dalle de Sol Grisatre	Pièce 022 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P23	/
P24	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Revêtement + Platre Couche d'Intérêt Revêtement + Platre	Pièce 023 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P24	/
P25	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Platre Couche d'Intérêt Platre	Pièce 023 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P25	/
P26	20/09/2021	Fenetre	Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intérêt Joint d'etanchéité Blanchatre	Pièce 023 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P26	/
P27	20/09/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Pièce 023 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P27	/
P28	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Revêtement + Platre Couche d'Intérêt Revêtement + Platre	Sanitaires - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P28	/
P29	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Platre	Sanitaires - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P29	/
P30	20/09/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Sanitaires - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P30	/
P31	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Revêtement + Platre Couche d'Intérêt Revêtement + Platre	Pièce 033 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P31	/
P32	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Platre Couche d'Intérêt Platre	Pièce 033 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P32	/

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P33	20/09/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Pièce 033 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P33	/
P34	20/09/2021	Fenetre	Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre	Pièce 033 - Batiment 56 - Rdc	Négatif	/	Photo P34	/
P35	20/09/2021	Fenetre	Mastic Vitrier Grisatre Couche d'Intéret Mastic Vitrier Grisatre	Pièce 033 - Batiment 56 - Rdc	Positif	/	Photo P35	/
P36	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Revêtement + Platre Couche d'Intéret Revêtement + Platre	Palier - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P36	/
P37	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Platre Couche d'Intéret Platre	Palier - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P37	/
P38	20/09/2021	Fenetre	Joint d'Etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre	Palier - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P38	/
P39	20/09/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Palier - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P39	/
P40	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Revêtement + Platre Couche d'Intéret Revêtement + Platre	Pièce 002 - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P40	/
P41	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Platre Couche d'Intéret Platre	Pièce 002 - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P41	/
P42	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Faïence Murale + Colle Couche d'Intéret Colle	Pièce 002 - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	/	/
P43	20/09/2021	Fenetre	Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre	Pièce 002 - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	/	/
P44	20/09/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Pièce 002 - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	/	/
P45	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Revêtement + Platre Couche d'Intéret Revêtement + Platre	Sanitaires Hommes - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P45	/
P46	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Platre Couche d'Intéret Platre	Sanitaires Hommes - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P46	/
P47	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Plinthe Faïence + Colle Couche d'Intéret Colle	Sanitaires Hommes - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P47	/
P48	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Faïence Murale Rosatre +	Sanitaires Hommes - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P48	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

355, avenue du Général Patton

CS 56613 49066 ANGERS CEDEX 1 - Tel./Fax. : 0241687286 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00460 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676

293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Page 26 sur 92

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
			Colle Couche d'Intérêt Colle					
P49	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Faïence Murale Blanche Petite taille + Colle Couche d'Intérêt Colle	Sanitaires Hommes - Batiment 56 - 1er Etage	Positif	/	Photo P49	/
P50	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Faïence Murale Blanche Grande Taille + Colle Couche d'Intérêt Colle	Sanitaires Hommes - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P50	/
P51	20/09/2021	Fenetre	Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intérêt Joint d'etanchéité Blanchatre	Sanitaires Hommes - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P51	/
P52	20/09/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Sanitaires Hommes - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P52	/
P53	20/09/2021	Revêtements de sols	Dalles de sol Bleue Couche d'Intérêt Dalle de sol Bleue	Pièce 007 - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P53	/
P54	20/09/2021	Revêtements de sols	Ragréage Couche d'Intérêt Ragréage	Pièce 007 - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P54	/
P55	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Revêtement + Platre Couche d'Intérêt Revêtement + Platre	Pièce 017 - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P55	/
P56	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Platre Couche d'Intérêt Platre	Pièce 017 - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P56	/
P57	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intérêt Colle	Pièce 017 - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P57	/
P58	20/09/2021	Fenetre	Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intérêt Joint d'etanchéité Blanchatre	Pièce 017 - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P58	/
P59	20/09/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Pièce 017 - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P59	/
P60	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Revêtement + Platre Couche d'Intérêt Revêtement + Platre	Pièce 021 - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P60	/
P61	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Platre Couche d'Intérêt Platre	Pièce 021 - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P61	/
P62	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intérêt Colle	Pièce 021 - Batiment 56 - 1er Etage	Positif	/	Photo P62	/


Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

N° échantillon	Date du prélèvement	Composant de la construction	Partie du composant	Localisation du prélèvement	Présence d'amiante	Croquis n°	Photo n°	Avis / Interprétation
P63	20/09/2021	Fenetre	Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre	Pièce 021 - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P63	/
P64	20/09/2021	Plafonds	Revêtement + Platre Couche d'Intéret Revêtement + Platre	Pièce 021 - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P64	/
P65	20/09/2021	Plafonds	Platre Couche d'Intéret Platre	Pièce 021 - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P65	/
P66	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Revêtement + Platre Couche d'Intéret Revêtement + Platre	Sanitaires Femmes - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P66	/
P67	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Platre Couche d'Intéret Platre	Sanitaires Femmes - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P67	/
P68	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Plinthe Faience + Colle Couche d'Intéret Colle	Sanitaires Femmes - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P68	/
P69	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Faience Murale Rosatre + Colle Couche d'Intéret Colle	Sanitaires Femmes - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P69	/
P70	20/09/2021	Murs et cloisons maçonnés	Faience Murale Blanche Petite Taille + Colle Couche d'Intéret Colle	Sanitaires Femmes - Batiment 56 - 1er Etage	Inconnu	/	Photo P70	/
P71	20/09/2021	Fenetre	Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre	Sanitaires Femmes - Batiment 56 - 1er Etage	Négatif	/	Photo P71	/
P72	20/09/2021	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Sanitaires Femmes - Batiment 56 - 1er Etage	Positif	/	Photo P72	/
P73	20/09/2021	Revêtements de sols	Dalle Béton Couche d'Intéret Dalle Béton	Grenier - Batiment 56 - 2ème Etage	Négatif	/	Photo P73	/
P74	20/09/2021	Toiture	Papier Cartonné + Isolant Couche d'Intéret Papier Cartonné + Isolant	Grenier - Batiment 56 - 2ème Etage	Négatif	/	Photo P74	/

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

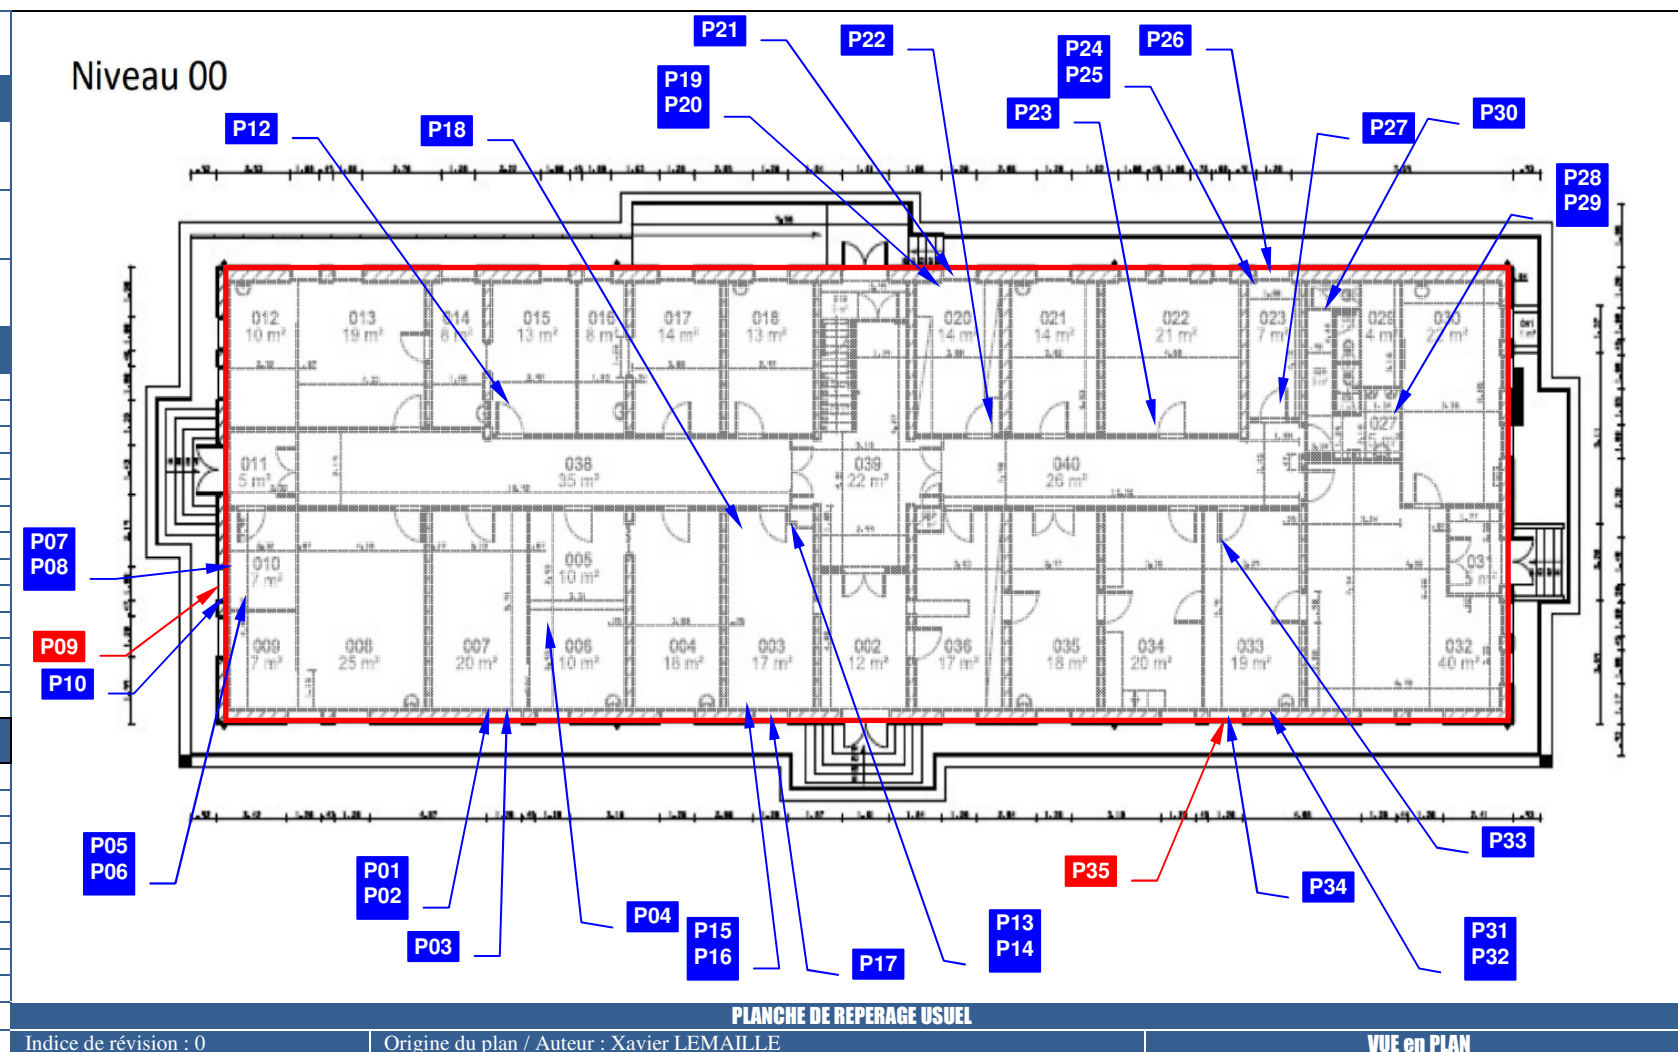[illegible]

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

[illegible]

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

Planche
N°3 / 3

**NIVEAU : 2^{ème}
Etage**

LEGENDE

P	Prélèvement négatif
P	Prélèvement positif
S	Sondage

Matériaux ou Produits
Contenant de l'Amiante

Représentation
graphique

Conduit Fibro Amianté



Divers

Représentation
graphique

Niveau 2

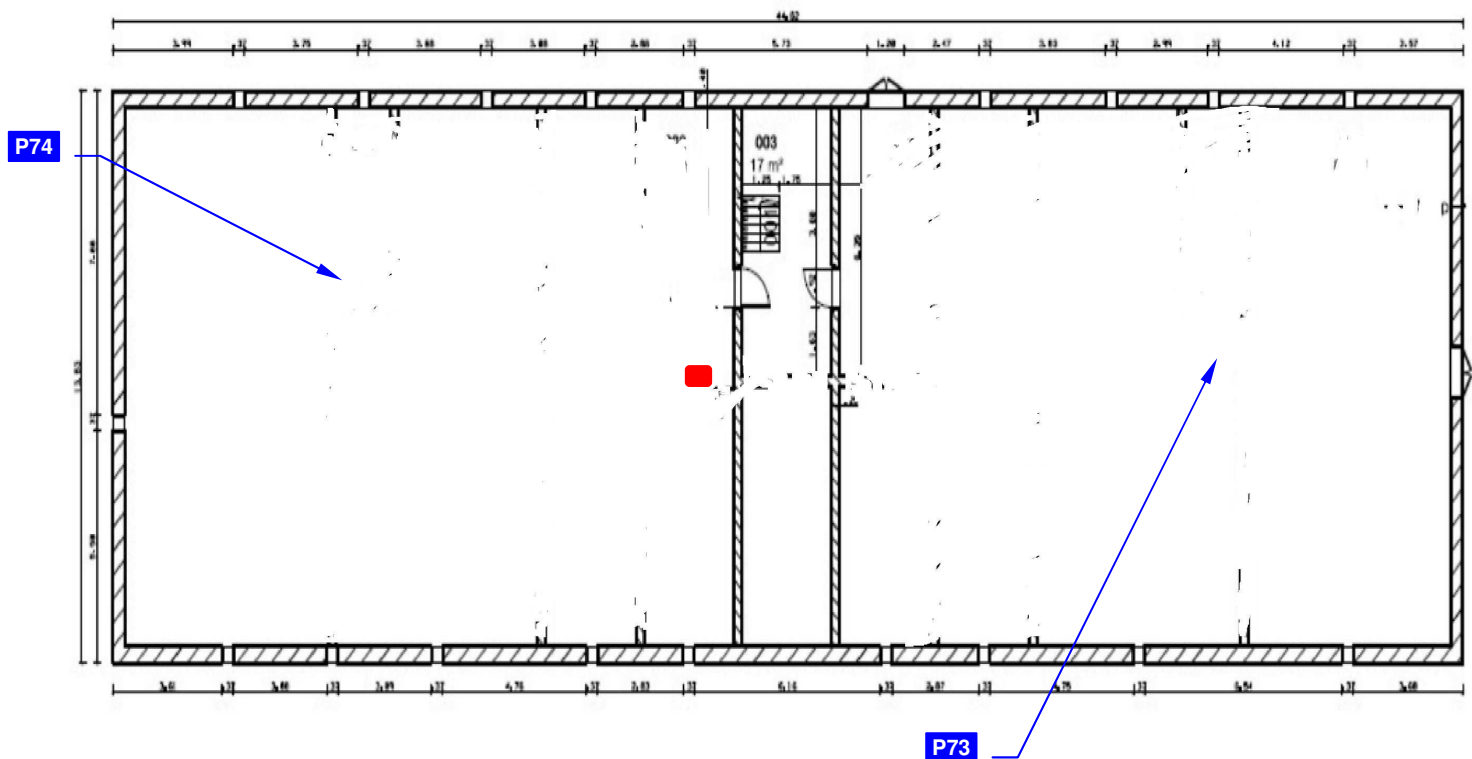


PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Xavier LEMAILLE

VUE en PLAN

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

ANNEXE 3 - PHOTOS

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P1

Pièce ou Local	Pièce 007 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Revêtement + Patre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P2

Pièce ou Local	Pièce 007 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Plâtre Couche d'Intéret Plâtre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P3

Pièce ou Local	Pièce 007 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Fenetre
Partie du composant	Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P4

Pièce ou Local	Pièce 006 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P5

Pièce ou Local	Pièce 010 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalles de sol Verdatre Couche d'Intéret Dalles de Sol Verdatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P6

Pièce ou Local	Pièce 010 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage + Colle Couche d'Intéret Ragréage + Colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P7

Pièce ou Local	Pièce 010 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P8

Pièce ou Local	Pièce 010 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P9

Pièce ou Local	Pièce 010 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Fenêtres
Partie du composant	Mastic Vitrier Couche d'Intéret Mastic Vitrier

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P10

Pièce ou Local	Pièce 010 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Fenêtres
Partie du composant	Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchâtre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P11

Pièce ou Local	Pièce 010 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques

Présence d'amiante	Non
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



PRELEVEMENT : P12

Pièce ou Local	Pièce 015 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques

Présence d'amiante	Non
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P13

Pièce ou Local	Pièce 003 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalles de sol Rosatre Couche d'Intéret Dalle de sol Rosatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P14

Pièce ou Local	Pièce 003 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage Couche d'Intéret Ragréage
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P15

Pièce ou Local	Pièce 003 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P16

Pièce ou Local	Pièce 003 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Faïence Murale + Coll Couche d'Intéret Colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P17

Pièce ou Local	Pièce 003 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Fenetre
Partie du composant	Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P18

Pièce ou Local	Pièce 003 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P19

Pièce ou Local	Pièce 020 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Poteaux
Partie du composant	Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P20

Pièce ou Local	Pièce 020 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Poteaux
Partie du composant	Plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P21

Pièce ou Local	Pièce 020 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Fenetre
Partie du composant	Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P22

Pièce ou Local	Pièce 020 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**


PRELEVEMENT : P23

Pièce ou Local	Pièce 022 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalles de sol Grisatre Couche d'Intéret Dalle de Sol Grisatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P24

Pièce ou Local	Pièce 023 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

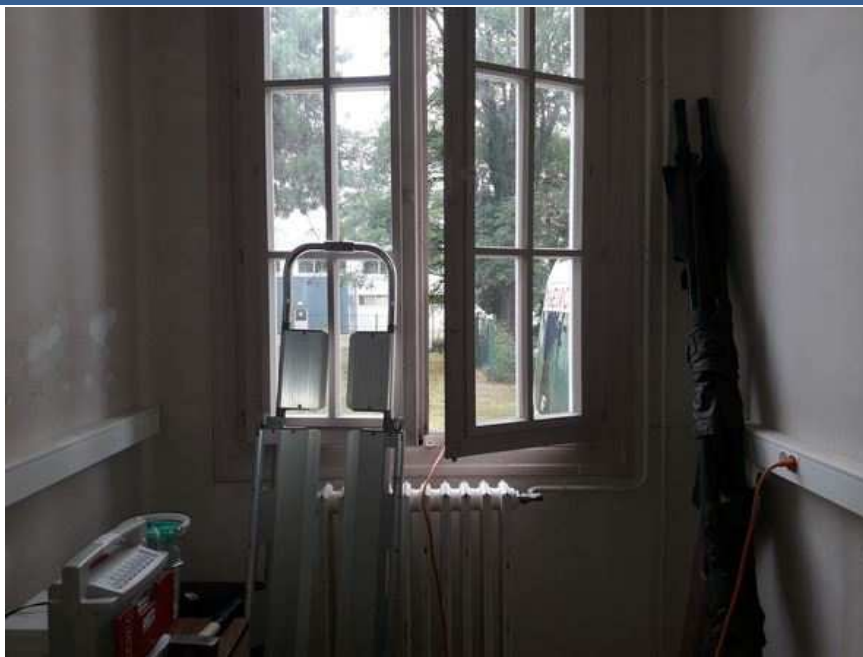


Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P25

Pièce ou Local	Pièce 023 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Platre Couche d'Intéret Platre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /

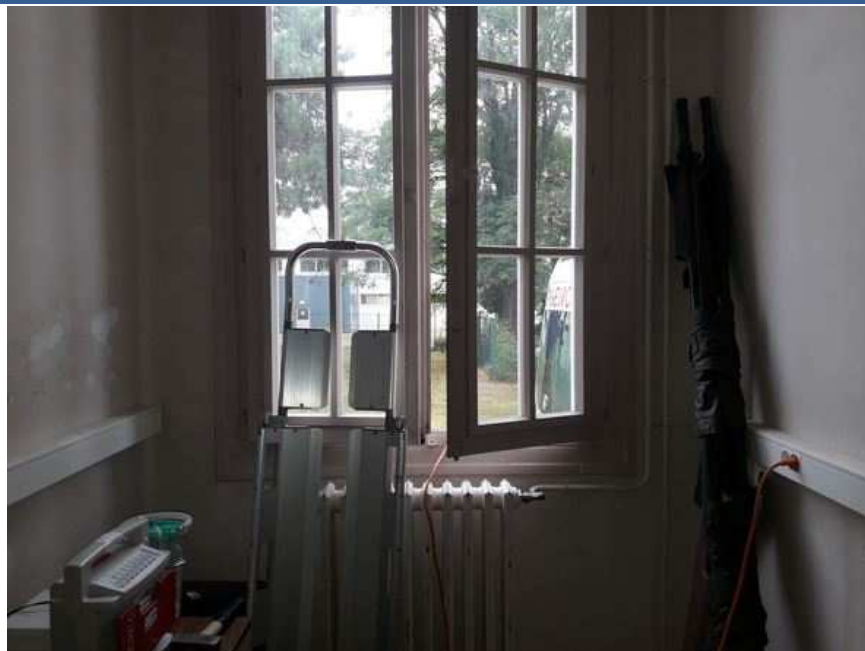

PRELEVEMENT : P26

Pièce ou Local	Pièce 023 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Fenetre
Partie du composant	Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P27

Pièce ou Local	Pièce 023 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /




PRELEVEMENT : P28

Pièce ou Local	Sanitaires (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre

Présence d'amiante **Non**


Plan N° /

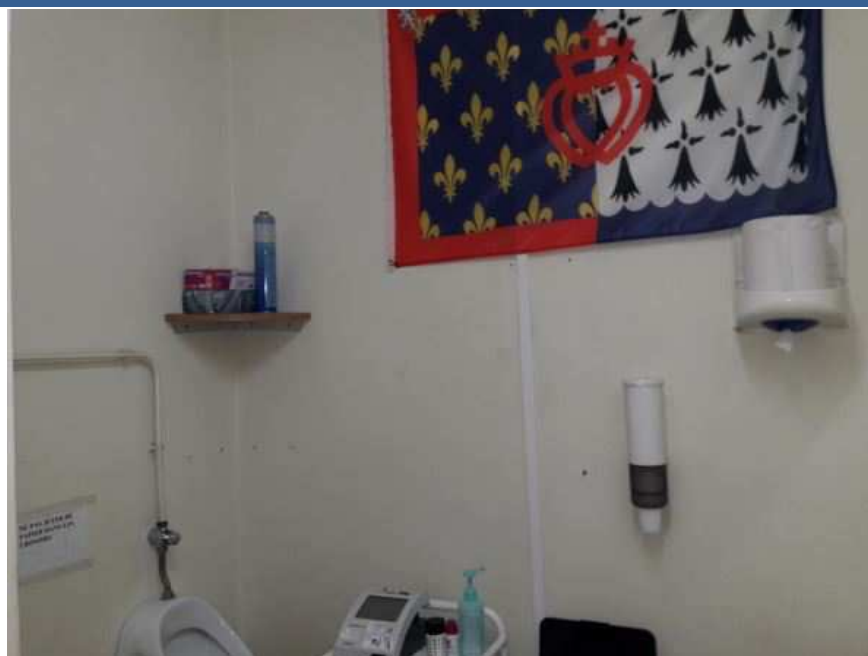

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**


PRELEVEMENT : P29

Pièce ou Local	Sanitaires (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Platre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

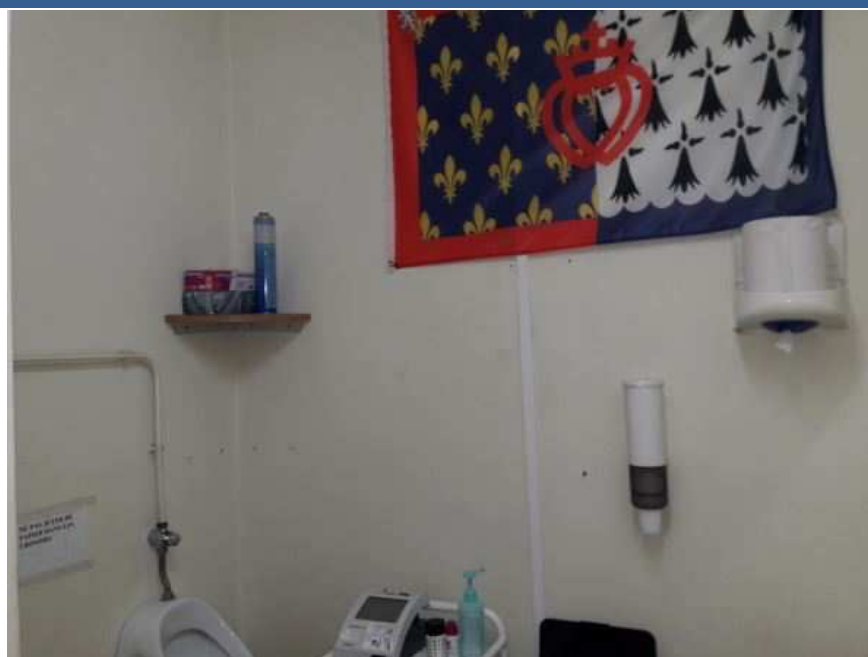

PRELEVEMENT : P30

Pièce ou Local	Sanitaires (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

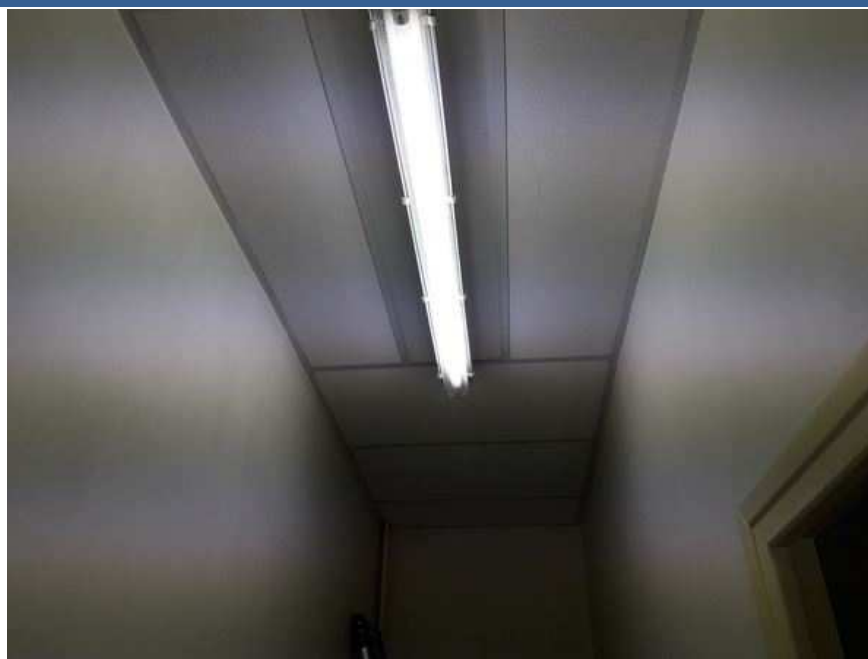

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P31

Pièce ou Local	Pièce 033 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P32

Pièce ou Local	Pièce 033 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Plâtre Couche d'Intéret Plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P33

Pièce ou Local	Pièce 033 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P34

Pièce ou Local	Pièce 033 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Fenetre
Partie du composant	Joint d'étanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchatre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P35

Pièce ou Local	Pièce 033 (Batiment 56 - Rdc)
Composant de la construction	Fenetre
Partie du composant	Mastic Vitrier Grisatre Couche d'Intéret Mastic Vitrier Grisatre

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P36

Pièce ou Local	Palier (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnes
Partie du composant	Revêtement + Platre Couche d'Intéret Revêtement + Platre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P37

Pièce ou Local	Palier (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Platre Couche d'Intéret Platre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P38

Pièce ou Local	Palier (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Fenetre
Partie du composant	Joint d'Etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P39

Pièce ou Local	Palier (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P40

Pièce ou Local	Pièce 002 (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P41

Pièce ou Local	Pièce 002 (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Platre Couche d'Intéret Platre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P45


Pièce ou Local	Sanitaires Hommes (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Revêtement + Platre Couche d'Intéret Revêtement + Platre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P46

Pièce ou Local	Sanitaires Hommes (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Platre Couche d'Intérêt Platre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

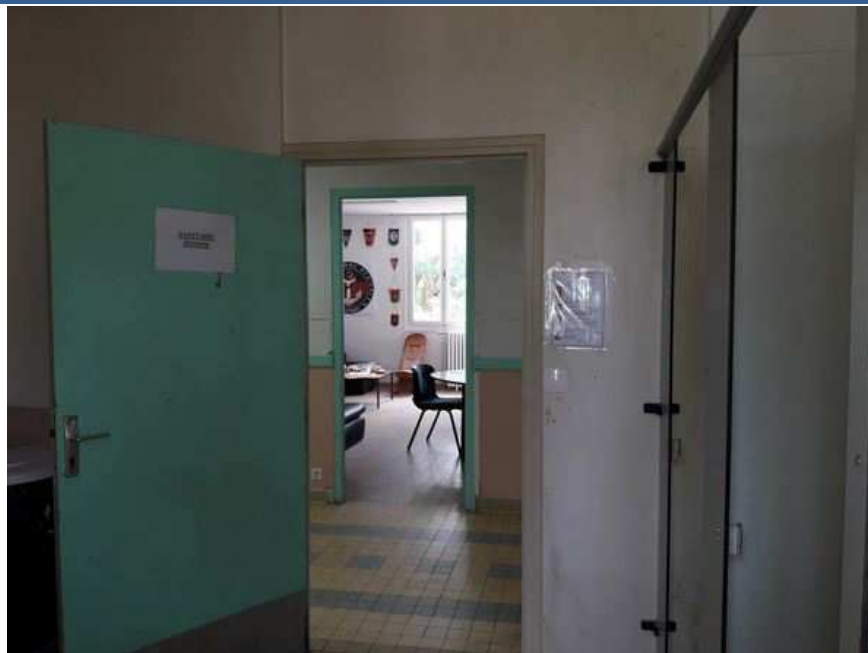

PRELEVEMENT : P47

Pièce ou Local	Sanitaires Hommes (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Plinthe Faïence + Colle Couche d'Intérêt Colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P48

Pièce ou Local	Sanitaires Hommes (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Faïence Murale Rosatre + Colle Couche d'Intéret Colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P49

Pièce ou Local	Sanitaires Hommes (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Faïence Murale Blanche Petite taille + Colle Couche d'Intéret Colle
Présence d'amiante	Oui
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P50

Pièce ou Local	Sanitaires Hommes (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Faïence Murale Blanche Grande Taille + Colle Couche d'Intéret Colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P51

Pièce ou Local	Sanitaires Hommes (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Fenetre
Partie du composant	Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P52

Pièce ou Local	Sanitaires Hommes (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P53

Pièce ou Local	Pièce 007 (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalles de sol Bleue Couche d'Intéret Dalle de sol Bleue

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P54

Pièce ou Local	Pièce 007 (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Ragréage Couche d'Intérêt Ragréage

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P55

Pièce ou Local	Pièce 017 (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P56

Pièce ou Local	Pièce 017 (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Platre Couche d'Intéret Platre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P57

Pièce ou Local	Pièce 017 (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intéret Colle

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P58

Pièce ou Local	Pièce 017 (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Fenetre
Partie du composant	Joint d'etanchéité Blanchatre Couche d'Intéret Joint d'etanchéité Blanchatre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P59

Pièce ou Local	Pièce 017 (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**


PRELEVEMENT : P60

Pièce ou Local	Pièce 021 (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P61

Pièce ou Local	Pièce 021 (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Plâtre Couche d'Intéret Plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/

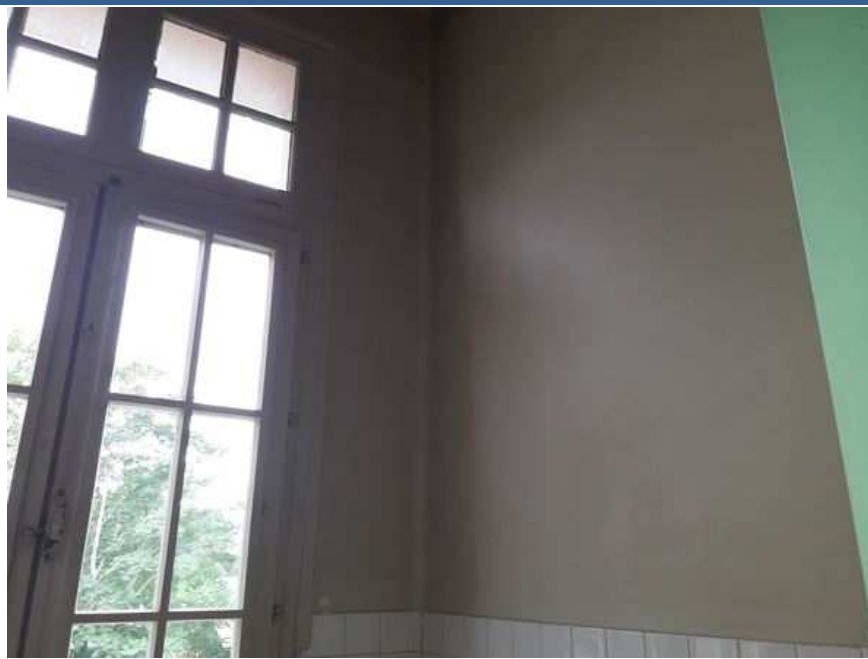

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P62

Pièce ou Local	Pièce 021 (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intéret Colle

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P63

Pièce ou Local	Pièce 021 (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Fenetre
Partie du composant	Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchâtre

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P64

Pièce ou Local	Pièce 021 (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P65

Pièce ou Local	Pièce 021 (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Plâtre Couche d'Intéret Plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P66

Pièce ou Local	Sanitaires Femmes (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P67

Pièce ou Local	Sanitaires Femmes (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Plâtre Couche d'Intérêt Plâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P68

Pièce ou Local	Sanitaires Femmes (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Plinthe Faïence + Colle Couche d'Intérêt Colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P69

Pièce ou Local	Sanitaires Femmes (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Faïence Murale Rosatre + Colle Couche d'Intérêt Colle
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P70

Pièce ou Local	Sanitaires Femmes (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Murs et cloisons maçonnés
Partie du composant	Faïence Murale Blanche Petite Taille + Colle Couche d'Intéret Colle
Présence d'amiante	Inconnu
Plan N°	/



PRELEVEMENT : P71

Pièce ou Local	Sanitaires Femmes (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Fenetre
Partie du composant	Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchâtre
Présence d'amiante	Non
Plan N°	/



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P72

Pièce ou Local	Sanitaires Femmes (Batiment 56 - 1er Etage)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Panneaux et plaques

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /



PRELEVEMENT : P73

Pièce ou Local	Grenier (Batiment 56 - 2ème Etage)
Composant de la construction	Revêtements de sols
Partie du composant	Dalle Béton Couche d'Intérêt Dalle Béton


Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

PRELEVEMENT : P74

Pièce ou Local	Grenier (Batiment 56 - 2ème Etage)	
Composant de la construction	Toiture	
Partie du composant	Papier Cartonné + Isolant Couche d'Intéret Papier Cartonné + Isolant	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Grenier (Batiment 56 - 2ème Etage)
Composant de la construction	Conduit Vertical
Partie du composant	Fibro Ciment

Présence d'amiante **Oui**

Plan N° /



MATERIAU RECONNU VISUELLEMENT

Pièce ou Local	Grenier (Batiment 56 - 2ème Etage)
Composant de la construction	Toiture
Partie du composant	Tuiles

Présence d'amiante **Non**

Plan N° /



Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967



Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-28816 EN DATE DU 27/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : QUALICONSULT IMMOBILIER - ANGERS 355, Avenue du Général PATTON CS 56613 49066 ANGERS Cedex 1	Réf. Commande ITGA : IT1421-28816 Réf. Commande Client : 876146/P1
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/09/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0001 - Revêtement + Patte Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre - Pièce 007 (Batiment 56 - Rdc) / Murs et cloisons maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT142109-29273 Description ITGA : Peinture avec couche fibreuse / Papier / Matériau plâtreux blanc	
* Peinture avec couche fibreuse non séparable + Papier + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0002 - Plâtre Couche d'Intérêt Plâtre - Pièce 007 (Batiment 56 - Rdc) / Murs et cloisons maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT142109-29274 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 1/11

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-28816 EN DATE DU 27/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29316	
Réf échantillon client : P0044 - Panneaux et plaques - Pièce 002 (Bâtiment 56 - 1er Etage) / Faux plafonds		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29317	
Réf échantillon client : P0045 - Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre - Sanitaires Hommes (Bâtiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnés		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (2)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29318	
Réf échantillon client : P0046 - Plâtre Couche d'Intérêt Plâtre - Sanitaires Hommes (Bâtiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnés		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (2)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29319	
Réf échantillon client : P0047 - Plinthe Faïence + Colle Couche d'Intérêt Colle - Sanitaires Hommes (Bâtiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnés		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Peinture / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable + Peinture non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ABE (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29320	
Réf échantillon client : P0048 - Faïence Murale Rosâtre + Colle Couche d'Intérêt Colle - Sanitaires Hommes (Bâtiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnés		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 10/11

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-28816 EN DATE DU 27/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0049 - Faïence Murale Blanche Petite taille + Colle Couche d'Intéret Colle - Sanitaires Hommes (Batiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnés			
		Réf échantillon ITGA : IT142109-29321	
		Description ITGA : Carrelage / Colle grise avec couche cartonnée / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise avec couche cartonnée + Peinture non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0050 - Faïence Murale Blanche Grande Taille + Colle Couche d'Intéret Colle - Sanitaires Hommes (Batiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnés			
		Réf échantillon ITGA : IT142109-29322	
		Description ITGA : Matériau souple blanc / Carrelage / Colle beige avec couche cartonnée	
* Matériau souple blanc	META (B) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige avec couche cartonnée	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.


(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Kévin GUY** Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 11/11

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-28816 EN DATE DU 27/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29275	
Réf échantillon client : P0003 - Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intérêt Joint d'étanchéité Blanchâtre - Pièce 007 (Batiment 56 - Rdc) / Fenêtre		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
* Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29276	
Réf échantillon client : P0004 - Panneaux et plaques - Pièce 006 (Batiment 56 - Rdc) / Faux plafonds		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BIL (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29277	
Réf échantillon client : P0005 - Dalles de sol Verdâtre Couche d'Intérêt Dalles de Sol Verdâtre - Pièce 010 (Batiment 56 - Rdc) / Revêtements de sols		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage rose en faible quantité	
* Revêtement bicouche souple beige et noir + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Ragréage rose en faible quantité non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29278	
Réf échantillon client : P0006 - Ragréage + Colle Couche d'Intérêt Ragréage + Colle - Pièce 010 (Batiment 56 - Rdc) / Revêtements de sols		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
* Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29279	
Réf échantillon client : P0007 - Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre - Pièce 010 (Batiment 56 - Rdc) / Revêtements de sols		Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Papier + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 2/11

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-28816 EN DATE DU 27/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29280	
Réf échantillon client : P0008 - Plâtre - Pièce 010 (Batiment 56 - Rdc)/ Revêtements de sols		Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc	
* Peinture non séparable + Papier + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29281	
Réf échantillon client : P0009 - Mastic Vitrier Couche d'Intérêt Mastic Vitrier - Pièce 010 (Batiment 56 - Rdc)/ Fenêtres		Description ITGA : Matériau mou gris	
* Matériau mou gris	META (B) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : RMT
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29282	
Réf échantillon client : P0010 - Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intérêt Joint d'étanchéité Blanchâtre - Pièce 010 (Batiment 56 - Rdc)/ Fenêtres		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
* Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29283	
Réf échantillon client : P0011 - Panneaux et plaques - Pièce 010 (Batiment 56 - Rdc)/ Faux plafonds		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29284	
Réf échantillon client : P0012 - Panneaux et plaques - Pièce 015 (Batiment 56 - Rdc)/ Faux plafonds		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 3 / 11

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-28816 EN DATE DU 27/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0013 - Dalles de sol Rosatre Couche d'Intéret Dalle de sol Rosatre - Pièce 003 (Batiment 56 - Rdc) / Revêtements de sols		Réf échantillon ITGA : IT142109-29285 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité	
* Revêtement bicouche souple beige et noir + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0014 - Ragréage Couche d'Intéret Ragréage - Pièce 003 (Batiment 56 - Rdc) / Revêtements de sols		Réf échantillon ITGA : IT142109-29286 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau blanc	
* Colle polymère jaune + Ragréage rose non séparable + Matériau blanc non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0015 - Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre - Pièce 003 (Batiment 56 - Rdc) / Murs et cloisons maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT142109-29287 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (2)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0016 - Faïence Murale + Coll Couche d'Intéret Colle - Pièce 003 (Batiment 56 - Rdc) / Murs et cloisons maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT142109-29288 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0017 - Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchâtre - Pièce 003 (Batiment 56 - Rdc) / Fenêtre		Réf échantillon ITGA : IT142109-29289 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
* Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 4 / 11

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-28816 EN DATE DU 27/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29290	
Réf échantillon client : P0018 - Panneaux et plaques - Pièce 003 (Batiment 56 - Rdc) / Faux plafonds		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29291	
Réf échantillon client : P0019 - Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre - Pièce 020 (Batiment 56 - Rdc) / Poteaux		Description ITGA : Papier peint / Peinture / Matériau plâtreux blanc	
* Papier peint + Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29292	
Réf échantillon client : P0020 - Plâtre - Pièce 020 (Batiment 56 - Rdc) / Poteaux		Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Papier + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (2)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29293	
Réf échantillon client : P0021 - Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchâtre - Pièce 020 (Batiment 56 - Rdc) / Fenêtre		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
* Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29294	
Réf échantillon client : P0022 - Panneaux et plaques - Pièce 020 (Batiment 56 - Rdc) / Faux plafonds		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 5 / 11

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-28816 EN DATE DU 27/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29295	
Réf échantillon client : P0023 - Dalles de sol Grisatre Couche d'Intéret Dalle de Sol Grisatre - Pièce 022 (Batiment 56 - Rdc) / Revêtements de sols		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité	
* Revêtement bicouche souple beige et noir + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29296	
Réf échantillon client : P0024 - Revêtement + Plâtre Couche d'Intéret Revêtement + Plâtre - Pièce 023 (Batiment 56 - Rdc) / Murs et cloisons maçonnés		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (2)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29297	
Réf échantillon client : P0025 - Plâtre Couche d'Intéret Plâtre - Pièce 023 (Batiment 56 - Rdc) / Murs et cloisons maçonnés		Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc	
* Peinture non séparable + Papier + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29298	
Réf échantillon client : P0026 - Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intéret Joint d'étanchéité Blanchâtre - Pièce 023 (Batiment 56 - Rdc) / Fenêtre		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
* Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29299	
Réf échantillon client : P0027 - Panneaux et plaques - Pièce 023 (Batiment 56 - Rdc) / Faux plafonds		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 6/11

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-28816 EN DATE DU 27/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29300	
Réf échantillon client : P0028 - Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre - Sanitaires (Batiment 56 - Rdc) / Murs et cloisons maçonnés		Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc	
* Peinture non séparable + Papier + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29301	
Réf échantillon client : P0029 - Plâtre - Sanitaires (Batiment 56 - Rdc) / Murs et cloisons maçonnés		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29302	
Réf échantillon client : P0030 - Panneaux et plaques - Sanitaires (Batiment 56 - Rdc) / Faux plafonds		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BIL. (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29303	
Réf échantillon client : P0031 - Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre - Pièce 033 (Batiment 56 - Rdc) / Murs et cloisons maçonnés		Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc	
* Peinture non séparable + Papier + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29304	
Réf échantillon client : P0032 - Plâtre Couche d'Intérêt Plâtre - Pièce 033 (Batiment 56 - Rdc) / Murs et cloisons maçonnés		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (2)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29305	
Réf échantillon client : P0033 - Panneaux et plaques - Pièce 033 (Batiment 56 - Rdc) / Faux plafonds		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 7 / 11

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-28816 EN DATE DU 27/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29306	
Réf échantillon client : P0034 - Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intérêt Joint d'étanchéité Blanchâtre - Pièce 033 (Batiment 56 - Rdc) / Fenêtre		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
* Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29307	
Réf échantillon client : P0035 - Mastic Vitrier Grisâtre Couche d'Intérêt Mastic Vitrier Grisâtre - Pièce 033 (Batiment 56 - Rdc) / Fenêtre		Description ITGA : Peinture / Matériau mou gris	
* Peinture non séparable + Matériau mou gris	META (B) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : CTP (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29308	
Réf échantillon client : P0036 - Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre - Palier (Batiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnées		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29309	
Réf échantillon client : P0037 - Plâtre Couche d'Intérêt Plâtre - Palier (Batiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnées		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (2)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29310	
Réf échantillon client : P0038 - Joint d'Étanchéité Blanchâtre Couche d'Intérêt Joint d'Étanchéité Blanchâtre - Palier (Batiment 56 - 1er Etage) / Fenêtre		Description ITGA : Peinture / Matériau souple gris	
* Peinture non séparable + Matériau souple gris	META (B) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 8 / 11

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-28816 EN DATE DU 27/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29311	
Réf échantillon client : P0039 - Panneaux et plaques - Plâtré (Batiment 56 - 1er Etage) / Faux plafonds		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29312	
Réf échantillon client : P0040 - Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre - Pièce 002 (Batiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnés		Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtré blanc	
* Peinture non séparable + Papier + Matériau plâtré blanc non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29313	
Réf échantillon client : P0041 - Plâtre Couche d'Intérêt Plâtre - Pièce 002 (Batiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnés		Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtré blanc	
* Peinture non séparable + Papier + Matériau plâtré blanc non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29314	
Réf échantillon client : P0042 - Faïence Murale + Colle Couche d'Intérêt Colle - Pièce 002 (Batiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnés		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP (3)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29315	
Réf échantillon client : P0043 - Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intérêt Joint d'étanchéité Blanchâtre - Pièce 002 (Batiment 56 - 1er Etage) / Fenêtre		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
* Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 9/11

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967



Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-28817 EN DATE DU 27/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : QUALICONSULT IMMOBILIER - ANGERS 355, Avenue du Général PATTON CS 56613 49066 ANGERS Cedex 1	Réf. Commande ITGA : IT1421-28817 Réf. Commande Client : 876146/P1
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/09/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29323	
Réf échantillon client : P0051 - Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intérêt Joint d'étanchéité Blanchâtre - Sanitaires Hommes (Bâtiment 56 - 1er Etage)/ Fenêtre		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
* Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29324	
Réf échantillon client : P0052 - Panneaux et plaques - Sanitaires Hommes (Bâtiment 56 - 1er Etage) / Faux plafonds		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 1/6

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-28817 EN DATE DU 27/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29325	
Réf échantillon client : P0053 - Dalles de sol Bleu Couche d'Intérêt Dalle de sol Bleu - Pièce 007 (Batiment 56 - 1er Etage) / Revêtements de sols		Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage rose en faible quantité	
* Revêtement bicouche souple beige et noir + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Ragréage rose en faible quantité non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29326	
Réf échantillon client : P0054 - Ragréage Couche d'Intérêt Ragréage - Pièce 007 (Batiment 56 - 1er Etage) / Revêtements de sols		Description ITGA : Peinture / Ragréage rose	
* Peinture non séparable + Ragréage rose	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29327	
Réf échantillon client : P0055 - Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre - Pièce 017 (Batiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnées		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ABE (4)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29328	
Réf échantillon client : P0056 - Plâtre Couche d'Intérêt Plâtre - Pièce 017 (Batiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnées		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Papier	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Papier	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29329	
Réf échantillon client : P0057 - Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intérêt Colle - Pièce 017 (Batiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnées		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Joint cassant blanc	
* Peinture non séparable + Colle beige + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : BIL (5)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 2/6

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-28817 EN DATE DU 27/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0058 - Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intérêt Joint d'étanchéité Blanchâtre - Pièce 017 (Batiment 56 - 1er Etage) / Fenêtre		Réf échantillon ITGA : IT142109-29330 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
* Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0059 - Panneaux et plaques - Pièce 017 (Batiment 56 - 1er Etage) / Faux plafonds		Réf échantillon ITGA : IT142109-29331 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ABE (5)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0060 - Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre - Pièce 021 (Batiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT142109-29332 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : BIL (4)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0061 - Plâtre Couche d'Intérêt Plâtre - Pièce 021 (Batiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT142109-29333 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0062 - Faïence Murale Blanche + Colle Couche d'Intérêt Colle - Pièce 021 (Batiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT142109-29334 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Joint cassant blanc	
* Peinture non séparable + Colle grise + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BIL (5)
Carrelage	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 3/6

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-28817 EN DATE DU 27/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29335	
Réf échantillon client : P0063 - Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intérêt Joint d'étanchéité Blanchâtre - Pièce 021 (Batiment 56 - 1er Etage) / Fenêtre		Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc	
* Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29336	
Réf échantillon client : P0064 - Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre - Pièce 021 (Batiment 56 - 1er Etage) / Plafonds		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29337	
Réf échantillon client : P0065 - Plâtre Couche d'Intérêt Plâtre - Pièce 021 (Batiment 56 - 1er Etage) / Plafonds		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (6)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29338	
Réf échantillon client : P0066 - Revêtement + Plâtre Couche d'Intérêt Revêtement + Plâtre - Sanitaires Femmes (Batiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnés		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE		Réf échantillon ITGA : IT142109-29339	
Réf échantillon client : P0067 - Plâtre Couche d'Intérêt Plâtre - Sanitaires Femmes (Batiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnés		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 4/6

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-28817 EN DATE DU 27/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0068 - Plinthe Faïence + Colle Couche d'Intérêt Colle - Sanitaires Femmes (Bâtiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT142109-29340 Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0069 - Faïence Murale Rosâtre + Colle Couche d'Intérêt Colle - Sanitaires Femmes (Bâtiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT142109-29341 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise avec couche cartonnée / Joint cassant blanc	
* Peinture non séparable + Colle grise avec couche cartonnée non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0070 - Faïence Murale Blanche Petite Taille + Colle Couche d'Intérêt Colle - Sanitaires Femmes (Bâtiment 56 - 1er Etage) / Murs et cloisons maçonnés		Réf échantillon ITGA : IT142109-29342 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Colle grise avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ABE (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0071 - Joint d'étanchéité Blanchâtre Couche d'Intérêt Joint d'étanchéité Blanchâtre - Sanitaires Femmes (Bâtiment 56 - 1er Etage) / Fenêtre		Réf échantillon ITGA : IT142109-29343 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau souple blanc	
* Peinture en faible quantité non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 24/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0072 - Panneaux et plaques - Sanitaires Femmes (Bâtiment 56 - 1er Etage) / Faux plafonds		Réf échantillon ITGA : IT142109-29344 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
* Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ABE (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 5/6


Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-28817 EN DATE DU 27/09/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0073 - Dalle Béton Couche d'Intérêt Dalle Béton - Grenier (Batiment 56 - 2ème Etage) / Revêtements de sols		Réf échantillon ITGA : IT142109-29345 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
* Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 27/09/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : 876146 - Amiante avant travaux - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE Réf échantillon client : P0074 - Papier Cartonné + Isolant Couche d'Intérêt Papier Cartonné + Isolant - Grenier (Batiment 56 - 2ème Etage) / Toiture		Réf échantillon ITGA : IT142109-29346 Description ITGA : Matériau fibreux blanc / Papier	
* Matériau fibreux blanc	MOLP le 24/09/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YAN
* Papier	MOLP le 24/09/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YAN

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).
 (2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
 (3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
 (4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
 (5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Kévin GUY** Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 15

Page 6/6

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**



ASSQC11

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD

Atteste que : **QUALICONSULT IMMOBILIER** (490 676 293 RCS Versailles)
VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant et après travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement
- Contrôle visuel amiante
- Analyse mâchefer
- Potabilité de l'eau
- Analyse ponctuelle d'éléments vis-à-vis de l'amiante
- Dossier amiante partie privative (DAPP)
- Analyse ponctuelle plomb
- Chiffrage remise en état après état des lieux de sortie
- Diagnostic installation d'assainissement non collectif
- Diagnostic installation d'assainissement collectif

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier au 31 décembre 2021**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 21/07/2021

L'assureur

MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 982
Siège Social : 14 bis Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9



Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 126
Sièges sociaux : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Enregistrements régies par le code des assurances

Société anonyme, au capital de 537 052 368 euros
RCS Le Mans 440 048 982

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 118

Société anonyme, au capital de 142 632 906 euros
RCS Le Mans 440 042 174

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293
355, avenue du Général Patton

CS 56613 49066 ANGERS CEDEX 1 - Tel./Fax. : 0241687286 - 0251139944

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 00460 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY- Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**

ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné : **BAT 056 - INFIRMERIE - CASERNE MARTIN DES PAILLERES - CHAMPAGNE - 72470 CHAMPAGNE**



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI3124 Version 006

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEMAILLE Xavier

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 30/11/2018 - Date d'expiration : 29/11/2023
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 30/11/2018 - Date d'expiration : 29/11/2023
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment Date d'effet : 04/06/2020 - Date d'expiration : 03/06/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 04/06/2020 - Date d'expiration : 03/06/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 07/10/2019 - Date d'expiration : 06/10/2024
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 07/10/2019 - Date d'expiration : 06/10/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 07/10/2019 - Date d'expiration : 06/10/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 05/06/2020.



Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'insalubrité par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérant des repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérages et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrat
ACCREDITATION
N° 4-8122
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
www.cofrat.fr

CPE DI FR 11 rev14
