



RAPPORT DE VÉRIFICATION

Vérification des installations électriques

(Code du travail : Art R.4226-16)
Rapport de vérification périodique

Pièce(s) jointe(s) :
Rapport de vérification dans un établissement recevant du public

N° de rapport : 134210174-002-1 - ERT
Date : 04/11/2025



Accréditation n°3-2016
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Lieu d'intervention :
ONCOPOLE-IUCT
1 AVENUE IRÈNE JOLIOT-CURIE
31100 TOULOUSE

Référence Client : 43061665

Date(s) d'intervention :
Du 06/10/2025 au 03/11/2025

Intervenant(s) :
DAVID LAGDER
Alexis DRUBAY



OBSERVATION(S)

Ce rapport comporte 130 pages - Version modèle rapport Electricité_ERT_6.22.2

Liste récapitulative des observations

Observations relatives aux installations du domaine Haute Tension

Localisation		Non-conformité - <i>Préconisation (P)</i>
N° Obs	Références réglementaires	
BATIMENT :		
➤ Observation(s) local		
(Gants isolent périmés)		
2	R. 4226-09 NF C13-200 : 622	Le matériel de sécurité du poste HT n'est pas en bon état (P) Le remplacer



Numéro d'observation récurrente



Nouvelle observation

(P) : Préconisation

Observations relatives aux installations du domaine Basse Tension


Localisation		Non-conformité - <i>Préconisation (P)</i>
N° Obs	Références réglementaires	
Ensemble des installations électriques contrôlées		
nouvelle observation 1	R. 4226-05	Les coupures et essais des dispositifs différentiels basse tension n'ont pas été réalisés pour des raisons de sécurité, de fait la vérification réglementaire n'est pas exhaustive. <i>(P) Les dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR) repérés 'NE' dans le paragraphe RESULTATS DES MESURAGES ET ESSAIS du rapport n'ont pas été essayés.</i> <i>Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire "coupure décalée" après l'établissement d'un plan de coupure.</i>

BATIMENT A : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL RC LAB EFS 026

➤ Appareil(s) d'éclairage

1 éclairage côté horloge


R. 4215-03
NF C15-100 : 411

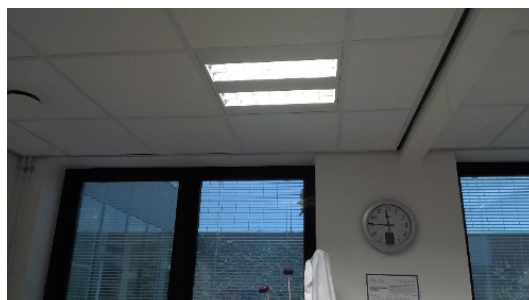Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Remplacer le câble d'alimentation par un modèle avec conducteur de protection


BATIMENT A : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL RC LAB EFS 042

➤ Prise(s) de courant

1 prise de courant entrée



R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Remplacer le câble d'alimentation par un modèle avec conducteur de protection



BATIMENT A : - DEUXIEME ETAGE : - BUREAU N2 MED TER 016

➤ Observation(s) local

Multiprise en série



R. 4215-06
NF C15-100 : 555

Présence de socles multiprises en série
(P) Un nombre approprié de socles de prises de courant doit être installé afin de répondre aux besoins des utilisateurs en toute sécurité, et de limiter l'emploi de socles multiprises.



BATIMENT A : - DEUXIEME ETAGE : - BUREAU N2 MED BEC 004

➤ Observation(s) local

Multiprise sous le bureau

6
nouvelle
observation

R. 4215-06
NF C15-100 : 555

Présence de socles multiprises en série
(P) Un nombre approprié de socles de prises de courant doit être installé afin de répondre aux besoins des utilisateurs en toute sécurité, et de limiter l'emploi de socles multiprises.



BATIMENT A : - TROISIEME ETAGE : - LOCAL CFO AD311

➤ COFFRET INVERSEUR

(Schéma absent)

7

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Identification incomplète des circuits de l'armoire électrique
(P) Etablir pour toute installation électrique, les schémas, diagrammes ou tableaux conformes aux normes.



BATIMENT A : - TERRASSE :

➤ Observation(s) local

1 bloc double prises de courant AD311 PCO01

8
nouvelle
observation

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Equipement en mauvais état
(P) Le réparer ou le remplacer



BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - CIRCULATION

➤ ARMOIRE AD 010

9
nouvelle observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 543

Connexion non individuelle du ou des conducteur(s) de protection.
(P) Raccorder individuellement les conducteurs de protection sur un barreau de connexion de terre.




BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - PREPARATION CHIMIO

➤ ARMOIRE AD 031

10
nouvelle observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 543

Connexion non individuelle du ou des conducteur(s) de protection.
(P) Raccorder individuellement les conducteurs de protection sur un barreau de connexion de terre.

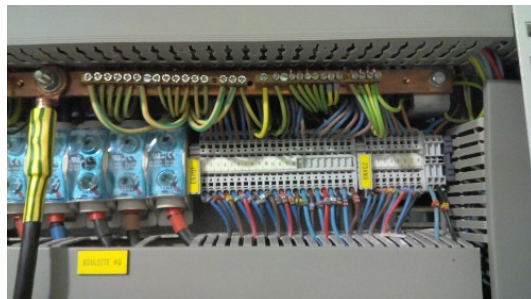


BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - LOCAL RC LAB PHA 006

➤ Prise de courant (AD 031 PCN 01)

11

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement

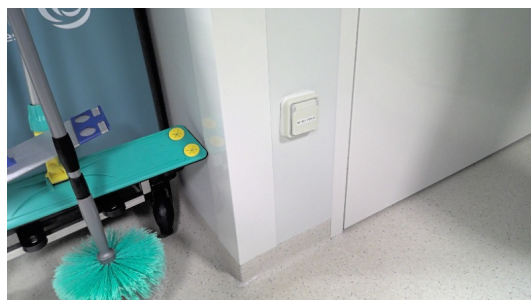

BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - LOCAL RC LAB PHA 064

➤ Prise de courant

12
nouvelle observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Remplacer le câble d'alimentation par un modèle avec conducteur de protection



BATIMENT B : - PREMIER ETAGE : - COULOIR BUREAUX

➤ ARMOIRE AD 110

13

R. 4215-03
NF C15-100 : 543

Connexion non individuelle du ou des conducteur(s) de protection
(P) Raccorder individuellement les conducteurs de protection sur un barreau de connexion de terre



BATIMENT B : - PREMIER ETAGE : - LABORATOIRE N1 LAB TRA 008

➤ Récepteur CE sur PC (Sorbone)

14
nouvelle observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Remplacer le câble d'alimentation par un modèle avec conducteur de protection



BATIMENT B : - PREMIER ETAGE : - LABO N1 LAB TRA 044

➤ Appareil(s) d'éclairage

1 éclairage côté couloir

15
nouvelle observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Remplacer le câble d'alimentation par un modèle avec conducteur de protection



BATIMENT B : - PREMIER ETAGE : - BUREAU N1 LAB TRA 045

➤ Observation(s) local

Rallonge en série

16
nouvelle observation

R. 4215-06
NF C15-100 : 555

Présence de socles multiprises en série
(P) Un nombre approprié de socles de prises de courant doit être installé afin de répondre aux besoins des utilisateurs en toute sécurité, et de limiter l'emploi de socles multiprises.



BATIMENT C : - REZ-DE-CHAUSSEE : - GAINE SECU LTE 019


➤ Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité portatif

(Absent en 2025)

17

R. 4226-13
Arrêté du 14/12/2011-11

Dysfonctionnement de l'éclairage de sécurité
(P) A remettre en état

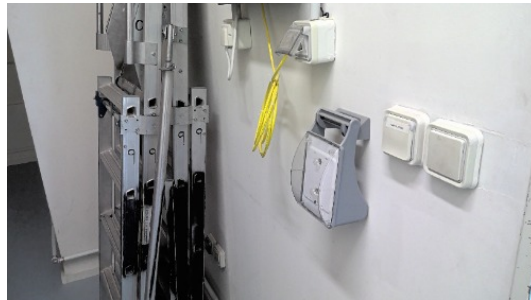

BATIMENT C : - TROISIEME ETAGE : - CIRCULATION

➤ Prise(s) de courant

1 prise de courant AD119-PCN25

18
nouvelle observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Remplacer le câble d'alimentation par un modèle avec conducteur de protection



BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 011

➤ Appareil éclairage de sécurité (BAPI)

Remettre en place le BAPI

19

R. 4215-13
NF C15-100 : 729

Le bloc autonome portatif à main (BAPI) du local de service électrique ne fonctionne pas
(P) Le faire réviser ou le remplacer



BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 019

➤ Appareil éclairage de sécurité (BAPI)

A remettre en place

20

R. 4215-13
NF C15-100 : 729

Le bloc autonome portatif à main (BAPI) du local de service électrique ne fonctionne pas
(P) Le faire réviser ou le remplacer



BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 020

➤ Appareil(s) d'éclairage masse inac

1 luminaire côté porte de sortie

21

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement



BATIMENT C : - TERRASSE : - ENCEINTE GROUPE FROID NT LOG LTE 007

➤ Appareil(s) d'éclairage masse inac

1 luminaire au niveau du caillebotis

22

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement




BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 015

➤ ARMOIRE C8

23

R. 4215-03
NF C15-100 : 543

Connexion non individuelle du ou des conducteur(s) de protection
(P) Raccorder individuellement les conducteurs de protection sur un barreau de connexion de terre

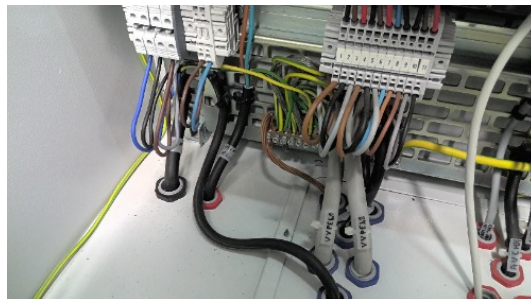

BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 014

➤ ARMOIRE C6

24

R. 4215-03
NF C15-100 : 543

Connexion non individuelle du ou des conducteur(s) de protection
(P) Raccorder individuellement les conducteurs de protection sur un barreau de connexion de terre



BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 016


➤ Appareil éclairage

1 luminaire derrière Baie 1 et 2

25

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement

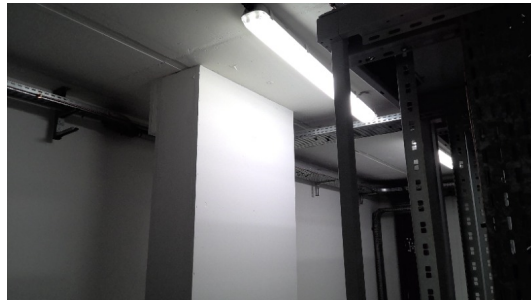

BATIMENT D : - REZ-DE-CHAUSSEE : - Bureau réception RC LOG HOT 015


➤ Appareil(s) d'éclairage

1 éclairage côté circulation

26
nouvelle observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Remplacer le câble d'alimentation par un modèle avec conducteur de protection

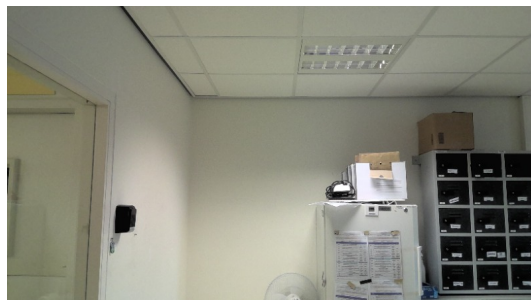

BATIMENT D : - PREMIER ETAGE : - COULOIR BUREAUX

➤ ARMOIRE AD 102

Connexions derrière le plastron des borniers

27
nouvelle
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Pièce(s) nue(s) sous tension et accessible(s).
(P) A isoler ou à supprimer d'urgence.



BATIMENT D : - DEUXIEME ETAGE : - Bureau N2 SUP GES 053

➤ Observation(s) local

Rallonge en série

28
nouvelle
observation

R. 4215-06
NF C15-100 : 555

Présence de socles multiprises en série
(P) Un nombre approprié de socles de prises de courant doit être installé afin de répondre aux besoins des utilisateurs en toute sécurité, et de limiter l'emploi de socles multiprises.




Rallonge en série

29
nouvelle
observation

R. 4215-06
NF C15-100 : 555

Présence de socles multiprises en série
(P) Un nombre approprié de socles de prises de courant doit être installé afin de répondre aux besoins des utilisateurs en toute sécurité, et de limiter l'emploi de socles multiprises.

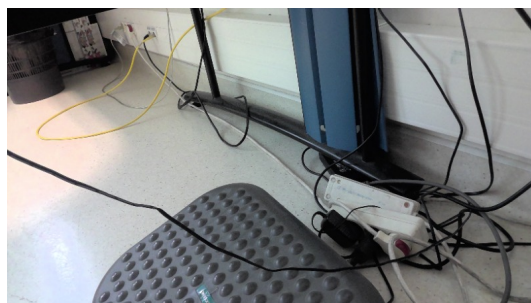

BATIMENT E : - SOUS-SOL : - COULOIR

➤ ARMOIRE CONVOYEUR GARE 1

30

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Absence de protection des prises de courant par dispositif différentiel (DDR) à haute sensibilité
(P) Installer un dispositif différentiel de seuil 30mA sur l'alimentation de ces prises



BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR RADIO THERAPIE

➤ ARMOIRE AD 014

- Non identifiée

31
nouvelle observation

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit
(P) A remettre à niveau



BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL TER 025


➤ Appareil éclairage

Eclairage côté couloir

32

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Remplacer le câble d'alimentation par un modèle avec conducteur de protection

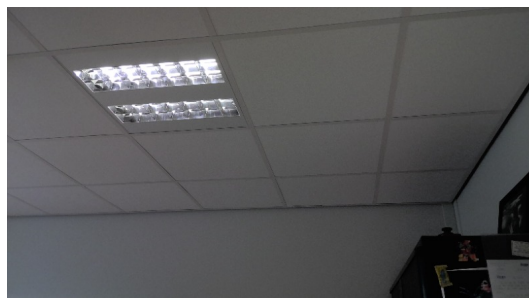

BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL TER 028

➤ Observation(s) local

Rallonge en série sous le bureau

nouvelle
33
observation

R. 4215-06
NF C15-100 : 555

Présence de socles multiprises en série

(P) Un nombre approprié de socles de prises de courant doit être installé afin de répondre aux besoins des utilisateurs en toute sécurité, et de limiter l'emploi de socles multiprises.



BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL EXT 030

➤ Prise(s) de courant

1 prise de courant AD014D28.5-PCN05

nouvelle
34
observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse.

(P) A refixer durablement.



BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR BATIMENT C


➤ ARMOIRE AD 013

Vis de fermeture de plastron absente

35
nouvelle
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

La porte de l'armoire électrique n'est pas verrouillée.
(P) Y remédier.



BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - COULOIR CURIETHERAPIE


➤ COFFRET COP 7

Connexions derrière le plastron des borniers

36
nouvelle
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Pièce(s) nue(s) sous tension et accessible(s).
(P) A isoler ou à supprimer d'urgence.

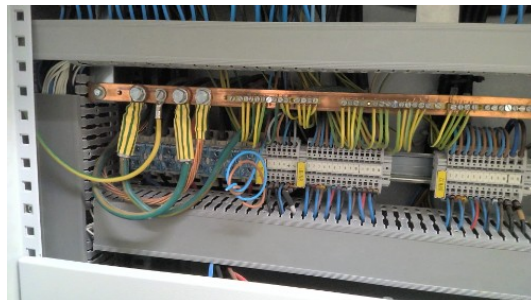

BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - COULOIR CÔTE CHAMBRE

➤ COFFRET CHAMBRES TE6.141 - CH 193

37
nouvelle
observation

R. 4215-02
NF C15-100 : -

Le schéma électrique n'est pas à jour
(P) Réaliser la mise à jour du schéma électrique.

BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - COULOIR PRINCIPAL

➤ ARMOIRE AD 116

- Baie vidéo

A Vérifier directement dans bloc (si sortie de câble ou non)

38

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Absence de protection des prises de courant par dispositif différentiel (DDR) à haute sensibilité
(P) Installer un dispositif différentiel de seuil 30mA sur l'alimentation de ces prises



BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 003 & 002 & 001


➤ Appareil éclairage de sécurité (BAPI)

Absence de BAPI local 001 et 003

39

R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-5

Absence d'éclairage de sécurité par installation fixe
(P) A réaliser

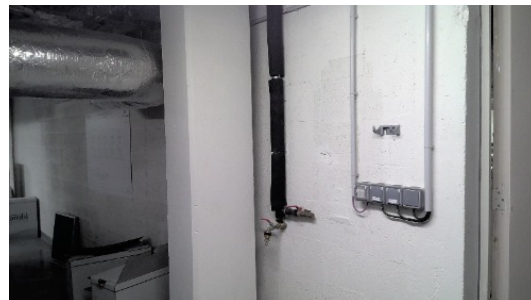

BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 009


➤ Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité portatif

Absence de BAPI

40

R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-5

Absence d'éclairage de sécurité par installation fixe
(P) A réaliser

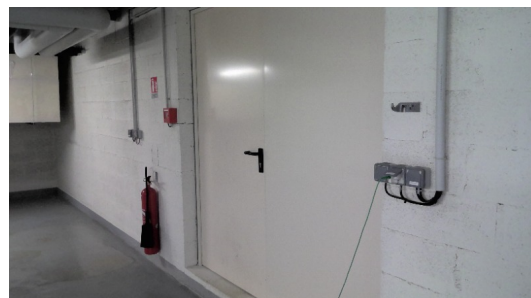

BATIMENT E : - TERRASSE : - GAINES CFO TS TOITURE 6 - N4-LOG-LTE-035

➤ Observation(s) local

Couvercle d'un détecteur

nouvelle
41
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Boite(s) de raccordement ouverte(s).
(P) Remettre en place le(s) couvercle(s).



➤ Appareil(s) d'éclairage masse inac

Luminaire en bout de bâtiment côté parking

nouvelle
42
observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse.
(P) A refixer durablement.



BATIMENT F : - REZ-DE-CHAUSSEE : - MÉDECINE NUCLEAIRE : - LOCAL LOG LTE 005 (VDI 04.1/04.2)

➤ Prise de courant

1 prise de courant entrée

43

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Remplacer le câble d'alimentation par un modèle avec conducteur de protection



BATIMENT F : - REZ-DE-CHAUSSEE : - MÉDECINE NUCLEAIRE : - LOCAL RC RAD NUC 056

➤ **Prise de courant (bloc pc)**

44

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement



BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - REANIMATION : - COULOIR REANIMATION

➤ **ARMOIRE AD 117**

AD117 Normal (Côté droit de l'armoire)

45

R. 4215-03
NF C15-100 : 543

Connexion non individuelle du ou des conducteur(s) de protection
(P) Raccorder individuellement les conducteurs de protection sur un barreau de connexion de terre



BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - REANIMATION : - LOCAL SCO 017

➤ **Capot de goulotte**

46

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Couvercle absent de goulotte (plinthe)
(P) A remettre en place



BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - REANIMATION : - LOCAL SCO 024

➤ Observation(s) local

Câble d'alimentation lave instruments

47
nouvelle observation

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Entrée de câble défectueuse
(P) A refaire au niveau de la fiche



BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - ROTONDE : - CHAMBRE 003


➤ Prise(s) de courant

1 prise de courant sur poteau

48
nouvelle observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement

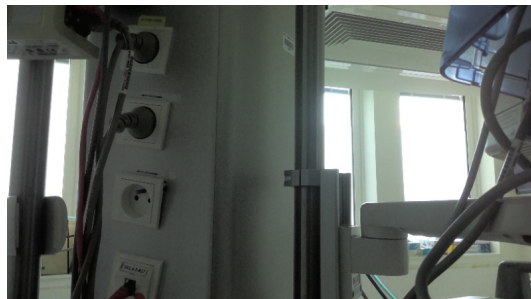

BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - ROTONDE : - CHAMBRE 006

➤ Prise(s) de courant

1 prise de courant sur poteau

nouvelle
49
observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement



BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - ROTONDE : - CHAMBRE 007

➤ Prise(s) de courant

2 prises de courant sur goulotte derrière le lit

nouvelle
50
observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Détérioré (e)
(P) A remplacer ou à réparer



1 prise de courant sous télé

nouvelle
51
observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement



BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - ROTONDE : - CHAMBRE 009

➤ Prise(s) de courant

1 prise de courant sur poteau

52
nouvelle observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement



BATIMENT F : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 MED HC3 039

➤ Appareil(s) d'éclairage

2 luminaires, 1 au dessus du vélo et 1 au dessus de l'évier

53
nouvelle observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Remplacer le câble d'alimentation par un modèle avec conducteur de protection



BATIMENT F : - TROISIEME ETAGE : - LOCAL N3 MED HEM 101

➤ Prise(s) de courant

54
nouvelle observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement



BATIMENT F : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE 342


➤ Prise(s) de courant

1 prise de courant sur goulotte

55
nouvelle observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Détérioré (e)
(P) A remplacer ou à réparer

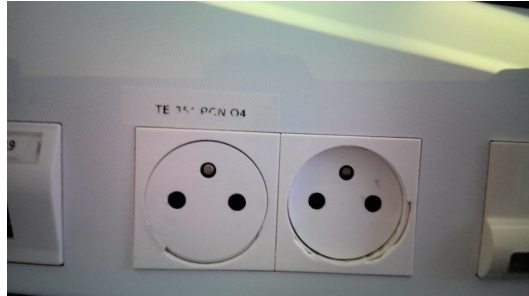

BATIMENT F : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE 348

➤ Prise(s) de courant

1 prise de courant sur goulotte

56
nouvelle observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Détérioré (e)
(P) A remplacer ou à réparer



BATIMENT F : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE 380

➤ Prise(s) de courant

1 prise de courant sur goulotte

57
nouvelle observation

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Détérioré (e)
(P) A remplacer ou à réparer



BATIMENT G : - REZ DE CHAUSSEE : - RADIOLOGIE : - COULOIR INTERPRETATION SCANNER

➤ Prise(s) de courant

1 prise de courant (AD016 PCN01)

58
nouvelle observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement



BATIMENT G : - PREMIER ETAGE : - LOCAL VDI LTE 009

➤ Prise(s) de courant

Bloc 3 prises de courant sur goulotte

59

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Remplacer le câble d'alimentation par un modèle avec conducteur de protection



BATIMENT G : - PREMIER ETAGE : - BUREAU N1 SUP ACC 002


➤ Observation(s) local

Rallonge sur goulotte



R. 4215-06
NF C15-100 : 555

Présence de socles multiprises en série
(P) Un nombre approprié de socles de prises de courant doit être installé afin de répondre aux besoins des utilisateurs en toute sécurité, et de limiter l'emploi de socles multiprises.

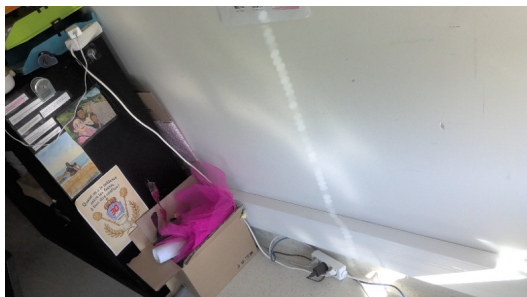

BATIMENT G : - PREMIER ETAGE : - CHAMBRE 175


➤ Prise(s) de courant

1 prise de courant lit



R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement

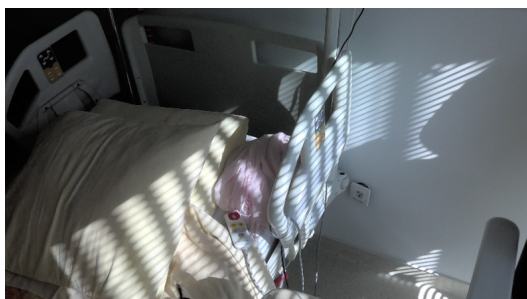


BATIMENT G : - TERRASSE : - GAINÉ CFO TS TOITURE 4

➤ Appareil éclairage de sécurité (BAPI)



R. 4226-13
Arrêté du 14/12/2011-11

Dysfonctionnement de l'éclairage de sécurité
(P) A remettre en état

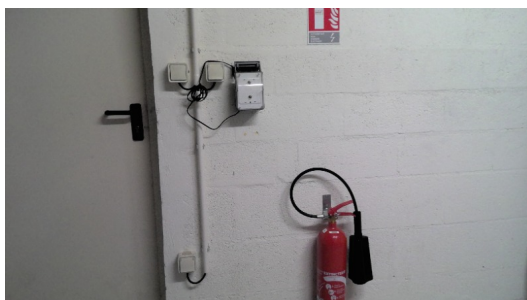


BATIMENT G : - TERRASSE : - GAINÉ CFO AD402 AD TOITURE 3 - NT-LOG-LTE-027

➤ **Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité portatif**

63

R. 4226-13
Arrêté du 14/12/2011-11

Dysfonctionnement de l'éclairage de sécurité
(P) A remettre en état

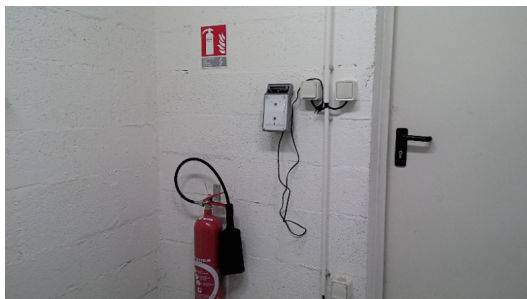

BATIMENT G : - TERRASSE : - VENTILATEUR DESEMFUMAGE MAN-H-22 & MAN-H-23

➤ **Appareil éclairage de sécurité (BAPI)**

Le remettre en place

64

R. 4215-13
NF C15-100 : 729

Le bloc autonome portatif à main (BAPI) du local de service électrique ne fonctionne pas
(P) Le faire réviser ou le remplacer



➤ **Prise(s) de courant**

65

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Détérioré (e)
(P) A remplacer ou à réparer



BATIMENT G : - TERRASSE : - LOCAL CTA 0.9 + H3

➤ ARMOIRE G3

66

R. 4215-03
NF C15-100 : 543

Connexion non individuelle du ou des conducteur(s) de protection
(P) Raccorder individuellement les conducteurs de protection sur un barreau de connexion de terre



BATIMENT G : - TERRASSE : - LOCAL CTA 0.11 + H5 + H6 (NT LOG LTE 034)

➤ ARMOIRE G6

67

R. 4215-03
NF C15-100 : 543

Connexion non individuelle du ou des conducteur(s) de protection
(P) Raccorder individuellement les conducteurs de protection sur un barreau de connexion de terre




BATIMENT G : - TERRASSE : - VENTILATEUR DESENFUMAGE MEXT-H-07 & MEXT-H-04

➤ Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité portatif

68

R. 4226-13
Arrêté du 14/12/2011-11

Dysfonctionnement de l'éclairage de sécurité
(P) A remettre en état

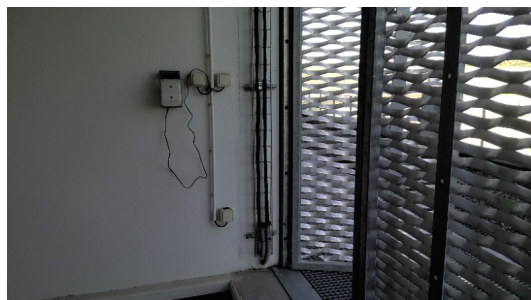

BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - RC LOG LOCAL CUI 021

➤ Prise(s) de courant

2 capots de deux prises de courant

nouvelle
69
observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse.
(P) A refixer durablement.



BATIMENT H : - PREMIER ETAGE : - CHAMBRE 116

➤ Prise(s) de courant

1 prise de courant derrière le lit

nouvelle
70
observation

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse
(P) A refixer durablement



Numéro d'observation récurrente



Nouvelle observation

(P) : Préconisation

Sommaire

1. Renseignements généraux de l'établissement	29
1.1 Renseignements principaux	29
1.2 Renseignements complémentaires relatifs à la vérification	30
Documents nécessaires à la vérification	30
Limite(s) d'intervention	30
1.3 Changements importants depuis la précédente vérification	46
2. Caractéristiques principales des installations	47
2.1 Structure de l'établissement	47
Nombre de bâtiments / affectation	47
3. Examen des prescriptions applicables	48
4. Résultats des mesurages et essais	49
4.1 Appareils de mesure et d'essais utilisés	49
4.2 Résultats	49
Prises de terre	49
Continuités entre tableaux de la distribution	49
Contrôleur(s) permanent(s) d'isolement	53
Dispositifs différentiels à courant résiduel	54
Examen des circuits terminaux	97
5. Résultats des autres vérifications	101
Liste des observations des circuits sans différentiel	101
Liste des observations des tableaux	101
6. Annexes	103
Liste des plans et schémas des installations	103
Liste des plans et schémas des installations archivés par APAVE	117
Tableau Haute Tension	126
Etendue, méthodologie et critères d'appréciation des mesurages	
Rappels sur les vérifications d'installations électriques	129

1. Renseignements généraux de l'établissement

1.1 Renseignements principaux

Etablissement vérifié :	ONCOPOLE-IUCT 1 AVENUE IRÈNE JOLIOT-CURIE 31100 TOULOUSE N° Etab : A54136514 N° Mission : C24049962M0045
Installation(s) vérifiée(s) :	INSTITUT UNIVERSITAIRE DU CANCER - ONCOPOLE
Activité principale :	ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES
Vérification :	
• Nature :	Périodique
• Périodicité réglementaire :	Annuelle
• Dates :	Du 06/10/2025 au 03/11/2025
• Durée (jours) :	25
• Date précédente :	06/12/2024
Accompagnement réglementaire :	Partiel
• Accompagnateur :	M. Gilles CAVALINI (Service Electrique)
Vérificateur(s) :	M. DAVID LAGDER MIDI PYRENEES M. Alexis DRUBAY
Surveillance des installations :	M. David FASANO (Responsable sécurité et service technique)
Registre de contrôle :	a été présenté et signé
Compte-rendu de fin de visite à :	M. Gilles CAVALINI (Service Electrique)

1.2 Renseignements complémentaires relatifs à la vérification

Documents nécessaires à la vérification

Descriptif Document	Fourni	Incomplet	Non Fourni	Sans Objet
Plan des locaux avec indication des locaux à risques particulier d'influences externes .			✓	
Schémas unifilaires des installations électriques	✓			
Rapport de vérification initiale : - VERITAS - 145360406.1.R - 18/12/2014	✓			
Rapports des vérifications périodiques antérieures	✓			
Déclaration CE de conformité et notices des matériels installés dans les emplacements à risque d'explosion			✓	
Liste des installations de sécurité et effectif maximal des locaux ou bâtiments			✓	
Eléments de traçabilité des essais réglementaires	✓			

Limite(s) d'intervention

- **Limite(s) d'intervention générale(s)**

L'appareillage et les circuits sur faux-plafonds n'ont pas été inspecté, les démontages à effectuer par l'établissement n'ayant pas été effectués

Les essais des contrôleurs d'isolement des moteurs de désenfumage et le report des défaut d'isolement à l'alarme incendie, les démontages des coffrets à effectuer par l'établissement n'ayant pas été effectués

- **Limite(s) d'intervention particulière(s)**

Ensemble des installations électriques contrôlées

La continuité à la terre du (des) récepteur(s) noté hauteur inaccessible au paragraphe Examen des circuits terminaux n'a pu être vérifiée.

(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

BATIMENT :

Appareil(s) inaccessible(s); Continuité à la terre non réalisée faute de mise à disposition de moyens d'élévation sécurisés

(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

La continuité à la terre des appareils d'éclairage notés inaccessibles au chapitre 'Examen des circuits terminaux' (soit masses 'inac', soit 'inac h > 4m') n'a pu être vérifiée

(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

Notre vérification porte sur l'état apparent des appareillages. Ceux inaccessibles et non visibles (en faux plafond, sous carter...) n'ont pas été inspectés.

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

EXTERIEURS : - RC LOG HOT 037

➤ AD LOG TGBT 3

Le rapport de visite initiale suite à modification de structure, bien que prévu au contrat, ne nous a pas été transmis ce qui n'a pas permis de mener complètement à bien notre mission.

(P) En l'absence de ces éléments, notre vérification n'a porté que sur le maintien en état et non sur la conception. Nous fournir les éléments manquants. A défaut, nous sommes à votre disposition pour réaliser une visite de conformité.

BATIMENT A : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL RC LAB EFS 029

➤ Prise(s) de courant

Prise de courant "AD011 PC011" hors service au moment de notre passage

(P) Avant une éventuelle remise en usage, vous assurer de son état de conformité, le cas échéant en sollicitant une vérification par APAVE

BATIMENT A : - PREMIER ETAGE : - LOCAL N1 LAB ANA 015

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT A : - PREMIER ETAGE : - LOCAL N1 LAB ANA 019

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT A : - DEUXIEME ETAGE : - COULOIR BUREAUX

➤ **Prise(s) de courant**

Prises de courant non en service près du bureau "N2 MED BEC 016"

(P) Avant une éventuelle remise en usage, vous assurer de son état de conformité, le cas échéant en sollicitant une vérification par APAVE

BATIMENT A : - TROISIEME ETAGE : - LOCAL CFO AD311

➤ **COFFRET INVERSEUR**

Bien que prévu au contrat, les schémas unifilaires des installations électriques accompagnés si nécessaire d'un synoptique montrant l'articulation des différents tableaux ne nous ont pas été transmis ou sont incomplets ou non à jour, ce qui n'a pas permis de mener complètement à bien notre mission.

(P) Nous communiquer les éléments manquants. A défaut nous sommes à votre dispositions pour leur création ou leur mise à niveau

BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGBT 1.1

➤ **TRANSFORMATEUR TGBT 1.1 - SOURCE NORMALE**

Poste non inspecté (ouverture de la porte d'accès asservi à la mise hors tension)

(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGBT GSS1

➤ **TRANSFORMATEUR GSS1 - SOURCE NORMALE**

Poste non inspecté (ouverture de la porte d'accès asservi à la mise hors tension)
(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGBT 2.1

➤ **TRANSFORMATEUR TGBT 2.1 - SOURCE NORMALE**

Poste non inspecté (ouverture de la porte d'accès asservi à la mise hors tension)
(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGBT GSS2

➤ **TRANSFORMATEUR GSS2 - SOURCE NORMALE**

Poste non inspecté (ouverture de la porte d'accès asservi à la mise hors tension)
(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGBT 1.2

➤ **TRANSFORMATEUR TGBT 1.2 - SOURCE NORMALE**

Poste non inspecté (ouverture de la porte d'accès asservi à la mise hors tension)
(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGBT 2.2

➤ **TRANSFORMATEUR TGBT 2.2 - SOURCE NORMALE**

Poste non inspecté (ouverture de la porte d'accès asservi à la mise hors tension)
(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - CIRCULATION

➤ **AD UPC02**

Le rapport de visite initiale suite à modification de structure, bien que prévu au contrat, ne nous a pas été transmis ce qui n'a pas permis de mener complètement à bien notre mission.

(P) En l'absence de ces éléments, notre vérification n'a porté que sur le maintien en état et non sur la conception. Nous fournir les éléments manquants. A défaut, nous sommes à votre disposition pour réaliser une visite de conformité.

BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - LOCAL RC LAB PHA 010

Local ou installation(s) en travaux au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - LOCAL RC LAB PHA 029

Local ou installation(s) en travaux au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - LOCAL RC LAB PHA 057

Local ou installation(s) en travaux au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - LOCAL RC LAB PHA 063

Local ou installation(s) en travaux au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - LOCAL RC LAB PHA 064

➤ **Prise de courant**

La mesure d'isolement n'a pas été réalisée sans accès possible aux connexions.

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - LOCAL TECHNIQUE CTA TGBT 1.2

➤ **Coffret CVC**

Le rapport de visite initiale suite à modification de structure, bien que prévu au contrat, ne nous a pas été transmis ce qui n'a pas permis de mener complètement à bien notre mission.

(P) En l'absence de ces éléments, notre vérification n'a porté que sur le maintien en état et non sur la conception. Nous fournir les éléments manquants. A défaut, nous sommes à votre disposition pour réaliser une visite de conformité.

BATIMENT B : - PREMIER ETAGE : - LOCAL TECHNIQUE NT LOG LTE 013

➤ **Coffret Système de transport pneumatique**

Bien que prévu au contrat, les schémas unifilaires des installations électriques accompagnés si nécessaire d'un synoptique montrant l'articulation des différents tableaux ne nous ont pas été transmis ou sont incomplets ou non à jour, ce qui n'a pas permis de mener complètement à bien notre mission.

(P) Nous communiquer les éléments manquants. A défaut nous sommes à votre dispositions pour leur création ou leur mise à niveau

BATIMENT B : - PREMIER ETAGE : - LABO N1 LAB TRA 044

➤ Appareil(s) d'éclairage

La mesure d'isolement n'a pas été réalisée sans accès possible aux connexions.

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT B : - DEUXIEME ETAGE : - LABO N2 LAB BIO 042

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT B : - TROISIEME ETAGE : - ONCO PCR2 N3 ONC 006

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT B : - TROISIEME ETAGE : - GENERATEUR AZOTE N3 PHC 012

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT B : - TROISIEME ETAGE : - LOCAL N3 PHC 025

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT C : - TERRASSE :

La tenue aux UV des câbles CR1 exposés à la lumière solaire, n'a pu être démontrée

(P) Vous faire confirmer cette caractéristique; dans le doute, le placer sous capotage métallique (la pose sous fourreau plastique doit impérativement être validé par votre fournisseur).

BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 003

Local fermé à clé au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT D : - EXTERIEUR : - Poste de livraison CFO ADO 034

- BOUCLE HTA ONCOPOLE
- TERRE BATIMENT

Pour des raisons d'exploitation, la mesure de la prise de terre n'a pas été réalisée
(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

BATIMENT D : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL RC LOG HOT 025

➤ COFFRET IUC

Armoire (coffret) non inspecté (ouverture de la porte d'accès asservi à la mise hors tension)
(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

BATIMENT D : - TROISIEME ETAGE : - TERRASSE

➤ ARMOIRE LT SERVEUR 1

Local, installation, ou équipement inaccessible au moment de notre passage, installations non vérifiées

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.



BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL EXT 118

➤ Armoire AD VARIAN

Armoire (coffret) non inspecté (ouverture de la porte d'accès asservi à la mise hors tension)
(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL CFO AD 8ème BUNKER

➤ AD EXT BUNKER (AD 039)

Le rapport de visite initiale suite à modification de structure, bien que prévu au contrat, ne nous a pas été transmis ce qui n'a pas permis de mener complètement à bien notre mission.

(P) En l'absence de ces éléments, notre vérification n'a porté que sur le maintien en état et non sur la conception. Nous fournir les éléments manquants. A défaut, nous sommes à votre disposition pour réaliser une visite de conformité.

BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - BLOC OPERATOIRE : - COULOIR BLOC OPERATOIRE :

Accès non accordé (raison d'hygiène : contamination lors de l'ouverture des placards où se trouvent les armoires) pour l'ensemble des armoires électriques situées dans les placards des couloirs des blocs au moment de notre passage, installations non vérifiées (Armoires, Contrôleurs Permanents d'isolement)

(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - COULOIR CURIETHERAPIE

➤ COFFRET COP 7

L'essai du contrôleur d'isolement n'a pas été réalisé

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - CHAMBRE 182

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - CHAMBRE 183

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - CHAMBRE 184

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - CHAMBRE 185

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - CHAMBRE 186

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - CHAMBRE 187

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - CHAMBRE 189

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - CHAMBRE 192

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - CHAMBRE 193

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - CHAMBRE 194

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT F : - REZ-DE-CHAUSSEE : - MÉDECINE NUCLEAIRE : - LOCAL RC RAD NUC 028

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT F : - REZ-DE-CHAUSSEE : - MÉDECINE NUCLEAIRE : - LOCAL LOG LTE 005 (VDI 04.1/04.2)

➤ **Prise de courant**

La mesure d'isolement n'a pas été réalisée sans accès possible aux connexions.

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT F : - REZ-DE-CHAUSSEE : - MÉDECINE NUCLEAIRE : - LOCAL RC RAD NUC Box 1 à 8

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT F : - REZ-DE-CHAUSSEE : - MÉDECINE NUCLEAIRE : - LOCAL RC RAD NUC 017

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - ROTONDE : - CHAMBRE 002

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT F : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 MED HC3 039

➤ Appareil(s) d'éclairage

La mesure d'isolement n'a pas été réalisée sans accès possible aux connexions.

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT F : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE 359

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT F : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE 364

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT F : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE 377

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT F : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE 385

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT G : - REZ DE CHAUSSEE : - RADIOLOGIE : - LOCAL DIA 065

➤ **CINV03**

Armoire(s) / coffret(s) non contrôlé(s) (présence de stockage empêchant l'accès)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT G : - REZ DE CHAUSSEE : - SOIN DE SUPPORT : - LOCAL RC SUP SSP 025

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT G : - PREMIER ETAGE : - LOCAL VDI LTE 009

➤ **Prise(s) de courant**

La mesure d'isolement n'a pas été réalisée sans accès possible aux connexions.

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT G : - PREMIER ETAGE : - CHAMBRE 170

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT G : - PREMIER ETAGE : - CHAMBRE 164

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT G : - TROISIEME ETAGE : - COULOIR ACCUEIL ADMISSION

- COFFRET CHAMBRE TE2.365 - COTE CH 327
- Prise de courant

Matériel non en service

(P) Avant une éventuelle remise en usage, vous assurer de son état de conformité, le cas échéant en sollicitant une vérification par APAVE

BATIMENT G : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE 327

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT G : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE 326

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT G : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE 325

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT G : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE 321

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT G : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE 320

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT G : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE 316

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT G : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE 317

Locaux ou installations inaccessibles pour risque particulier lié à l'environnement (amiante, biologique, chimique, intoxication CO, etc...), sans moyen d'accès sécurisé nous n'avons pu procéder à la totalité des investigations.

(P) Nous sommes à votre disposition pour une mission supplémentaire comprenant les compléments de vérification.

BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL TECHNIQUE LTE 038

➤ ARMOIRE CUC GROUPE FROID

Bien que prévu au contrat, les schémas unifilaires des installations électriques accompagnés si nécessaire d'un synoptique montrant l'articulation des différents tableaux ne nous ont pas été transmis ou sont incomplets ou non à jour, ce qui n'a pas permis de mener complètement à bien notre mission.

(P) Nous communiquer les éléments manquants. A défaut nous sommes à votre dispositions pour leur création ou leur mise à niveau

BATIMENT H : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE N°307

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT H : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE N° 310

Local occupé au moment de notre passage (non vérifié)

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

BATIMENT I : - REZ-DE-CHAUSSEE : - MAMMOGRAPHIE 2 CSE 034

➤ COFFRET PDB MAMMO ICR - 1

Bien que prévu au contrat, les schémas unifilaires des installations électriques accompagnés si nécessaire d'un synoptique montrant l'articulation des différents tableaux ne nous ont pas été transmis ou sont incomplets ou non à jour, ce qui n'a pas permis de mener complètement à bien notre mission.

(P) Nous communiquer les éléments manquants. A défaut nous sommes à votre dispositions pour leur création ou leur mise à niveau

1.3 Changements importants depuis la précédente vérification

Il nous a été déclaré l'absence de modifications de structure, d'extension d'installation ou d'affectation des locaux.

2. Caractéristiques principales des installations

2.1 Structure de l'établissement

Nombre de bâtiments / affectation

1. INSTITUT UNIVERSITAIRE DU CANCER - ONCOPOLE

Pour les autres caractéristiques se reporter soit au rapport de vérification initiale, soit au précédent rapport quadriennal de vérification

3. Examen des prescriptions applicables

Se reporter soit au rapport de vérification initiale, soit au précédent rapport quadriennal de vérification

4. Résultats des mesurages et essais

4.1 Appareils de mesure et d'essais utilisés

Continuité/isolément, masses et circuits	Essais des DDR	Tests des CPI	Mesures des prises de terre	Continuité de précision (si requis)
MEGGER MFT 1835	MEGGER MFT 1835		MEGGER MFT 1835	

4.2 Résultats

Prises de terre

Localisation	Désignation	Conditions de mesure / Barrette	Valeur (Ω)
BATIMENT D : - EXTERIEUR : - Poste de livraison CFO ADO 034	TERRE BATIMENT	Ensemble interconnecté	9999

Continuités entre tableaux de la distribution

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur ($m\Omega$)
EXTERIEURS : - LOCAL LTE 037 TGBT 3	ARMOIRE TGBT 3	TERRE BATIMENT	630
EXTERIEURS : - LOCAL LTE 037 TGBT 3	ARMOIRE AD 037	TERRE BATIMENT	550
EXTERIEURS : - LOCAL LTE 037 TGBT 3	ARMOIRE AD 38	TERRE BATIMENT	520
BATIMENT A : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR BUREAU EFS	ARMOIRE AD 012	MASSES BATIMENT	550
BATIMENT A : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL NT LOG LTE 013	ARMOIRE AD 032	MASSES BATIMENT	600
BATIMENT A : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL NT LOG LTE 013	CELLULES GROUPE	MASSES BATIMENT	620
BATIMENT A : - PREMIER ETAGE : - COULOIR LABORATOIRES	ARMOIRE AD 100	MASSES BATIMENT	790
BATIMENT A : - PREMIER ETAGE : - COULOIR LABORATOIRES	ARMOIRE AD 101	MASSES BATIMENT	640
BATIMENT A : - DEUXIEME ETAGE : - COULOIR BUREAUX	ARMOIRE AD 212	MASSES BATIMENT	790
BATIMENT A : - DEUXIEME ETAGE : - COULOIR BUREAUX	ARMOIRE AD 213	MASSES BATIMENT	690
BATIMENT A : - TROISIEME ETAGE : - LOCAL CFO AD311	ARMOIRE AD 311	MASSES BATIMENT	440
BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGBT 1.1	ARMOIRE TGBT 1.1	TERRE BATIMENT	590
BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO ADO 035	ARMOIRE ADO 035	MASSES BATIMENT	650

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGS	ARMOIRE TGS	TERRE BATIMENT	500
BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGS	ARMOIRE TS7	TERRE BATIMENT	520
BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGBT GSS1	TGBT GSS1	TERRE BATIMENT	800
BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGBT 2.1	ARMORIE TGBT 2.1	TERRE BATIMENT	710
BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGBT GSS2	ARMOIRE TGBT GSS2	TERRE BATIMENT	500
BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGBT HQ2	ARMOIRE TGBT GSS2	TERRE BATIMENT	690
BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGBT 1.2	ARMOIRE TGBT 1.2	TERRE BATIMENT	900
BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGBT 2.2	ARMOIRE TGBT 2.2	TERRE BATIMENT	500
BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGBT 2.2	ARMOIRE AD036	MASSES BATIMENT	600
BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - CIRCULATION	ARMOIRE AD 010	MASSES BATIMENT	700
BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - PREPARATION CHIMIO	ARMOIRE AD 031	MASSES BATIMENT	570
BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - ZONE CHAUDE	ARMOIRE AD 026	MASSES BATIMENT	600
BATIMENT B : - PREMIER ETAGE : - COULOIR BUREAUX	ARMOIRE AD111	MASSES BATIMENT	700
BATIMENT B : - PREMIER ETAGE : - COULOIR BUREAUX	ARMOIRE AD 110	MASSES BATIMENT	550
BATIMENT B : - DEUXIEME ETAGE : - COULOIR BUREAUX	ARMOIRE AD 208	MASSES BATIMENT	500
BATIMENT B : - DEUXIEME ETAGE : - COULOIR BUREAUX	ARMOIRE AD 207	MASSES BATIMENT	500
BATIMENT B : - TROISIEME ETAGE : - COULOIR BUREAUX	ARMOIRE AD 314	MASSES BATIMENT	720
BATIMENT B : - TROISIEME ETAGE : - COULOIR BUREAUX	ARMOIRE AD 315	MASSES BATIMENT	500
BATIMENT B : - TROISIEME ETAGE : - COULOIR BUREAUX	ARMOIRE AD 314 HQ	MASSES BATIMENT	720
BATIMENT B : - TROISIEME ETAGE : - COULOIR BUREAUX	ARMOIRE AD 315 HQ	MASSES BATIMENT	500
BATIMENT C : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR	ARMOIRE AD 017	MASSES BATIMENT	600
BATIMENT C : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR	ARMOIRE AD 020	MASSES BATIMENT	550

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
BATIMENT C : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL CFO AD 018	ARMOIRE AD 018	MASSES BATIMENT	680
BATIMENT C : - PREMIER ETAGE : - CIRCULATION	ARMOIRE AD 112	MASSES BATIMENT	700
BATIMENT C : - PREMIER ETAGE : - LOCAL CFO AD 113	ARMOIRE AD 113	MASSES BATIMENT	620
BATIMENT C : - PREMIER ETAGE : - LOCAL CFO AD 119	ARMOIRE AD 119	MASSES BATIMENT	500
BATIMENT C : - PREMIER ETAGE : - LOCAL CFO AD 114	ARMOIRE AD114	MASSES BATIMENT	510
BATIMENT C : - DEUXIEME ETAGE : - CIRCULATION	ARMOIRE AD209	MASSES BATIMENT	550
BATIMENT C : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL CFO AD210	ARMOIRE AD210	MASSES BATIMENT	500
BATIMENT C : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL CFO AD211	ARMOIRE AD211	MASSES BATIMENT	600
BATIMENT C : - TROISIEME ETAGE : - CIRCULATION	ARMOIRE AD300	MASSES BATIMENT	400
BATIMENT C : - TROISIEME ETAGE : - LOCAL CFO N3 LOG LTE 007	ARMOIRE AD309	MASSES BATIMENT	570
BATIMENT C : - TROISIEME ETAGE : - LOCAL CFO LTE 010	ARMOIRE AD310	MASSES BATIMENT	600
BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 004	ARMOIRE AD 400	MASSES BATIMENT	540
BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 012	ARMOIRE AD 401	MASSES BATIMENT	710
BATIMENT D : - EXTERIEUR : - Poste de livraison CFO ADO 034	ARMOIRE AD034	MASSES BATIMENT	500
BATIMENT D : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR COTE MORGUE	ARMOIRE AD 021	MASSES BATIMENT	700
BATIMENT D : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR SERVICE MORTUAIRE	ARMOIRE AD 025	MASSES BATIMENT	700
BATIMENT D : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR SERVICE MORTUAIRE	ARMOIRE AD 009	MASSES BATIMENT	500
BATIMENT D : - PREMIER ETAGE : - COULOIR BUREAUX	ARMOIRE AD 102	MASSES BATIMENT	300
BATIMENT D : - PREMIER ETAGE : - COULOIR BUREAUX	ARMOIRE AD 103	MASSES BATIMENT	200
BATIMENT D : - DEUXIEME ETAGE : - Circulation bureaux	ARMOIRE AD 200	MASSES BATIMENT	620
BATIMENT D : - DEUXIEME ETAGE : - Circulation bureaux	ARMOIRE AD 201	MASSES BATIMENT	700
BATIMENT D : - TROISIEME ETAGE : - Circulation bureaux	ARMOIRE AD 313	MASSES BATIMENT	800

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR RADIO THERAPIE	ARMOIRE AD 014	MASSES BATIMENT	670
BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR BATIMENT C	ARMOIRE AD 013	MASSES BATIMENT	700
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - BLOC OPERATOIRE : - SALLE DE REVEIL	ARMOIRE AD 118	TERRE BATIMENT	900
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - COULOIR CURIETHERAPIE	ARMOIRE AD 109 - COULOIR HCO 509	TERRE BATIMENT	900
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - COULOIR PRINCIPAL	ARMOIRE AD 116	MASSES BATIMENT	630
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL TECHNIQUE N2 LOG LTE 023	ARMOIRE AD 215	MASSES BATIMENT	560
BATIMENT E : - TROISIEME ETAGE : - CIRCULATION	ARMOIRE AD 307 - COULOIR HEMATO 2	MASSES BATIMENT	530
BATIMENT E : - TROISIEME ETAGE : - CIRCULATION	ARMOIRE AD 301 - COULOIR HEMATO GREFFE	MASSES BATIMENT	580
BATIMENT F : - REZ-DE-CHAUSSEE : - MÉDECINE NUCLEAIRE : - COULOIR ACCUEIL	ARMOIRE AD 017 HQ	MASSES BATIMENT	830
BATIMENT F : - REZ-DE-CHAUSSEE : - MÉDECINE NUCLEAIRE : - COULOIR	ARMOIRE AD 015	MASSES BATIMENT	570
BATIMENT F : - REZ-DE-CHAUSSEE : - MÉDECINE NUCLEAIRE : - COULOIR	ARMOIRE AD 016	MASSES BATIMENT	610
BATIMENT F : - REZ-DE-CHAUSSEE : - CIRCULATION PRINCIPALE : (face au local RIA C1-00-02) - CIRCULATION	ARMOIRE AD 017	MASSES BATIMENT	610
BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - REANIMATION : - COULOIR REANIMATION	ARMOIRE AD 117	MASSES BATIMENT	670
BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - CIRCULATION RÉANIMATION - BLOCS	ARMOIRE AD 108	MASSES BATIMENT	670
BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - CIRCULATION RÉANIMATION - BLOCS	ARMOIRE AD 115	MASSES BATIMENT	600
BATIMENT F : - TROISIEME ETAGE : - CIRCULATION HEM	ARMOIRE AD 302	MASSES BATIMENT	580
BATIMENT F : - TROISIEME ETAGE : - CIRCULATION HEM	ARMOIRE AD 308	MASSES BATIMENT	650
BATIMENT G : - PREMIER ETAGE : - CIRCULATIONS	ARMOIRE AD 104	MASSES BATIMENT	600
BATIMENT G : - PREMIER ETAGE : - CIRCULATIONS	COFFRET CHAMBRE TE2. 176 - COTE CH 117/118	MASSES BATIMENT	590
BATIMENT G : - DEUXIEME ETAGE : - COULOIR COTE ACCUEIL ADMISSION	ARMOIRE AD 202	MASSES BATIMENT	600
BATIMENT G : - DEUXIEME ETAGE : -	ARMOIRE AD 203 - COTE CH	MASSES	700

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
COULOIR COTE ACCUEIL ADMISSION	228	BATIMENT	
BATIMENT G : - TROISIEME ETAGE : - COULOIR ACCUEIL ADMISSION	ARMOIRE AD 303	MASSES BATIMENT	500
BATIMENT G : - TROISIEME ETAGE : - COULOIR ACCUEIL ADMISSION	ARMOIRE AD 304 - COTE CH 321	MASSES BATIMENT	800
BATIMENT G : - TERRASSE : - LOCAL AD403 TOITURE 4 ET 5	ARMOIRE AD 403	MASSES BATIMENT	510
BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR ARRIERE & RESERVE ALIMENTAIRE	ARMOIRE AD 008	MASSES BATIMENT	800
BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR COTE AMPHITHEATRE	ARMOIRE AD 004	MASSES BATIMENT	520
BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR COTE AMPHITHEATRE	ARMOIRE AD 002	MASSES BATIMENT	520
BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - ZONE ACCEUIL & CIRCULATION PC SECURITE	ARMOIRE AD 001 - PLACARD ACCUEIL	MASSES BATIMENT	570
BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - PC SECURITE	ARMOIRE AD 033	MASSES BATIMENT	500
BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - ONCOMIP : - CIRCULATION & ACCEUIL	ARMOIRE AD 003	MASSES BATIMENT	520
BATIMENT H : - PREMIER ETAGE : - CIRCULATIONS	ARMOIRE AD 107 - COTE CH 108	MASSES BATIMENT	540
BATIMENT H : - TROISIEME ETAGE : - COULOIR CHAMBRES 3B	ARMOIRE AD 306	MASSES BATIMENT	560
BATIMENT H : - TROISIEME ETAGE : - COULOIR CHAMBRES 3B	ARMOIRE AD 305	MASSES BATIMENT	600
BATIMENT I : - REZ-DE-CHAUSSEE : - CIRCULATION CONSULTATIONS	ARMOIRE AD 007 - COULOIR ONCOREABILITATION	MASSES BATIMENT	600
BATIMENT I : - REZ-DE-CHAUSSEE : - CIRCULATION CONSULTATIONS	ARMOIRE AD 005 - COULOIR RADIO SENOLOGIE	MASSES BATIMENT	630
BATIMENT I : - REZ-DE-CHAUSSEE : - CIRCULATION CONSULTATIONS	ARMOIRE AD 006	MASSES BATIMENT	700

Contrôleur(s) permanent(s) d'isolement

Localisation	Source	Contrôleur permanent d'isolement (CPI)			
		Marque Type	Réglage (kΩ)	Essai (kΩ)	Report
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - BLOC OPERATOIRE : - COULOIR BLOC OPERATOIRE :	TRANSFORMAT EUR D'ISOLEMENT COP1	SOCOMECE HL765	500	Non mesuré	VOYANT DANS LA SALLE D'OPERATIO

Localisation	Source	Contrôleur permanent d'isolement (CPI)			
		Marque Type	Réglage (k Ω)	Essai (k Ω)	Report
					N
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - BLOC OPERATOIRE : - COULOIR BLOC OPERATOIRE :	TRANSFORMAT EUR D'ISOLEMENT COP2	SOCOMECHL765	500	Non mesuré	VOYANT DANS LA SALLE D'OPERATIO N
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - BLOC OPERATOIRE : - COULOIR BLOC OPERATOIRE :	TRANSFORMAT EUR D'ISOLEMENT COP3	SOCOMECHL765	500	Non mesuré	VOYANT DANS LA SALLE D'OPERATIO N
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - BLOC OPERATOIRE : - COULOIR BLOC OPERATOIRE :	TRANSFORMAT EUR D'ISOLEMENT COP4	SOCOMECHL765	500	Non mesuré	VOYANT DANS LA SALLE D'OPERATIO N
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - BLOC OPERATOIRE : - COULOIR BLOC OPERATOIRE :	TRANSFORMAT EUR D'ISOLEMENT COP5	SOCOMECHL765	500	Non mesuré	VOYANT DANS LA SALLE D'OPERATIO N
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - BLOC OPERATOIRE : - COULOIR BLOC OPERATOIRE :	TRANSFORMAT EUR D'ISOLEMENT COP6	SOCOMECHL765		Non mesuré	VOYANT DANS LA SALLE D'OPERATIO N
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - BLOC OPERATOIRE : - COULOIR BLOC OPERATOIRE :	TRANSFORMAT EUR D'ISOLEMENT COP7	SOCOMECHL765	500	Non mesuré	VOYANT DANS LA SALLE D'OPERATIO N
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - BLOC OPERATOIRE : - COULOIR BLOC OPERATOIRE :	TRANSFORMAT EUR D'ISOLEMENT COP8	SOCOMECHL765	500	Non mesuré	VOYANT DANS LA SALLE D'OPERATIO N
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - COULOIR CURIETHERAPIE	TRANSFORMAT EUR D'ISOLEMENT COP7	SOCOMECHL765	500	5000	VOYANT DANS LA SALLE D'OPERATIO N

Dispositifs différentiels à courant résiduel

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (M Ω)	N° Obs
			I Δ_n (mA)	Tempo (s)			

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
EXTERIEURS : - LOCAL LTE 037 TGBT 3							
➤ ARMOIRE AD 037							
2	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ ARMOIRE AD 38							
1	FMN 01	DDR	300		NE		
2	FMN 02/03	DDR	300		NE		
2	FMN 04/05	DDR	300		NE		
1	FMN 06	DDR	300		NE		
1	FMN 07	DDR	300		NE		
EXTERIEURS : - RC LOG HOT 037							
➤ AD LOG TGBT 3							
1	D1	DDR	30	Inst	NE		
1	Eclairage	DDR	300	Inst	NE		
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
1	Poste trav	DDR	30	Inst	NE		
1	Alim diverses	DDR	300	Inst	NE		
1	CVC	DDR	300	Inst	NE		
1	Borne repas	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT A : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR BUREAU EFS							
➤ Armoire AD 011 HQ							
14	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
12	FM	DDR	300	Inst	NE		
5	FM	DDR	300	Inst	NE		
1	Armoire transfo cuve azote	DDR	10	Inst	NE		
1	Central intrusion	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 011							
10	Eclairage	DDR	300		NE		
2	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
37	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	PCN34	DDR	30	Inst	NE		
9	FM	DDR	30		NE		
35	FM	DDR	300	Inst	NE		
7	FMN	DDR	300	Inst	NE		
5	FMN	DDR	300	Inst	NE		
1	FMN57	DDR	300	Inst	NE		
1	FMN61	DDR	300	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	FMN68	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 012							
2	Eclairage	DDR	300		NE		
1	Eclairage	DDR	30		NE		
1	AUTOCLAVE	DDR	30		NE		
15	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
7	FMN	DDR	30		NE		
2	FMN	DDR	300		NE		
1	FMN	DDR	300	Inst	NE		
3	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
7	FMN HQ	DDR	300		NE		
BATIMENT A : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL NT LOG LTE 013							
➤ ARMOIRE AD 032							
3	Eclairage	DDR	300		NE		
2	Prises	DDR	30		NE		
BATIMENT A : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL RC LAB EFS 039							
➤ Armoire LT A6							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT A : - PREMIER ETAGE : - COULOIR LABORATOIRES							
➤ ARMOIRE AD 100							
8	Eclairage	DDR	300		NE		
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
47	Prises	DDR	30		NE		
2	FMN	DDR	30		NE		
6	FMN	DDR	300		NE		
2	FMN	DDR	300		NE		
1	Lave vaisselle	DDR	30	Inst	NE		
2	LAB	DDR	30	Inst	NE		
10	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
12	FMN HQ	DDR	30		NE		
1	FMN HQ	DDR	300		NE		
1	FMN	DDR	300	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 101							
12	Eclairage	DDR	300		NE		
63	Prises	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Lave vaisselle	DDR	30		NE		
10	FMN	DDR	30		NE		
BATIMENT A : - DEUXIEME ETAGE : - COULOIR BUREAUX							
➤ ARMOIRE AD 212							
2	Eclairage	DDR	300		NE		
34	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMN41	DDR	30		NE		
1	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
➤ ARMOIRE AD 213							
51	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT A : - TROISIEME ETAGE : - LOCAL CFO AD311							
➤ ARMOIRE AD 311							
1	Eclairage	DDR	30		NE		
2	FMN	DDR	300	Inst	NE		
2	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMN	DDR	300		NE		
1	Prise de courant HQ	DDR	300	Inst	NE		
1	Alim baie HQ	DDR	30	Inst	NE		
4	Alim baie HQ	DDR	30		NE		
1	FMO07	DDR	30		NE		
BATIMENT A : - TROISIEME ETAGE : - CIRCULATION BUREAUX							
➤ ARMOIRE AD312							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
26	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
1	FMN	DDR	30	Inst	NE		
1	FM	DDR	30	Inst	NE		
1	FMN	DDR	30		NE		
2	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
1	FM	DDR	30	Inst	NE		
1	Alim baie	DDR	30	Inst	NE		
3	FM/Baie	DDR	30		NE		
BATIMENT A : - TROISIEME ETAGE : - LOCAL N3 LOG LTE 005							
➤ Armoire LT A5							
1	PC 230V	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT A : - TERRASSE : - LOCAL N3 LOG LTE 002							
➤ ARMOIRE LT A4							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	PC 230V	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT A : - TERRASSE : - LOCAL N3 LOG LTE 003							
➤ COFFRET DE SUPERVISION							
1	Général	IDR	30	Inst	NE		
BATIMENT A : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 006 CTA PE1 + PE6							
➤ ARMOIRE C1							
1	Traceur	DDR	30	Inst	NE		
1	PC 230V	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT A : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 008 Sous station 2							
➤ ARMOIRE C9							
1	PC 230V	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT A : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 009 Sous station 2							
➤ ARMOIRE C3							
1	PC 230V	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT A : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 010							
➤ ARMOIRE C4							
1	PC 230V	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT A : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 014							
➤ ARMOIRE LT A3							
1	Non identifiée	IDR	300	Inst	NE		
1	PC 230V	DDR	30	Inst	NE		
1	Adoucisseur	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO ADO 035							
➤ ARMOIRE ADO 035							
2	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGS							
➤ ARMOIRE TS7							
27	FMN	DDR	30		NE		
BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL CFO TGBT 2.2							
➤ ARMOIRE AD036							
2	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT B : - EXTERIEUR : - LOCAL STOCKAGE OXYGENE							
➤ Armoire AD18							
1	Général	IDR	30	Inst	NE		
BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - CIRCULATION							
➤ AD UPC02							
3	Eclairage	DDR	300	Inst	NE		
16	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
3	PC Robot	DDR	30	Inst	NE		
10	Divers	DDR	30	Inst	NE		
1	Non identifiée	DDR	300	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 010							
7	Eclairage	DDR	300		NE		
49	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	FMN	DDR	30	Inst	NE		
11	FMN	DDR	300		NE		
4	FMN	DDR	300	Inst	NE		
5	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	FM	DDR	300	Inst	NE		
1	FM012	DDR	300	Inst	NE		
3	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - PREPARATION CHIMIO							
➤ ARMOIRE AD 031							
7	Eclairage	DDR	300		NE		
20	Prise de courant	DDR	30		NE		
8	FMN	DDR	300		NE		
1	Attente	DDR	30	Inst	NE		
2	FM	DDR	300	Inst	NE		
13	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - ZONE CHAUDE							
➤ ARMOIRE AD 026							
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
4	Eclairage	DDR	300		NE		
12	Prise de courant	DDR	30		NE		
7	FMN	DDR	30		NE		
2	FM	DDR	300	Inst	NE		
1	FM	DDR	300	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - LOCAL TECHNIQUE CTA TGBT 1.2							
➤ Armoire TGBT HQ2							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
➤ Armoire TGBT SS2							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
➤ Coffret CVC							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
➤ Armoire TGBT 1.2							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - LOCAL TECHNIQUE CTA 21							
➤ Armoire B1							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - LOCAL RC LOG LTE 014							
➤ Armoire TGBT SS1							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
➤ Armoire TGBT 2.1							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
➤ Armoire TGBT 1.1							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT B : - PREMIER ETAGE : - COULOIR BUREAUX							
➤ ARMOIRE AD111							
10	Eclairage	DDR	300		NE		
77	Prises	DDR	30		NE		
21	FM	DDR	30		NE		
5	FMN	DDR	30	Inst	NE		
26	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
2	FM	DDR	300	Inst	NE		
8	FMN	DDR	300		NE		
➤ ARMOIRE AD 110							
11	Eclairage	DDR	300		NE		
70	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	PCN61	DDR	30	Inst	NE		
3	FMN	DDR	300		NE		
7	FMN	DDR	30		NE		
21	FMN	DDR	300	Inst	NE		
1	Autoclave	DDR	30	Inst	NE		
1	Lave vaisselle	DDR	300	Inst	NE		
24	Prises HQ	DDR	30		NE		
9	FMN	DDR	300		NE		
BATIMENT B : - PREMIER ETAGE : - LOCAL TECHNIQUE NT LOG LTE 013							
➤ Coffret Système de transport pneumatique							
1	Départ	DDR	300		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Départ	DDR	300		NE		
BATIMENT B : - DEUXIEME ETAGE : - COULOIR BUREAUX							
➤ ARMOIRE AD 208							
9	Eclairage	DDR	300		NE		
54	Prise de courant	DDR	30		NE		
5	FMN	DDR	300		NE		
4	FMN	DDR	30	Inst	NE		
1	Laverie	DDR	30		NE		
23	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
4	FMN HQ	DDR	300		NE		
➤ ARMOIRE AD 207							
6	Eclairage	DDR	300		NE		
59	Prise de courant	DDR	30		NE		
10	FMN	DDR	300		NE		
3	FMN	DDR	30		NE		
4	Congélateur	DDR	300		NE		
16	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
1	FMN HQ	DDR	300		NE		
BATIMENT B : - TROISIEME ETAGE : - COULOIR BUREAUX							
➤ ARMOIRE AD 314							
12	Eclairage	DDR	300		NE		
78	Prise de courant	DDR	30		NE		
34	FMN	DDR	300		NE		
6	FNM	DDR	30		NE		
3	FMN	DDR	300	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 315							
13	Eclairage	DDR	300		NE		
71	Prise de courant	DDR	30		NE		
41	FMN	DDR	300		NE		
6	FMN	DDR	30		NE		
1	FMN	DDR	300		NE		
4	FMN	DDR	300	Inst	NE		
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Autoclave	DDR	30		NE		
➤ ARMOIRE AD 314 HQ							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
26	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FM	DDR	300	Inst	NE		
12	FM	DDR	300		NE		
➤ ARMOIRE AD 315 HQ							
29	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FM	DDR	300	Inst	NE		
6	FM	DDR	300		NE		
1	SEQUENCEUR	DDR	30		NE		
BATIMENT C : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR							
➤ ARMOIRE AD 017							
4	Eclairage	DDR	300		NE		
3	Eclairage	DDR	30		NE		
87	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	FMN	DDR	300		NE		
1	FMN33	DDR	300	Inst	NE		
3	FMN	DDR	30	Inst	NE		
1	FMN34	DDR	300		NE		
➤ ARMOIRE AD 020							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
10	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMN	DDR	300		NE		
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT C : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL CFO AD 018							
➤ ARMOIRE AD 018							
8	Eclairage	DDR	300		NE		
2	Eclairage	DDR	30		NE		
20	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMN41	DDR	300	Inst	NE		
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
2	Azote/Armazote liquide	DDR	30		NE		
15	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
3	Divers FMN	DDR	300	Inst	NE		
3	Divers FMN	DDR	300	Inst	NE		
1	DAV 32	DDR	300		NE		
1	Aérotherme	DDR	300	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	FMN30	DDR	300	Inst	NE		
1	FMN31	DDR	300	Inst	NE		
1	FMN 34 DAV	DDR	300		NE		
13	FM/Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT C : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL RC LOG LTE 022							
➤ Armoire CFR - PCH1							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT C : - PREMIER ETAGE : - CIRCULATION							
➤ ARMOIRE AD 112							
3	Eclairage	DDR	30		NE		
3	Eclairage	DDR	300		NE		
22	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Lave vaisselle	DDR	30	Inst	NE		
1	FMN	DDR	300		NE		
1	FMN	DDR	300	Inst	NE		
1	Machine à glace	DDR	30	Inst	NE		
1	PCN31	DDR	30		NE		
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT C : - PREMIER ETAGE : - LOCAL CFO AD 113							
➤ ARMOIRE AD 113							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
2	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
13	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
9	FM	DDR	30		NE		
BATIMENT C : - PREMIER ETAGE : - LOCAL CFO AD 119							
➤ ARMOIRE AD 119							
3	Eclairage	DDR	300		NE		
30	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	PCN32	DDR	30	Inst	NE		
1	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
1	FM	DDR	30	Inst	NE		
1	Alim	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT C : - PREMIER ETAGE : - LOCAL CFO AD 114							
➤ ARMOIRE AD114							
11	Prise de courant	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
2	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
BATIMENT C : - DEUXIEME ETAGE : - CIRCULATION							
➤ ARMOIRE AD209							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
25	Prise de courant	DDR	30		NE		
3	Prise de courant HQ	DDR	30	Inst	NE		
12	FM	DDR	30		NE		
BATIMENT C : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL CFO AD210							
➤ ARMOIRE AD210							
2	Eclairage	DDR	30		NE		
2	Eclairage	DDR	300	Inst	NE		
16	Prise de courant	DDR	30		NE		
3	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
8	FM	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT C : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL CFO AD211							
➤ ARMOIRE AD211							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
8	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMN	DDR	300		NE		
1	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
BATIMENT C : - TROISIEME ETAGE : - CIRCULATION							
➤ ARMOIRE AD300							
4	Eclairage	DDR	30		NE		
15	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	FMN	DDR	30		NE		
1	FMN	DDR	300	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT C : - TROISIEME ETAGE : - LOCAL CFO N3 LOG LTE 007							
➤ ARMOIRE AD309							
2	Eclairage	DDR	30		NE		
5	Eclairage	DDR	300	Inst	NE		
14	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	FM	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT C : - TROISIEME ETAGE : - LOCAL CFO LTE 010							
➤ ARMOIRE AD310							
1	Eclairage	DDR	300		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
10	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 037							
➤ ARMOIRE C11							
1	PC 230V	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 011							
➤ ARMOIRE C5							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Cumulus	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 018							
➤ ARMOIRE TS2							
5	FMN	DDR	30		NE		
4	Réserve	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 020							
➤ ARMOIRE C7							
1	PC 230V	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 004							
➤ ARMOIRE AD 400							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
3	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
26	FM	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 012							
➤ ARMOIRE AD 401							
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
1	Eclairage	DDR	300		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMN	DDR	300	Inst	NE		
4	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
15	FM	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 015							
➤ ARMOIRE C10							
1	PC 230V	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE C8							
1	PC 230V	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 014							
➤ ARMOIRE C6							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	PC 230V	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT D : - EXTERIEUR : - Poste de livraison CFO ADO 034							
➤ ARMOIRE AD034							
2	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
3	Divers	DDR	30	Inst	NE		
1	Sofrel	DDR	30	Inst	NE		
1	Attente	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT D : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR COTE MORGUE							
➤ ARMOIRE AD 021							
6	Eclairage	DDR	30		NE		
11	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT D : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR SERVICE MORTUAIRE							
➤ ARMOIRE AD 025							
7	Eclairage	DDR	300		NE		
2	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	BARRIERE PARKING	DDR	300		NE		
1	PC QUAI	DDR	30		NE		
1	Borne recharge véhicule	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 009							
10	Eclairage	DDR	300		NE		
2	Eclairage	DDR	30		NE		
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
1	PCN 54	DDR	30	Inst	NE		
51	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	PCN 40	DDR	30	Inst	NE		
3	FMN	DDR	300	Inst	NE		
3	FMN	DDR	30	Inst	NE		
1	Labo morgue	DDR	300	Inst	NE		
3	FMN	DDR	30	Inst	NE		
1	Compacteur 1	DDR	30	Inst	NE		
1	Compacteur 2	DDR	30	Inst	NE		
2	PCN 43/44	DDR	30	Inst	NE		
1	FMN12	DDR	300	Inst	NE		
1	Arm clim	DDR	300	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	PCN49	DDR	300	Inst	NE		
1	PCN 42	DDR	30		NE		
11	Divers	DDR	30		NE		
3	FM	DDR	300		NE		
1	SONDE RADIOACTIVITE	DDR	30		NE		
BATIMENT D : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL RC LOG HOT 025							
➤ COFFRET IUC							
1	Présence tension	DDR	30		NE		
1	Machine à lave	IDR	30		NE		
1	Sèche linge	DDR	30		NE		
1	Machine à laver	DDR	30		NE		
BATIMENT D : - REZ-DE-CHAUSSEE : - Local RC LOG MED 006							
➤ ARMOIRE L.T.							
1	Général prises	DDR	30	Inst	NE		
1	TRACEUR RESEAU INCENDIE	DDR	30		NE		
BATIMENT D : - PREMIER ETAGE : - Local informatique N1 INF 020							
➤ AD 120-1							
12	Divers	DDR	30		NE		
1	PDU	DDR	30	Inst	NE		
➤ AD 120-2							
11	Divers HQ	DDR	30		NE		
1	PDU HQ	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT D : - PREMIER ETAGE : - Local serveur N1 SUP INF 008							
➤ AD 121-1							
12	Divers	DDR	30		NE		
➤ AD 121-2							
12	Divers HQ	DDR	30		NE		
BATIMENT D : - PREMIER ETAGE : - COULOIR BUREAUX							
➤ ARMOIRE AD 102							
3	Eclairage	DDR	300		NE		
35	Prise de courant	DDR	30		NE		
3	FMN	DDR	300	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	FMN	DDR	30	Inst	NE		
3	FMN	DDR	30	Inst	NE		
4	Alim baie	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	FM	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 103							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
46	Prise de courant	DDR	30		NE		
13	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
BATIMENT D : - DEUXIEME ETAGE : - Circulation bureaux							
➤ ARMOIRE AD 200							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
36	PRISES	DDR	30		NE		
1	Prise de courant HQ	DDR	30	Inst	NE		
6	FM	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 201							
2	Eclairage	DDR	300		NE		
37	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMN	DDR	300	Inst	NE		
1	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
BATIMENT D : - TROISIEME ETAGE : - TERRASSE							
➤ ARMOIRE LT SERVEUR 1							
1	Départ PC	DDR	30		NE		
BATIMENT D : - TROISIEME ETAGE : - Circulation bureaux							
➤ ARMOIRE AD 313							
20	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	FMN	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
2	FM	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT E : - SOUS-SOL : - COULOIR							
➤ ARMOIRE PRINCIPALE GARE 2							
1	PC 230V	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR RADIO THERAPIE							
➤ ARMOIRE AD 014							
6	Eclairage	DDR	300		NE		
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
120	Prise de courant	DDR	30		NE		
3	CVC	DDR	300		NE		
4	FMN	DDR	300		NE		
2	Compresseur	DDR	300		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Interphone	DDR	300	Inst	NE		
1	FMN33	DDR	300	Inst	NE		
1	FMN34	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL EXT 031							
➤ ARMOIRE E24							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL EXT 061							
➤ ARMOIRE E22							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL EXT 097							
➤ ARMOIRE E21							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL EXT 112							
➤ COFFRET CTA BUNKER							
1	Départ	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL EXT 118							
➤ ARMOIRE E19							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL EXT 126							
➤ ARMOIRE E23							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL EXT 129							
➤ ARMOIRE E25							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL EXT 136							
➤ ARMOIRE E26 BUNKER 8							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL CFO AD 8ème BUNKER							
➤ AD EXT BUNKER (AD 039)							
1	Eclairage loc tech	DDR	300	Inst	NE		
33	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
1	Armoire clim	DDR	300	Inst	NE		
5	Divers	DDR	300	Inst	NE		
2	Cumulus	DDR	30	Inst	NE		
1	Alim secourue portes pompier	DDR	300	Inst	NE		
2	Coffret caméra / RJB	DDR	300	Inst	NE		
8	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Automate GTC	DDR	30	Inst	NE		
1	FMN02	DDR	300	Inst	NE		
BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR BATIMENT C							
➤ ARMOIRE AD 013							
51	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
9	Eclairage	DDR	300		NE		
80	PRISES	DDR	30		NE		
8	FMN	DDR	300	Inst	NE		
3	CVC	DDR	300	Inst	NE		
1	Clim dosimétrie	DDR	30		NE		
1	FMN34	DDR	300	Inst	NE		
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - BLOC OPERATOIRE : - COULOIR BLOC OPERATOIRE :							
➤ COFFRET COP 1							
1	Eclairage	DDR	30		NE		
12	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	FM	DDR	300	Inst	NE		
5	FM	DDR	30	Inst	NE		
➤ COFFRET COP 2							
1	Eclairage	DDR	30		NE		
10	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	FM	DDR	300	Inst	NE		
6	FM	DDR	30	Inst	NE		
➤ COFFRET COP 3							
1	Eclairage	DDR	30		NE		
10	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	FM	DDR	300	Inst	NE		
6	FM	DDR	30	Inst	NE		
➤ COFFRET COP 4							
1	Eclairage	DDR	30		NE		
10	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	FM	DDR	300	Inst	NE		
6	FM	DDR	30	Inst	NE		
➤ COFFRET COP 5							
1	Eclairage	DDR	30		NE		
10	Prise de courant	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
2	FM	DDR	300	Inst	NE		
6	FM	DDR	30	Inst	NE		
➤ COFFRET COP 6							
1	Eclairage	DDR	30		NE		
10	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	FM	DDR	300	Inst	NE		
5	FM	DDR	30	Inst	NE		
➤ COFFRET COP 8							
2	VAR	DDR	30		NE		
2	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	FM	DDR	300	Inst	NE		
1	FM	DDR	30	Inst	NE		
➤ COFFRET COP 11							
1	Eclairage	DDR	30		NE		
10	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FM	DDR	300	Inst	NE		
5	FM	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - BLOC OPERATOIRE : - SALLE DE REVEIL							
➤ ARMOIRE AD 118							
70	Prise de courant	DDR	30		NE		
3	FMN	DDR	300	Inst	NE		
20	Prise de courant HQ	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - COULOIR CURIETHERAPIE							
➤ COFFRET COP 7							
1	Eclairage	DDR	30		NE		
7	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	FM	DDR	300	Inst	NE		
3	FM	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 109 - COULOIR HCO 509							
2	Eclairage	DDR	300		NE		
9	Eclairage	DDR	30		NE		
41	Prise de courant	DDR	30		NE		
3	FMN	DDR	30	Inst	NE		
1	Machine sous vide	DDR	30	Inst	NE		
1	Lave vaisselle	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Lave bassin	DDR	30		NE		
1	FMN	DDR	300	Inst	NE		
12	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
7	FMN HQ	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - COULOIR CÔTE CHAMBRE							
➤ COFFRET CHAMBRES TE6.141 - CH 193							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
9	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRES TE4.140 - CH 195							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
5	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRES TE2.147 - CH 179/180							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRES TE2.146 - CH 181/182							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRES TE3.145 - CH 183/184							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRES TE3.143 - CH 186/187/188							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRES TE5.144 - CH 185							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
3	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRES TE3.142 - CH 189							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - COULOIR PRINCIPAL							
➤ ARMOIRE AD 116							
3	Eclairage	DDR	300		NE		
14	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	FMN	DDR	300	Inst	NE		
4	FMN	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
2	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
2	FMN	DDR	30	Inst	NE		
1	Baie vidéo	DDR	300	Inst	NE		38
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 003 & 002 & 001							
➤ ARMOIRE E3							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ ARMOIRE E2							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ ARMOIRE E1							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 005							
➤ ARMOIRE F4							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Capteur traceur	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 006							
➤ ARMOIRE F5							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ ARMOIRE F6							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Capteur traceur	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 007							
➤ ARMOIRE F7							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Alim clim	DDR	30	Inst	NE		
1	Clim office	DDR	300	Inst	NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 009							
➤ ARMOIRE E15							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 010							
➤ ARMOIRE E14							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 011							
➤ ARMOIRE E13							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 012							
➤ ARMOIRE E12							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 013							
➤ ARMOIRE E7							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 014							
➤ ARMOIRE E6							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 015							
➤ ARMOIRE E18							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 016							
➤ ARMOIRE E4							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 017							
➤ ARMOIRE E5							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Clim stock info	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 018							
➤ ARMOIRE E17							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 020 & 022 & 021 & 019							
➤ ARMOIRE E10							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ ARMOIRE E11							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ ARMOIRE E9							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ ARMOIRE E8							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL TECHNIQUE N2 LOG LTE 023							
➤ ARMOIRE AD 215							
11	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
18	FMN	DDR	300		NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 035							
➤ ARMOIRE E16							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 039							
➤ ARMOIRE F3							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 038							
➤ ARMOIRE F2							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 004							
➤ ARMOIRE F1							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT E : - TROISIEME ETAGE : - CIRCULATION							
➤ ARMOIRE AD 307 - COULOIR HEMATO 2							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
12	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
25	Prise de courant	DDR	30		NE		
7	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	FMN	DDR	30	Inst	NE		
7	FMN	DDR	30	Inst	NE		
1	FM	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 301 - COULOIR HEMATO GREFFE							
4	Eclairage	DDR	30		NE		
12	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	FMN	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.349- COTE CHAMBRE 339/340							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.351- COTE CHAMBRE 341/342/343							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.354- COTE CHAMBRE 344/345							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.356- COTE CHAMBRE 346/347							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	PRISES	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.360- COTE CHAMBRE 348/349							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.358- COTE CHAMBRE 352/353/354							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMN 02 groum	DDR	300	Inst	NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.357- COTE CHAMBRE 355/356/357							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.355- COTE CHAMBRE 358/359							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.353- COTE CHAMBRE 360/361							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.352- COTE CHAMBRE 362/363							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.350- COTE CHAMBRE 364/365							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.348- COTE CHAMBRE 366/367/368							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE6.347- COTE CHAMBRE 369/370/371							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
9	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE6.345- COTE CHAMBRE 372/373							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE6.343- COTE CHAMBRE 374/375							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE6.341- COTE CHAMBRE 376/377/378							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
9	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE6.340- COTE CHAMBRE 379/380/381							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
9	PRISES	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE6.342- COTE CHAMBRE 382/383							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	PRISES	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE6.344- COTE CHAMBRE 384/385							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	PRISES	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE6.346- COTE CHAMBRE 386/387/388							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
9	PRISES	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.359- COTE CHAMBRE 350/351							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT F : - REZ-DE-CHAUSSEE : - MÉDECINE NUCLEAIRE : - COULOIR ACCUEIL							
➤ ARMOIRE AD 017 HQ							
47	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMO04	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT F : - REZ-DE-CHAUSSEE : - MÉDECINE NUCLEAIRE : - COULOIR							
➤ ARMOIRE AD 015							
3	Eclairage	DDR	30		NE		
2	Eclairage	DDR	300	Inst	NE		
25	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	PNEUMATIQUE	DDR	300		NE		
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ ARMOIRE AD 016							
4	Eclairage	DDR	300		NE		
94	Prise de courant	DDR	30		NE		
9	FMN	DDR	300		NE		
2	FMN	DDR	30		NE		
2	Porte auto	DDR	300	Inst	NE		
1	CVC	DDR	300	Inst	NE		
1	Réserve	DDR	300	Inst	NE		
1	Rideau d'air chaud	DDR	30		NE		
33	PRISE HQ	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
3	FM HQ	DDR	30		NE		
3	Réserve	DDR	30	Inst	NE		
3	FM	DDR	300	Inst	NE		
BATIMENT F : - REZ-DE-CHAUSSEE : - CIRCULATION PRINCIPALE : (face au local RIA C1-00-02) - CIRCULATION							
➤ ARMOIRE AD 017							
4	Eclairage	DDR	300		NE		
3	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
87	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	FMN	DDR	300		NE		
1	FMN33	DDR	300	Inst	NE		
2	FMN	DDR	30		NE		
1	FMN34	DDR	300	Inst	NE		
BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - COULOIR CHIRURGIE AMBULATOIRE							
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.150 - COTE CHAMBRE 153							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.149 - COTE CHAMBRE 156							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.146 - COTE CHAMBRE 158							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - REANIMATION : - COULOIR REANIMATION							
➤ ARMOIRE AD 117							
2	Eclairage	DDR	300		NE		
1	VAR15	DDR	300	Inst	NE		
83	Prise de courant	DDR	30		NE		
3	FMN	DDR	30	Inst	NE		
1	Lave bassin	DDR	30	Inst	NE		
72	Prise de courant HQ	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - CIRCULATION MEDECINE ONCOLOGIE 1A							
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.151-COTE CHAMBRES 176/177							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - CIRCULATION RÉANIMATION - BLOCS							
➤ ARMOIRE AD 108							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
3	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
3	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Lave bassin	DDR	30	Inst	NE		
1	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
➤ ARMOIRE AD 115							
3	Eclairage	DDR	30		NE		
4	Eclairage	DDR	300	Inst	NE		
24	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	FMN	DDR	300	Inst	NE		
1	Lave sabot	DDR	30	Inst	NE		
2	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
6	FM HQ	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT F : - DEUXIEME ETAGE : - CIRCULATIONS							
➤ ARMOIRE AD 206							
5	Eclairage	DDR	300		NE		
3	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
45	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Lave vaisselle	DDR	30	Inst	NE		
1	Lave bassin	DDR	30	Inst	NE		
1	FMN11	DDR	300	Inst	NE		
4	Prise de courant HQ	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 214							
1	Eclairage	DDR	300	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Libre	DDR	300	Inst	NE		
1	FMN06	DDR	300	Inst	NE		
3	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
8	FM	DDR	30	Inst	NE		
7	FM	DDR	300	Inst	NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.245 - COTE CHAMBRE 247/248							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I Δ _n (mA)	Tempo (s)			
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.244 - COTE CHAMBRE 249							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
7	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.243 - COTE CHAMBRE 251							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
8	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.241 - COTE CHAMBRE 255							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
7	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.240 - COTE CHAMBRE 257/258							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
9	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.242 - COTE CHAMBRE 252/253							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
8	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT F : - TROISIEME ETAGE : - CIRCULATION HEM							
➤ ARMOIRE AD 302							
4	Eclairage	DDR	30		NE		
2	Eclairage	DDR	300	Inst	NE		
5	PCN	DDR	30	Inst	NE		
24	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMN04	DDR	30	Inst	NE		
1	Alim serveur	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 308							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
31	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	Lave vaisselle	DDR	30	Inst	NE		
1	FMN02	DDR	30	Inst	NE		
1	FMN11	DDR	30	Inst	NE		
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	FM	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT F : - TERRASSE : - GAINÉ CFO TS TOITURE 3 - N4-LOG-LTE-036							
➤ ARMOIRE TS3							
6	FMN	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
6	Réserve	DDR	30	Inst	NE		
1	FMN	DDR	300	Inst	NE		
BATIMENT G : - REZ DE CHAUSSEE : - TERTIAIRE MEDICAL : - COULOIR EXT 516							
➤ AD 014 HQ							
27	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
21	FM	DDR	30		NE		
4	FM	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT G : - REZ DE CHAUSSEE : - TERTIAIRE MEDICAL : - LOCAL LTE 009							
➤ COFFRET BT							
1	Général	IDR	300	Inst	NE		
1	Général	IDR	300	Inst	NE		
BATIMENT G : - REZ DE CHAUSSEE : - RADIOLOGIE : - LOCAL DIA 065							
➤ ARMOIRE F9							
1	PC 230V	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT G : - REZ DE CHAUSSEE : - RADIOLOGIE : - LOCAL TECHNIQUE DIA 059							
➤ ARMOIRE IRM							
1	DJ1	DDR	30	Inst	NE		
1	QF1	DDR	300	Inst	NE		
1	QF2	DDR	300	Inst	NE		
1	QF3	DDR	300	Inst	NE		
1	QF6	DDR	300	Inst	NE		
2	QF7/8	DDR	30	Inst	NE		
1	QF9	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT G : - REZ DE CHAUSSEE : - RADIOLOGIE : - LOCAL RAD DIA 008							
➤ Armoire AXD							
1	DJ1	DDR	30	Inst	NE		
2	QF1/QF2	DDR	300	Inst	NE		
BATIMENT G : - REZ DE CHAUSSEE : - RADIOLOGIE : - LOCAL RAD DIA 027							
➤ Coffret PDB							
1	Général	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT G : - PREMIER ETAGE : - CIRCULATIONS							
➤ ARMOIRE AD 104							
2	Eclairage	DDR	300		NE		
7	Eclairage	DDR	30		NE		
24	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Lave vaisselle	DDR	30	Inst	NE		
1	FMN	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Lave bassin	DDR	30	Inst	NE		
2	FMN	DDR	300	Inst	NE		
3	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.176 - COTE CH 117/118							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.174 - COTE CH 121/122							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.175 - COTE CH 119/120							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.173 - COTE CH 123/124							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.172 - COTE CH 126							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	PRISES	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.171 - COTE CH 128							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	PRISES	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.170 - COTE CH 130							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	PRISES	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.169 - COTE CH 132							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	PRISES	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE1.168 - COTE CH 134							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
2	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ ARMOIRE AD 106 - COTE CH 120							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
8	Eclairage	DDR	30		NE		
23	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
2	FM	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 105 - COTE CH 135							
3	Eclairage	DDR	300		NE		
11	Eclairage	DDR	30		NE		
26	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	PCN	DDR	30	Inst	NE		
1	Lave bassin	DDR	30	Inst	NE		
6	PRISES	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.167 - COTE CH 137							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.166 - COTE CH 139							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	PRISES	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.164 - COTE CH 141							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	PRISES	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.163 - COTE CH 144							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.162 - COTE CH 146							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE4.161 - COTE CH 148							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
5	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.160 - COTE CH 151							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.158 - COTE CH 161							
7	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.157 - COTE CH 163							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.155 - COTE CH 165							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	PRISES	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.156 - COTE CH 171							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.154 - COTE CH 167/168							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.152 - COTE CH 173/174							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.153 - COTE CH 169/170							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.165 - COTE CH 143							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	PRISES	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE5.159 - COTE CH 152							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
3	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.165 - COTE CH 143							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	PRISES	DDR	30		NE		
BATIMENT G : - DEUXIEME ETAGE : - COULOIR COTE ACCUEIL ADMISSION							
➤ ARMOIRE AD 202							
2	Eclairage	DDR	300		NE		
9	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
28	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMN04	DDR	300	Inst	NE		
1	FMN09	DDR	300	Inst	NE		
1	Lave bassin	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
➤ ARMOIRE AD 203 - COTE CH 228							
5	Eclairage	DDR	300		NE		
9	Eclairage	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
39	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Lave vaisselle	DDR	30		NE		
2	FMN	DDR	300	Inst	NE		
3	FMN	DDR	300	Inst	NE		
1	Lave bassin	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.248 - COTE CHAMBRE 270/271							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.247 - COTE CHAMBRE 273							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.246 - COTE CHAMBRE 273							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT G : - TROISIEME ETAGE : - EXTERIEUR : - LT CTA 0.8 + H1							
➤ Armoire G1							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT G : - TROISIEME ETAGE : - COULOIR ACCUEIL ADMISSION							
➤ ARMOIRE AD 303							
3	Eclairage	DDR	30		NE		
1	Eclairage	DDR	300	Inst	NE		
15	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMN	DDR	300	Inst	NE		
4	Prise de courant HQ	DDR	30	Inst	NE		
2	FM	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 304 - COTE CH 321							
2	Eclairage	DDR	300		NE		
5	Eclairage	DDR	30		NE		
19	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	Lave vaisselle/Bassin	DDR	30	Inst	NE		
3	FMN	DDR	300	Inst	NE		
1	Chauffe plat	DDR	30		NE		
3	Prise de courant HQ	DDR	30	Inst	NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE1.368 - COTE CH 321							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.367 - COTE CH 323							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.366 - COTE CH 325							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
5	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.365 - COTE CH 327							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.364 - COTE CH 329							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.362- CH 332/334							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.363- CH 333							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.361- CH 336/337							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT G : - TERRASSE : - SOUS STATION 4 EAU CHAUDE SANITAIRES							
➤ ARMOIRE G7							
1	Prise	DDR	30		NE		
BATIMENT G : - TERRASSE : - GAINÉ CFO TS TOITURE 4							
➤ ARMOIRE TS4							
1	FMN01	DDR	300		NE		
1	FMN02	DDR	300		NE		
BATIMENT G : - TERRASSE : - GAINÉ CFO AD402 AD TOITURE 3 - NT-LOG-LTE-027							
➤ ARMOIRE AD 402							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	PCN	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT G : - TERRASSE : - LOCAL SOUS STATION 4 CHAUFFAGE							
➤ ARMOIRE G4							
1	Prise	DDR	30		NE		
BATIMENT G : - TERRASSE : - LOCAL CTA 0.7 + H2							
➤ ARMOIRE G2							
1	PC 230V	DDR	30		NE		
1	Clim	DDR	30		NE		
BATIMENT G : - TERRASSE : - LOCAL CTA 0.9 + H3							
➤ ARMOIRE G3							
1	PC 230V	DDR	30		NE		
BATIMENT G : - TERRASSE : - LOCAL CTA 0.10 + H4							
➤ ARMOIRE G5							
2	Prise	DDR	30		NE		
BATIMENT G : - TERRASSE : - LOCAL CTA 0.11 + H5 + H6 (NT LOG LTE 034)							
➤ ARMOIRE G6							
1	PC 230V	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT G : - TERRASSE : - LOCAL AD403 TOITURE 4 ET 5							
➤ ARMOIRE AD 403							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
2	Prise de courant	DDR	30		NE		
3	FMN Nacelle	DDR	30		NE		
1	FMN	DDR	300	Inst	NE		
1	Prise de courant HQ	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL TECHNIQUE LTE 038							
➤ H1							
1	Général prises	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE CUC GROUPE FROID							
1	CENTRALE POSITIVE CH FROIDE	DDR	30		NE		
1	CENTRALE POSITIVE LOCAUX CLIMATISES	DDR	30		NE		
1	CHAMBRE NEGATIVE CP	DDR	30		NE		
1	CHAMBRE NEGATIVE	DDR	30		NE		
1	GENERAL COMMANDE	DDR	30		NE		
1	CIRCUIT COMMANDE	DDR	30		NE		
1	CH NEGATIVE EVAP 2	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - RC LOG LOCAL CUI 006							
➤ ARMOIRE H2							
1	PC 230V	DDR	30		NE		
BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR ARRIERE & RESERVE ALIMENTAIRE							
➤ ARMOIRE AD 008							
9	Eclairage	DDR	300		NE		
1	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
4	Eclairage	DDR	300		NE		
42	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Cellule refroid	DDR	30	Inst	NE		
1	Coupe légumes	DDR	30		NE		
2	Plaque d'induction	DDR	30	Inst	NE		
4	FMN	DDR	300		NE		
1	FMN51	DDR	300	Inst	NE		
1	Lave vaisselle	DDR	300		NE		
1	Four mixte	DDR	300		NE		
1	Lave batterie	DDR	300		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	FM	DDR	300	Inst	NE		
BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR COTE AMPHITHEATRE							
➤ ARMOIRE AD 004							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
11	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Plaque	DDR	30		NE		
2	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	FMO	DDR	30		NE		
➤ ARMOIRE AD 002							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
10	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMN03	DDR	300		NE		
BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - ZONE ACCEUIL & CIRCULATION PC SECURITE							
➤ ARMOIRE AD 001 - PLACARD ACCUEIL							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
20	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	FMN	DDR	300	Inst	NE		
1	Prise de courant	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
7	FM Baie	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 022							
3	Eclairage	DDR	300		NE		
53	Prise de courant	DDR	30		NE		
3	FMN	DDR	300	Inst	NE		
1	FMN62	DDR	300	Inst	NE		
1	FMN05	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 024 - PLACARD ACCUEIL							
8	Eclairage	DDR	300		NE		
1	FMN	DDR	30		NE		
1	Clim	DDR	300		NE		
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMN	DDR	300		NE		
BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - PC SECURITE							
➤ ARMOIRE AD 033							
2	Eclairage	DDR	300		NE		
12	Prise de courant	DDR	30		NE		
3	Prise de courant	DDR	30		NE		
3	FM	DDR	30	Inst	NE		
1	TELECOMMANDE ECL	DDR	300		NE		
BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL RC SUP FOR 006							
➤ ARMOIRE H3							
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - ONCOMIP : - CIRCULATION & ACCEUIL							
➤ ARMOIRE AD 003							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
26	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
2	FM Baie	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL RC LAB EFS PSY							
➤ Armoire AD 022 HQ							
3	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT H : - PREMIER ETAGE : - CIRCULATIONS							
➤ ARMOIRE AD 107 - COTE CH 108							
2	Eclairage	DDR	300		NE		
8	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
18	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Lave vaisselle	DDR	30	Inst	NE		
1	Lave bassin	DDR	30	Inst	NE		
2	FMN	DDR	300	Inst	NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	FMN	DDR	30	Inst	NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.184 - COTE CH 100/101							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.183 - COTE CH 102							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.182 - COTE CH 104							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.181 - COTE CH 106							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.180 - COTE CH 108							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.179 - COTE CH 110/111							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.178 - COTE CHAMBRE 112							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.177 - COTE CHAMBRE 115/116							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT H : - DEUXIEME ETAGE : - CIRCULATIONS							
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.275 - COTE CHAMBRE 200/201							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
7	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE4.274 - COTE CHAMBRE 203							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.273 - COTE CHAMBRE 205							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE4.272 - COTE CHAMBRE 207							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.271 - COTE CHAMBRE 209							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.270 - COTE CHAMBRE 211							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.269 - COTE CHAMBRE 215							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.268 - COTE CHAMBRE 216							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
5	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.267 - COTE CHAMBRE 219							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
8	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.266 - COTE CHAMBRE 211							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.265 - COTE CHAMBRE 223							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.264 - COTE CHAMBRE 225							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE1.262 - COTE CHAMBRE 228							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
2	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.261 - COTE CHAMBRE 230							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.260 - COTE CHAMBRE 232							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE4.259 - COTE CHAMBRE 234							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
5	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.258 - COTE CHAMBRE 236							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE4.257 - COTE CHAMBRE 239							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
5	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.256 - COTE CHAMBRE 240							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.255 - COTE CHAMBRE 242							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.253 - COTE CHAMBRE 262							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.251 - COTE CHAMBRE 264							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.250 - COTE CHAMBRE 266							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.249 - COTE CHAMBRE 268							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.252 - COTE CHAMBRE 269							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.254 - COTE POSTE INFIRMIER							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ AD 204							
7	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
2	Eclairage	DDR	300		NE		
25	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Lave vaisselle	DDR	30	Inst	NE		
1	FMN04	DDR	300	Inst	NE		
1	FMN06	DDR	30	Inst	NE		
2	FMN	DDR	300	Inst	NE		
4	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
4	FM	DDR	30		NE		
➤ AD 205							
2	Eclairage	DDR	300		NE		
7	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
27	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMN03	DDR	300	Inst	NE		
1	FMN09	DDR	300	Inst	NE		
4	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
4	FM	DDR	30	Inst	NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE5.263 - COTE CHAMBRE 226							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
3	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT H : - TROISIEME ETAGE : - CIRCULATION							
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.376 - COTE CHAMBRE 301							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.375 - COTE CHAMBRE 303							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.374 - COTE CHAMBRE 305							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.373 - COTE CHAMBRE 307							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE2.372 - COTE CHAMBRE 309							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
4	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.371 - COTE CHAMBRE 312							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.370 - COTE CHAMBRE 315/316							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
➤ COFFRET CHAMBRE TE3.369 - COTE CHAMBRE 318/319							
1	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	Prise de courant	DDR	30		NE		
BATIMENT H : - TROISIEME ETAGE : - LOCAL CTA LOG LTE 014							
➤ ARMOIRE H4							
1	Prise	DDR	30		NE		
BATIMENT H : - TROISIEME ETAGE : - COULOIR CHAMBRES 3B							
➤ ARMOIRE AD 306							
2	Eclairage	DDR	300		NE		
3	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
13	Prise de courant	DDR	30		NE		
2	Lave vaisselle/bassin	DDR	30		NE		
1	Chauffe plat	DDR	30		NE		
1	FMN	DDR	300	Inst	NE		
2	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
4	FM	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 305							
4	Eclairage	DDR	300		NE		
4	Eclairage	DDR	30	Inst	NE		
19	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMN	DDR	300	Inst	NE		
3	FMN	DDR	300	Inst	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
5	Prise de courant HQ	DDR	30		NE		
6	FM	DDR	30	Inst	NE		
BATIMENT I : - REZ-DE-CHAUSSEE : - CIRCULATION CONSULTATIONS							
➤ ARMOIRE AD 007 - COULOIR ONCOREABILITATION							
1	Eclairage	DDR	300	Inst	NE		
1	Clim FMN	DDR	300		NE		
59	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMN	DDR	300	Inst	NE		
5	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
3	FMN Baie	DDR	30	Inst	NE		
➤ ARMOIRE AD 005 - COULOIR RADIO SENOLOGIE							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
96	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	Lave bassin	DDR	30	Inst	NE		
6	FMN	DDR	300	Inst	NE		
18	Prise de courant	DDR	30	Inst	NE		
1	FM	DDR	30	Inst	NE		
1	UTL	DDR	300		NE		
➤ ARMOIRE AD 006							
1	Eclairage	DDR	300		NE		
1	Eclairage	DDR	30		NE		
48	Prise de courant	DDR	30		NE		
1	FMN	DDR	300		NE		
1	FMN	DDR	300	Inst	NE		
1	LAVE BASSIN	DDR	30		NE		
7	Prise de courant	DDR	30		NE		
6	FMN	DDR	30		NE		
BATIMENT I : - REZ-DE-CHAUSSEE : - SALLE MAMMOTOME CSE 024							
➤ Coffret PDB (MAMMOTOME)							
1	Départ	DDR	30		NE		
BATIMENT I : - REZ-DE-CHAUSSEE : - MAMMOGRAPHIE 2 CSE 034							
➤ COFFRET PDB MAMMO ICR - 1							
1	Général	DDR	30	Inst	NE		

Significations des abréviations utilisées

DDR : Disjoncteur Différentiel	IDR : Interrupteur Différentiel	RD : Relais différentiel	I_{Δn} : Intensité différentielle
B : Bon fonctionnement du différentiel ≤ à 1A ou bon fonctionnement mécanique du différentiel > à 1A	M : Fonctionnement incorrect du différentiel ≤ à 1A ou fonctionnement incorrect mécanique du différentiel > à 1A	NE : Fonctionnement du différentiel ≤ à 1A ou fonctionnement mécanique du différentiel > à 1A non essayé	Tempo : Temporisation

Examen des circuits terminaux

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
BATIMENT A : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL RC LAB EFS 026										
4	Appareil(s) d'éclairage(2025)								M NM	3
BATIMENT A : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL RC LAB EFS 042										
45	Prise(s) de courant								M NM	4
BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - LOCAL RC LAB PHA 006										
1	Prise de courant (AD 031 PCN 01)								B	11
BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - LOCAL RC LAB PHA 064										
1	Prise de courant								M NM	12
BATIMENT B : - PREMIER ETAGE : - LABORATOIRE N1 LAB TRA 008										
1	Récepteur CE sur PC (Sorbone)								M NM	14
BATIMENT B : - PREMIER ETAGE : - LABO N1 LAB TRA 044										
2	Appareil(s) d'éclairage(2025)								M NM	15
BATIMENT C : - REZ-DE-CHAUSSEE : - GAINES SECURITE LTE 019										
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité portatif	2								17
BATIMENT C : - TROISIEME ETAGE : - CIRCULATION										
19	Prise(s) de courant								M NM	18
BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 011										
1	Appareil éclairage de sécurité (BAPI)	2								19
BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 019										
1	Appareil éclairage de sécurité (BAPI)	2								20
BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 020										
7	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									21
BATIMENT C : - TERRASSE : - ENCEINTE GROUPE FROID NT LOG LTE 007										
14	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									22

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 016										
4	Appareil éclairage MIPI									25
BATIMENT D : - REZ-DE-CHAUSSEE : - Bureau réception RC LOG HOT 015										
4	Appareil(s) d'éclairage(2025)								M NM	26
BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL TER 025										
1	Appareil éclairage(2025)								M NM	32
BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - LOCAL EXT 030										
3	Prise(s) de courant								B	34
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 003 & 002 & 001										
1	Appareil éclairage de sécurité (BAPI)	2								39
BATIMENT E : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 LOG LTE 009										
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité portatif	2								40
BATIMENT E : - TERRASSE : - GAINÉ CFO TS TOITURE 6 - N4-LOG-LTE-035										
8	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									41 42
BATIMENT F : - REZ-DE-CHAUSSEE : - MÉDECINE NUCLEAIRE : - LOCAL LOG LTE 005 (VDI 04.1 /04.2)										
6	Prise de courant								M NM	43
BATIMENT F : - REZ-DE-CHAUSSEE : - MÉDECINE NUCLEAIRE : - LOCAL RC RAD NUC 056										
2	Prise de courant (bloc pc)								B	44
BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - REANIMATION : - LOCAL SCO 017										
1	Capot de goulotte								B	46
BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - ROTONDE : - CHAMBRE 003										
22	Prise(s) de courant								B	48
BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - ROTONDE : - CHAMBRE 006										
22	Prise(s) de courant								B	49
BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - ROTONDE : - CHAMBRE 007										

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolation (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
22	Prise(s) de courant								B	50 51
BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - ROTONDE : - CHAMBRE 009										
22	Prise(s) de courant								B	52
BATIMENT F : - DEUXIEME ETAGE : - LOCAL N2 MED HC3 039										
4	Appareil(s) d'éclairage(2025)								M NM	53
BATIMENT F : - TROISIEME ETAGE : - LOCAL N3 MED HEM 101										
1	Prise(s) de courant								B	54
BATIMENT F : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE 342										
10	Prise(s) de courant								B	55
BATIMENT F : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE 348										
10	Prise(s) de courant								B	56
BATIMENT F : - TROISIEME ETAGE : - CHAMBRE 380										
10	Prise(s) de courant								B	57
BATIMENT G : - REZ DE CHAUSSEE : - RADIOLOGIE : - COULOIR INTERPRETATION SCANNER										
4	Prise(s) de courant								B	58
BATIMENT G : - PREMIER ETAGE : - LOCAL VDI LTE 009										
6	Prise(s) de courant								M NM	59
BATIMENT G : - PREMIER ETAGE : - CHAMBRE 175										
6	Prise(s) de courant								B	61
BATIMENT G : - TERRASSE : - GAINC CFO TS TOITURE 4										
1	Appareil éclairage de sécurité (BAPI)	2								62
BATIMENT G : - TERRASSE : - GAINC CFO AD402 AD TOITURE 3 - NT-LOG-LTE-027										
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité portatif	2								63
BATIMENT G : - TERRASSE : - VENTILATEUR DESEMFUMAGE MAN-H-22 & MAN-H-23										
1	Appareil éclairage de sécurité (BAPI)	2								64
2	Prise(s) de courant								B	65

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
BATIMENT G : - TERRASSE : - VENTILATEUR DESENFUMAGE MEXT-H-07 & MEXT-H-04										
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité portatif	2								68
BATIMENT H : - REZ-DE-CHAUSSEE : - RC LOG LOCAL CUI 021										
5	Prise(s) de courant								B	69
BATIMENT H : - PREMIER ETAGE : - CHAMBRE 116										
6	Prise(s) de courant								B	70

* En absence de renseignement classe 1

Significations des abréviations utilisées			
Cl : Classe	In : Intensité nominale	B : Continuité satisfaisante	M : Continuité non satisfaisante
Dj : Disjoncteur	DDR : Disjoncteur Différentiel	IDR : Interrupteur Différentiel	I : Interrupteur
Fu : Fusibles	RE : Relais Electronique	PI : Protection Intégrée	PSNE : Protection Surcharge non exigée
RT : Relais Thermique	RM : Relais Magnétique	RMT : Relais Magnétothermique	ND : Non déterminé
MIPI : Masse Inaccessible Protection Intrinsèque – sans objet	NM : Non mesuré		

5. Résultats des autres vérifications

Liste des observations des circuits sans différentiel

Localisation - Désignation	N° Obs
BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR RADIO THERAPIE	
➤ ARMOIRE AD 014	
Non identifiée	31

Liste des observations des tableaux

Localisation - Désignation	N° Obs
BATIMENT A : - TROISIEME ETAGE : - LOCAL CFO AD311	
➤ COFFRET INVERSEUR	7
BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - CIRCULATION	
➤ ARMOIRE AD 010	9
BATIMENT B : - REZ DE CHAUSSEE : - PHARMACIE : - PREPARATION CHIMIO	
➤ ARMOIRE AD 031	10
BATIMENT B : - PREMIER ETAGE : - COULOIR BUREAUX	
➤ ARMOIRE AD 110	13
BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 015	
➤ ARMOIRE C8	23
BATIMENT C : - TERRASSE : - LOCAL NT LOG LTE 014	
➤ ARMOIRE C6	24
BATIMENT D : - PREMIER ETAGE : - COULOIR BUREAUX	
➤ ARMOIRE AD 102	27
BATIMENT E : - SOUS-SOL : - COULOIR	
➤ ARMOIRE CONVOYEUR GARE 1	30
BATIMENT E : - REZ-DE-CHAUSSEE : - COULOIR BATIMENT C	
➤ ARMOIRE AD 013	35
BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - COULOIR CURIETHERAPIE	
➤ COFFRET COP 7	36

BATIMENT E : - PREMIER ETAGE : - ZONE CURITHERAPIE : - COULOIR CÔTE CHAMBRE

➤ **COFFRET CHAMBRES TE6.141 - CH 193** **37**

BATIMENT F : - PREMIER ETAGE : - REANIMATION : - COULOIR REANIMATION

➤ **ARMOIRE AD 117** **45**

BATIMENT G : - TERRASSE : - LOCAL CTA 0.9 + H3

➤ **ARMOIRE G3** **66**

BATIMENT G : - TERRASSE : - LOCAL CTA 0.11 + H5 + H6 (NT LOG LTE 034)

➤ **ARMOIRE G6** **67**

6. Annexes

Liste des plans et schémas des installations

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
D37031C	AD34	Entreprise	23/05/2011
CUC J230 CFOPEE NZ SCHEZZ ZZ 7000 0	SCHEMAS HT	Entreprise	26/06/2010
CUC J230 CFOPEE NZ SCHEZZ ZZ 7001 B	Synoptique de distribution HT/BT	Entreprise	26/11/2012
CUC J230 CFO PEE N0 SCHE Z1 B1 7004 C	TGBT 1.1	Entreprise	29/06/2012
CUC J230 CFO PEE N0 SCHE Z1 B2 7010 B	TGBT 1.2	Entreprise	29/06/2012
7005 B	TGBT 2.1	Entreprise	11/10/2012
CUC J230 CFO PEE N0 SCHE Z1 B2 7011 0	TGBT 2.2	Entreprise	18/08/2013
CUC J230 CFO PEE N0 SCHE Z1 C4 7047 C	TGBT 3	Entreprise	27/08/2012
CUC J230 CFO PEE N0 SCHE Z1 B1 7006 B	TGBT GSS1	Entreprise	23/08/2012
CUC J230 CFO PEE N0 SCHE Z1 B2 7014 C	TGBT GSS2	Entreprise	23/11/2012
CUC J230 CFO PEE N2 SCHE Z2 E2 7008 C	TGBT HQ 1.1	Entreprise	19/07/2012
CUC J230 CFO PEE N2 SCHE Z1 B2 7015 C	TGBT HQ2	Entreprise	08/11/2012
CUC J230 CFO PEE N2 SCHE Z2 E2 7009 C	TGBT HQ 2.1	Entreprise	19/07/2012
CUC J230	TGS	Entreprise	10/10/2012

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
CFO PEE N0 SCHE Z1 B1 7007 B			
CUC J230 CFO PEE N4 SCHE Z1 C3 7134 0	TS1	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE N4 SCHE Z1 C4 7135 0	TS2	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE N4 SCHE Z2 F2 7136 0	TS3	Entreprise	10/06/2013
PAS DE SCHEMA	TS4	Entreprise	
CUC J230 CFO PEE N4 SCHE Z3 G2 7138 0	TS5	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE N4 SCHE Z2 E1 7139 0	TS6	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO BEE N0 SCHE ZZ ZZ 7140 A	TS7	Entreprise	15/06/2011
CUC J230 CFO PEE N2 SCHE Z2 F2 7016 0	TGBT 230 CLIM HOSP	Entreprise	25/05/2012
CUC J230 CFO PEE N2 SCHE Z2 F2 7017 C	TGBT 231 CLIM HOSP	Entreprise	18/07/2012
CUQ J230 CFO PEE N0 SCHE Z3 G1 7032 0	AD 001	Entreprise	28/05/2013
CUQ J230 CFO PEE N0 SCHE Z3 G4 7025 0	AD 003	Entreprise	28/05/2013
CUC J230 CFO PEE N0 SCHE Z3 H3 7026 0	AD 004	Entreprise	28/05/2013
PAS DE SCHEMA	AD 005	Entreprise	
CUC J230	AD 006	Entreprise	29/05/2013

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
CFO PEE N0 SCHE Z3 I2 7034 0			
PAS DE SCHEMA	AD 007	Entreprise	
CUC J230 CFO PEE N0 SCHE Z3 H2 7028 0	AD 008	Entreprise	24/06/2013
IUC 0ELE BET DOE N0 SCHE Z1 D1 7035 0	AD 009	Entreprise	02/06/2014
CUC 3ELE BET DOE N0 SCHE Z1 B1 7076 0	AD 010	Entreprise	23/05/2014
CUC J230 CFO PEE N0 SCHE Z1 A1 70719 0	AD 012	Entreprise	30/05/2013
CUQ 3ELE CFO DOE N0 SCHE Z12 EL1 7039 0	AD 013	Entreprise	19/06/2014
CUC J230 CFO PEE N0 SCHE Z2 E2 7040 A	AD 014	Entreprise	03/05/2013
PAS DE SCHEMA	AD 014 HQ	Entreprise	
CUC J230 CFO PEE N0 SCHE Z2 F1 7041 0	AD 015	Entreprise	03/06/2013
IUC 3ELE BET DOE N0 SCHE Z2 F1 7046 0	AD 017	Entreprise	22/05/2014
CUC 3ELE BET DOE N0 SCHE Z2 F3 7045 0	AD 016	Entreprise	22/05/2014
PAS DE SCHEMA	AD 018	Entreprise	
CUC J230 CFO PEE N0 SCHE Z1 C3 7036 0	AD 020	Entreprise	03/06/2013
IUC 0ELE BET DOE N0 SCHE Z1 C4	AD 021	Entreprise	02/06/2015

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
7029 0			
CUQ J230 CFO PEE N0 SCHE Z3 G5 7021 0	AD 022	Entreprise	03/06/2013
CUQ J230 CFO PEE N0 SCHE Z3 G1 7030 0	AD 024	Entreprise	03/06/2013
CUC J230 CFO PEE N0 SCHE Z1 D1 7137 0	AD 025	Entreprise	03/06/2014
IUC 3ELE BET DOE N0 SCHE Z1 B1 7044 0	AD 026	Entreprise	26/05/2014
CUC 3ELE BET DOE N0 SCHE Z1 B1 3101 0	AD 031	Entreprise	26/05/2014
CUQ J230 CFO PEE N0 SCHE Z1 A1 7020 0	AD 032	Entreprise	03/06/2013
PAS DE SCHEMA	AD 033	Entreprise	
CUQ J230 CFO PEE N0 SCHE Z1 D3 7031 0	AD 035	Entreprise	03/06/2013
CUC J230 CFO PEE N0 SCHE Z1 B1 7012 0	AD 035	Entreprise	03/06/2013
CUC J230 CFO PEE N0 SCHE Z1 B2 7013 0	AD 036	Entreprise	03/06/2013
CUC J230 CFO PEE N1 SCHE Z1 C1 7062 0	AD 037	Entreprise	04/06/2013
CUC J230 CFO PEE N0 SCHE Z3 H2 7048 0	AD 037	Entreprise	03/06/2013
CUC J230 CFO PEE N0 SCHE Z3 H2 7053 0	AD 038	Entreprise	16/12/2013
CUQ J230	AD 100	Entreprise	04/06/2013

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
CFO PEE N1 SCHE Z1 A1 7059 0			
CUC J230 CFO PEE SCHE Z11 A2 7074 0	AD 101	Entreprise	18/06/2014
CUC J230 CFO PEE N1 SCHE Z1 D1 7067 0	AD 102	Entreprise	04/06/2014
CUC J230 CFO PEE N1 SCHE Z1 D2 7068 0	AD 103	Entreprise	04/06/2014
CUC J230 CFO PEE N1 SCHE Z3 G3 7060 0	AD 104	Entreprise	04/06/2013
CUC J230 CFO PEE N1 SCHE Z3 G3 7060 0	AD 106	Entreprise	04/06/2013
CUC J230 CFO PEE N1 SCHE Z3 G3 7060 0	AD 105	Entreprise	04/06/2013
CUC J230 CFO PEE N1 SCHE Z3 H1 7064 0	AD 107	Entreprise	04/06/2013
CUC J230 CFO PEE N1 SCHE Z2 F3 7061 0	AD 108	Entreprise	04/06/2013
CUQ 3ELE CFO DOE N1 SCHE Z2 E3 7070 0	AD 109	Entreprise	04/06/2013
PAS DE SCHEMA	AD 110	Entreprise	
PAS DE SCHEMA	AD 111	Entreprise	
CUC 3ELE CFO DOE N1 SCHE Z2 F1 7073 0	AD 112	Entreprise	18/06/2014
CUC 3ELE CFO DOE N1 SCHE Z2 N1 7072 0	AD 115	Entreprise	18/06/2014
PAS DE	AD 200	Entreprise	

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
SCHEMA			
PAS DE SCHEMA	AD 201	Entreprise	
CUQ 3ELE CFO DOE N2 SCHE Z3 G2 7097 0	AD 203	Entreprise	02/06/2014
CUC J230 CFO PEE N2 SCHE Z3 G2 7102 0	AD 205	Entreprise	06/06/2013
CUC J230 CFO PEE N2 SCHE Z1 C1 7091 0	AD 209	Entreprise	05/06/2013
CUC 3ELE BET DOE N1 SCHE Z1 B1 7076 0	AD 110	Entreprise	25/05/2014
CUC 3ELE BET DOE N1 SCHE B2 7075 0	AD 111	Entreprise	25/05/2014
CUC 3ELE CFO DOE N1 SCHE Z2 F1 7073 0	AD 112	Entreprise	18/06/2014
CUC J230 CFO PEE N1 SCHE Z1 C3 7065 0	AD 114	Entreprise	04/06/2013
CUC J230 CFO PEE N2 SCHE Z2 E3 7095 0	AD 215	Entreprise	06/05/2013
CUC J230 CFO PEE N1 SCHE Z2 E1 7071 0	AD 116	Entreprise	04/06/2013
CUC 3ELE BET DOE N1 SCHE Z2 F1 7077 0	AD 117	Entreprise	26/05/2014
CUC J230 CFO PEE N1 SCHE Z1 C2 7066 0	AD 119	Entreprise	04/06/2013
CUC J230 CFO PEE N2 SCHE Z3 G3 7090 0	AD 202	Entreprise	06/06/2013
CUC J230	AD 204	Entreprise	06/06/2013

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
CFO PEE N2 SCHE Z3 H1 7101 0			
CUC 3ELE CFO DOE N2 SCHE Z1 B1 7104 0	AD 207	Entreprise	26/05/2014
CUC J230 CFO PEE N2 SCHE Z1 B2 7105 0	AD 208	Entreprise	16/05/2014
CUC J230 CFO PEE N2 SCHE Z1 C1 7094 0	AD 210	Entreprise	05/06/2013
CUC J230 CFO PEE N2 SCHE Z1 C3 7103 0	AD 211	Entreprise	05/06/2013
CUC J230 CFO PEE N2 SCHE Z1 A1 7092 0	AD 212	Entreprise	13/06/2014
CUC 3ELE CFO DOE N2 SCHE Z1 A2 7093 0	AD 213	Entreprise	13/06/2014
CUC J230 CFO PEE N3 SCHE Z2 E1 7123 0	AD 300	Entreprise	06/06/2013
CUC J230 CFO PEE N3 SCHE Z2 E1 7124 0	AD 301	Entreprise	06/05/2013
CUC 3ELE CFO DOE N3 SCHE Z2 F1 7125 0	AD 302	Entreprise	04/06/2014
CUC 3ELE CFO DOE N3 SCHE Z3 G3 7110 0	AD 303	Entreprise	03/06/2014
CUC 3ELE CFO DOE N3 SCHE Z3 G1 7117 0	AD 304	Entreprise	02/06/2014
CUC J230 CFO PEE N3 SCHE Z3 G2 7118 0	AD 305	Entreprise	08/06/2013
CUC 3ELE	AD 306	Entreprise	02/06/2014

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
CFO DOE N3 SCHE Z3 H1 7115 0			
CUC J230 CFO PEE N3 SCHE Z2 E3 7121 0	AD 307	Entreprise	18/06/2014
CUC 3ELE CFO DOE N3 SCHE Z2 F3 7122 0	AD 308	Entreprise	06/06/2014
CUC J230 CFO PEE N3 SCHE Z1 7114 0	AD 309	Entreprise	07/06/2013
CUC J230 CFO PEE N3 SCHE Z1 C3 7119 0	AD 310	Entreprise	27/06/2013
CUC 3ELE CFO DOE N3 SCHE Z1 A1 7120 0	AD 313	Entreprise	13/06/2014
CUC 3ELE CFO DOE N3 SCHE Z1 D1 71116 0	AD 313	Entreprise	04/06/2014
CUC 3ELE CFO DOE N3 SCHE Z1 B1 7111 0	AD 314	Entreprise	22/05/2014
CUC 3ELE CFO DOE N3 SCHE Z1 B1 7113 0	AD 315	Entreprise	12/06/2014
CUC J230 CFO PEE N1 SCHE Z2 E2 7078 0	AD 118	Entreprise	04/06/2014
CUC J230 CFO PEE N4 SCHE Z1 C1 7130 0	AD 400	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE N4 SCHE Z1 C3 7131 0	AD 401	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE N4 SCHE Z3 G2 7132 0	AD 402	Entreprise	10/06/2013
CUC J230	AD 403	Entreprise	10/06/2013

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
CFO PEE N4 SCHE Z3 G2 7133 0			
CUC J230 CFO PREE NZ ZZ ZZ 7162 0	COFFRET CHAMBRES TE6.141	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PREE NZ ZZ ZZ 7144 0	COFFRET CHAMBRES TE4.140	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PREE NZ ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRES TE2.147	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PREE NZ ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRES TE2.146	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PREE NZ ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRES TE3.145	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PREE NZ ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRES TE3.143	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PREE NZ ZZ ZZ 7145 0	COFFRET CHAMBRES TE2.144	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PREE NZ ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRES TE3.142	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.176	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.174	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.175	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.175	Entreprise	10/06/2013
CUC J230	COFFRET CHAMBRE TE2.173	Entreprise	10/06/2013

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0			
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.172	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.171	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.170	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.169	Entreprise	10/06/2013
CUQ J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7141 0	COFFRET CHAMBRE TE1.168	Entreprise	10/06/2013
CUQ J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.167	Entreprise	06/06/2013
CUQ J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.166	Entreprise	10/06/2013
CUQ J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.164	Entreprise	10/06/2013
CUQ J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.163	Entreprise	10/06/2013
CUQ J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.162	Entreprise	10/06/2013
CUQ J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7144 0	COFFRET CHAMBRE TE4.161	Entreprise	10/06/2013
CUQ J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7145 0	COFFRET CHAMBRE TE5	Entreprise	10/06/2013
CUC J230	COFFRET CHAMBRE TE3.158	Entreprise	10/06/2013

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0			
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.158	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.157	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.157	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.155	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.156	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.184	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.183	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.182	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.181	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.180	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.179	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.178	Entreprise	10/06/2013
CUC J230	COFFRET CHAMBRE TE2.177	Entreprise	10/06/2013

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0			
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.275	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7144 0	COFFRET CHAMBRE TE4.274	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.273	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7144 0	COFFRET CHAMBRE TE4.272	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.271	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.270	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.269	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.268	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.267	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.266	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.265	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.264	Entreprise	10/06/2013
CUC J230	COFFRET CHAMBRE TE1.262	Entreprise	10/06/2013

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7141 0			
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.261	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.260	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7144 0	COFFRET CHAMBRE TE4.259	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.258	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7144 0	COFFRET CHAMBRE TE4.257	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.256	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.255	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.253	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.251	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.250	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.249	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.252	Entreprise	10/06/2013
CUC J230	COFFRET CHAMBRE TE3.254	Entreprise	10/06/2013

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0			
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.376	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.375	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.374	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.373	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.351	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.354	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.356	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.360	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.358	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.357	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.355	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.353	Entreprise	10/06/2013
CUC J230	COFFRET CHAMBRE TE2.352	Entreprise	10/06/2013

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0			
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7142 0	COFFRET CHAMBRE TE2.350	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE3.348	Entreprise	10/06/2013
B J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ 7162 0	COFFRET CHAMBRE TE6.347	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE6.345	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE6.343	Entreprise	10/06/2013
B J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ 7162 0	COFFRET CHAMBRE TE6.341	Entreprise	10/06/2013
B J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ 7162 0	COFFRET CHAMBRE TE6.340	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE6.342	Entreprise	10/06/2013
CUC J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ 7143 0	COFFRET CHAMBRE TE6.344	Entreprise	10/06/2013
B J230 CFO PEE NZ SCHE ZZ 7162 0	COFFRET CHAMBRE TE6.346	Entreprise	10/06/2013

Liste des plans et schémas des installations archivés par APAVE

Lien vers le schéma	Désignation	Facteur de correction	Date de MAJ
IND A	ARMOIRE TGBT 3	0,8	2017-2-17
IND A	ARMOIRE AD 037	0,8	12/10/2021
IND 0	ARMOIRE AD 38	0,8	16/12/2013

IND 0	ARMOIRE AD 012	0,8	2013-5-30
IND 0	ARMOIRE AD 032	0,8	2013-6-3
IND 0	Armoire LT A6	0.8	2013-7-1
IND C	ARMOIRE AD 100	0,8	2023-11-9
IND F	ARMOIRE AD 212	0,8	2024-5-2
IND D	ARMOIRE AD 213	0,8	2024-4-11
IND A	ARMOIRE TGBT 1.1	0,8	23/11/2022
IND 0	ARMOIRE ADO 035	0,8	2013-6-3
IND B	ARMOIRE TGS	0,8	2012-11-8
IND A	ARMOIRE TS7	0,8	2011-9-26
IND B	ARMORIE TGBT 2.1	0,8	23/11/2022
IND 0	ARMOIRE AD036	0,8	2013-6-3
IND F	ARMOIRE AD 010	0,8	2024-2-15
IND 0	Armoire Fosse Laboratoire	0.8	2013-6-3
IND 0	Armoire TGBT SS1	0.8	2013-7-1
IND 0	Armoire TGBT 2.1	0.8	2013-7-1
IND 0	Armoire TGBT 1.1	0.8	2013-7-1
IND C	ARMOIRE AD111	0,8	2024-5-2
IND H	ARMOIRE AD 110	0,8	11/10/2023
IND E	ARMOIRE AD 208	0,8	2024-4-11
IND C	ARMOIRE AD 207	0,8	2024-4-11
IND E	ARMOIRE AD 017	0,8	18/11/2022
IND 0N	ARMOIRE AD 020	0,8	2013-6-3
IND C	ARMOIRE AD 018	0,8	2024-4-18
IND 0	ARMOIRE AD 112	0,8	2014-6-18
IND 0	ARMOIRE AD 113	0,8	2013-6-4
IND A	ARMOIRE AD 119	0,8	2024-1-25
IND 0	ARMOIRE AD114	0,8	2013-6-4
IND A	ARMOIRE AD209	0,8	17/11/2015
IND A	ARMOIRE AD210	0,8	17/11/2015
IND 0	ARMOIRE AD211	0,8	2013-6-5
IND 0	ARMOIRE AD309	0,8	2013-6-7
IND 1	ARMOIRE AD034	0,8	2017-1-18
IND A	COFFRET GTIE	0,8	2012-9-19
IND B	ARMOIRE AD 025	0,8	19/10/2023
IND E	ARMOIRE AD 009	0,8	12/10/2021
IND B	ARMOIRE L.T.	0,8	18/11/2011
IND B	AD 120-1	0,8	22/11/2021
IND B	AD 120-2	0,8	22/11/2021
IND A	AD 121-1	0,8	2017-2-17

IND A	AD 121-2	0,8	2017-2-17
IND C	ARMOIRE AD 102	0,8	2023-5-23
IND H	ARMOIRE AD 103	0,8	2024-2-29
IND C	ARMOIRE AD 200	0,8	2024-2-29
IND D	ARMOIRE AD 201	0,8	2023-8-22
https://drive.google.com/file/d/1lseGm7-TV0uJ79IbkBazx9VF5--kfQne/view?usp=drivesdk	COFFRET INVERSEUR SERVEUR 1	0,8	2017-2-17
IND E	ARMOIRE AD 014	0,8	20/12/2022
IND C	ARMOIRE AD 013	0,8	2024-1-4
IND B	Armoire Scan 100-01A	0,8	2021-4-8
IND A	COFFRET COP 2	0,8	2023-8-23
IND A	COFFRET COP 3	0,8	2023-8-23
IND A	COFFRET COP 4	0,8	2023-8-23
IND A	COFFRET COP 5	0,8	2023-8-23
IND A	COFFRET COP 6	0,8	2022-8-4
IND A	COFFRET COP 8	0,8	2024-3-14
IND A	COFFRET COP 11	0,8	2022-6-23
IND 0	ARMOIRE AD 118	0,8	2013-6-4
IND A	COFFRET COP 7	0,8	2022-6-8
IND B	ARMOIRE AD 109 - COULOIR HCO 509	0,8	2021-7-26
IND 0	COFFRET CHAMBRES TE6. 141 - CH 193	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRES TE4. 140 - CH 195	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRES TE2. 147 - CH 179/180	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRES TE2. 146 - CH 181/182	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRES TE3. 145 - CH 183/184	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRES TE3. 143 - CH 186/187/188	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRES TE5. 144 - CH 185	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRES TE3. 142 - CH 189	0,8	2013-6-10
IND B	ARMOIRE AD 116	0,8	2022-12-6
IND 0	ARMOIRE TGBT 230 CLIM BLOCS	0,8	2013-8-19
IND 0	ARMOIRE TGBT 231 CLIM BLOCS	0,8	2012-7-18
IND 0	ARMOIRE E3	0,8	2013-7-1

IND 0	ARMOIRE E2	0,8	2013-11-5
IND 0	ARMOIRE E1	0,8	2013-7-1
IND 0	ARMOIRE F4	0,8	2013-7-1
IND 0	ARMOIRE F5	0,8	2013-7-1
IND 0	ARMOIRE F6	0,8	2014-2-6
IND A	ARMOIRE F7	0,8	13/12/2021
IND 0	ARMOIRE E15	0,8	2013-7-1
IND 0	ARMOIRE E14	0,8	2013-7-1
IND C	ARMOIRE E13	0,8	2013-1-17
IND 0	ARMOIRE E12	0,8	2013-7-1
IND 0	ARMOIRE E7	0,8	2013-7-1
IND 0	ARMOIRE E6	0,8	2013-7-1
IND 0	ARMOIRE E18	0,8	2013-7-1
IND 0	ARMOIRE E4	0,8	2013-11-5
IND 0	ARMOIRE E5	0,8	2013-7-1
IND 0	ARMOIRE E17	0,8	2013-11-5
IND 0	ARMOIRE E10	0,8	2013-7-1
IND 0	ARMOIRE E11	0,8	2013-7-1
IND 0	ARMOIRE E9	0,8	2013-11-5
IND 0	ARMOIRE E8	0,8	2013-7-1
IND A	ARMOIRE AD 215	0,8	17/11/2015
IND 0	ARMOIRE E16	0,8	2013-7-1
IND A	TGBT HQ 1.1	0,8	2018-8-13
IND A	TGBT HQ 2.1	0,8	2018-8-13
IND 0	ARMOIRE F3	0,8	2013-7-1
IND 0	ARMOIRE F2	0,8	2013-7-1
IND 0	ARMOIRE F1	0,8	2013-7-1
IND B	ARMOIRE AD 017 HQ	0,8	2021-3-30
IND 0	Armoire CINV08	0,8	2013-6-10
IND 0	Armoire CINV07	0,8	27/10/2011
IND 0	ARMOIRE AD 015	0,8	2013-6-3
IND C	ARMOIRE AD 016	0,8	2023-5-23
IND A	Armoire CINV06	0,8	15/11/2012
IND A	Armoire CINV05	0,8	15/11/2012
IND E	ARMOIRE AD 017	0,8	18/11/2022
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 150 - COTE CHAMBRE 153	0,8	2013-6-10
IND	COFFRET CHAMBRE TE2. 149 - COTE CHAMBRE 156	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3.	0,8	2013-6-10

	146 - COTE CHAMBRE 158		
IND B	ARMOIRE AD 117	0,8	2024-6-6
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 151-COTE CHAMBRES 176/177	0,8	2013-6-10
IND 0	ARMOIRE AD 115	0,8	2014-6-18
IND E	ARMOIRE AD 206	0,8	2024-6-6
IND 0	ARMOIRE AD 214	0,8	2013-5-6
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 245 - COTE CHAMBRE 247/248	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 244 - COTE CHAMBRE 249	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 243 - COTE CHAMBRE 251	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 241 - COTE CHAMBRE 255	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 240 - COTE CHAMBRE 257/258	0,8	2013-6-10
IND A	COFFRET CHAMBRE TE3. 242 - COTE CHAMBRE 252/253	0,8	2023-7-11
IND C	ARMOIRE AD 302	0,8	18/12/2023
IND A	ARMOIRE AD 308	0,8	17/11/2015
IND 0	Armoire AXD	0,8	10/11/2010
IND 0	Armoire CINV09	0,8	2013-6-10
IND 0	Armoire CINV10	0,8	2013-6-10
IND C	ARMOIRE AD 104	0,8	2024-2-29
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 176 - COTE CH 117/118	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 174 - COTE CH 121/122	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 175 - COTE CH 119/120	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 173 - COTE CH 123/124	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 172 - COTE CH 126	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 171 - COTE CH 128	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 170 - COTE CH 130	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 169 - COTE CH 132	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE1. 168 - COTE CH 134	0,8	2013-6-10

IND A	ARMOIRE AD 106 - COTE CH 120	0,8	2021-3-3
IND 0	ARMOIRE AD 105 - COTE CH 135	0,8	2014-6-2
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 167 - COTE CH 137	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 166 - COTE CH 139	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 164 - COTE CH 141	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 163 - COTE CH 144	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 162 - COTE CH 146	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE4. 161 - COTE CH 148	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 160 - COTE CH 151	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 158 - COTE CH 161	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 157 - COTE CH 163	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 155 - COTE CH 165	0,8	2013-6-11
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 156 - COTE CH 171	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 154 - COTE CH 167/168	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 152 - COTE CH 173/174	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 153 - COTE CH 169/170	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 165 - COTE CH 143	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE5. 159 - COTE CH 152	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 165 - COTE CH 143	0,8	2013-6-10
IND B	ARMOIRE AD 202	0,8	2023-11-9
IND A	ARMOIRE AD 203 - COTE CH 228	0,8	2016-4-27
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 248 - COTE CHAMBRE 270/271	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 247 - COTE CHAMBRE 273	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 246 - COTE CHAMBRE 273	0,8	2013-6-10
IND D	Armoire G1	0,8	2012-9-10

IND 0	ARMOIRE AD 303	0,8	2013-6-6
IND A	ARMOIRE AD 304 - COTE CH 321	0,8	2016-5-3
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE1. 368 - COTE CH 321	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 367 - COTE CH 323	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 366 - COTE CH 325	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 365 - COTE CH 327	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 364 - COTE CH 329	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 362- CH 332/334	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 363- CH 333	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 361- CH 336/337	0,8	2013-6-10
IND B	ARMOIRE AD 008	0,8	2024-4-25
IND 0	ARMOIRE AD 004	0,8	2013-5-28
IND A	ARMOIRE AD 002	0,8	2024-1-25
IND D	ARMOIRE AD 001 - PLACARD ACCUEIL	0,8	2024-4-25
IND E	ARMOIRE AD 022	0,8	2023-12-8
IND A	ARMOIRE AD 024 - PLACARD ACCUEIL	0,8	17/11/2015
IND 0	ARMOIRE AD 033	0,8	2013-6-3
IND A	ARMOIRE AD 003	0,8	17/11/2015
IND 0	Armoire AD 022 HQ	0,8	2013-6-3
IND 0	ARMOIRE AD 107 - COTE CH 108	0,8	2013-6-4
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 184 - COTE CH 100/101	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 183 - COTE CH 102	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 182 - COTE CH 104	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 181 - COTE CH 106	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 180 - COTE CH 108	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 179 - COTE CH 110/111	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 178 - COTE CHAMBRE 112	0,8	2013-6-10

IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 177 - COTE CHAMBRE 115/116	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 275 - COTE CHAMBRE 200/201	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE4. 274 - COTE CHAMBRE 203	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 273 - COTE CHAMBRE 205	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE4. 272 - COTE CHAMBRE 207	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 271 - COTE CHAMBRE 209	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 270 - COTE CHAMBRE 211	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 269 - COTE CHAMBRE 215	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 268 - COTE CHAMBRE 216	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 267 - COTE CHAMBRE 219	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 266 - COTE CHAMBRE 211	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 265 - COTE CHAMBRE 223	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 264 - COTE CHAMBRE 225	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE1. 262 - COTE CHAMBRE 228	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 261 - COTE CHAMBRE 230	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 260 - COTE CHAMBRE 232	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE4. 259 - COTE CHAMBRE 234	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 258 - COTE CHAMBRE 236	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE4. 257 - COTE CHAMBRE 239	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 256 - COTE CHAMBRE 240	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 255 - COTE CHAMBRE 242	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 253 - COTE CHAMBRE 262	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 251 - COTE CHAMBRE 264	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2.	0,8	2013-6-10

	250 - COTE CHAMBRE 266		
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 249 - COTE CHAMBRE 268	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 252 - COTE CHAMBRE 269	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 254 - COTE POSTE INFIRMIER	0,8	2013-6-10
IND B	AD 204	0,8	2023-5-3
IND B	AD 205	0,8	2023-5-3
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE5. 263 - COTE CHAMBRE 226	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 376 - COTE CHAMBRE 301	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 375 - COTE CHAMBRE 303	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 374 - COTE CHAMBRE 305	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 373 - COTE CHAMBRE 307	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE2. 372 - COTE CHAMBRE 309	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 371 - COTE CHAMBRE 312	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 370 - COTE CHAMBRE 315/316	0,8	2013-6-10
IND 0	COFFRET CHAMBRE TE3. 369 - COTE CHAMBRE 318/319	0,8	2013-6-10
IND B	ARMOIRE H4	0,8	28/11/2012
IND C	ARMOIRE AD 306	0,8	2024-5-2
IND 0	ARMOIRE AD 305	0,8	2013-6-6
IND 0	ARMOIRE AD 007 - COULOIR ONCOREABILITATION	0,8	2013-5-29
IND C	ARMOIRE AD 005 - COULOIR RADIO SENOLOGIE	0,8	30/11/2023
IND A	ARMOIRE AD 006	0,8	2023-11-2

Tableau Haute Tension

Emplacement et désignation des circuits HT	Dispositif de coupure / protection HT						Canalisations en aval					
	Type	Calibre/ Réglage (A)	Tempo (s)	Seuil	Homopolaire	Pdc (KA)	Type Liaison	Nombre	Section (mm²)	Nature	L (m)	Pose

EXTERIEURS : > LOCAL LTE 025 GSS3

➤ CELLULE HAUTE TENSION

Ik max : **Référence client :** **Armoire amont :**

.36 TRG SS3	IF HT	31,5				40						
.35 GE Poste-Livraison	I HT											
.34 CUC 2R	I HT											

BATIMENT A : > REZ-DE-CHAUSSEE : > LOCAL NT LOG LTE 013

➤ CELLULE HAUTE TENSION

Ik max : **Référence client :** **Armoire amont :**

.Cellule Potentiel	IF HT	6,3										
.Protection GES 1	IF HT	43										
.Protection GES 2	IF HT	43										
.Protection GES 3	IF HT	43										
.Cellule protection Homopolaire	IF HT	31,5										
.Disjoncteur double sectionnement	Dj 2S HT											
.Vers CUC 3 Remplacement	Dj 1S HT											
.Vers CUC 1 Remplacement	Dj 1S HT											
.Vers Poste de Livraison	Dj 1S HT											

BATIMENT B : > EXTERIEUR : > LOCAL CFO ADO 035

➤ CELLULE HAUTE TENSION

Ik max : **Référence client :** **Armoire amont :**

.TGBT 2.1	IF HT	80				32						
.TGBT 1.1	IF HT	80				32						
.CUC 1 N 18	I HT											
.CUC 17	I HT											

BATIMENT B : > EXTERIEUR : > LOCAL CFO TGBT GSS1

➤ CELLULE HAUTE TENSION

Ik max : **Référence client :** **Armoire amont :**

.Transfo T GSS 23R	IF HT	80				32						
.Cellule 22 Vers CUC 2 Cellule 28	I HT											
.21 Depuis GE PM 1 W8	I HT											

BATIMENT B : > EXTERIEUR : > LOCAL CFO TGBT GSS2

Emplacement et désignation des circuits HT	Dispositif de coupure / protection HT						Canalisations en aval					
	Type	Calibre/ Réglage (A)	Tempo (s)	Seuil	Homopolaire	Pdc (KA)	Type Liaison	Nombre	Section (mm²)	Nature	L (m)	Pose

➤ **CELLULE HAUTE TENSION**

Ik max : **Référence client :** **Armoire amont :**

.Vers TGBT GSS2	IF HT	63				31,5
.Vers GSS3	I HT					
.Vers GSS1	I HT					

BATIMENT B : > EXTERIEUR : > LOCAL CFO CELLULE HT

➤ **CELLULE HAUTE TENSION**

Ik max : **Référence client :** **Armoire amont :**

.Cellule 27	I HT
.Cellule 26	I HT
.Cellule 25	I HT
.Cellule 24	I HT

BATIMENT D : > EXTERIEUR : > Poste de livraison CFO ADO 034

➤ **CELLULE HAUTE TENSION**

Ik max : **Référence client :** **Armoire amont :**

.Cellule Poste Groupe Electrogène	Dj 1S HT	
.Cellule Poste CUC 1	Dj 1S HT	
.Cellule Poste CUC 3	Dj 1S HT	
.Cellule Disjoncteur double sectionnement	Dj 2S HT	
.Cellule Potentiel CM	IF HT	30
.Arrivée EDF Normal	I HT	
.Arrivée EDF Secours	I HT	

Significations des abréviations utilisées

HT : Haute tension	Ik max : Intensité de court-circuit maximale	Dj 1S HT : Disjoncteur simple sectionnement
L : Longueur	Arriv HT : Interrupteur arrivée HT	Dj 2S HT : Disjoncteur double sectionnements
PdC : Pouvoir de coupure	Dep HT : Interrupteur départ HT	Wh TT/TC HT : Interrupteur comptage HT
Aux HT : Auxiliaire HT	I HT : Interrupteur HT	IF HT : Interrupteur fusible HT

Etendue, méthodologie et critères d'appréciation des mesurages

Préambule

Les mesures / essais à effectuer sont définis selon le type de vérification (Initiale, à la demande de l'Inspection du Travail, Périodique, Temporaire), lorsque possible en fonction des conditions rencontrées sur le site et de la mise à disposition des installations.

Les méthodologies de mesurage utilisées et les valeurs limites sont celles décrites dans les normes d'installation rendues applicables par l'arrêté du 19/04/2012 (notamment série NF C15-100, NF C 15-150-1, NF EN 50107-1, NF C 15-211, NF C13-100, NF C13-200, NF C17-200).

Résistance des Prises de terre

- **Etendue** : La mesure de la résistance de la prise de terre est effectuée pour tous les types de vérification.
- **Méthodologie** : Ces mesures sont effectuées soit par la méthode des 2 terres auxiliaires, soit par la méthode de boucle, soit toute autre méthode appropriée. Dans tous les cas la mesure est effectuée barrette fermée, ainsi que barrette ouverte si nécessaire et si possible.
- **Valeurs limites**

Type de réseau	Valeur Id (A) HT	Valeur maximum prise de terre				Masses BT TT (Ohm)
		TNR – ITR (Ohm)	TTS (Ohm)			
			U _{tp} = 2 kV	U _{tp} = 4 kV	U _{tp} = 10 kV	
Aéro-souterrain	40	26	30	30	30	50 / I Delta n
	150	6	10	24	30	
	300	3	5	12	30	
Souterrain	1000	1	1	3	10	

Pour la NF C 13 200, en règle générale, une valeur de prise de terre inférieure ou égale à 1 ohm est présumée satisfaisante à cette exigence.

U_{tp} : tension de tenue des masses du poste - Id : courant de défaut à la terre du réseau HT de distribution publique

Continuité des conducteurs de protection

- **Etendue** : Les mesures de continuité sont effectuées :
 - Quelque soit le type de vérification, comme suit :
 - Liaisons entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant (remplacé par un examen visuel en cas d'impossibilité).
 - Tous les matériels fixes et amovibles de classe I, y compris prolongateurs et accessoires présentés.
 - Lors de chaque vérification initiale et sur demande de l'Inspection du Travail, de la totalité des appareils d'éclairage et prises de courant accessibles.
 - Lors de chaque vérification périodique, de la moitié des prises de courant accessibles dans les locaux de bureaux (ou locaux ayant des influences externes assimilées), la totalité dans les autres locaux, et du tiers des appareils d'éclairage fixes accessibles depuis le sol.
- **Méthodologie** : La vérification est effectuée à l'aide d'un milliohmètre, d'un ohmmètre ou visuellement.
- **Valeurs limites**
 - **En basse tension** : La valeur de la continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de distribution doit être systématiquement indiquée lors des vérifications initiales. Les valeurs de continuité des conducteurs de protection aboutissant aux différents matériels doivent être comparées à celles préconisées dans le paragraphe D.6.2 ou D.6.3 du guide UTE C 15-105; toutefois, lors des vérifications initiales ou sur demande de l'inspection du travail réalisées en schéma TN ou IT, en l'absence de notes de calculs justificatives dans le dossier technique, les valeurs sont à comparer à celles du tableau DC du paragraphe D.6.1 du guide UTE C 15-105.
 - **En haute tension** : En cas de doute, ou lorsque l'examen visuel n'est pas réalisable, une mesure de continuité doit être effectuée; entre deux points simultanément accessibles. La résistance mesurée doit être au plus égale à 200 mΩ.
- **Unité des valeurs** : milli-ohm ou ohm.
- **Sur les prises de courant sans millésime est réalisée tous les ans.**
- **Sur les appareils d'éclairage ou prises de courant avec millésime est réalisée à la date du millésime.**

Isolement des Circuits et Matériels BT

- **Etendue** : Quelque soit le type de vérification, les mesures d'isolement sont effectuées sur tous les appareils portatifs à main et mobiles présentés, les matériels fixes et semi-fixes dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse, ainsi que les circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel est défectueux ou absent, à l'exception des matériels alimentés en TBTS ou TBTP, de classe II.
- **Méthodologie** : La mesure d'isolement est effectuée entre conducteur actif et masse (ou terre) à l'aide d'un ohmmètre approprié suivant le domaine de tension.
- **Valeurs limites** : 0,5 Mégohm pour U > 500V (NF C15-100 ou NF C17-200), pour les câbles chauffants noyés dans les parois, 0,25 Mégohm pour U ≤ 230V, 0,40 Mégohm pour U > 230V.
- **Unité des valeurs** : Mégohm

Essai du (des) Contrôleur(s) Permanent d'isolement (CPI)

- **Etendue** : L'essai du CPI (sauf si présence d'un défaut) est effectué quel que soit le type de vérification pour les installations à neutre isolé ou impédant à l'exclusion des réseaux HT.
- **Méthodologie** : Essai avec une résistance calibrée, complété par la vérification de l'efficacité de la signalisation et de son report.
- **Valeurs limites** : Cohérence de l'indication du CPI avec la valeur de la résistance calibrée; bon fonctionnement de la signalisation et de son report
- **Unité des valeurs** : kOhm

Essais des Dispositifs Différentiels Résiduels (DDR)

- **Etendue** : L'essai des DDR est effectué sur tous les appareils installés quel que soit le type de vérification à l'exclusion des réseaux HT et les DDR > à 1A. Cet essai est réalisé si l'établissement l'autorise et le rend possible.
- **Méthodologie** : L'essai des DDR est réalisé par création d'un défaut réel sur l'installation ou d'un défaut amont-aval (méthode 1 ou 2 de l'annexe 6B du titre 6 de la NFC15-100-1).
- **Valeurs limites** : Essais satisfaisants si la valeur de déclenchement est comprise entre la valeur assignée (I delta n) et la moitié de la valeur assignée (I Delta n/2).
- **Unité des valeurs** : mA
- Pour les DDR > à 1A seul un test de fonctionnement mécanique par le bouton test est réalisé.

Rappels sur les vérifications d'installations électriques en application des articles R. 4226-14, R. 4226-16, R. 4226-21 et R. 4722-26 du code du travail

1. OBJECTIF

Les vérifications en application des articles ci-dessus ont pour but de rechercher les points où les installations électriques s'écartent des dispositions fixées par :

- les articles R. 4215-3 à 17 et R. 4226-5 à 13 Code du Travail,
- le décret mines et carrières décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité,
- les arrêtés pris pour leurs applications et des normes concernées (dans la limite des prescriptions visant la sécurité des personnes vis-à-vis des risques électriques).

Elles sont conduites selon la méthodologie définie par l'arrêté du 26/12/2011.

Les vérifications initiales (R. 4226-14) ou suite à modification de structure visent à donner un avis sur la conformité de la conception / réalisation des installations électriques neuves ou modifiées, alors que les vérifications périodiques (R. 4226-16) visent à s'assurer du maintien en état de conformité des installations existantes et non modifiées (cf §6).

La vérification sur demande de l'Inspection du Travail (R. 4722-26) est identique à l'initiale, mais porte sur une installation existante.

Les vérifications d'installations temporaires (R. 4226-21) sont effectuées à la demande du Chef d'établissement (dénommé « Employeur » dans le Code du travail) et ne sont pas incluses dans aucun des types de vérifications précisées ci-dessus sauf en VDT (R4722-26).

Ces différents types de vérifications concernent la protection des personnes au travail vis-à-vis des risques d'électrisation et de brûlures dues aux installations électriques, à l'exclusion de tout autre objectif, par exemple :

- sûreté de fonctionnement et sélectivité des installations électriques,
- protection contre la foudre, etc,
- voire des objectifs visés par d'autres réglementations :
 - protection du public contre les risques d'incendie et de panique
 - protection des biens et de l'environnement
 - conformité des produits, etc.

L'attention est également attirée sur le fait que certaines installations ou équipements peuvent être assujettis à d'autres textes et doivent faire l'objet de vérifications spécifiques; il en est ainsi, par exemple :

- des équipements de travail (protection vis à vis des risques mécaniques),
- des appareils de levage, de manutention ou de transport par câbles,
- des installations émettrices de rayonnements (protection vis-à-vis des risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants),
- des installations de protection ou de détection des risques d'incendie et d'explosion (protection vis à vis de la protection des biens et du public),
- des installations d'alarme, de transmission de données, de comptage,
- des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

2. ETENDUE ET LIMITES

Conformément à l'arrêté du 26/12/2011 fixant l'objet et l'étendue des vérifications, celles-ci portent sur la matérialité physique des installations électriques, c'est-à-dire l'ensemble des matériels électriques présentés lors de la vérification et mis en œuvre dans l'établissement, tels que matériels de production, transformation, transport, distribution, ou utilisation.

Le respect de la normalisation des matériels, notamment lorsqu'il est concrétisé par un marquage officiel, leurs apporte une présomption de conformité. En conséquence, les examens sont limités à leurs adaptations aux conditions d'usage et à leurs états apparents.

La vérification d'un équipement de travail porte sur les points suivants :

- adaptation de l'équipement de travail aux caractéristiques de l'installation fixe d'alimentation, en ce qui concerne le schéma des mises à la terre et le courant de court-circuit présumé au point d'installation,
- adaptation des différentes enveloppes et des câbles aux conditions d'influences externes,
- protection contre les contacts directs,
- protection contre les contacts indirects en cas de défaut d'isolement sur les masses accessibles,
- protection contre les surintensités de la canalisation fixe alimentant la machine.

La vérification ne concerne pas la protection contre les surintensités des circuits internes ni la protection des moteurs contre les échauffements anormaux des équipements de travail soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché.

Par ailleurs, les installations électriques étant examinées en tenant compte des contraintes d'exploitation et de sécurité propres à chaque établissement, la vérification peut être limitée dans certains cas à leurs seuls états apparents.

De plus, Apave ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir signalé les défauts sur des appareils non présentés, parties d'installations inaccessibles, renseignements erronés, etc.

Sont exclus du champ de la vérification :

- les dispositions administratives, organisationnelles et sécuritaires relatives à l'information et à la formation du personnel chargé de l'exploitation courante, des travaux ou interventions,
- les dispositions administratives relatives aux documents à tenir à la disposition des autorités publiques,
- l'examen des matériels électriques en présentation ou en démonstration et destinés à la vente,
- les matériels en stock, en réserve, signalés comme n'étant plus mis en œuvre.

3. ORGANISATION DE LA VERIFICATION

Afin d'assurer l'ensemble des investigations imposées par l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit organiser la vérification avec l'intervenant Apave dès le début de visite, en particulier :

- signaler les parties d'installations nouvelles ou ayant fait l'objet de modifications de structure, pour lesquelles une vérification initiale a été faite (cf. §6),
- donner les moyens d'accès aux locaux et équipements (ouverture d'armoires électriques, appareils en hauteur, etc.),
- ainsi qu'une autorisation d'accès aux locaux de service électrique (cf NF C18 510 art 11.4.2),
- faire assurer les mises hors tension des installations permettant les mesurages et essais, puis les remises sous tension,
- fournir les pièces du dossier technique des installations électriques définies par l'arrêté du 20/04/2012, en particulier :
 - les notes de calculs justifiant du dimensionnement et de la protection,
 - les schémas complets et à jour,
 - les rapports de vérification initiale, suite à modification de structure, périodique annuel et quadriennal précédents,
 - le plan de classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes, notamment à risque d'incendie et d'explosion, à défaut le

classement de l'intervenant Apave ne constitue qu'une proposition, à valider par le Chef d'établissement.

Indication, le cas échéant par famille de locaux, des conditions d'influences externes et des degrés minimaux de protection des matériels.

Les emplacements à risques d'explosion et leur classification en zones figurent dans « le document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) » établi et mis à jour par le chef d'établissement, il n'est pas du ressort du vérificateur de proposer un tel classement.

Si nécessaire, une limite d'intervention est portée dans le rapport à ce sujet indiquant que le DRPCE n'a pas été réalisé ou fourni par le chef d'établissement et qu'une analyse permettant sa rédaction doit être menée.

- Pour les zones avec atmosphères explosives (ATEX) :
 - le document relatif à la prévention contre les explosions (DRPCE), prévu aux articles R.4227-50 et 52 du code du travail,
 - le rapport de sécurité des installations électriques, en application de l'arrêté du 8/07/2003.
- Note DGT mars 2024 :
 - Dépose et repose des plastrons des armoires basse tension :

La dépose et repose des plastrons est à réaliser par une personne habilitée de l'établissement ou missionnée pour le faire par le client. Si ce n'est pas réalisé, l'intervenant APAVE procède à la dépose et repose des plastrons sauf refus du client. Cette intervention pourra faire l'objet d'une facturation complémentaire. En cas de refus ou de risque pour l'intervenant APAVE, cela fera l'objet d'une observation et l'acte technique ne sera pas réalisé.
 - Essais des dispositifs différentiels :

L'essai des dispositifs différentiels est à réaliser pendant la vérification réglementaire. Si ces essais ne sont pas autorisés, Apave propose une coupure décalée. En cas de refus, l'absence d'essais fera l'objet d'une observation dans le rapport et un plan de coupure sera à réaliser par le client pour les prochaines vérifications.
 - Essais des dispositifs de coupure d'urgence des armoires de distribution basse tension :

L'essai des systèmes télécommandés des coupures d'urgence des armoires de distribution basse tension est à réaliser pendant la vérification réglementaire. Si ces essais ne sont pas autorisés, Apave propose une coupure décalée. En cas de refus, l'absence d'essais fera l'objet d'une observation dans le rapport et un plan de coupure sera à réaliser par le client pour les prochaines vérifications.
 - Coupure décalées :

En cas de coupure décalée ce rapport fera l'objet d'un rapport en complète et remplace.

4. CONDUITE DE LA VERIFICATION

Lorsque l'insuffisance de la mise à disposition des moyens ci-dessus ne permet pas d'exécuter complètement la vérification, mention en est faite dans le rapport Apave.

Il appartient alors au Chef d'Etablissement de prendre à sa charge dans les plus brefs délais l'organisation des compléments.

A défaut, la vérification pourrait être considérée comme une vérification non réglementaire.

Concernant la continuité à la terre des appareils d'éclairage qui n'aurait pu être mesurée lors des vérifications, l'attention du chef d'établissement doit être attirée sur le fait qu'en cas d'intervention ultérieure sur ces appareils d'éclairage ou dans leur voisinage, il devra préalablement procéder ou faire procéder à cette vérification (Arr. du 26/12/2011-Annexe II, Art 1).

5. RAPPORTS

Les rapports établis conséquemment aux différents types de vérifications répondent aux prescriptions définies par l'arrêté du 26/12/2011.

Ainsi, le rapport périodique annuel est limité aux informations à caractères administratifs ainsi qu'aux seules non-conformités constatées, alors que le rapport périodique quadriennal contient toutes les informations imposées.

Les observations sont référencées aux articles du Code du travail, et le cas échéant à l'arrêté d'application concerné et/ou la norme d'installation définie par l'arrêté du 19/04/2012, dans sa dernière version.

Lorsque la version de la norme applicable à l'installation est antérieure à cette dernière version, les opérations qui permettent de lever les observations sont à réaliser dans le cadre de cette norme antérieure sauf si l'ampleur des travaux les soumet à une visite initiale électrique qui sera réalisée en référence à la dernière version de la norme concernée.

Le rapport réglementaire de vérification des installations électriques est destiné à l'employeur, lorsque le contractant (Facility Manager par exemple), n'est pas l'employeur, l'original du livrable doit lui être adressé.

Sauf avis contraire du Chef d'établissement, dûment notifié à l'agence APAVE qui a émis le présent rapport, dans un délai de deux mois maximum à compter de la date d'envoi, le contenu du présent est considéré comme définitivement validé.

6. MODIFICATIONS DE STRUCTURE

Conformément à l'article R. 4226-6 du Code du travail, les modifications de structure⁽¹⁾ doivent donner lieu à une vérification initiale effectuée par un organisme accrédité, lors de leur mise en service.

Ainsi, les parties d'installations rencontrées en vérification périodique qui entrent dans ce cadre, ne font pas l'objet d'une telle vérification 'de conformité', elles sont signalées à l'Etablissement à qui il revient de faire réaliser cette vérification.

⁽¹⁾ Modification de la puissance de court-circuit, du schéma des liaisons à la terre, modification/ajout de circuits de distribution, création/réaménagement d'installations

7. SURVEILLANCE ET MAINTENANCE

La vérification des installations électriques ne constitue qu'un des éléments concourant à la protection des travailleurs contre les dangers des courants électriques ; aussi, et conformément à l'article R. 4226-7 du Code du travail, le chef d'établissement doit mettre en place une organisation de la surveillance des installations électriques chargée de détecter en permanence d'éventuelles déficiences pouvant apparaître entre deux vérifications.

Les déficiences relevées dans le cadre des vérifications et de la surveillance doivent être levées dans les plus brefs délais.

8. INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Les installations temporaires établies le cas échéant entre deux vérifications périodiques, doivent faire l'objet d'une vérification spécifique (cf Art. R. 4226-21) dans les conditions définies par les arrêtés des 22/12/2011 et 26/12/2011.

9. INTERVENTIONS D'ENTREPRISES EXTERIEURES

Conformément aux dispositions des articles R.4511-5 à R.4511-8 du Code du travail, des dispositions de sécurité particulières parfaitement définies doivent être prises par les responsables des entreprises concernées pour toute intervention sur ou à proximité des installations électriques.
