

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX

Code du travail :	Décret :	Arrêtés :
Code de la Santé Publique :	Article R.4412-97	n°2011-629 du 3 juin 2011 n°2012-639 du 4 mai 2012 n°2013-594 du 5 juillet 2013 n°2015-789 du 29 juin 2015 n°2017-899 du 9 mai 2017 n°2019-251 du 27 mars 2019
Norme :	Norme NFX 46 -020 d'août 2017	du 26 juin 2013 du 25 juillet 2016 du 16 juillet 2019

1. IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE BÂTI

Adresse : CDC POITIERS
14 Boulevard de Chasseigne
86036 POITIERS CEDEX

Complément d'adresse

Bât : CDC POITIERS
Esc. :
Porte n° :
Référence cadastrale : Non Communiqué(s)

Fonction principale du bâtiment : Tertiaire

Type de bien : ERP

Catégorie du bâtiment :

Date du permis de construire : 0



N° de dossier

5288160

Date de la commande

30/10/2025

Date du repérage

06/11/2025

Accompagnateur

Aucun

2. DESIGNATION DE L'ORGANISME ET AUTEUR DU REPERAGE

Organisme : **QUALICONSULT IMMOBILIER**

Auteur du repérage : MAUBERT Fabrice



Adresse : 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609
87023 LIMOGES CEDEX 9



ICERT

Compétence
Certifié par N° CPDI5844

Depuis le 30/03/2022



Désignation de la compagnie d'assurance : MMA ENTREPRISES

Numéro de police : 127106241

Date de validité : 31/12/2025

3. DESIGNATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE



Laboratoire : ITGA OUEST

N° d'accréditation : 1-5970 rév 12



Adresse : Bât K Avenue d'Alphasis 35760 SAINT-GRÉGOIRE



REVISION

Version 01



DATE

19/11/2025



OBJET

Création du document

SOMMAIRE

CONCLUSIONS DU RAPPORT DE REPERAGE	3
1. IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS.....	5
1.1. IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE	5
1.2. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE.....	5
2. PREAMBULE	5
3. BUT DE LA MISSION	5
3.1. REPERAGE ANTERIEUR REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE	5
3.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX	5
3.3. PERIMETRE DU REPERAGE	6
3.4. PROGRAMME DE REPERAGE	6
4.	6
5. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC	7
5.1. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE	7
5.2. PHASE DE REPERAGE	7
5.3. PHASE PRELEVEMENT ET ANALYSE D'ECHANTILLON	8
6. LOCAUX VISITES ET NON-VISITES.....	8
7. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE	9
7.1. DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE	9
7.2. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	13
7.3. MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	14
8. OBSERVATIONS & RESERVES	19
9. ANNEXES	19
FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	20
PLANCHE(S) DE REPERAGE	20
PLANCHE PHOTO(S).....	22
PROCES VERBAUX D'ANALYSES LABORATOIRE	28
DOCUMENT(S) REMI(S)	33
ATTESTATION D'ASSURANCE	34
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	35

CONCLUSIONS DU RAPPORT DE REPERAGE

DANS LE CADRE DE LA MISSION OBJET DU PRESENT RAPPORT, IL A ETE REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

 Cloisons et doublage sèches Enduit de jointoiment entre plaques de plâtre + Peinture			Quantité estimée total dans la ZPSO :
Etage	Local ou partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure	(Quantité estimée dans le local)
1er	Salle 11 R	Résultat d'analyse (P001)	Environ 100 M2
1er	Bureau 10 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)	
1er	Bureau 8 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)	
1er	Bureau 9 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)	
1er	Bureau 7 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)	
1er	Bureau 6 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)	
1er	Bureau 5 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)	
1er	Bureau 4 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)	
1er	Bureau 3 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)	
1er	Bureau 1 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)	

 **Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Enduit de jointoiment entre plaques de plâtre + Peinture** **Quantité estimée total dans la ZPSO :**

Etage	Local ou partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure	(Quantité estimée dans le local)
1er	Bureau 10 C	Résultat d'analyse (P007)	Environ 100 M2
1er	Bureau 11 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)	
1er	Bureau 9 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)	
1er	Bureau 8 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)	
1er	Bureau 7 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)	
1er	Bureau 01C06	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)	
1er	Bureau 5 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)	
1er	Bureau 4 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)	
1er	Bureau 3 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)	
1er	Bureau 2 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)	
1er	Bureau 1 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)	



Edité le : 19/11/2025
Fait à : LIMOGES CEDEX 9



Cachet de l'entreprise

QUALICONSULT IMMOBILIER
16 Rue Frédéric Bastiat- BP 91609
87023 LIMOGES
Tél. 05 55 33 04 40 – Fax 05 55 69 33 00
limoges.facilities@qualiconsult.fr
SIRET 490 676 293 00247



Signature de l'opérateur



1. IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS

1.1. IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE



Nom : Caisse des Dépôts et Consignations DEOFF2 - Plateforme d'exécution des dépenses

Qualité du donneur d'ordre :

Sur déclaration de l'intéressé



Adresse : DEOFF2 Plateforme d'exécution dépenses 56 RUE DE LILLE
75356 PARIS 07 SP

1.2. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE



Nom : Caisse des Dépôts et Consignations DEOFF2 - Plateforme d'exécution des dépenses

Qualité du donneur d'ordre :

Sur déclaration de l'intéressé



Adresse : DEOFF2 Plateforme d'exécution dépenses 56 RUE DE LILLE
75356 PARIS 07 SP

2. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **de travaux de l'immeuble sis :**

CDC POITIERS
Boulevard de Chasseigne
86036 POITIERS CEDEX

Date de délivrance du permis de construire : **0**

Destination présente et passée de l'immeuble bâti : **Tertiaire**

Les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention sont définies à l'annexe 13-9 du Code de la santé publique ainsi que par arrêté.

ANCIENS REPERAGE REMIS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE :

Référence

Remplacement des menuiserie extérieures

Moyens mis à disposition par le maître d'ouvrage : **Néant**

3. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les ouvrages ou composant de la construction susceptibles d'être affectés par les travaux.

Liste des écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 d'août 2017 :

Sans Objet

3.1. REPERAGE ANTERIEUR REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun repérages antérieure nous a été remis

3.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Ref. Programme de Travaux

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Remplacement des menuiserie extérieures

Remplacement des menuiserie extérieures

3.3. PERIMETRE DU REPERAGE

Liste des locaux inscrit dans le périmètre du repérage	Etage	Travaux
Bureau 10 C	1er	Concernée
Salle BR	1er	Concernée
Salle 11 R	1er	Concernée
Bureau 11 C	1er	Concernée
Bureau 9 C	1er	Concernée
Bureau 8 C	1er	Concernée
Bureau 7 C	1er	Concernée
Bureau 01C06	1er	Concernée
Bureau 5 C	1er	Concernée
Bureau 4 C	1er	Concernée
Bureau 3 C	1er	Concernée
Bureau 2 C	1er	Concernée
Bureau 1 C	1er	Concernée
Bureau 10 R	1er	Concernée
Bureau 9 R	1er	Concernée
Bureau 8 R	1er	Concernée
Bureau 7 R	1er	Concernée
Bureau 6 R	1er	Concernée
Bureau 5 R	1er	Concernée
Bureau 4 R	1er	Concernée
Bureau 3 R	1er	Concernée
Bureau 1 R	1er	Concernée

3.4. PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire(s)
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs - projetés	M	
	Crépis extérieurs	M	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
3 - Parois verticales intérieures			
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture	M	

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

4. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

4.1. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE

Dans le cadre d'une mission de repérage amiante avant travaux, **le maître d'ouvrage / donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER** les plans du bâtiment à jour ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche et le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante (ancien rapport de repérage, DTA, DIUO, DOE, etc...)

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre doit définir précisément la nature des travaux projeté ainsi que le périmètre de l'opération.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre n'est pas en mesure d'imposer :

- La méthodologie de repérage, celle-ci étant définie par l'arrêté du 16 juillet 2019 et la norme NF X 46-020 d'août 2017 satisfait également aux exigences de l'arrêté,
- Le nombre de prélèvement à analyser,

Le nombre d'investigations approfondies, le nombre de sondages, ainsi que le nombre de prélèvements et analyses à effectuer ne peut être déterminé avant l'achèvement du repérage.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à **QUALICONSULT IMMOBILIER** tous les moyens d'accès pour le bon déroulement du repérage et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de toutes les autorisations et instrument d'accès nécessaires.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre informe les occupants et exploitant, de l'intervention qui doit être réalisé dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. **Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre** ou son représentant prend, à la demande l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre est tenu :

- De vérifier la cohérence entre le programme de travaux et le programme de repérage et son périmètre proposés.
- De fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisations,
- De procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage,
- D'informer l'opérateur de repérage de toute modification du programme de travaux

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par **le maître d'ouvrage / donneur d'ordre** dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

4.2. PHASE DE REPERAGE

La phase de repérage comporte deux étapes :

- **1er Etape** : l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble bâti, pour cela il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

- **2ème Etape** : l'opérateur de repérage :

- Recherche et identifie les matériaux ou produit inscrit dans le programme de repérage
- Repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante
- Conclut sur la présence ou l'absence d'amiante

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leur caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

!! Avertissement :

Le repérage est réalisé conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019 et à la norme NF X46-020 d'août 2017, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (exemple des enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Les sondages et investigation approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020, il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages ...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore occupé et meublé, ces revêtements étant encore en place

4.3. PHASE PRELEVEMENT ET ANALYSE D'ECHANTILLON

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du matériau ou produit inscrit dans le programme de repérage, sera placé dans un contenant étanche doublé sur lequel seront reportées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel est soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront besoins l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le **COFRAC** au titre du LAB GTA 44 et de la norme NF X43-050.

Les méthodes d'analyse appliquée est conforme au programme d'accréditation des laboratoires LAB GTA 44 « Recherche d'amiante dans les échantillons massifs » du **COFRAC**.

En fonction de la nature du matériau ou produit à analyser, les techniques d'analyse appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (**MOLP**)
- La microscopie électronique à transmission analytique (**META**)

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses ».

5. LOCAUX VISITES ET NON-VISITES

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	 Justification
1er	Bureau 10 C	OUI	
1er	Salle BR	OUI	
1er	Salle 11 R	OUI	
1er	Bureau 11 C	OUI	
1er	Bureau 9 C	OUI	
1er	Bureau 8 C	OUI	
1er	Bureau 7 C	OUI	
1er	Bureau 01C06	OUI	
1er	Bureau 5 C	OUI	
1er	Bureau 4 C	OUI	
1er	Bureau 3 C	OUI	
1er	Bureau 2 C	OUI	
1er	Bureau 1 C	OUI	
1er	Bureau 10 R	OUI	
1er	Bureau 9 R	OUI	
1er	Bureau 8 R	OUI	
1er	Bureau 7 R	OUI	
1er	Bureau 6 R	OUI	
1er	Bureau 5 R	OUI	
1er	Bureau 4 R	OUI	
1er	Bureau 3 R	OUI	
1er	Bureau 1 R	OUI	

6. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE

6.1. DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
1er	Bureau 10 C	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs - Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
		Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment entre plaques de plâtre + Peinture
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er	Salle BR	Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment entre plaques de plâtre + Peinture
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er	Salle 11 R	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs -Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
		Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Cloisons et doublage sèches	Enduit de jointoiment entre plaques de plâtre + Peinture
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er	Bureau 11 C	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment entre plaques de plâtre + Peinture
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs - Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
		Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er	Bureau 9 C	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment entre plaques de plâtre + Peinture
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs - Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
		Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er	Bureau 8 C	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment entre plaques de plâtre + Peinture
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs - Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
		Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er	Bureau 7 C	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment entre plaques de plâtre + Peinture
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs - Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
		Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er	Bureau 01C06	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiment entre plaques de plâtre + Peinture
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs - Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
		Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
1er	Bureau 5 C	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs - Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
		Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er	Bureau 4 C	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs - Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
		Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er	Bureau 3 C	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs - Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
		Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er	Bureau 2 C	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs - Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
		Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er	Bureau 1 C	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs - Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
		Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
1er	Bureau 10 R	Cloisons et doublage sèches	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs -Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
		Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
1er	Bureau 9 R	Cloisons et doublage sèches	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs -Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
		Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
1er	Bureau 7 R	Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°2	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture
		Cloisons et doublage sèches	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
1er	Bureau 6 R	Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
		Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) n°2	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture
		Cloisons et doublage sèches	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
1er	Bureau 5 R	Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
		Cloisons et doublage sèches	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs -Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
1er	Bureau 4 R	Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Cloisons et doublage sèches	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs -Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
1er	Bureau 3 R	Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Cloisons et doublage sèches	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs -Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur
1er	Bureau 1 R	Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir
		Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir
		Cloisons et doublage sèches	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture
		Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs -Crépis
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
		Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur

6.2. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE



Cloisons et doublage sèches Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture



Etage	Local / partie d'immeuble	Critère ayant permis de conclure
1er	Salle 11 R	Résultat d'analyse (P001)
1er	Bureau 10 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
1er	Bureau 9 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
1er	Bureau 8 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
1er	Bureau 7 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
1er	Bureau 6 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
1er	Bureau 5 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
1er	Bureau 4 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
1er	Bureau 3 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
1er	Bureau 1 R	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture


Etage	Local / partie d'immeuble	Critère ayant permis de conclure
1er	Bureau 10 C	Résultat d'analyse (P007)
1er	Bureau 11 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
1er	Bureau 9 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
1er	Bureau 8 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
1er	Bureau 7 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
1er	Bureau 01C06	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
1er	Bureau 5 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
1er	Bureau 4 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
1er	Bureau 3 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
1er	Bureau 2 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
1er	Bureau 1 C	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)

6.3. MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Salle 11 R	Résultat d'analyse (P002)
1er	Bureau 10 R	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
1er	Bureau 9 R	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
1er	Bureau 5 R	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
1er	Bureau 4 R	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
1er	Bureau 3 R	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
1er	Bureau 1 R	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Menuiseries extérieures Battant mastic vitré Joint Noir


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Salle 11 R	Résultat d'analyse (P003)
1er	Bureau 10 R	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
1er	Bureau 9 R	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
1er	Bureau 5 R	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
1er	Bureau 4 R	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
1er	Bureau 3 R	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
1er	Bureau 1 R	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)

Menuiseries extérieures Dormant Joint Noir


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Salle 11 R	Résultat d'analyse (P004)
1er	Bureau 10 R	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
1er	Bureau 9 R	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
1er	Bureau 5 R	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
1er	Bureau 4 R	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
1er	Bureau 3 R	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
1er	Bureau 1 R	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)

Façades lourdes y compris poteaux Enduits extérieurs -Crépis


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Salle 11 R	Résultat d'analyse (P005)
1er	Bureau 10 R	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)
1er	Bureau 9 R	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)
1er	Bureau 5 R	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)
1er	Bureau 4 R	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)
1er	Bureau 3 R	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)
1er	Bureau 1 R	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)

Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Salle 11 R	Résultat d'analyse (P006)
1er	Bureau 10 R	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)
1er	Bureau 9 R	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)
1er	Bureau 5 R	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)
1er	Bureau 4 R	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)
1er	Bureau 3 R	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)
1er	Bureau 1 R	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Bureau 10 C	Résultat d'analyse (P008)
1er	Bureau 11 C	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
1er	Bureau 9 C	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
1er	Bureau 8 C	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
1er	Bureau 7 C	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
1er	Bureau 01C06	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
1er	Bureau 5 C	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
1er	Bureau 4 C	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
1er	Bureau 3 C	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
1er	Bureau 2 C	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
1er	Bureau 1 C	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)

Menuiseries extérieures Battant mastic vitré Joint Noir


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Bureau 10 C	Résultat d'analyse (P009)
1er	Bureau 11 C	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)
1er	Bureau 9 C	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)
1er	Bureau 8 C	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)
1er	Bureau 7 C	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)
1er	Bureau 01C06	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)
1er	Bureau 5 C	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)
1er	Bureau 4 C	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)
1er	Bureau 3 C	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)
1er	Bureau 2 C	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)
1er	Bureau 1 C	Résultat d'analyse (P009-ZPSO)

Menuiseries extérieures Dormant Joint Noir


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Bureau 10 C	Résultat d'analyse (P010)
1er	Bureau 11 C	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)
1er	Bureau 9 C	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)
1er	Bureau 8 C	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)
1er	Bureau 7 C	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)
1er	Bureau 01C06	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)
1er	Bureau 5 C	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)
1er	Bureau 4 C	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)
1er	Bureau 3 C	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)
1er	Bureau 2 C	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)
1er	Bureau 1 C	Résultat d'analyse (P010-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Façades lourdes y compris poteaux Enduits extérieurs - Crépis


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Bureau 10 C	Résultat d'analyse (P011)
1er	Bureau 11 C	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)
1er	Bureau 9 C	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)
1er	Bureau 8 C	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)
1er	Bureau 7 C	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)
1er	Bureau 01C06	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)
1er	Bureau 5 C	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)
1er	Bureau 4 C	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)
1er	Bureau 3 C	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)
1er	Bureau 2 C	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)
1er	Bureau 1 C	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)

Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Bureau 10 C	Résultat d'analyse (P012)
1er	Bureau 11 C	Résultat d'analyse (P012-ZPSO)
1er	Bureau 9 C	Résultat d'analyse (P012-ZPSO)
1er	Bureau 8 C	Résultat d'analyse (P012-ZPSO)
1er	Bureau 7 C	Résultat d'analyse (P012-ZPSO)
1er	Bureau 01C06	Résultat d'analyse (P012-ZPSO)
1er	Bureau 5 C	Résultat d'analyse (P012-ZPSO)
1er	Bureau 4 C	Résultat d'analyse (P012-ZPSO)
1er	Bureau 3 C	Résultat d'analyse (P012-ZPSO)
1er	Bureau 2 C	Résultat d'analyse (P012-ZPSO)
1er	Bureau 1 C	Résultat d'analyse (P012-ZPSO)

Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Enduit de jointoiment entre plaques de plâtre + Peinture


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Salle BR	Résultat d'analyse (P013) Au vu des résultats d'analyses des prélèvements réalisés sur les enduits de jointoiment des plaques de plâtre + Peinture au mur, il convient de considérer ce matériau comme contenant de l'amiante. L'hétérogénéité du matériau peut s'expliquer par : une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ; une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ; etc...
1er	Bureau 7 R	Résultat d'analyse (P013-ZPSO) Au vu des résultats d'analyses des prélèvements réalisés sur les enduits de jointoiment des plaques de plâtre + Peinture au mur, il convient de considérer ce matériau comme contenant de l'amiante. L'hétérogénéité du matériau peut s'expliquer par : une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ; une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ; etc...
1er	Bureau 6 R	Résultat d'analyse (P013-ZPSO) Au vu des résultats d'analyses des prélèvements réalisés sur les enduits de jointoiment des plaques de plâtre + Peinture au mur, il convient de considérer ce matériau comme contenant de l'amiante. L'hétérogénéité du matériau peut s'expliquer par : une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ; une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ; etc...

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Menuiseries extérieures Battant mastic vitré Joint Noir


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Salle BR	Résultat d'analyse (P014)
1er	Bureau 7 R	Résultat d'analyse (P014-ZPSO)
1er	Bureau 6 R	Résultat d'analyse (P014-ZPSO)

Menuiseries extérieures Dormant Joint Noir


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Salle BR	Résultat d'analyse (P015)
1er	Bureau 7 R	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)
1er	Bureau 6 R	Résultat d'analyse (P015-ZPSO)

Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Salle BR	Résultat d'analyse (P016)
1er	Bureau 7 R	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)
1er	Bureau 6 R	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)

Menuiseries extérieures Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Salle BR	Résultat d'analyse (P017)
1er	Bureau 7 R	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)
1er	Bureau 6 R	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)

7. OBSERVATIONS & RESERVES

Néant

8. ANNEXES

FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

Réf. échantillon.	Date du prélèvement	Matériaux ou Produit	Présence d'amiante
P001	06/11/2025	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture	Positif
P002	06/11/2025	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur	Négatif
P003	06/11/2025	Battant Joint Noir	Négatif
P004	06/11/2025	Dormant Joint Noir	Négatif
P005	06/11/2025	Enduits extérieurs -Crépis	Négatif
P006	06/11/2025	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Négatif
P007	06/11/2025	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture	Positif
P008	06/11/2025	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur	Négatif
P009	06/11/2025	Battant mastic vitré Joint Noir	Négatif
P010	06/11/2025	Dormant Joint Noir	Négatif
P011	06/11/2025	Enduits extérieurs - Crépis	Négatif
P012	06/11/2025	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Négatif
P013	06/11/2025	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture	Négatif
P014	06/11/2025	Battant mastic vitré Joint Noir	Négatif
P015	06/11/2025	Dormant Joint Noir	Négatif
P016	06/11/2025	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	Négatif
P017	06/11/2025	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur	Négatif


PLANCHE(S) DE REPERAGE


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PLANCHE	NIVEAU
---------	--------

N: 1/1

Titre : Document 1

LEGENDE



Localisation prélèvement négatif

Localisation prélèvement positif

Sondage

LEGENDE :

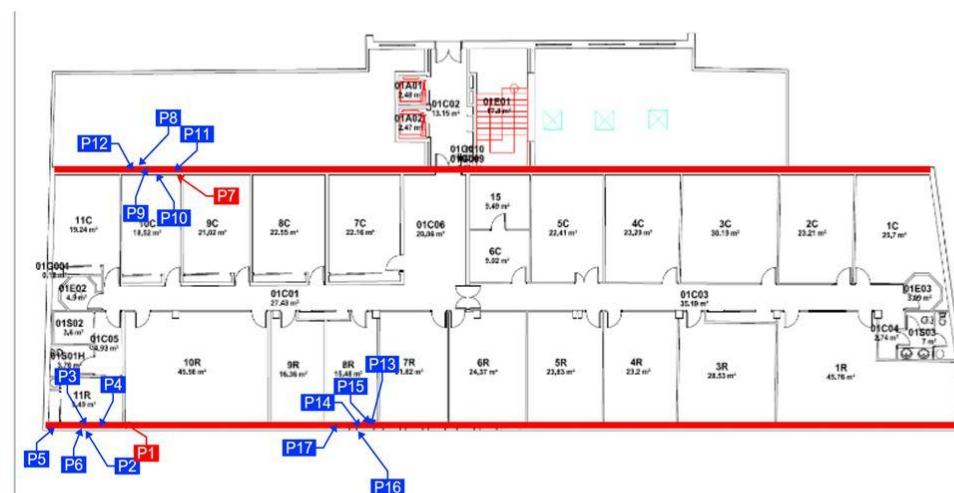
[illegible]

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Fabrice MAUBERT

VUE en PLAN

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Version : 0

Origine de la planche de repérage : **MAUBERT Fabrice**

VUE EN PLAN ou ELEVATION


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



PLANCHE PHOTO(S)



PRELEVEMENT : P001
OUVRAGE

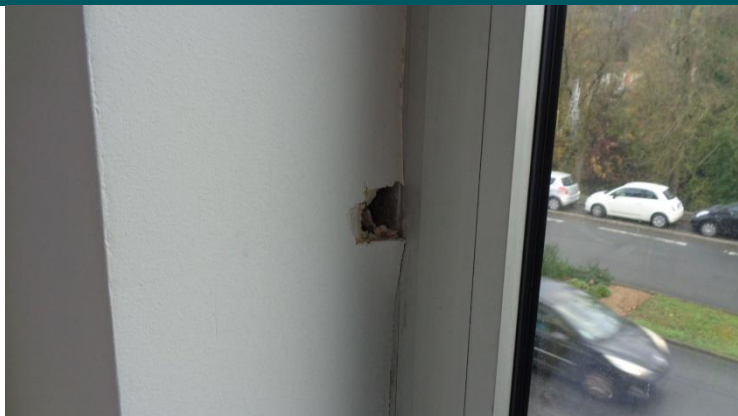

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit
1er - Salle 11 R	Cloisons et doublage sèches	Enduit de jointoiment entre plaques de plâtre + Peinture

PRESENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P002
OUVRAGE




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit
1er - Salle 11 R	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur

ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P003
OUVRAGE

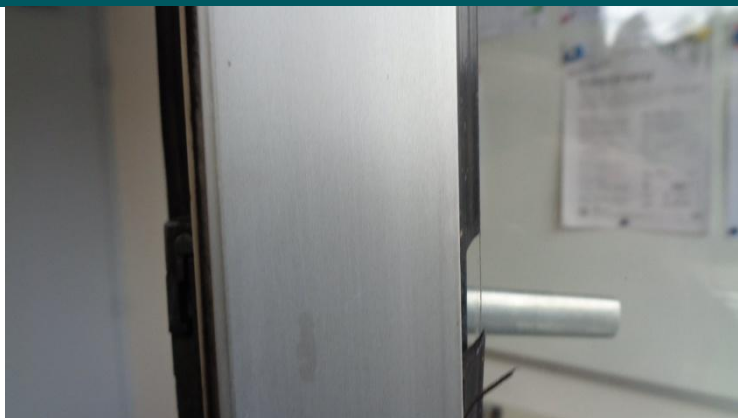

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Salle 11 R	Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir	ABSENCE D'AMIANTE :




PRELEVEMENT : P004
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Salle 11 R	Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir	ABSENCE D'AMIANTE :




PRELEVEMENT : P005
OUVRAGE

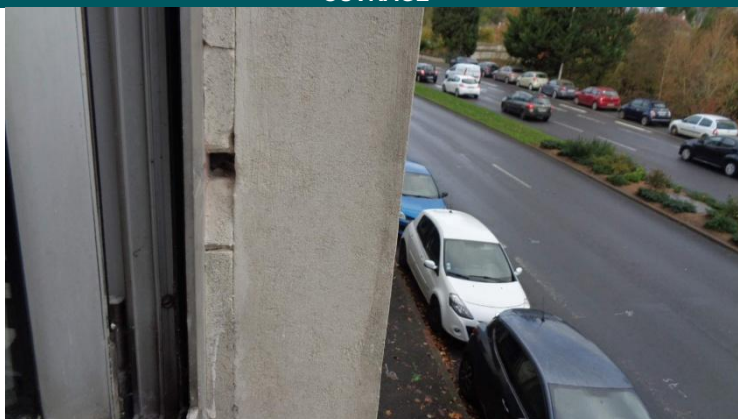

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Salle 11 R	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs - Crépis	ABSENCE D'AMIANTE :




PRELEVEMENT : P006
OUVRAGE

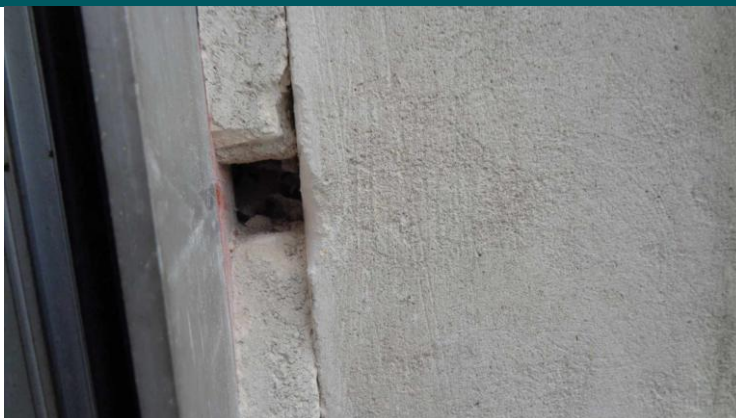

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Salle 11 R	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	ABSENCE D'AMIANTE :




PRELEVEMENT : P007
OUVRAGE

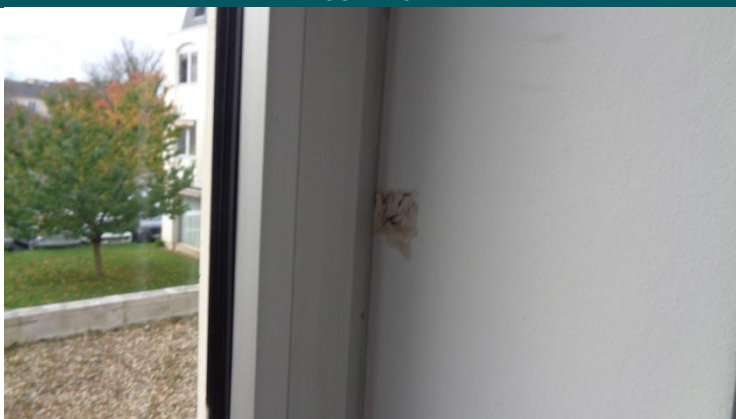

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Bureau 10 C	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture	PRESENCE D'AMIANTE :




PRELEVEMENT : P008
OUVRAGE

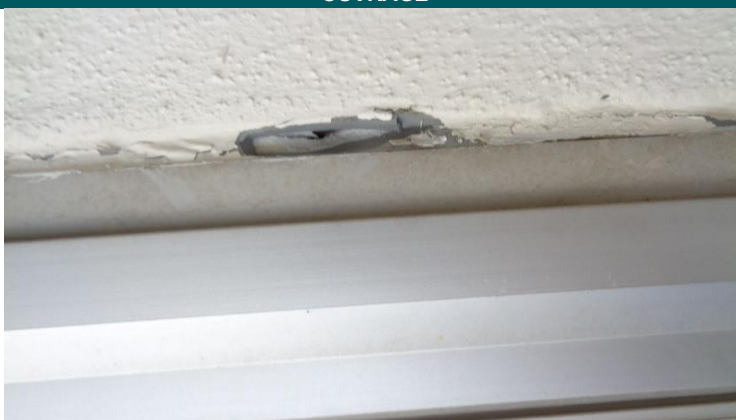

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Bureau 10 C	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur	ABSENCE D'AMIANTE :




PRELEVEMENT : P009
OUVRAGE

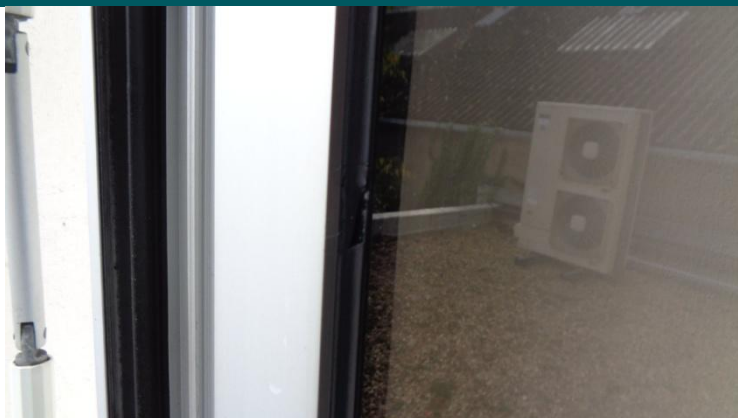

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	ABSENCE D'AMIANTE :
1er - Bureau 10 C	Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir	



PRELEVEMENT : P010
OUVRAGE

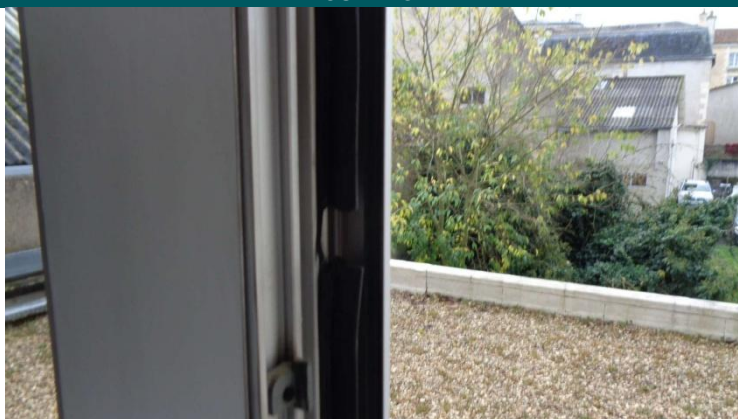

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	ABSENCE D'AMIANTE :
1er - Bureau 10 C	Menuiseries extérieures	Dormant Joint Noir	



PRELEVEMENT : P011
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	ABSENCE D'AMIANTE :
1er - Bureau 10 C	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs - Crépis	



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


PRELEVEMENT : P012
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Bureau 10 C	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P013
OUVRAGE

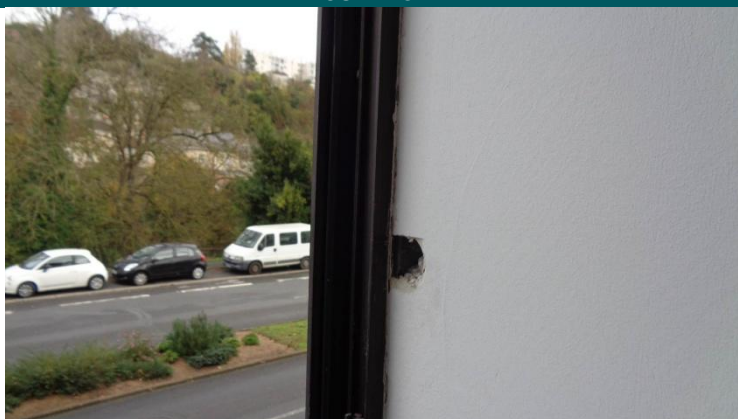

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Salle BR	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduit de jointoiement entre plaques de plâtre + Peinture	ABSENCE D'AMIANTE :




PRELEVEMENT : P014
OUVRAGE



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	
1er - Salle BR	Menuiseries extérieures	Battant mastic vitré Joint Noir	ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P015
OUVRAGE



Pièce ou local

Localisation

Matériau ou produit

1er - Salle BR

Menuiseries
extérieures

Dormant Joint Noir

ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P016
OUVRAGE



Pièce ou local

Localisation

Matériau ou produit

1er - Salle BR


Menuiseries
extérieures

Joints d'étanchéité
entre menuiserie et
structure

ABSENCE D'AMIANTE :



PRELEVEMENT : P017
OUVRAGE

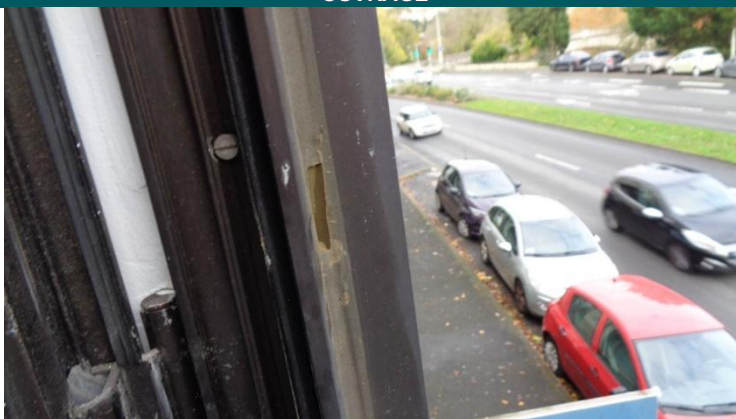

Pièce ou local

Localisation

Matériau ou produit

1er - Salle BR

Menuiseries
extérieures

Joints d'étanchéité
entre menuiserie
extérieur

ABSENCE D'AMIANTE :



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



PROCES VERBAUX D'ANALYSES LABORATOIRE



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Document 1


Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr


L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-24908 EN DATE DU 13/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Cliant : QUALICONSULT IMMOBILIER - LIMOGES 16 rue Frédéric Bastiat BP 91609 87023 LIMOGES	Réf. Commande ITGA : IT1425-24908 Réf. Commande Client : 5288160
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/11/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

ou

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : QUALICONSULT IMMOBILIER 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87023 LIMOGES CEDEX 9 Réf échantillon client : P001 - Enduit de jointement entre plaques de plâtre + Peinture - (1er) Salle 11 R - Cloisons et doublage sèches		Réf échantillon ITGA : IT142511-5503 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KOB (2)
Réf dossier client : QUALICONSULT IMMOBILIER 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87023 LIMOGES CEDEX 9 Réf échantillon client : P002 - Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur - (1er) Salle 11 R - Menuiseries extérieurs		Réf échantillon ITGA : IT142511-5504 Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc / Matériau souple gris	
* Peinture non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 12/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK (3)
* Matériau souple gris	META (B) le 12/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/4

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-24908 EN DATE DU 13/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : QUALICONSULT IMMOBILIER 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87023 LIMOGES CEDEX 9		Réf échantillon ITGA : IT142511-5505	
Réf échantillon client : P003 - Battant mastic vitré Joint Noir - (1er) Salle 11 R - Menuiseries extérieures		Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières	
* Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 12/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK
Réf dossier client : QUALICONSULT IMMOBILIER 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87023 LIMOGES CEDEX 9		Réf échantillon ITGA : IT142511-5506	
Réf échantillon client : P004 - Dormant Joint Noir - (1er) Salle 11 R - Menuiseries extérieures		Description ITGA : Matériau souple noir	
* Matériau souple noir	META (B) le 12/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK
Réf dossier client : QUALICONSULT IMMOBILIER 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87023 LIMOGES CEDEX 9		Réf échantillon ITGA : IT142511-5507	
Réf échantillon client : P005 - Enduits extérieurs -Crépis - (1er) Salle 11 R - Façades lourde sy compris poteaux		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Matériau compact gris en faible quantité hétérogène	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige + Matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 12/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : QUALICONSULT IMMOBILIER 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87023 LIMOGES CEDEX 9		Réf échantillon ITGA : IT142511-5508	
Réf échantillon client : P006 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - (1er) Salle 11 R - Menuiseries extérieures		Description ITGA : Peinture / Matériau souple gris	
* Peinture non séparable + Matériau souple gris	META (B) le 12/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK (3)
Réf dossier client : QUALICONSULT IMMOBILIER 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87023 LIMOGES CEDEX 9		Réf échantillon ITGA : IT142511-5509	
Réf échantillon client : P007 - Enduit de jointement entre plaques de plâtre + Peinture - (1er) Bureau 10C - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonée	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonée non séparable	META (A) le 13/11/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FAF (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/4

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-24908 EN DATE DU 13/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : QUALICONSULT IMMOBILIER 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87023 LIMOGES CEDEX 9 Réf échantillon client : P008 - Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur - (1er) Bureau 10C - Menuiseries extérieurs		Réf échantillon ITGA : IT142511-5510 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau souple gris / Mousse blanche	
* Peinture en faible quantité non séparable + Matériau souple gris	META (B) le 12/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK (3)
* Mousse blanche	META (B) le 12/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK
Réf dossier client : QUALICONSULT IMMOBILIER 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87023 LIMOGES CEDEX 9 Réf échantillon client : P009 - Battant mastic vitré Joint Noir - (1er) Bureau 10C - Menuiseries extérieurs		Réf échantillon ITGA : IT142511-5511 Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières	
* Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 12/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK
Réf dossier client : QUALICONSULT IMMOBILIER 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87023 LIMOGES CEDEX 9 Réf échantillon client : P010 - Dormant Joint Noir - (1er) Bureau 10C - Menuiseries extérieurs		Réf échantillon ITGA : IT142511-5512 Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières	
* Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 12/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK
Réf dossier client : QUALICONSULT IMMOBILIER 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87023 LIMOGES CEDEX 9 Réf échantillon client : P011 - Enduits extérieurs - Crépis - (1er) Bureau 10C - Façades lourde sy compris poteaux		Réf échantillon ITGA : IT142511-5513 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris en faible quantité hétérogène	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc + Matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 12/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : QUALICONSULT IMMOBILIER 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87023 LIMOGES CEDEX 9 Réf échantillon client : P012 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - (1er) Bureau 10C - Menuiseries extérieurs		Réf échantillon ITGA : IT142511-5514 Description ITGA : Matériau souple gris avec poussières	
* Matériau souple gris avec poussières	META (B) le 12/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/4

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-24908 EN DATE DU 13/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : QUALICONCONSULT IMMOBILIER 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87023 LIMOGES CEDEX 9		Réf échantillon ITGA : IT142511-5515	
Réf échantillon client : P013 - Enduit de Jointement entre plaques de plâtre + Peinture - (1er) Salle BR - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 13/11/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK (2)
Réf dossier client : QUALICONCONSULT IMMOBILIER 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87023 LIMOGES CEDEX 9		Réf échantillon ITGA : IT142511-5516	
Réf échantillon client : P014 - Battant mastic vitré Joint Noir - (1er) Salle BR- Menuiseries extérieurs		Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières	
* Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 12/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK
Réf dossier client : QUALICONCONSULT IMMOBILIER 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87023 LIMOGES CEDEX 9		Réf échantillon ITGA : IT142511-5517	
Réf échantillon client : P015 - Dormant Joint Noir - (1er) Salle BR- Menuiseries extérieurs		Description ITGA : Matériau souple noir	
* Matériau souple noir	META (B) le 13/11/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB
Réf dossier client : QUALICONCONSULT IMMOBILIER 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87023 LIMOGES CEDEX 9		Réf échantillon ITGA : IT142511-5518	
Réf échantillon client : P016 - Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure - (1er) Salle BR- Menuiseries extérieurs		Description ITGA : Matériau souple marron avec poussières	
* Matériau souple marron avec poussières	META (B) le 12/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK
Réf dossier client : QUALICONCONSULT IMMOBILIER 16, rue Frédéric Bastiat - BP 91609 87023 LIMOGES CEDEX 9		Réf échantillon ITGA : IT142511-5519	
Réf échantillon client : P017 - Joints d'étanchéité entre menuiserie extérieur - (1er) Salle BR- Menuiseries extérieurs		Description ITGA : Matériau souple marron avec poussières	
* Matériau souple marron avec poussières	META (B) le 12/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Audrey LUTHRINGER Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/4

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



DOCUMENT(S) REMI(S)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


ATTESTATION D'ASSURANCE

ATTESTATION D'ASSURANCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD atteste que : **QUALICONSULT IMMOBILIER**
 (490 676 293 RCS Versailles) VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant et après travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement
- Contrôle visuel amiante
- Analyse mâchefer
- Potabilité de l'eau
- Analyse ponctuelle d'éléments vis-à-vis de l'amiante
- Dossier amiante partie privative (DAPP)
- Analyse ponctuelle plomb
- Chiffrage remise en état après état des lieux de sortie
- Diagnostic installation d'assainissement non collectif
- Diagnostic installation d'assainissement collectif
- Diagnostic alex pour QUALITEL
- Diagnostic Sicile cristalline.
- Mission d'analyse ponctuelle en caractérisation des hydrocarbures (C10 – C40)
- Audit énergétique réglementaire selon le Décret N° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L.126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
- Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative DPEMD (arrêté du 26/03/2023)

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 20/12/2024

L'assureur

MMA IARD SA
 RCS Le Mans 440 048 882
 Siège Social : 160, rue Henri Champion
 72030 LE MANS CEDEX 9

E. Le Campy

MMA IARD Assurances Mutuelles
 Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
 RCS Le Mans 775 652 126

MMA IARD
 Société anonyme, au capital de 537 052 368 euros entièrement versé
 RCS Le Mans 440 048 882

Sièges sociaux : 160, rue Henri Champion – 72030 Le Mans Cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances

IDU REP Eco circulaire FR231780 03XLOT



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



CERTIFICAT DE QUALIFICATION

**Certificat de compétences
Diagnosticueur Immobilier****N° CPDI5844 Version 009**

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MAUBERT Fabrice

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 30/03/2022 - Date d'expiration : 29/03/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 30/03/2022 - Date d'expiration : 29/03/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 15/06/2022 - Date d'expiration : 14/06/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 11/05/2022 - Date d'expiration : 10/05/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 15/06/2022 - Date d'expiration : 14/06/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 30/03/2022 - Date d'expiration : 29/03/2029
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 11/05/2022 - Date d'expiration : 10/05/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 29 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

**Certification de personnes
Diagnosticueur**
Portée disponible sur www.icert.frI.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19
