N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		**ACT - Consultation des entreprises MAPA travaux**	**125 jrs**	**Mer 18/06/25**	**Mar 09/12/25**	
2		publication AAPC + mise en ligne DCE	1 jr	Mer 18/06/25	Mer 18/06/25	
3		Délai de remise des plis (candidatures et offres)	63 jrs	Jeu 19/06/25	Lun 15/09/25	2
4		Visite de site obligatoire 1 (A DETERMINER)	1 jr	Jeu 26/06/25	Jeu 26/06/25	2FD+5 jrs
5		Visite de site obligatoire 2 (A DETERMINER)	1 jr	Mar 01/07/25	Mar 01/07/25	2FD+8 jrs
6		Visite de site obligatoire 3 (A DETERMINER)	1 jr	Jeu 03/07/25	Jeu 03/07/25	2FD+10 jrs
7		Visite de site obligatoire 4 (A DETERMINER)	1 jr	Jeu 10/07/25	Jeu 10/07/25	2FD+15 jrs
8		Date limite réponse questions candidats	0 jr	Lun 08/09/25	Lun 08/09/25	3FD-6 jrs
9		Date limite remise des plis	0 jr	Lun 15/09/25	Lun 15/09/25	3
10		Ouverture des plis	1 jr	Mar 16/09/25	Mar 16/09/25	9
11		Analyse des candidatures	5 jrs	Mer 17/09/25	Mar 23/09/25	10
12		**Présentation analyse candidatures par MOE à la MOA**	**0 jr**	Mar 23/09/25	Mar 23/09/25	11
13		Demande de complétude candidatures	6 jrs	Mer 24/09/25	Mer 01/10/25	12
14		Validation candidatures	0 jr	Mer 01/10/25	Mer 01/10/25	13
15		Analyse des offres (10j MOE, 10 jours échanges MOA/MOE)	20 jrs	Mer 17/09/25	Mar 14/10/25	10
16		**Présentation par la MOE analyse des offres avant négociations**	**0 jr**	Mar 14/10/25	Mar 14/10/25	15
17		Validation analyse des offres avant négociations	5 jrs	Mer 15/10/25	Mar 21/10/25	16
18		Envoi des convocations négociation	1 jr	Mer 22/10/25	Mer 22/10/25	17
19		Semaine de negociation entreprises	7 jrs	Jeu 23/10/25	Ven 31/10/25	18
20		Remise offre finale + délai de remise offre finale	11 jrs	Lun 03/11/25	Lun 17/11/25	19
21		analyse des offres apres négociation par la MOE	5 jrs	Mar 18/11/25	Lun 24/11/25	20
22		**Présentation de l'analyse par la MOE a la MOA**	**0 jr**	Lun 24/11/25	Lun 24/11/25	21
23		Validation analyse des offres par la MOA	2 jrs	Mar 25/11/25	Mer 26/11/25	22
24		**Commission technique IFSeM (visio)**	**1 jr**	Jeu 27/11/25	Jeu 27/11/25	23
25		Envoi courrier d'attribution sous réserve (information date de réunion de démarrage + préparation OS démarrage)	1 jr	Ven 28/11/25	Ven 28/11/25	24
26		Délai remise pièces attributaires	7 jrs	Lun 01/12/25	Mar 09/12/25	25
27		**Signature du marché notification et information concomitante des candidats rejetés**	0 jr	Mar 09/12/25	Mar 09/12/25	26
28		**Travaux préparatoires**	**60 jrs**	**Mer 10/12/25**	**Mar 03/03/26**	
29		Déménagement locaux R1 aile C	30 jrs	Mer 10/12/25	Mar 20/01/26	27
30		Curage	30 jrs	Mer 21/01/26	Mar 03/03/26	29
31		**Réalisation**	**218 jrs**	**Mer 10/12/25**	**Ven 09/10/26**	**27**
32		Préparation chantier	25 jrs	Mer 10/12/25	Mar 13/01/26	27
33		Etudes d'exécution / Synthèse	60 jrs	Mer 24/12/25	Mar 17/03/26	27FD+10 jrs
34		Definition des équipements	15 jrs	Mer 10/12/25	Mar 30/12/25	27
35		Approbation des équipements	15 jrs	Mer 31/12/25	Mar 20/01/26	34
36		Approvisionnement des groupes frigorifiques	125 jrs	Mer 21/01/26	Mar 14/07/26	35
37		Approvisionnement Centrale de traitement d'air	50 jrs	Mer 06/05/26	Mar 14/07/26	36FF
38		Approvisionnement des transformateurs	75 jrs	Mer 01/04/26	Mar 14/07/26	36FF
39		Approvisionnement des onduleurs et batteries	60 jrs	Mer 22/04/26	Mar 14/07/26	36FF
40		Travaux GOE/charpente métallique dalle technique	25 jrs	Mer 18/03/26	Mar 21/04/26	33
41		Travaux GOE renforcement bâtiment	25 jrs	Mer 18/03/26	Mar 21/04/26	33
42		**Travaux second oeuvre**	**50 jrs**	**Mer 22/04/26**	**Mar 30/06/26**	
43		Résine planchers bas / peinture	15 jrs	Mer 22/04/26	Mar 12/05/26	41
44		Cloisons / doublage / Peinture	20 jrs	Mer 13/05/26	Mar 09/06/26	43
45		Faux plancher	15 jrs	Mer 10/06/26	Mar 30/06/26	44
46		Portes	10 jrs	Mer 10/06/26	Mar 23/06/26	44
47		**Travaux lots techniques**	**80 jrs**	**Mer 22/04/26**	**Mar 11/08/26**	
48		Chemins de câbles	40 jrs	Mer 13/05/26	Mar 07/07/26	43
49		Travaux aérauliques	25 jrs	Mer 22/04/26	Mar 26/05/26	40
50		Tuyauteries	40 jrs	Mer 22/04/26	Mar 16/06/26	40
51		Installation équipements de traitement d'air	10 jrs	Mer 15/07/26	Mar 28/07/26	40;37
52		Installations équipements refroidissement	10 jrs	Mer 15/07/26	Mar 28/07/26	36;40
53		Installation équipements électriques	10 jrs	Mer 15/07/26	Mar 28/07/26	42;38;39
54		Raccordement équipements refroidissement	10 jrs	Mer 29/07/26	Mar 11/08/26	52
55		Raccordement équipements électriques	10 jrs	Mer 29/07/26	Mar 11/08/26	53
56		Raccordement CTA Salle informatique	3 jrs	Mer 29/07/26	Ven 31/07/26	51
57		**AOR**	**43 jrs**	**Mer 12/08/26**	**Ven 09/10/26**	
58		Mise en service et essais niveaux 2 et 3	10 jrs	Mer 12/08/26	Mar 25/08/26	55;54;56
59		Commissioning niveaux 4 et 5	10 jrs	Mer 26/08/26	Mar 08/09/26	58
60		Réception des ouvrages	3 jrs	Mer 09/09/26	Ven 11/09/26	59
61		Prononciation de la réception	0 jr	Ven 11/09/26	Ven 11/09/26	60
62		Validation des DOE	20 jrs	Mer 09/09/26	Mar 06/10/26	60DD
63		Levée des réserves	20 jrs	Lun 14/09/26	Ven 09/10/26	60
64		Fin des travaux	0 jr	Ven 09/10/26	Ven 09/10/26	63

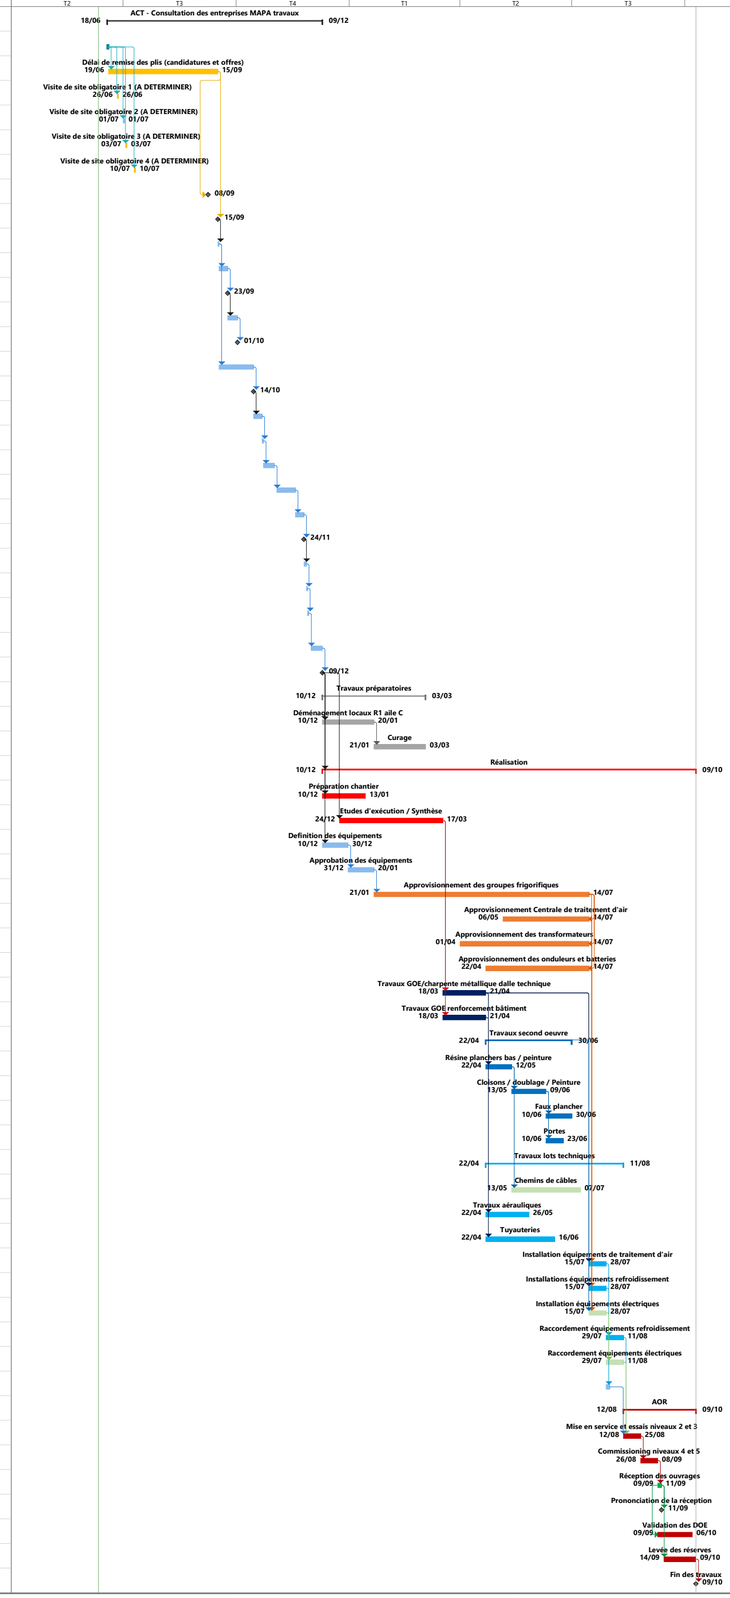

Projet : Projet1
Date : Mer 11/06/25

Tâche | Jalon | Récapitulatif du projet | Jalon inactif | Tâche manuelle | Report récapitulatif manuel | Début uniquement | Tâches externes | Echéance | Progression manuelle
Fractionnement | Récapitulative | Tâche inactive | Récapitulatif inactif | Durée uniquement | Récapitulatif manuel | Fin uniquement | Jalons externes | Avancement
