# Création de Bâtiments Modulaires pour la MA de NÎMES (30)

| N° | Nom de la tâche |
|---|---|
| 1 | **NOTIFICATION du Marché ENTREPRISES** |
| 2 | ***PREPARATION CHANTIER*** |
| 3 | ***VRD / GROS-ŒUVRE*** |
| 4 | Terrassement / décapage |
| 5 | Fondations |
| 6 | Tranchées / réseaux |
| 7 | Dallage béton |
| 8 | Réalisation rampes d'accès |
| 9 | Séchage béton |
| 10 | Réalisation bordures périphériques |
| 11 | Serrurerie clôtures périphériques |
| 12 | Serrurerie escalier |
| 13 | Serrurerie Garde-corps |
| 14 | Modelage des abords / Plantations |
| 15 | ***BATIMENTS MODULAIRES*** |
| 16 | Mise au point plans d'exécution |
| 17 | Fabrication en usine |
| 18 | livraison / Grutage RdC |
| 19 | Assemblage Raccordements |
| 20 | Livraison / Grutage R+1 |
| 21 | Assemblage Raccordements |
| 22 | Habillage façades / finitions |
| 23 | Coursive |
| 24 | Réseaux / CF/cf / CVC |
| 25 | Réseaux / CVC |
| 26 | OPR |
| 27 | LEVEE DES RESERVES |
| 28 | DOE |
| 29 | ***Réception*** |

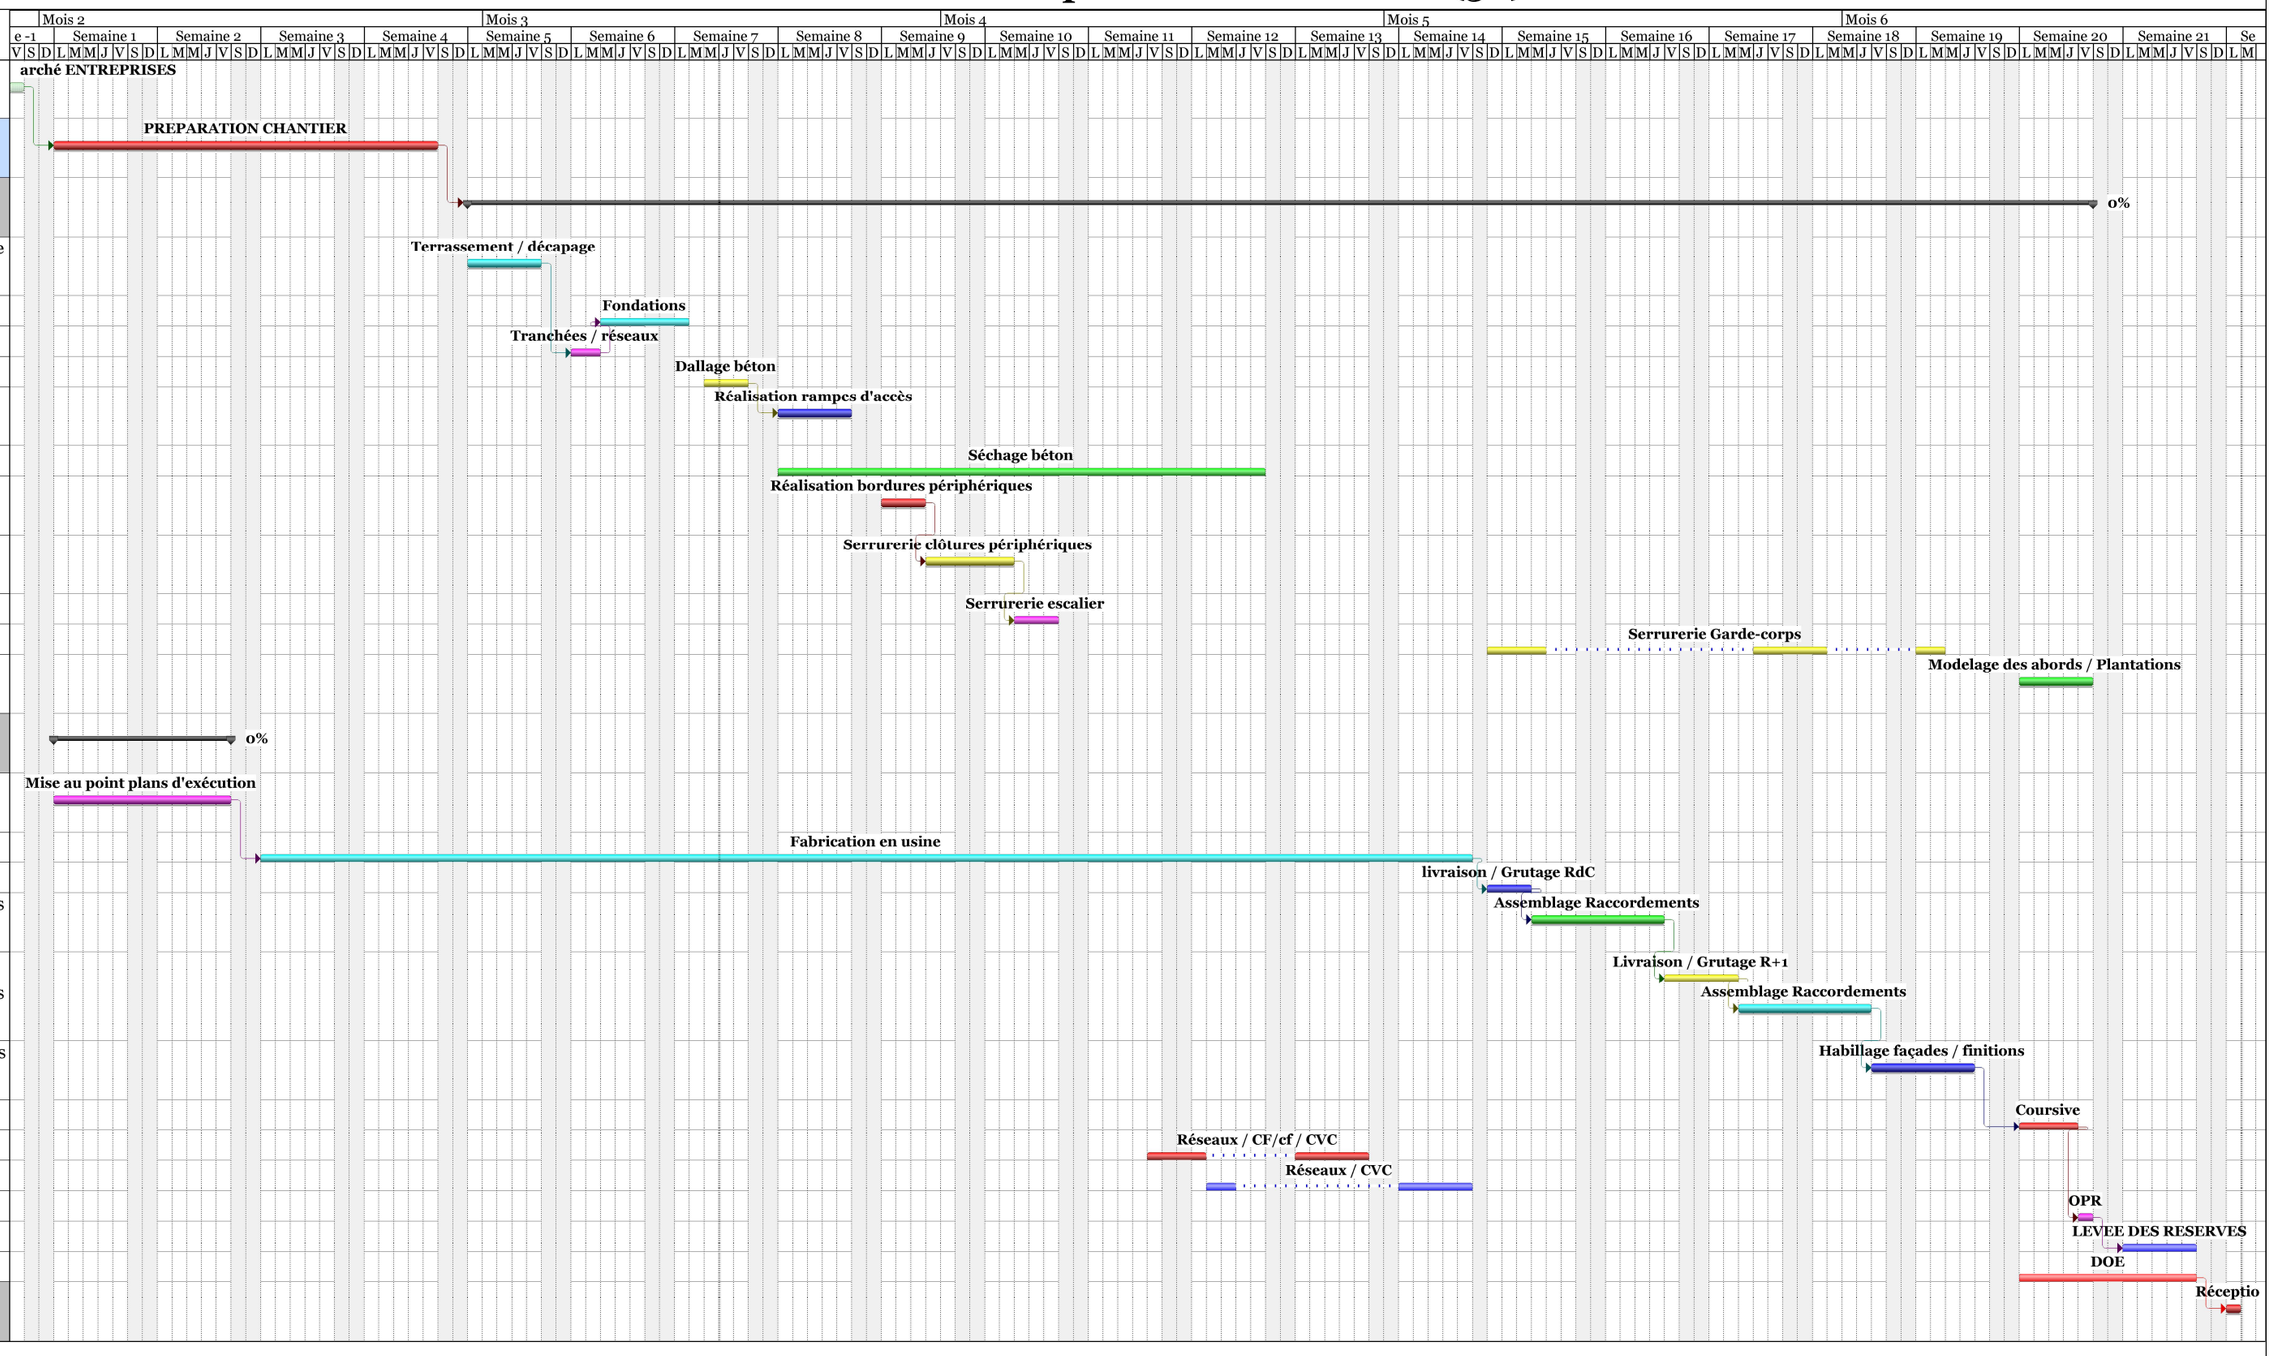


Bâtiments Modulaires Bureaux MA
Date : 18/10/2024

Critiques · Fractionnement critique · Avancement de la tâche critique · Tâche · Fractionnement · Avancement de la tâche · Planifié · Fractionnement planifié · Jalon planifié · Jalon · Récapitulation de l'avancement · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâches externes · Jalons externes · Échéance

MAISON D'ARRET DE NÎMES

ARCHIBEL Sarl
