N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédéc
0		**4634012_DIRES_ARTELIA_MUR_BUSSANG_PLANNING_**	**70 jours**	**Lun 30/06/25**	**Ven 03/10/25**	
1		**1 Travaux préparatoires**	**13 jours**	**Lun 30/06/25**	**Mer 16/07/25**	
2		1.1 Sécurisation du site par alternat et la signalétique	1 jour	Lun 30/06/25	Lun 30/06/25	
3		1.2 Dépose de la glissière de sécurité	1 jour	Mar 01/07/25	Mar 01/07/25	2
4		1.3 Sécurisation et renforcement des accès	1 jour	Mer 02/07/25	Mer 02/07/25	3
5		**1.4 Aménagement du lit du cours d'eau**	**4 jours**	**Jeu 03/07/25**	**Mar 08/07/25**	**4**
6		1.4.1 Mise à sec (big bag + film polyane)	1 jour	Jeu 03/07/25	Jeu 03/07/25	4
7		1.4.2 Zone de décantation	1 jour	Ven 04/07/25	Ven 04/07/25	6
8		1.4.3 Pompage des eaux et pêche de sauvegarde	2 jours	Lun 07/07/25	Mar 08/07/25	7
9		**1.5 Evacuation des matériaux de l'effondrement du mur**	**7 jours**	**Mer 09/07/25**	**Jeu 17/07/25**	**8**
10		1.5.1 Evacuation des matériaux effondrés	2 jours	Mer 09/07/25	Jeu 10/07/25	8
11		1.5.2 Démolition de la maçonnerie disloquée	2 jours	Ven 11/07/25	Lun 14/07/25	10
12		1.5.3 Terrassements et talutage	1 jour	Mar 15/07/25	Mar 15/07/25	11
13		1.5.4 Mise en place de géotextile et de la plateforme de travail en matériaux granulaires	2 jours	Mer 16/07/25	Jeu 17/07/25	12
14		**2 Travaux de réparation du mur**	**41 jours**	**Ven 18/07/25**	**Ven 12/09/25**	**13**
15		2.1 Stabilisation de la maçonnerie existant intacte	2 jours	Ven 18/07/25	Lun 21/07/25	13
16		2.2 Mis en place du coffrage perdu	2 jours	Mar 22/07/25	Mer 23/07/25	15
17		2.3 Forage pour réalisation des clous	9 jours	Jeu 24/07/25	Mar 05/08/25	16
18		2.4 Forage pour mise en place des barbacanes	12 jours	Mer 06/08/25	Jeu 21/08/25	17
19		2.5 Mise en place du ferraillage de la paroi	3 jours	Ven 22/08/25	Mar 26/08/25	18
20		2.6 Réalisation du béton projeté	2 jours	Mer 27/08/25	Jeu 28/08/25	19
21		2.7 Mise en place des enrochements liaisonnés	3 jours	Ven 29/08/25	Mar 02/09/25	20
22		2.8 Remblaiement	2 jours	Mer 03/09/25	Jeu 04/09/25	21
23		2.9 Réalisation de la poutre de couronnement	2 jours	Ven 05/09/25	Lun 08/09/25	22
24		2.10 Remise en place de la terre végétale en tête de mur	1 jour	Mar 09/09/25	Mar 09/09/25	23
25		2.11 Fixation de la glissière	1 jour	Mer 10/09/25	Mer 10/09/25	24
26		2.12 Reprise de l'enrobé	1 jour	Jeu 11/09/25	Jeu 11/09/25	25
27		2.13 Remise en état	1 jour	Ven 12/09/25	Ven 12/09/25	26
28		3 Travaux de drainage sur la totalité du mur (Tranche Optionnelle)	1,5 mois	Jeu 03/07/25	Mer 13/08/25	4
29		**4 Travaux de mise en oeuvre du sabot en enrochements (tranche optionnelle)**	**21 jours**	**Ven 05/09/25**	**Ven 03/10/25**	
30		4.1 Mise à sec complémentaire	3 jours	Ven 05/09/25	Mar 09/09/25	22
31		4.2 Sabot en enrochements liaisonnés	3 semaines	Mer 10/09/25	Mar 30/09/25	30
32		4.3 Remise en état	3 jours	Mer 01/10/25	Ven 03/10/25	31

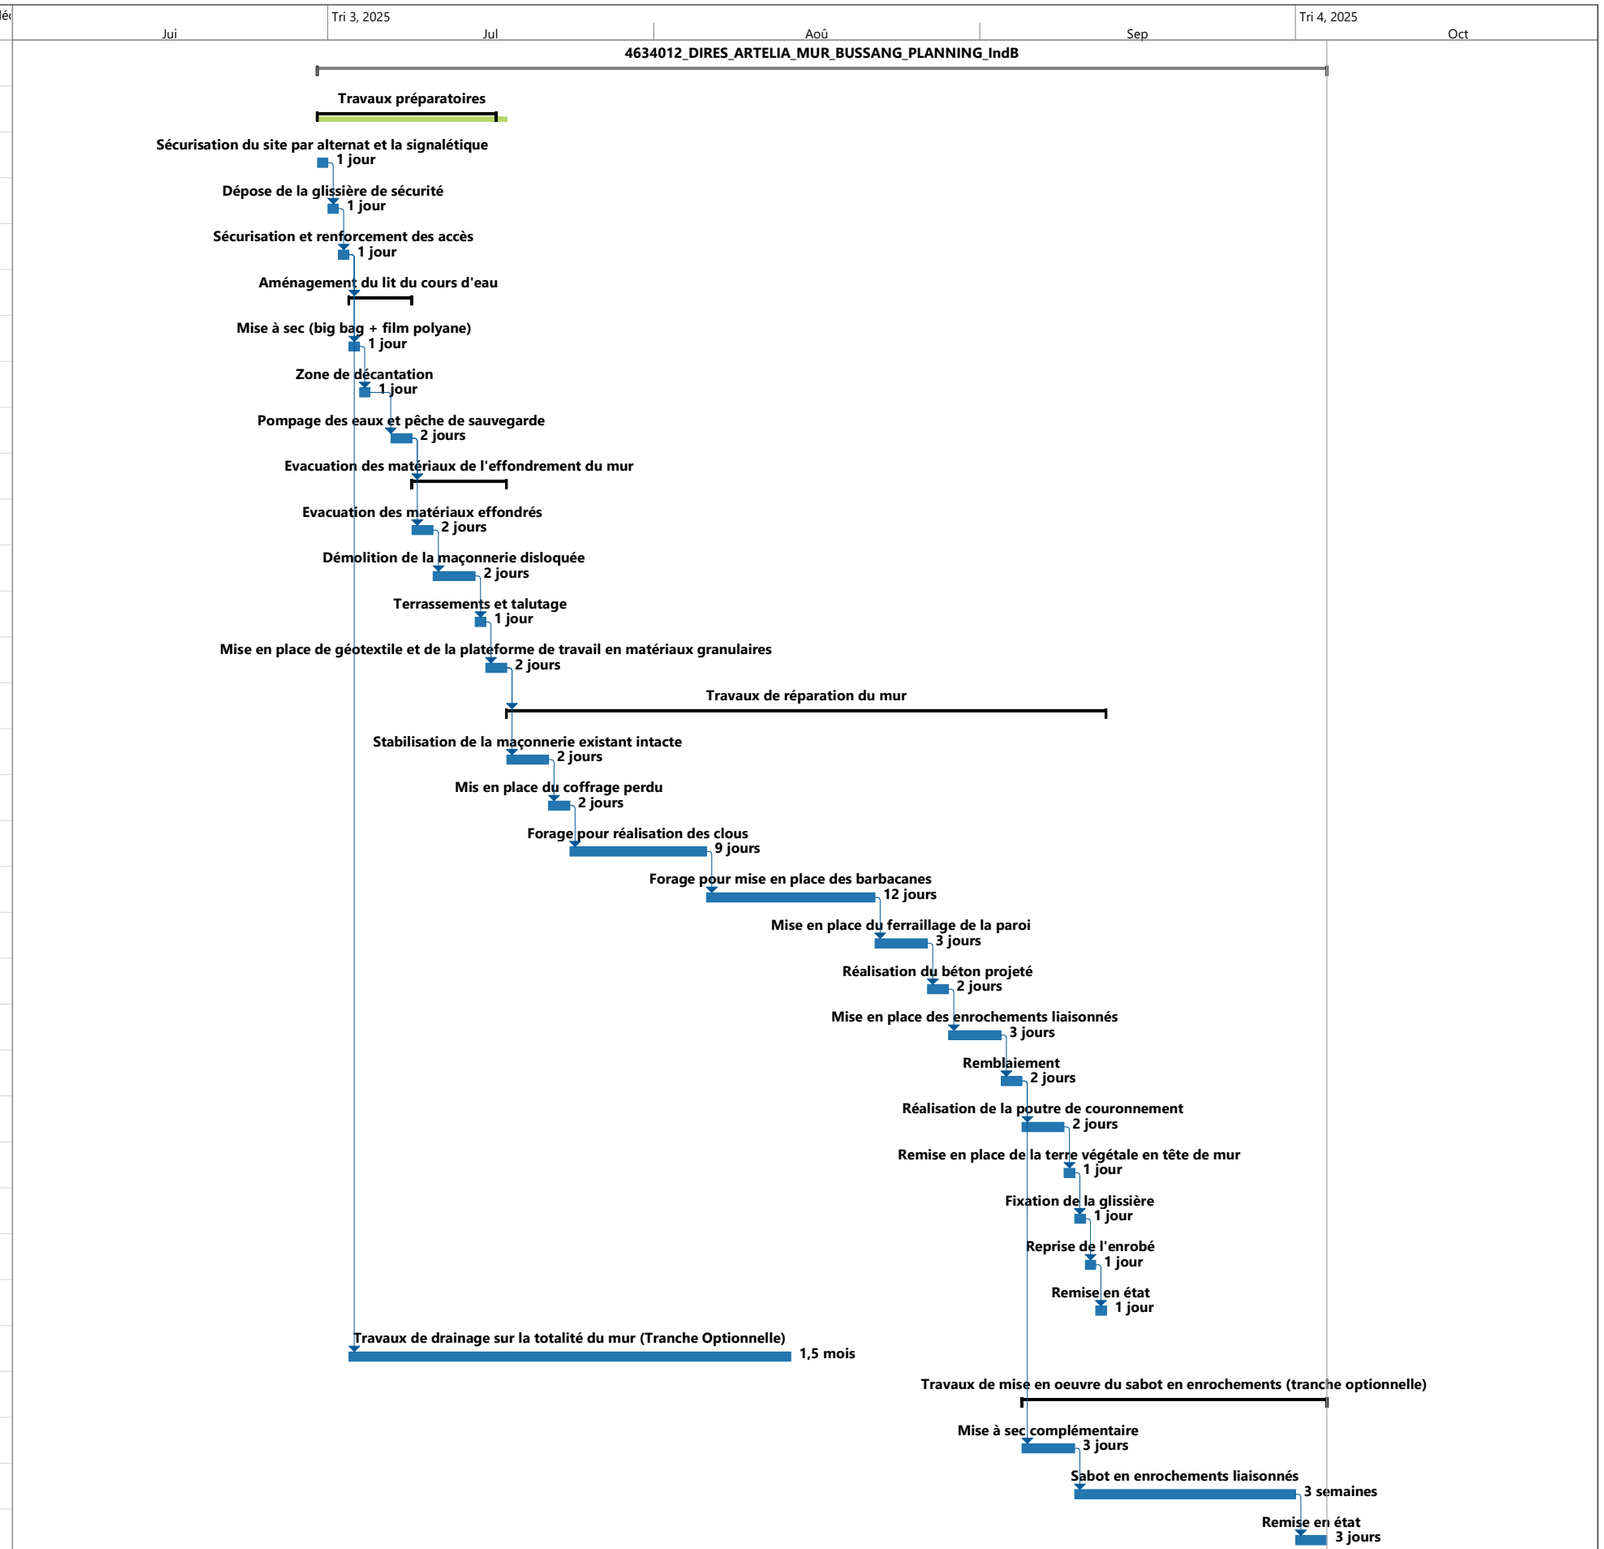

Projet : 4634012_DIRES_ARTEL
Date : Ven 18/10/24

Tâche	Récapitulative	Jalon inactif	Durée uniquement	Début uniquement	Jalons externes	Progression manuelle
Fractionnement	Récapitulatif du projet	Récapitulatif inactif	Report récapitulatif manuel	Fin uniquement	Échéance	
Jalon	Tâche inactive	Tâche manuelle	Récapitulatif manuel	Tâches externes	Avancement	
