PLANNING PRO
RENOVATION BASE FUSCO
BATIMENT EPHREME
LANESTER

Maître d'Ouvrage: Etat - Ministère des armées
Architecte: Bohuon Bertic et CO Architectes

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**PREPARATION**	30 jours	Lun 28/06/27	Ven 06/08/27
2				
3	DEMENAGEMENT	10 jours	Lun 09/08/27	Ven 20/08/27
4	NEUTRALISATION RESEAUX	5 jours	Lun 23/08/27	Ven 27/08/27
5	**BATIMENT EPHREME**	**266 jours**	**Lun 23/08/27**	**Lun 02/10/28**
6	REALISATION D'UNE CHAMBRE TEMOIN	15 jours	Lun 03/01/28	Ven 21/01/28
7	**LOT 01 ECHAFAUDAGE**			
8	Montage échafaudage	20 jours	Lun 04/10/27	Ven 29/10/27
9	Démontage échafauage	15 jours	Lun 22/05/28	Ven 09/06/28
10	**LOT 02 DESAMIANTAGE -CURAGE - DEMOLITION**	**125 jours**	**Lun 23/08/27**	**Ven 25/02/28**
11	**DESAMIANTAGE**	**110 jours**	**Lun 23/08/27**	**Ven 04/02/28**
12	RDC	30 jours	Lun 23/08/27	Ven 01/10/27
13	R+1 aile nord	40 jours	Lun 04/10/27	Ven 26/11/27
14	R+1 aile nord	40 jours	Lun 29/11/27	Ven 04/02/28
15	Traitement du plomb	5 jours	Lun 07/02/28	Ven 11/02/28
16	**DEMOLITIONS**	**80 jours**	**Lun 25/10/27**	**Ven 25/02/28**
17	Démolition et purge intérieur	80 jours	Lun 25/10/27	Ven 25/02/28
18	Dépose ITE	25 jours	Lun 24/01/28	Ven 25/02/28
19	**LOT 03 GROS OEUVRE + CHRAPENTE BOIS + ETANCHEITE + MEN EXT + SERRURERIE BARDAGE RAVALEMENT**	**75 jours**	**Lun 07/02/28**	**Ven 19/05/28**
20	**GROS OEUVRE**	**29 jours**	**Lun 14/02/28**	**Jeu 23/03/28**
21	Frangements de murs	5 jours	Lun 14/02/28	Ven 18/02/28
22	Obturation d'ouvertures	5 jours	Lun 21/02/28	Ven 25/02/28
23	isolation de plancher haut de	5 jours	Lun 28/02/28	Ven 03/03/28
24	Carottages	4 jours	Lun 06/03/28	Jeu 09/03/28
25	Aménagements extérieurs	10 jours	Ven 10/03/28	Jeu 23/03/28
26	**ETANCHEITE**	**60 jours**	**Lun 28/02/28**	**Ven 19/05/28**
27	Dépose étachéité existante	20 jours	Lun 28/02/28	Ven 24/03/28
28	Etanchéité + isolation	15 jours	Lun 27/03/28	Ven 14/04/28
29	Divers finition (DEP...)	5 jours	Lun 15/05/28	Ven 19/05/28
30	**MENUISERIES EXTERIEURES**	**35 jours**	**Lun 07/02/28**	**Ven 24/03/28**
31	Dépose Menuiseries ext	10 jours	Lun 07/02/28	Ven 18/02/28
32	Pose menuiseries ext	20 jours	Lun 28/02/28	Ven 24/03/28
33	METALLERIE	5 jours	Lun 27/03/28	Ven 31/03/28
34	**BARDAGE RAVALEMENT**	**90 jours**	**Lun 14/02/28**	**Ven 16/06/28**
35	Appuis menuiserie	10 jours	Lun 14/02/28	Ven 25/02/28
36	Isolation ext	20 jours	Lun 20/03/28	Ven 14/04/28
37	Bardage	20 jours	Lun 17/04/28	Ven 12/05/28
38	Divers finition	10 jours	Lun 15/05/28	Ven 26/05/28
39	GC Toiture	10 jours	Lun 29/05/28	Ven 09/06/28
40	Enduit sous préaux	5 jours	Lun 12/06/28	Ven 16/06/28
41	**LOT 04 MEN INT + CLOISONS + FAUX-PLAFONDS**	**93 jours**	**Lun 20/03/28**	**Mer 26/07/28**
42	MENUISERIES INTERIEURES BOI	30 jours	Lun 22/05/28	Mer 26/07/28
43	CLOISONS DOUBLAGES	50 jours	Lun 20/03/28	Ven 26/05/28
44	**LOT 05 RVTS DE SOLS -FAIENCE + PEINTURE**	**65 jours**	**Lun 01/05/28**	**Ven 28/07/28**
45	REVETEMENTS DE SOLS	40 jours	Lun 05/06/28	Ven 28/07/28
46	PEINTURE	50 jours	Lun 01/05/28	Ven 07/07/28
47	**LOT 07 ELECTRICITE**	60 jours	Lun 28/02/28	Ven 29/09/28
48	**LOT 08 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION**	60 jours	Lun 28/02/28	Lun 02/10/28
49	**Construction Extension**	**128 jours**	**Lun 07/02/28**	**Mer 02/08/28**
50	**LOT 03 GROS OEUVRE + CHRAPENTE BOIS + ETANCHEITE + MEN EXT + SERRURERIE BARDAGE RAVALEMENT**	**78 jours**	**Lun 07/02/28**	**Mer 24/05/28**
51	**GO**	**45 jours**	**Lun 07/02/28**	**Ven 07/04/28**
52	Terrassements	5 jours	Lun 07/02/28	Ven 11/02/28
53	Fondation spéciale	5 jours	Lun 14/02/28	Ven 18/02/28
54	Longrine	4 jours	Lun 21/02/28	Jeu 24/02/28
55	Dallage	5 jours	Ven 25/02/28	Jeu 02/03/28
56	élévation RDC	10 jours	Ven 03/03/28	Jeu 16/03/28
57	Plancher haut RDC	7 jours	Mar 14/03/28	Mer 22/03/28
58	Elévation R+1	5 jours	Jeu 23/03/28	Mer 29/03/28
59	Acrotère	5 jours	Jeu 30/03/28	Mer 05/04/28
60	Divers (seuils, appuis, dressements...)	5 jours	Lun 03/04/28	Ven 07/04/28
61	**CHARPENTE**	**35 jours**	**Jeu 06/04/28**	**Mer 24/05/28**
62	MOB	15 jours	Jeu 06/04/28	Mer 26/04/28
63	Charpente	5 jours	Jeu 27/04/28	Mer 03/05/28
64	Solivage	5 jours	Jeu 18/05/28	Mer 24/05/28
65	Divers finition	2 jours		
66	**ETANCHEITE**	**15 jours**	**Jeu 04/05/28**	**Mer 24/05/28**
67	Terrasse inaccessible végé	15 jours	Jeu 04/05/28	Mer 24/05/28
68	Divers finition (DEP...)			
69	**MENUISERIES EXTERIEURES**	5 jours	Jeu 18/05/28	Mer 24/05/28
70	**BARDAGE RAVALEMENT**	15 jours	Jeu 25/05/28	Mer 14/06/28
71	**LOT 04 MEN INT + CLOISONS + FAUX-PLAFONDS**	**50 jours**	**Jeu 25/05/28**	**Mer 02/08/28**
72	MENUISERIES INTERIEURES B	10 jours	Jeu 22/06/28	Mer 02/08/28
73	CLOISONS DOUBLAGES	20 jours	Jeu 25/05/28	Mer 21/06/28
74	**LOT 05 RVTS DE SOLS -FAIENCE + PEINTURE**	**30 jours**	**Jeu 22/06/28**	**Mer 02/08/28**
75	REVETEMENTS DE SOLS	15 jours	Jeu 13/07/28	Mer 02/08/28
76	PEINTURE	20 jours	Jeu 22/06/28	Mer 19/07/28
77	**LOT 07 ELECTRICITE**	30 jours	Jeu 25/05/28	Mar 01/08/28
78	**LOT 08 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION**	30 jours	Jeu 25/05/28	Mar 01/08/28
79	FINITION TCE	20 jours	Lun 31/07/28	Ven 15/09/28
80	**LOT 06 NETTOYAGE OPR**	**5 jours**	**Lun 18/09/28**	**Ven 22/09/28**
81	OPR	5 jours	Lun 25/09/28	Ven 29/09/28
82	Levée des OPR	15 jours	Lun 09/10/28	Ven 27/10/28
83	**LOT 06 NETTOYAGE de livraison**	**5 jours**	**Lun 30/10/28**	**Ven 03/11/28**
84	10 jours de fermeture chantier pour comémoration	10 jours	Lun 06/11/28	Ven 17/11/28
85	**RECEPTION**	1 jour	Lun 20/11/28	Lun 20/11/28

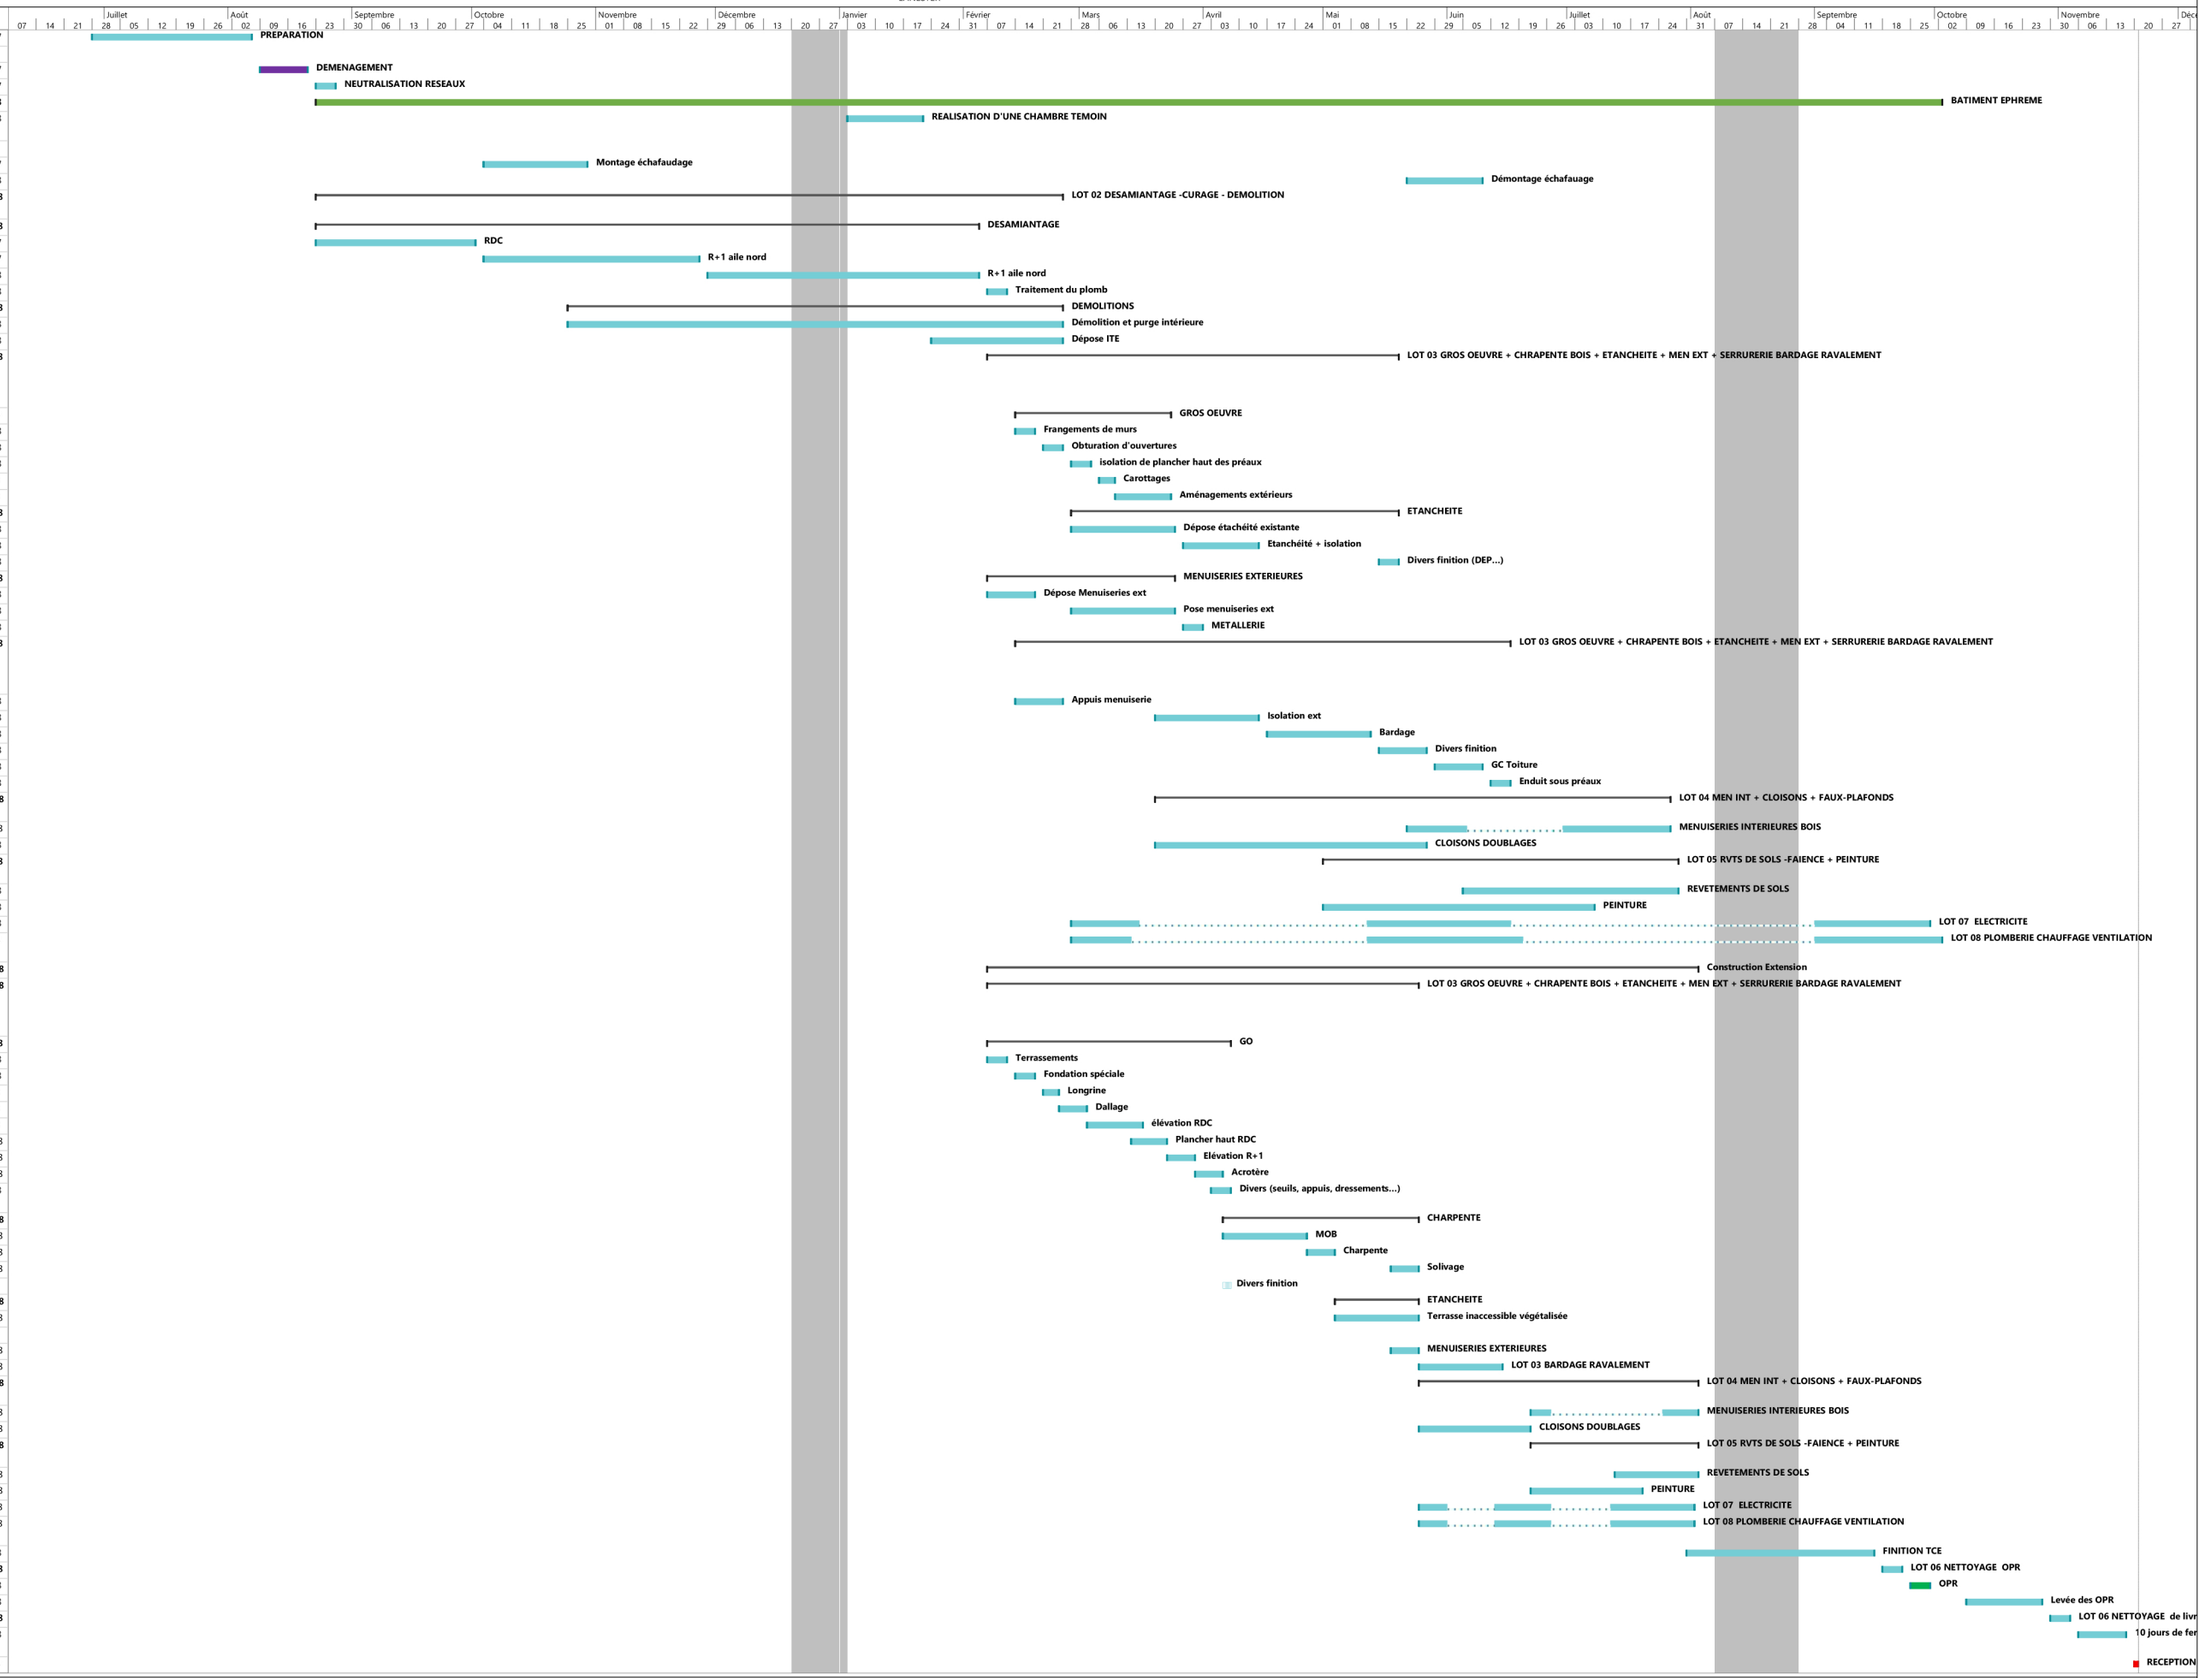

Planning compris 5 semaines de congés par an
Délais désamiantage et déplombage à confirmer selon cartographie

09-5-2025
