RENOVATION DU BATIMENT DE LOGEMENT N°0268 (26 E) ET CREATION D'UN PARKING D'UNE CINQUANTAINE DE PLACES EN EXTERIEUR SUR LA Base Aéronautique Navale de LANDIVISIAU (29) - Planning DCE

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée
0		**Calendrier DCE RENOVATION DU BATIMENT DE LOGEMENT N°0268 (26 E) ET CREATION D'UN PARKING D'UNE CINQUANTAINE DE PLACES EN EXTERIEUR SUR LA Base Aéronautique Navale de LANDIVISIAU (29)**	**256 j**
1		**PREPARATION**	**25 j**
2		OS Démarrage Préparation	0 j
3		Préparation / Installations de chantier	1 ms
4		Plan de retrait amiante	4 s
5		Démarrage Travaux	0 j
6		**Lot 01 VRD**	**192 j**
7		repérage réseaux, dévoiement réseaux et terrassement généraux	4 s
8		Abattages des arbres	5 j
9		Voirie	12 j
10		Aménagement extérieur	15 j
11		Espaces vert	5 j
12		finitions diverses	5 j
13		**Lot 02 Gros Œuvre**	**77 j**
14		**Rénovation batiment**	**77 j**
15		Curage avant désamiantage	2 s
16		Désamiantage (plinthes, conduites et peinture plafond (une piece).	6 s
17		Démolition et curage apres désamiantage, compris charpente	3 s
18		Réseaux sous dallage compris création démolition	5 j
19		Percement des planchers, murs intérieures et extérieurs	7 s
20		Fondation gaine ascenseur	5 j
21		Elévation gaine ascenseur	10 j
22		Finition appuis et seuils	10 j
23		Etanchéité voiles enterrés, compris terrassement	30 j
24		**Local Poubelles et vélos**	**15 j**
25		implantation	1 j
26		Fondation	2 j
27		voiles	7 j
28		Dallage	3 j
29		finitions	2 j
30		**Lot 03 Charpente**	**109 j**
31		Ossature support de la toiture du bâtiment existant	10 j
32		Ossature support de la toiture des locaux poubelles et vélos	5 j
33		Ossature et bardage sur existant	20 j
34		pose de claustras bois	4 j
35		**Lot 04 Couverture**	**18 j**
36		Couverture en tôles d'acier galvanisé sur batiment existant	10 j
37		diverses fintions (EP, rives faitages...)	5 j
38		couverture en zinc à joint debout pour l'ensemble des pans de la toiture du local vélo	5 j
39		**Lot 05 Traitement des facades - enduits**	**30 j**
40		préparation des supports	10 j
41		application peintures	20 j
42		**Lot 06 Menuiseries extérieures**	**115 j**
43		pose des menuiseries	30 j
44		finitions, réglages de fin de chantier	10 j
45		**Lot 07 Métallerie**	**85 j**
46		Fourniture et pose de blocs porte métallique	5 j
47		Réalisation des escaliers métallique extérieurs	10 j
48		Mains courantes et gardes corps	15 j
49		grilles de ventilation, BAL, rateliers vélos et diverses finitions	10 j
50		**Lot 08 Cloisons-Doublages-faux plafonds**	**93 j**
51		pose cloisons doublages et plafonds placo	60 j
52		pose des plafonds démontables	10 j
53		**Lot 09 Menuiseries intérieures**	**135 j**
54		appros huisseires	1 j

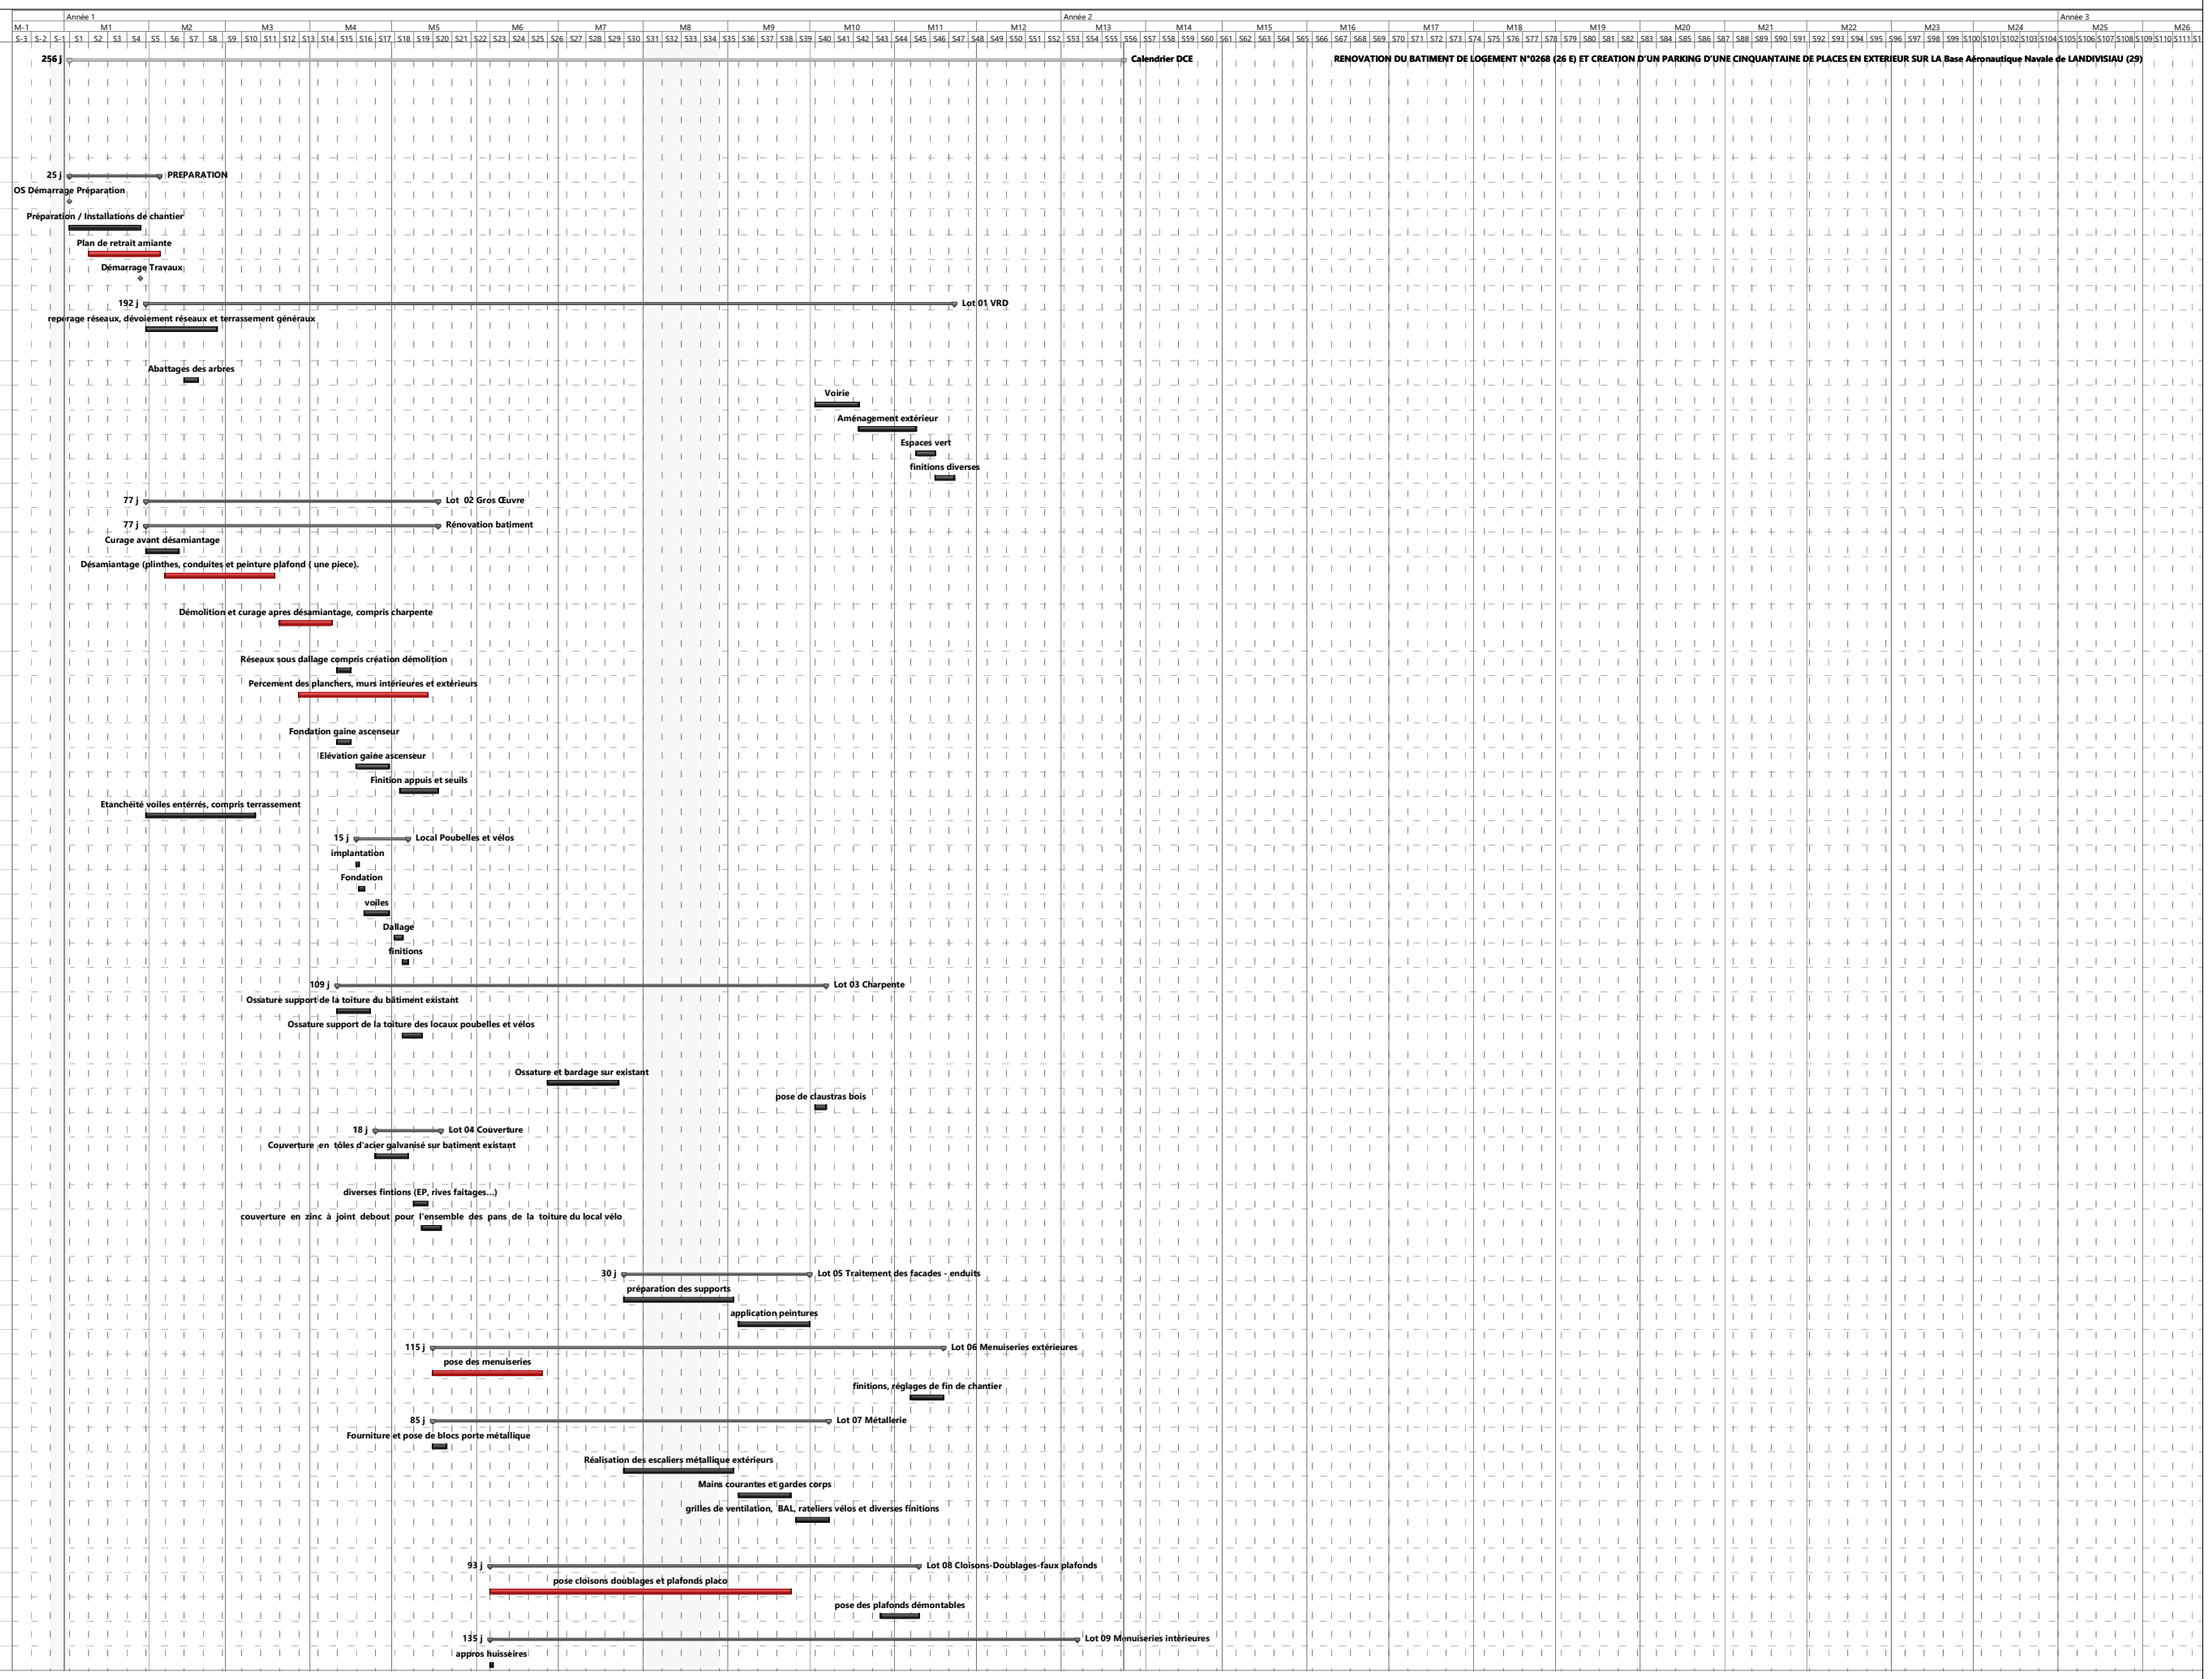

Planning compris congés et hors intempéries

Etabli par OTEIS

RENOVATION DU BATIMENT DE LOGEMENT N°0268 (26 E) ET CREATION D'UN PARKING D'UNE CINQUANTAINE DE PLACES EN EXTERIEUR SUR LA Base Aéronautique Navale de LANDIVISIAU (29) - Planning DCE
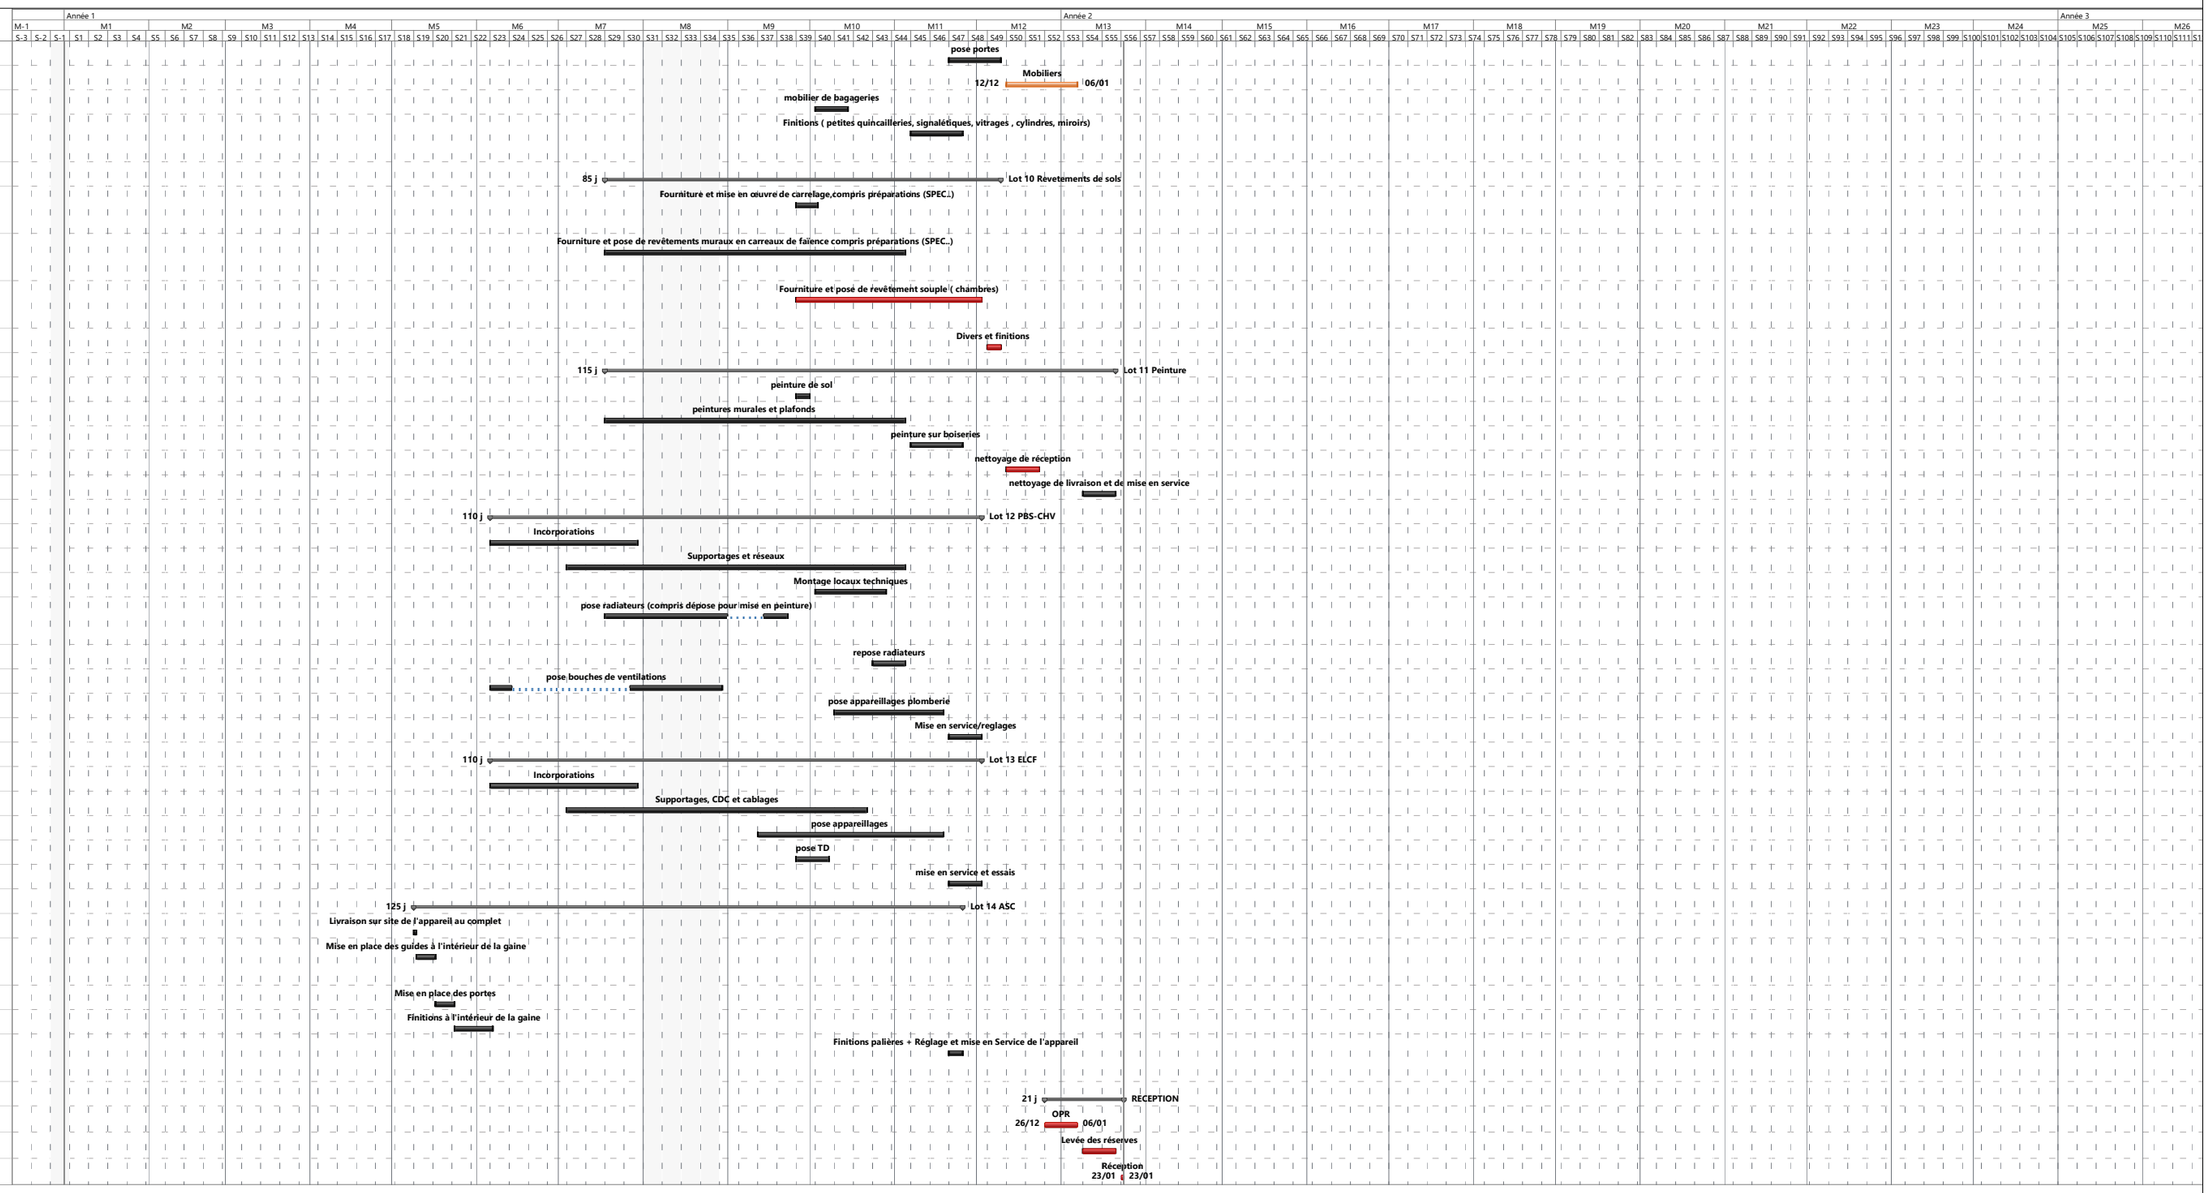
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée
55		pose portes	15 j
56		Mobiliers	20 j
57		mobilier de bagageries	10 j
58		Finitions (petites quincailleries, signalétiques, vitrages , cylindres, miroirs)	15 j
59		**Lot 10 Revetements de sols**	**85 j**
60		Fourniture et mise en œuvre de carrelage,compris préparations (SPEC..)	6 j
61		Fourniture et pose de revêtements muraux en carreaux de faïence compris préparations (SPEC..)	60 j
62		Fourniture et pose de revêtement souple (chambres)	50 j
63		Divers et finitions	5 j
64		**Lot 11 Peinture**	**115 j**
65		peinture de sol	5 j
66		peintures murales et plafonds	60 j
67		peinture sur boiseries	15 j
68		nettoyage de réception	10 j
69		nettoyage de livraison et de mise en service	10 j
70		**Lot 12 PBS-CHV**	**110 j**
71		Incorporations	40 j
72		Supportages et réseaux	70 j
73		Montage locaux techniques	20 j
74		pose radiateurs (compris dépose pour mise en peinture)	20 j
75		repose radiateurs	10 j
76		pose bouches de ventilations	10 j
77		pose appareillages plomberie	30 j
78		Mise en service/reglages	10 j
79		**Lot 13 ELCF**	**110 j**
80		Incorporations	40 j
81		Supportages, CDC et cablages	60 j
82		pose appareillages	50 j
83		pose TD	10 j
84		mise en service et essais	10 j
85		**Lot 14 ASC**	**125 j**
86		Livraison sur site de l'appareil au complet	1 j
87		Mise en place des guides à l'intérieur de la gaine	5 j
88		Mise en place des portes	5 j
89		Finitions à l'intérieur de la gaine	10 j
90		Finitions palières + Réglage et mise en Service de l'appareil	5 j
91		**RECEPTION**	**21 j**
92		OPR	2 s
93		Levée des réserves	2 s
94		Réception	1 j
