Planning prévisionnel - 2025MFAL - Chaufferie Bois CMA
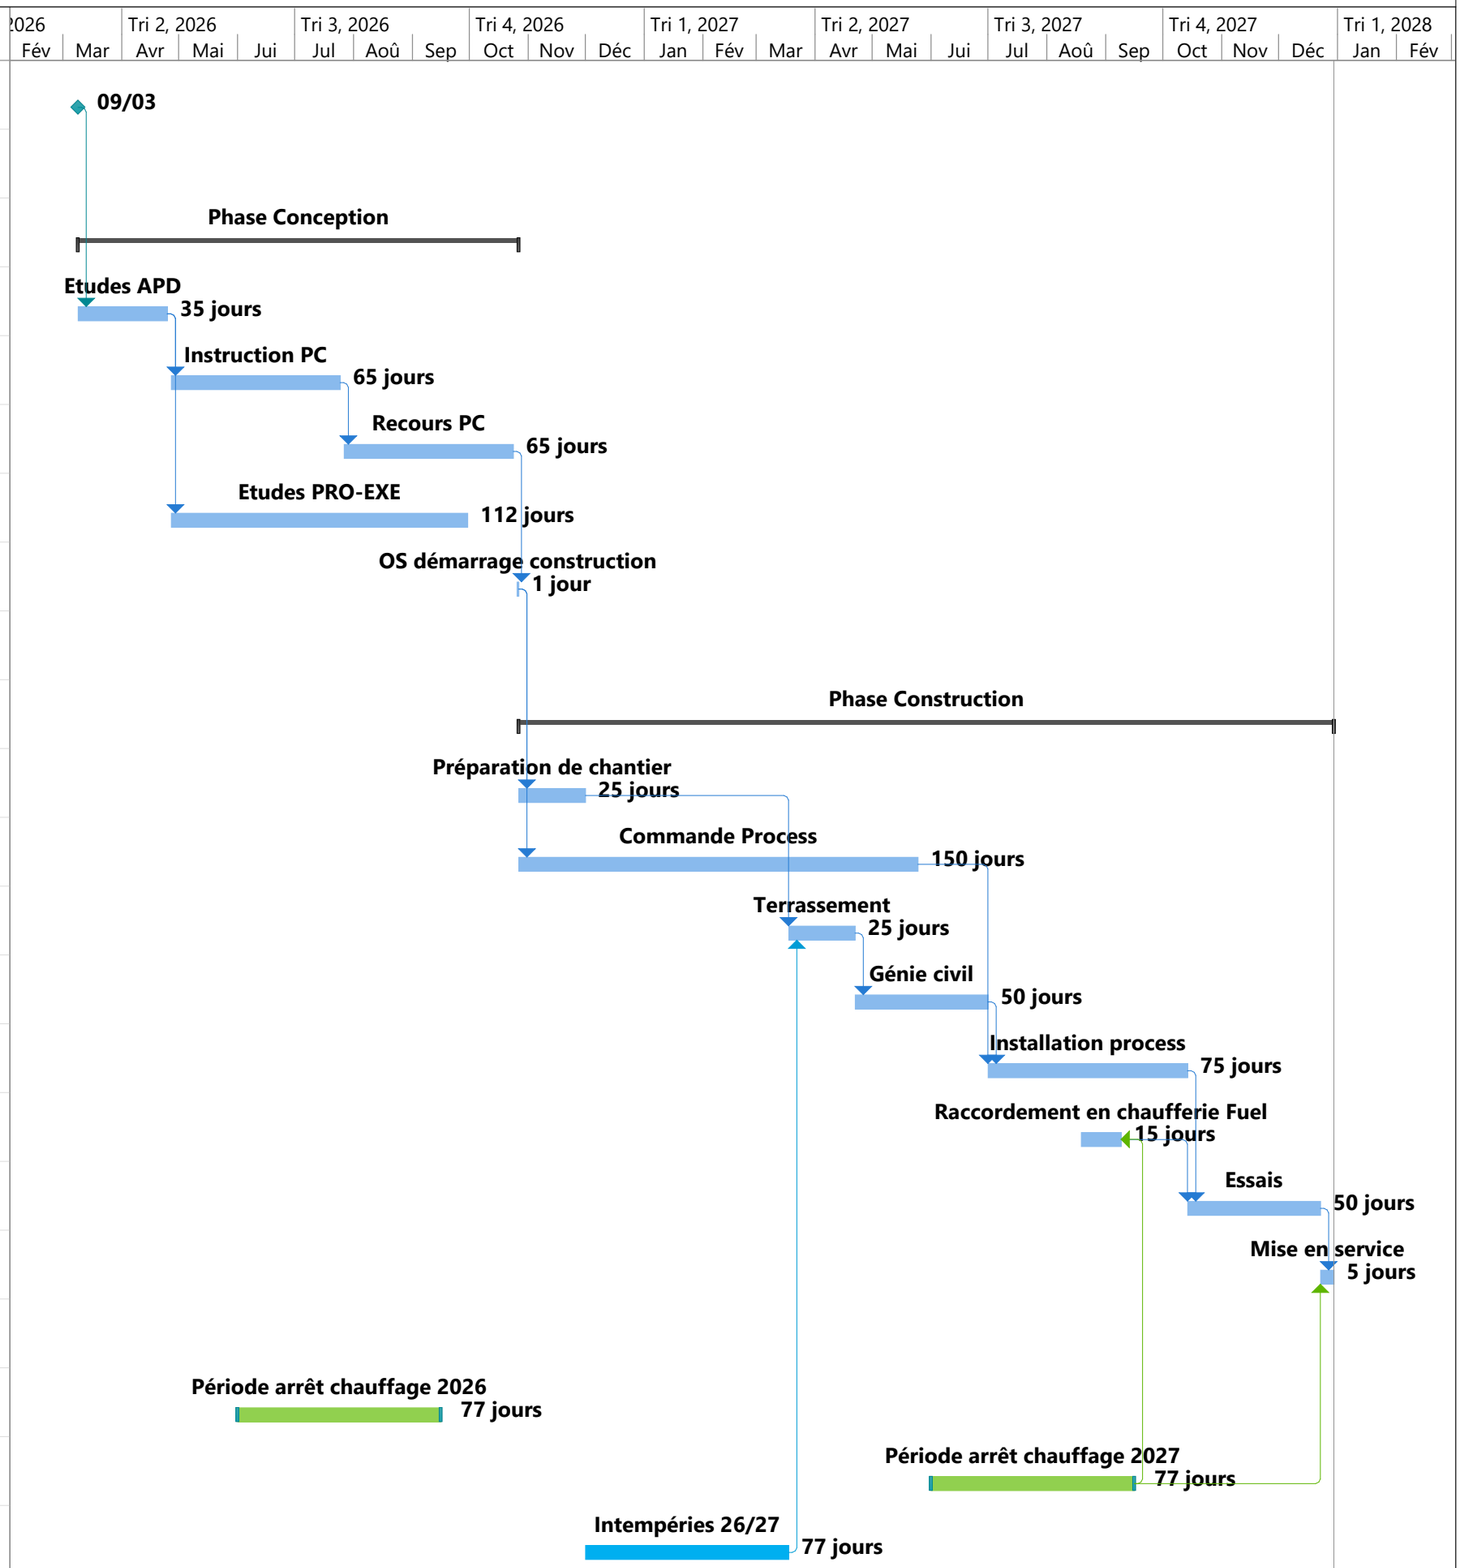
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		Notification du contrat	0 jour	Lun 09/03/26	Lun 09/03/26
2					
3		**Phase Conception**	**166 jours**	**Lun 09/03/26**	**Lun 26/10/26**
4		Etudes APD	35 jours	Lun 09/03/26	Ven 24/04/26
5		Instruction PC	65 jours	Lun 27/04/26	Ven 24/07/26
6		Recours PC	65 jours	Lun 27/07/26	Ven 23/10/26
7		Etudes PRO-EXE	112 jours	Lun 27/04/26	Mar 29/09/26
8		OS démarrage construction	1 jour	Lun 26/10/26	Lun 26/10/26
9					
10		**Phase Construction**	**307 jours**	**Mar 27/10/26**	**Mer 29/12/27**
11		Préparation de chantier	25 jours	Mar 27/10/26	Lun 30/11/26
12		Commande Process	150 jours	Mar 27/10/26	Lun 24/05/27
13		Terrassement	25 jours	Jeu 18/03/27	Mer 21/04/27
14		Génie civil	50 jours	Jeu 22/04/27	Mer 30/06/27
15		Installation process	75 jours	Jeu 01/07/27	Mer 13/10/27
16		Raccordement en chaufferie Fuel	15 jours	Jeu 19/08/27	Mer 08/09/27
17		Essais	50 jours	Jeu 14/10/27	Mer 22/12/27
18		Mise en service	5 jours	Jeu 23/12/27	Mer 29/12/27
19					
20		Période arrêt chauffage 2026	77 jours	Lun 01/06/26	Mar 15/09/26
21		Période arrêt chauffage 2027	77 jours	Mar 01/06/27	Mer 15/09/27
22		Intempéries 26/27	77 jours	Mar 01/12/26	Mer 17/03/27
