N°	Mo	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesse	Noms ressources	% achevé
1		PYRENEES 2026						0%
2		**Labélisation / AAP**	**2054 jour**	**Mar 01/01/19**	**Sam 14/11/26**		MRPIE;Direction;I	**36%**
3		Sourcing partenaires occupants	7 moisé	Mar 20/02/24	Mar 17/09/24			46%
4		Evaluation de la valeur de cession du bâtiment	0 jour	Mar 18/06/24	Mar 18/06/24			10...
5		**CTI/CSI**	**0 jour**	**Ven 18/10/24**	**Ven 18/10/24**			0%
6		Avis RRPIE	0 jour	*Mar 01/01/19*	*Mar 01/01/19*			0%
7		**CNIP**	**22 jours**	**Ven 03/01/25**	**Mar 04/02/25**			**0%**
8		**Remise du dossier CNIP**	**1 jour**	**Ven 03/01/25**	**Ven 03/01/25**			0%
9		**Passage en CNIP**	**0 jour**	**Mar 04/02/25**	**Mar 04/02/25**			0%
10		*Déménagement médiateur*	2 moisé	Mar 15/09/26	Sam 14/11/26			0%
11		**Conception**	**774 jours**	**Mer 02/08/23**	**Lun 20/07/26**			**15%**
12		**Programme**	**238 jours**	**Mer 02/08/23**	**Ven 28/06/24**			**91%**
13		Interviews des services	78 jours	Mer 02/08/23	Ven 17/11/23			10...
14		Etudes	6 mois	Mer 01/11/23	Ven 26/04/24		PEA	10...
15		Arbitrage / Validation Programme	1 mois	Lun 03/06/24	Ven 28/06/24		Direction	0%
16		**Diag / AMO**	**700 jours**	**Mar 14/11/23**	**Lun 20/07/26**			**13%**
50		Diag technique BAT	93 jours	Mer 02/08/23	Ven 08/12/23			10...
51		**ESQ**	224 jours	**Mar 23/07/24**	**Ven 30/05/25**			**0%**
52		Validation des lignes directrices	1 jour	Mar 23/07/24	Mar 23/07/24			0%
53		Etude ESQ	6,5 moisé	Ven 06/09/24	Jeu 20/03/25	15FD+50 j	BAT	0%
54		Envoi des plans pour validation services	1 jour	Ven 28/03/25	Ven 28/03/25			0%
55		Validation des plans	2 semaine	Lun 31/03/25	Ven 11/04/25	54		0%
56		Rédaction mémoire	3 semaine	Lun 14/04/25	Ven 02/05/25	55		0%
57		Relecture BAT	1 semaine	Lun 05/05/25	Ven 09/05/25	56		0%
58		Relecture COP	1 semaine	Lun 12/05/25	Ven 16/05/25	57		0%
59		Validation	2 semaine	Lun 19/05/25	Ven 30/05/25	58	Direction	0%
60		COPIL	0 jour	Mar 27/05/25	Mar 27/05/25		Direction	0%
61		**APS**	**74 jours**	**Mar 27/05/25**	**Ven 05/09/25**			**0%**
62		Etude APS	2,5 moisé	Mar 27/05/25	Dim 10/08/25	60	BAT	0%
63		Relecture interne	2 semaine	Lun 11/08/25	Ven 22/08/25	62		0%
64		Validation	2 semaine	Lun 25/08/25	Ven 05/09/25	63	Direction	0%
65		**APD**	**84 jours**	**Ven 05/09/25**	**Jeu 01/01/26**			**0%**
66		Etude APD	3 moisé	Ven 05/09/25	Jeu 04/12/25	64	BAT	0%
67		Relecture interne	2 semaine	Ven 05/12/25	Jeu 18/12/25	66		0%
68		Validation	2 semaine	Ven 19/12/25	Jeu 01/01/26	67	Direction	0%
69		**Passation des marchés de travaux**	**231 jours**	**Jeu 01/01/26**	**Ven 20/11/26**			**0%**
70		PRO/DCE	3 moisé	Jeu 01/01/26	Mer 01/04/26	68	BAT;COP	0%
71		Validation service marché	2 semaine	Jeu 19/03/26	Mer 01/04/26	70FF	PAI	0%
72		Validation RMA	5 semaine	Ven 02/01/26	Jeu 05/02/26	68		0%
73		Consultation	3 moisé	Mer 01/04/26	Mar 30/06/26	72;71	COP	0%
74		Analyse / négociation	2 moisé	Mar 30/06/26	Sam 29/08/26	73	BAT;COP	0%
75		Relecture interne / production COP	2 semaine	Lun 31/08/26	Ven 11/09/26	74		0%
76		Passage en CIM	1 mois	Lun 14/09/26	Ven 09/10/26	75		0%
77		Demande EJ/ Attribution	1 moisé	Ven 09/10/26	Dim 08/11/26	76		0%
78		Notification des marchés de travaux	2 semaine	Lun 09/11/26	Ven 20/11/26	77	COP	0%
79		**Travaux**	**442 jours**	**Ven 20/11/26**	**Mar 01/08/28**			**0%**
80		**Préparation Travaux**	**2 moisé**	**Ven 20/11/26**	**Mar 19/01/27**	**78**		**0%**
81		**Phase 1**	**116 jours**	**Mer 06/01/27**	**Mer 16/06/27**			**0%**
82		Déménagement R-1	2 semaine	Mer 06/01/27	Mar 19/01/27	80FD-10 j	OMNITECH	0%
83		Travaux R-1 & Ascenseur, colonnes, ...	4 moisé	Mar 19/01/27	Mer 19/05/27	82		0%
84		réception partielle ?	1 mois	Jeu 20/05/27	Mer 16/06/27	83		0%
85		**Phase 2**	**116 jours**	**Jeu 03/06/27**	**Jeu 11/11/27**			**0%**
86		Déménagement	2 semaine	Jeu 03/06/27	Mer 16/06/27	84FD-10 j	OMNITECH;Servic	0%
87		Travaux RDC & R+1	4 moisé	Mer 16/06/27	Jeu 14/10/27	86		0%
88		Réception partielle	1 mois	Ven 15/10/27	Jeu 11/11/27	87		0%
89		**Phase 3**	**146 jours**	**Ven 29/10/27**	**Ven 19/05/28**			**0%**
90		Déménagement	2 semaine	Ven 29/10/27	Jeu 11/11/27	88FD-10 j	OMNITECH;Servic	0%
91		Travaux R+2 & R+3	5 moisé	Jeu 11/11/27	Dim 09/04/28	90		0%
92		Réception partielle	1 mois	Lun 10/04/28	Ven 05/05/28	91		0%
93		*Aménagement des médiateurs*	*2 semaine*	*Lun 08/05/28*	*Ven 19/05/28*	92		0%
94		**Phase 4**	**72 jours**	**Lun 24/04/28**	**Mar 01/08/28**			**0%**
95		Déménagement	2 semaine	Lun 24/04/28	Ven 05/05/28	92FD-10 j	OMNITECH;Servic	0%
96		Travaux R+4	2 moisé	Ven 05/05/28	Mar 04/07/28	95		0%
97		Réception	1 mois	Mer 05/07/28	Mar 01/08/28	96		0%
98								
99		**Communication**	304 jours	Jeu 28/03/24	Mar 27/05/25			60%
100		Présentation aux agents	1 jour	Jeu 28/03/24	Jeu 28/03/24			10...
101		Point d'information	1 jour	Mar 02/07/24	Mar 02/07/24			10...
102		Point d'information	1 jour	Mar 15/10/24	Mar 15/10/24			10...
103		Point d'information	1 jour	Mar 21/01/25	Mar 21/01/25			0%
104		Point d'information	1 jour	Mar 27/05/25	Mar 27/05/25			0%

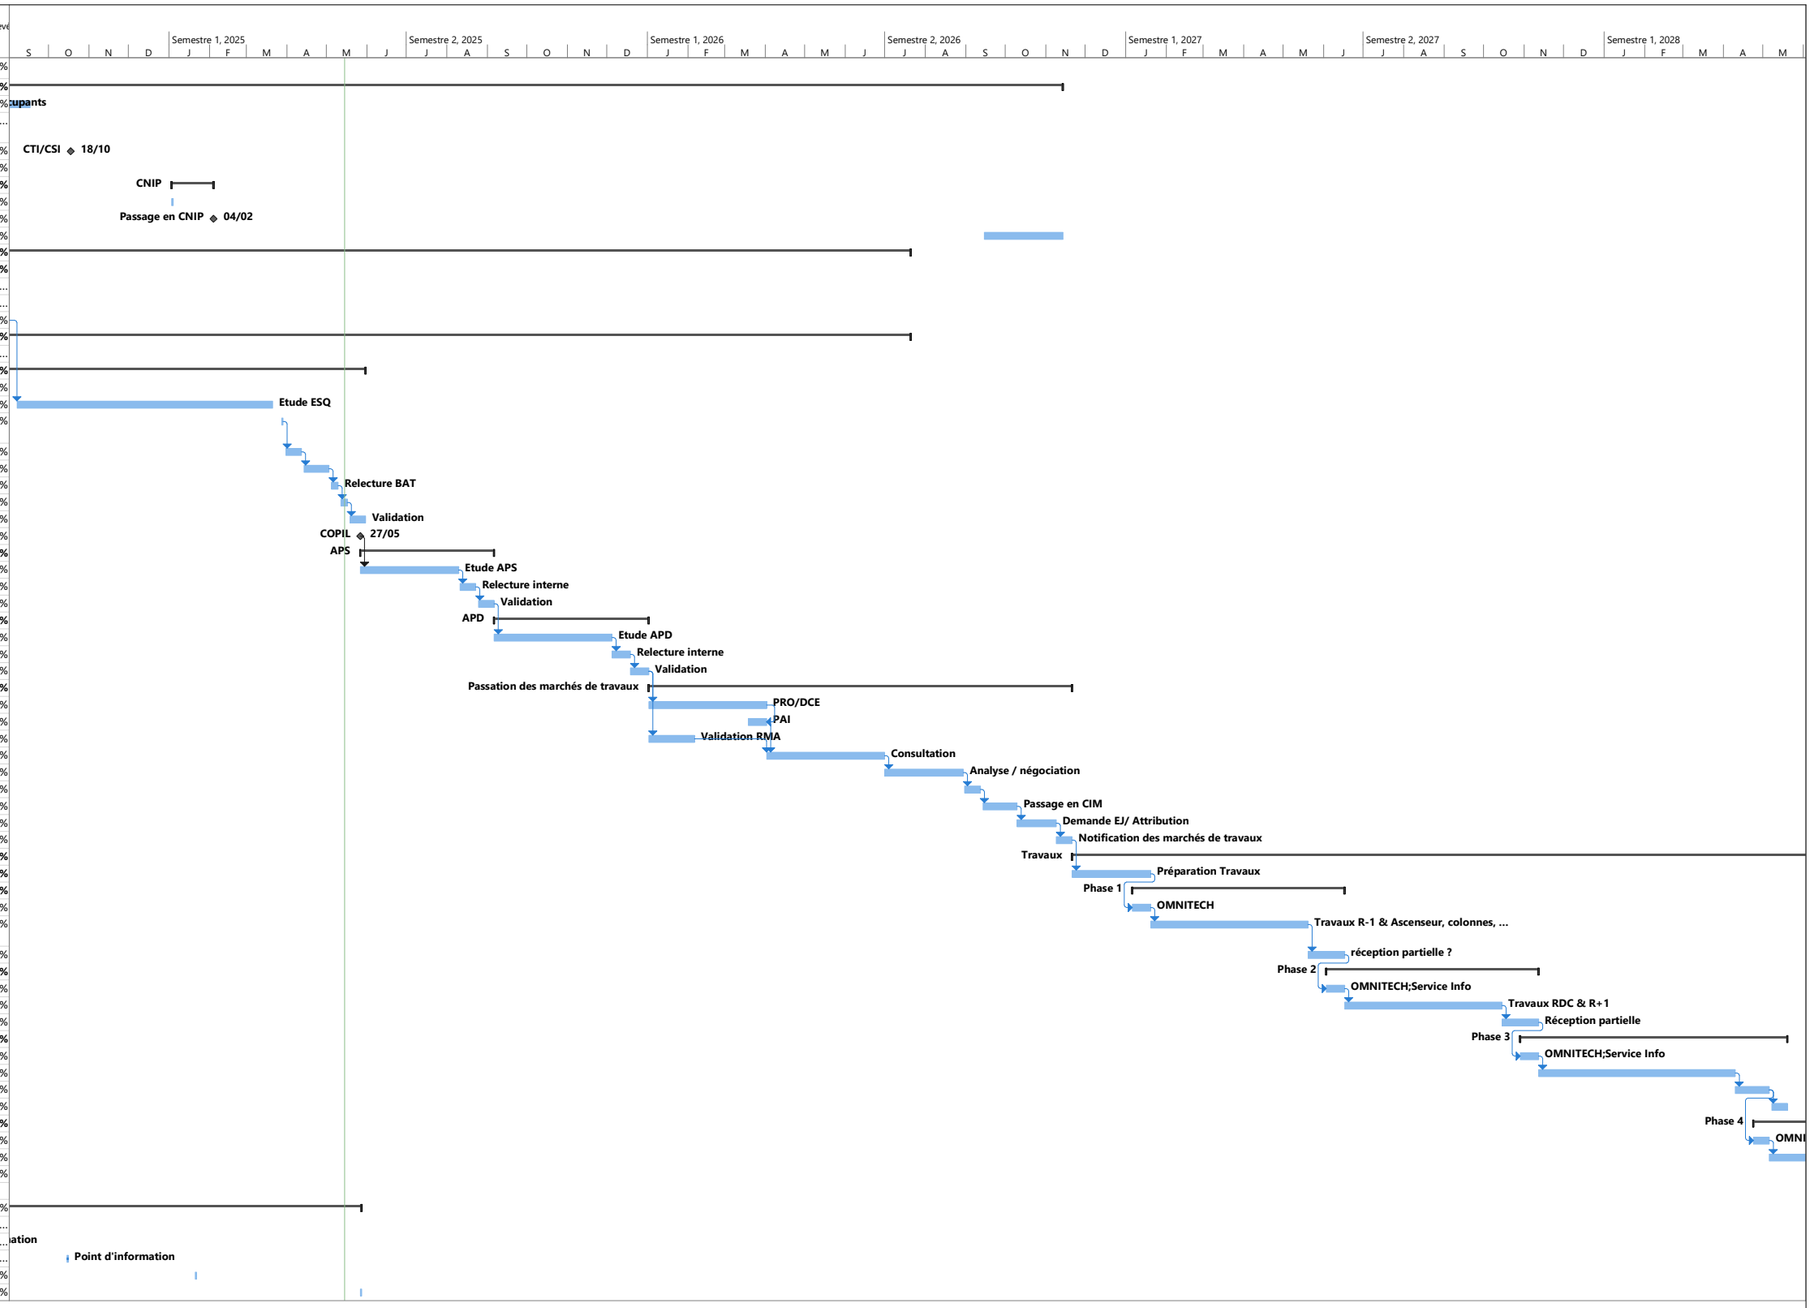

Projet : Planning Simu FENNEC
Date : Jeu 15/05/25

Tâche · Fractionnement · no · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâche inactive · Jalon inactif · Récapitulatif inactif · Tâche manuelle · Durée uniquement · Report récapitulatif manuel · Récapitulatif manuel · Début uniquement · Fin uniquement · Tâches externes · Jalons externes · Échéance · Avancement · Progression manuelle
