LABADIOLLE SAS
ECONOMIE & COORDINATION

peretto & peretto
Architectes

PREFECTURE DES LANDES
Planning DCE
Planning du 05/06/25
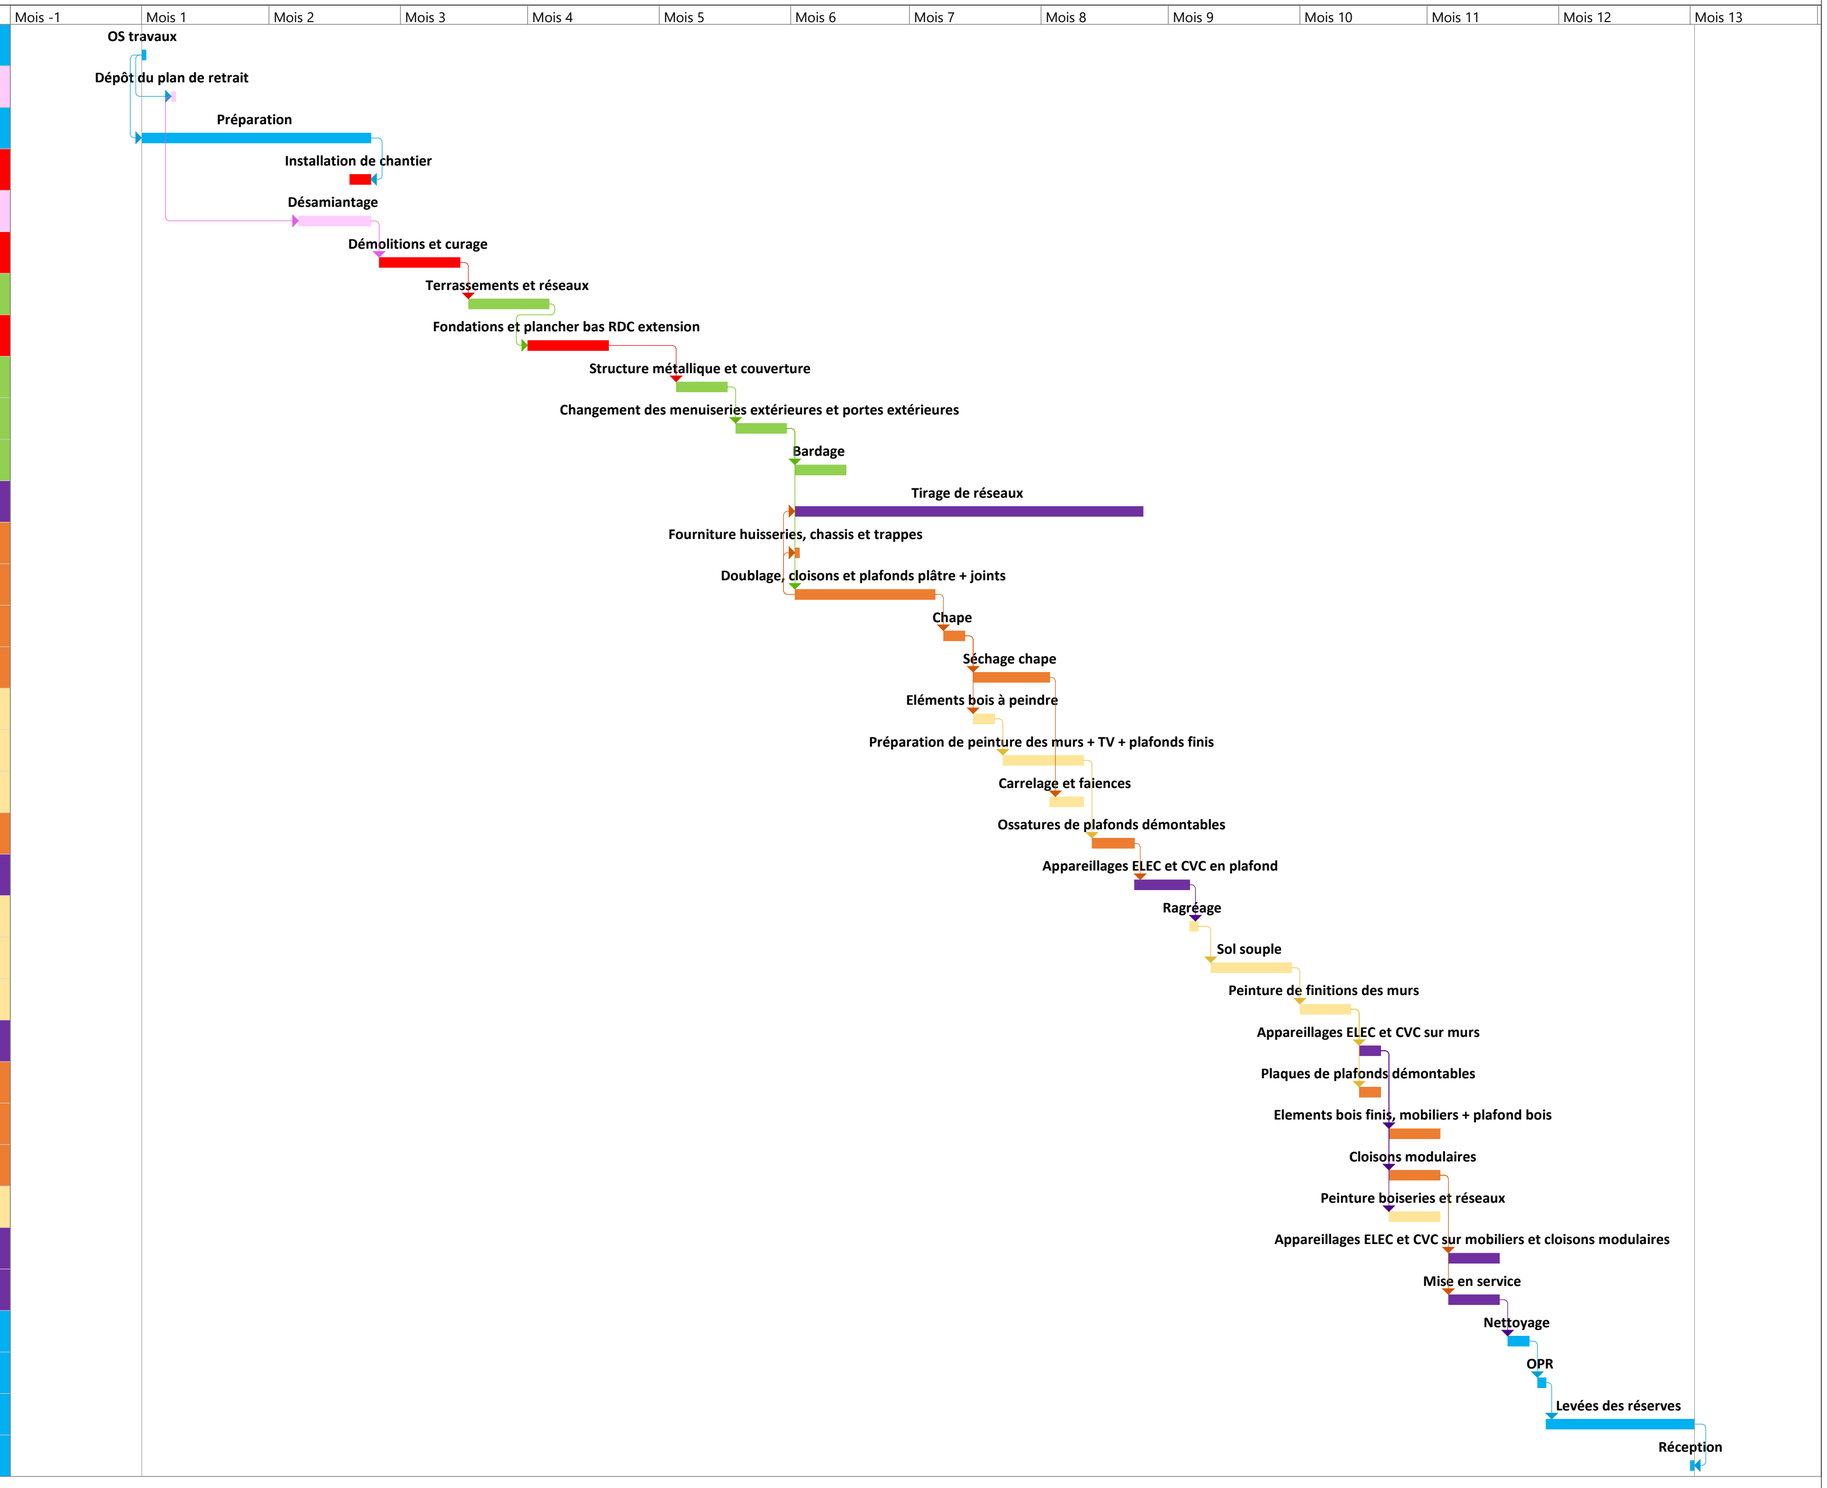
N°	Nom de la tâche	Durée
1	OS travaux	1 jr
2	Dépôt du plan de retrait	1 jr
3	Préparation	40 jrs
4	Installation de chantier	5 jrs
5	Désamiantage	13 jrs
6	Démolitions et curage	13 jrs
7	Terrassements et réseaux	15 jrs
8	Fondations et plancher bas RDC extension	15 jrs
9	Structure métallique et couverture	10 jrs
10	Changement des menuiseries extérieures et portes extérieures	10 jrs
11	Bardage	10 jrs
12	Tirage de réseaux	59 jrs
13	Fourniture huisseries, chassis et trappes	1 jr
14	Doublage, cloisons et plafonds plâtre + joints	25 jrs
15	Chape	5 jrs
16	Séchage chape	14 jrs
17	Eléments bois à peindre	5 jrs
18	Préparation de peinture des murs + TV + plafonds finis	14 jrs
19	Carrelage et faiences	5 jrs
20	Ossatures de plafonds démontables	8 jrs
21	Appareillages ELEC et CVC en plafond	8 jrs
22	Ragréage	2 jrs
23	Sol souple	13 jrs
24	Peinture de finitions des murs	10 jrs
25	Appareillages ELEC et CVC sur murs	5 jrs
26	Plaques de plafonds démontables	5 jrs
27	Elements bois finis, mobiliers + plafond bois	10 jrs
28	Cloisons modulaires	10 jrs
29	Peinture boiseries et réseaux	10 jrs
30	Appareillages ELEC et CVC sur mobiliers et cloisons modulaires	8 jrs
31	Mise en service	8 jrs
32	Nettoyage	5 jrs
33	OPR	2 jrs
34	Levées des réserves	10 jrs
35	Réception	1 jr
