# PG — PLANNING GLOBAL — v1 — Edition du 04/07/25

*Opération* **EXTENSION D'UN BATIMENT EXISTANT • DGA -TH / VAL DE REUIL**

*Maître d'ouvrage* **Unité du Service Infrastructure de la Défense (USID) •**

**Base Aérienne 105 d'Evreux-Fauville • 27000 EVREUX**

*Maître d'œuvre* **ATELIER AURA • 5, Rue du Bois Saint Paul • 27600 SAINT AUBIN SUR GAILLON**
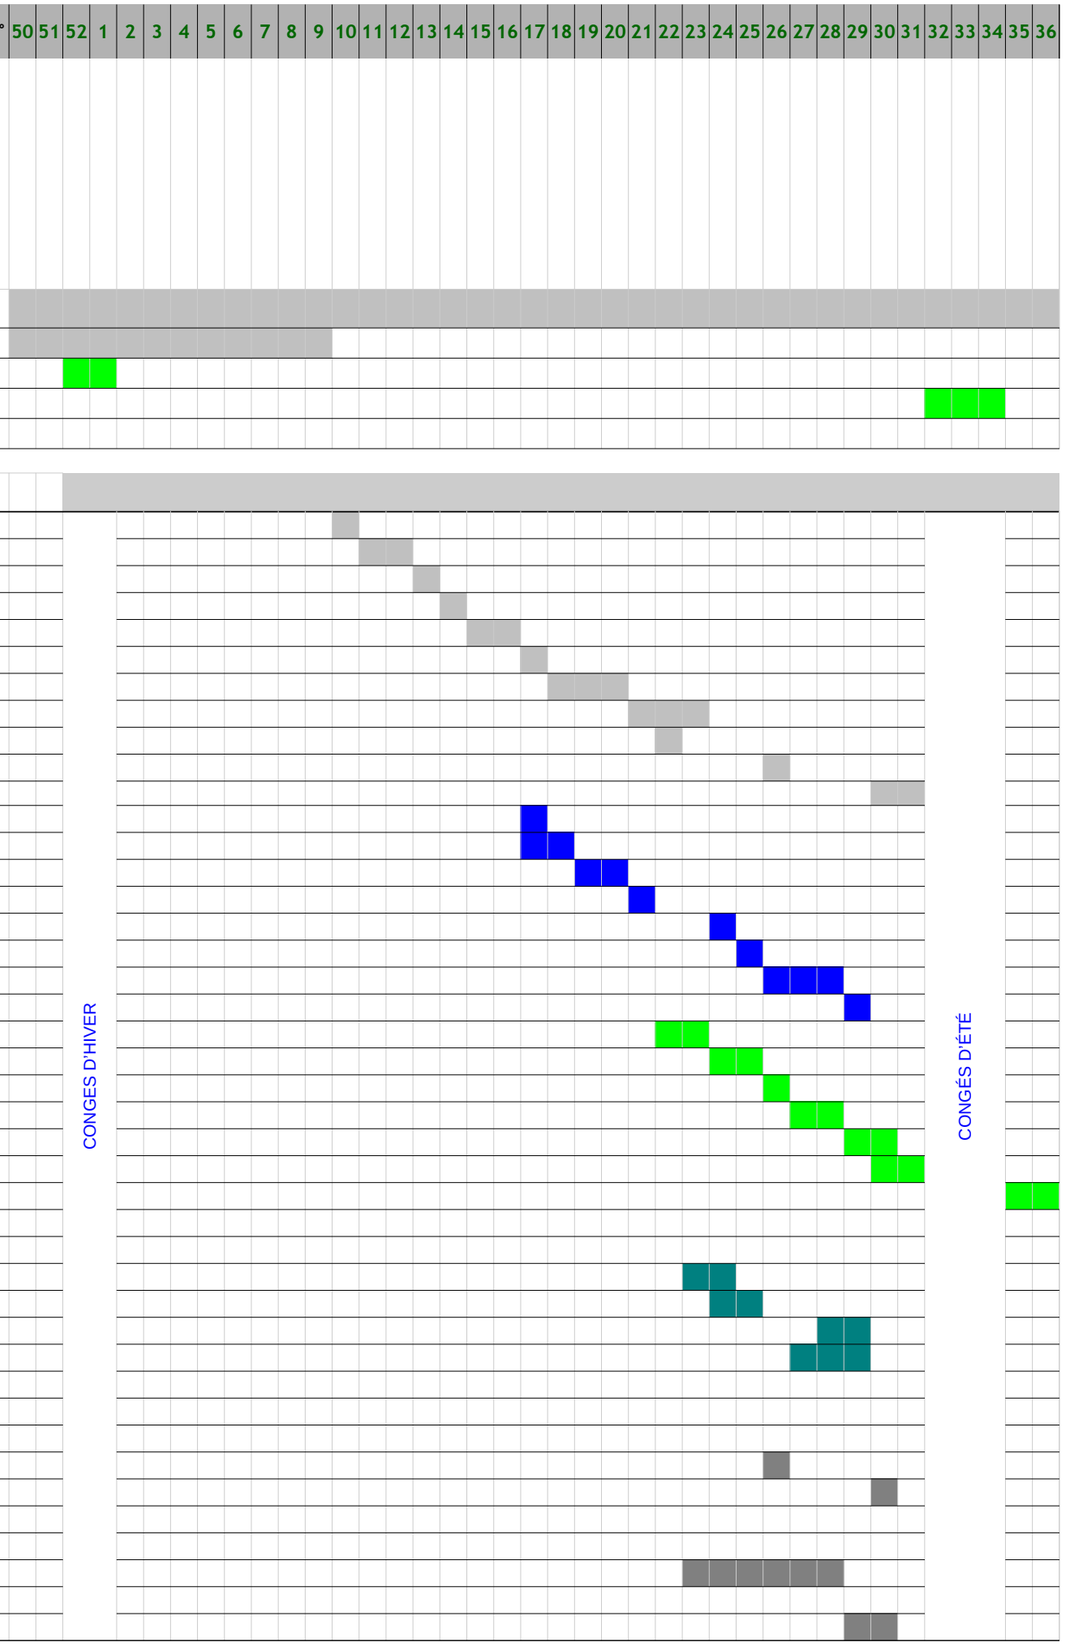
| *Lot* | n° | OUVRAGES | Précisions | sem | Date début | Date fin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | *PHASES HORS TRAVAUX* | *Global* | | *09/12/25* | *17/11/26* | 1 |
| *Tous Corps d'État* | | Préparation | Suite OS | 12 | 09/12/25 | 03/03/26 | 1 |
| | | Congés d'hiver | | 2 | 22/12/25 | 05/01/26 | 3 |
| | | Congés d'été | | 3 | 04/08/26 | 25/08/26 | 3 |
| | | AOR-Réception | | 3 | 27/10/26 | 17/11/26 | 15 |
| | 2 | *PHASE TRAVAUX* | *Global* | 34 | | | 1 |
| *Désamiantage - Démolition* | 01 | Désamiantage (Extension 2) | | 1 | 03/03/26 | 10/03/26 | 01 |
| *Installation de chantier* | 01 | Terrassements extensions | | 2 | 10/03/26 | 24/03/26 | 01 |
| *Gros Œuvre* | 01 | Reprises de réseaux | | 1 | 24/03/26 | 31/03/26 | 01 |
| | 01 | Fondations | | 1 | 31/03/26 | 07/04/26 | 01 |
| | 01 | Dalles portées des extensions | | 2 | 07/04/26 | 21/04/26 | 01 |
| | 01 | Remblais | | 1 | 21/04/26 | 28/04/26 | 01 |
| | 01 | Élévations maçonnées Imprimante | | 3 | 28/04/26 | 19/05/26 | 01 |
| | 01 | Plancher haut | | 3 | 19/05/26 | 09/06/26 | 01 |
| | 01 | Élargissement ouverture (Extension 2) | | 1 | 26/05/26 | 02/06/26 | 01 |
| | 01 | Démolition - Ouvertures (Extension 1) | | 1 | 23/06/26 | 30/06/26 | 01 |
| | 01 | Aménagements extérieurs | | 2 | 21/07/26 | 04/08/26 | 01 |
| *Clos Couvert* | 02 | Dépose de bardage existant | | 1 | 21/04/26 | 28/04/26 | 02 |
| | 02 | Structure métallique (Extension 2) | | 2 | 21/04/26 | 05/05/26 | 02 |
| | 02 | Bardage + habillage (Extension 2) | | 2 | 05/05/26 | 19/05/26 | 02 |
| | 02 | Menuiseries extérieures (Extension 2) | | 1 | 19/05/26 | 26/05/26 | 02 |
| | 02 | Étanchéité (Extension 1) | | 1 | 09/06/26 | 16/06/26 | 02 |
| | 02 | Menuiseries extérieures (Extension 1) | | 1 | 16/06/26 | 23/06/26 | 02 |
| | 02 | ITE (Extension 1) | | 3 | 23/06/26 | 14/07/26 | 02 |
| Clos Couvert | 02 | Ouvrage de finition | | 1 | 14/07/26 | 21/07/26 | 02 |
| *Aménagements intérieurs* | 03 | Plafond isolé (Extension 2) | | 2 | 26/05/26 | 09/06/26 | 03 |
| | 03 | Doublage thermique périphérique (Extension 2) | | 2 | 09/06/26 | 23/06/26 | 03 |
| | 03 | Déposes en existant | | 1 | 23/06/26 | 30/06/26 | 03 |
| | 03 | Cloisonnement intérieur + habillages | | 2 | 30/06/26 | 14/07/26 | 03 |
| | 03 | Plafond en existant | | 2 | 14/07/26 | 28/07/26 | 03 |
| | 03 | Carrelage - Plinthes - Faïences | | 2 | 21/07/26 | 04/08/26 | 03 |
| | 03 | Peinture (murs et plafonds) | | 4 | 25/08/26 | 22/09/26 | 03 |
| | 03 | Résine de sol | | 2 | 22/09/26 | 06/10/26 | 03 |
| | 03 | Nettoyage fin de chantier | | 1 | 27/10/26 | 03/11/26 | 03 |
| | 08 | Distribution intérieure (Extension 2) | | 2 | 02/06/26 | 16/06/26 | 08 |
| | 08 | Modification en existant | | 2 | 09/06/26 | 23/06/26 | 08 |
| | 08 | Distribution intérieure (Existant) | | 2 | 07/07/26 | 21/07/26 | 08 |
| | 08 | Distribution intérieure (Extension 1) | | 3 | 30/06/26 | 21/07/26 | 08 |
| | 08 | Équipement incendie | | 2 | 06/10/26 | 20/10/26 | 08 |
| | 08 | Appareillages | | 1 | 20/10/26 | 27/10/26 | 08 |
| | 08 | Contrôle, essais | | 1 | 27/10/26 | 03/11/26 | 08 |
| *Plomberie - CVC* | 09 | Modification en existant | | 1 | 23/06/26 | 30/06/26 | 09 |
| | 09 | Création réseaux EF, EC, EU | | 1 | 21/07/26 | 28/07/26 | 09 |
| | 09 | Appareillage plomberie | | 1 | 22/09/26 | 29/09/26 | 09 |
| | 09 | Contrôle, essais | | 1 | 29/09/26 | 06/10/26 | 09 |
| | 09 | Distribution VMC / CTA | | 6 | 02/06/26 | 14/07/26 | 09 |
| | 09 | Appareillage CTA / VMC | | 2 | 06/10/26 | 20/10/26 | 09 |
| | 09 | Distribution Argon | | 2 | 14/07/26 | 28/07/26 | 09 |
