OTE INGÉNIERIE — Construction & environnement

SENLIS

Calendrier prévisionnel général de l'opération phase AVP

Ind 1 du 23/05/2025
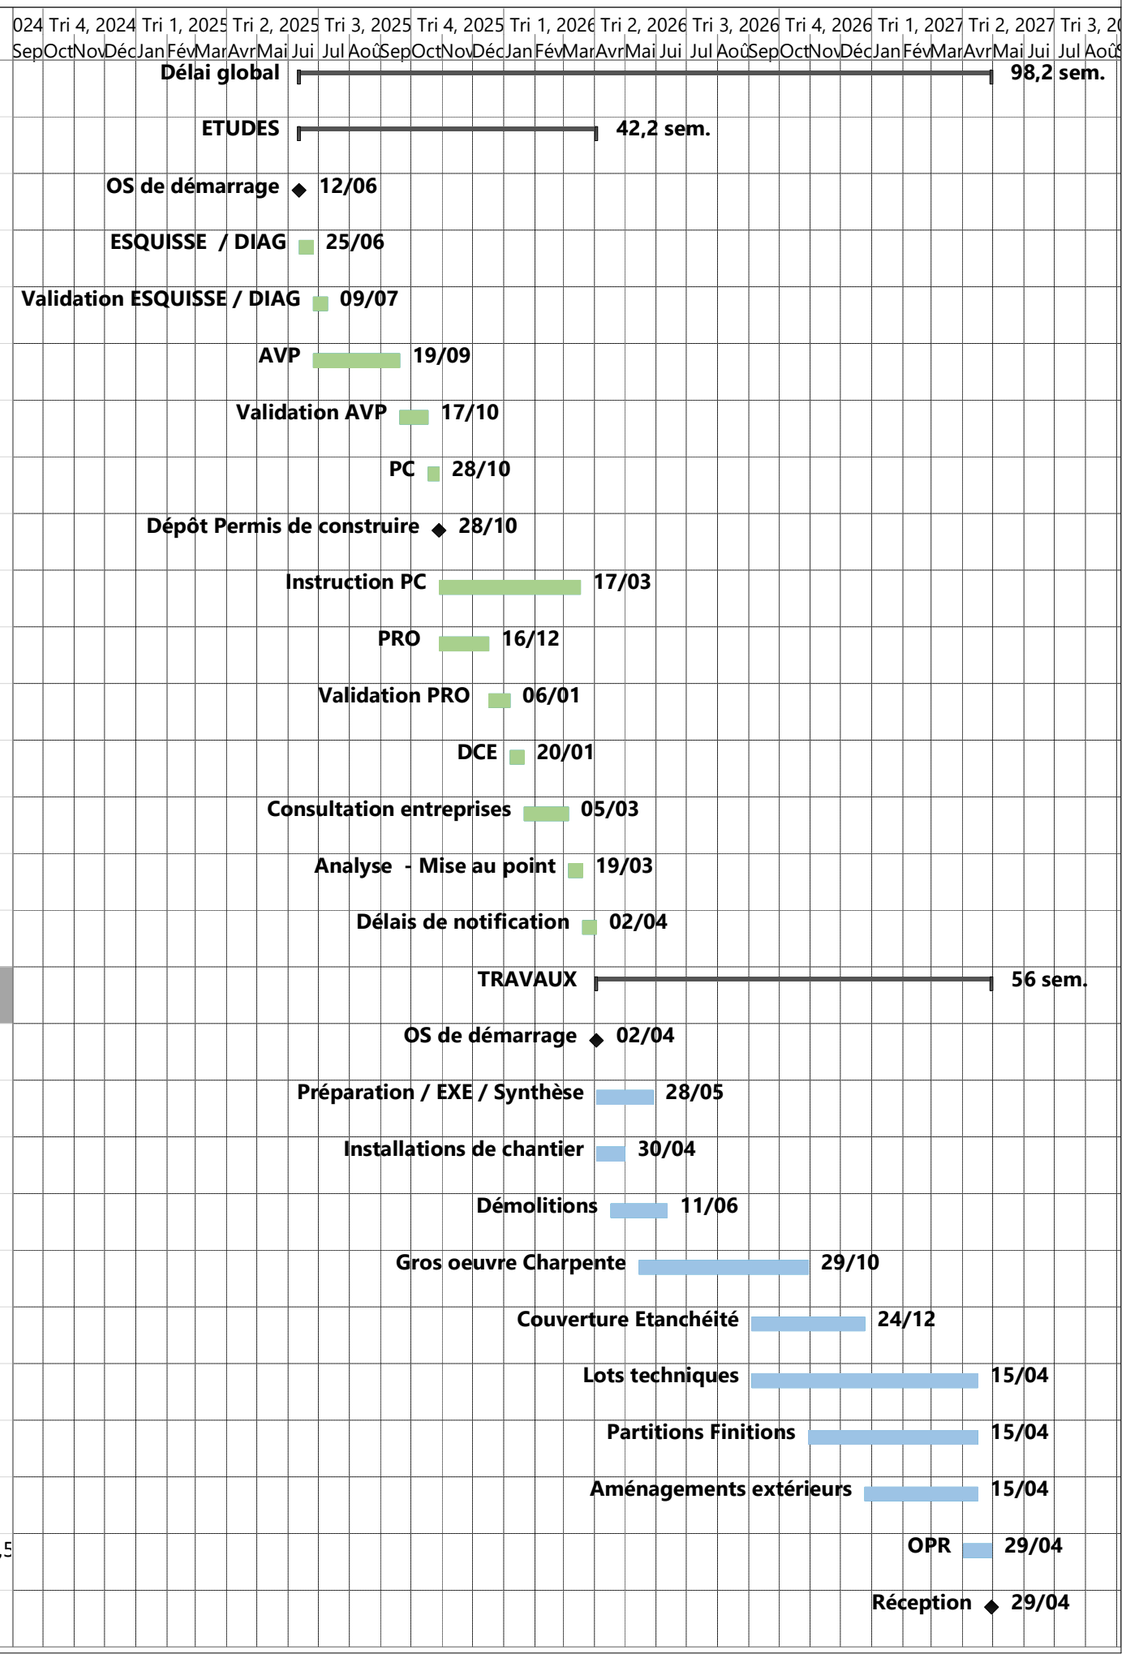
N°	Texte	Nom de la tâche	Durée prévue	Début prévu	Fin prévue	Prédécesseurs
1		**Délai global**	**98,2 sem.**	**Jeu 12/06/25**	**Jeu 29/04/27**	
2		**ETUDES**	**42,2 sem.**	**Jeu 12/06/25**	**Jeu 02/04/26**	
3		OS de démarrage	0 sem.	Jeu 12/06/25	Jeu 12/06/25	
4		ESQUISSE / DIAG	2 sem.	Jeu 12/06/25	Mer 25/06/25	3
5		Validation ESQUISSE / DIAG	2 sem.	Jeu 26/06/25	Mer 09/07/25	4
6		AVP	12,3 sem.	Jeu 26/06/25	Ven 19/09/25	4
7		Validation AVP	4 sem.	Ven 19/09/25	Ven 17/10/25	6
8		PC	1,5 sem.	Ven 17/10/25	Mar 28/10/25	7;5
9		Dépôt Permis de construire	0 sem.	Mar 28/10/25	Mar 28/10/25	8
10		Instruction PC	20 sem.	Mer 29/10/25	Mar 17/03/26	9
11		PRO	7 sem.	Mer 29/10/25	Mar 16/12/25	9
12		Validation PRO	3 sem.	Mer 17/12/25	Mar 06/01/26	11
13		DCE	2 sem.	Mer 07/01/26	Mar 20/01/26	12
14		Consultation entreprises	6,4 sem.	Mer 21/01/26	Jeu 05/03/26	13
15		Analyse - Mise au point	2 sem.	Ven 06/03/26	Jeu 19/03/26	14
16		Délais de notification	2 sem.	Ven 20/03/26	Jeu 02/04/26	15
17		**TRAVAUX**	**56 sem.**	**Jeu 02/04/26**	**Jeu 29/04/27**	
18		OS de démarrage	0 sem.	Jeu 02/04/26	Jeu 02/04/26	15;16
19		Préparation / EXE / Synthèse	2 m	Ven 03/04/26	Jeu 28/05/26	18
20		Installations de chantier	1 m	Ven 03/04/26	Jeu 30/04/26	18
21		Démolitions	2 m	Ven 17/04/26	Jeu 11/06/26	20FD-0,5 m
22		Gros oeuvre Charpente	6 m	Ven 15/05/26	Jeu 29/10/26	21FD-1 m
23		Couverture Etanchéité	4 m	Ven 04/09/26	Jeu 24/12/26	22FD-2 m
24		Lots techniques	8 m	Ven 04/09/26	Jeu 15/04/27	22FD-2 m
25		Partitions Finitions	6 m	Ven 30/10/26	Jeu 15/04/27	22
26		Aménagements extérieurs	4 m	Ven 25/12/26	Jeu 15/04/27	22FD+2 m
27		OPR	1 m	Ven 02/04/27	Jeu 29/04/27	25FD-0,5 m;24FD-0,5
28		**Réception**	0 jr	Jeu 29/04/27	Jeu 29/04/27	27
