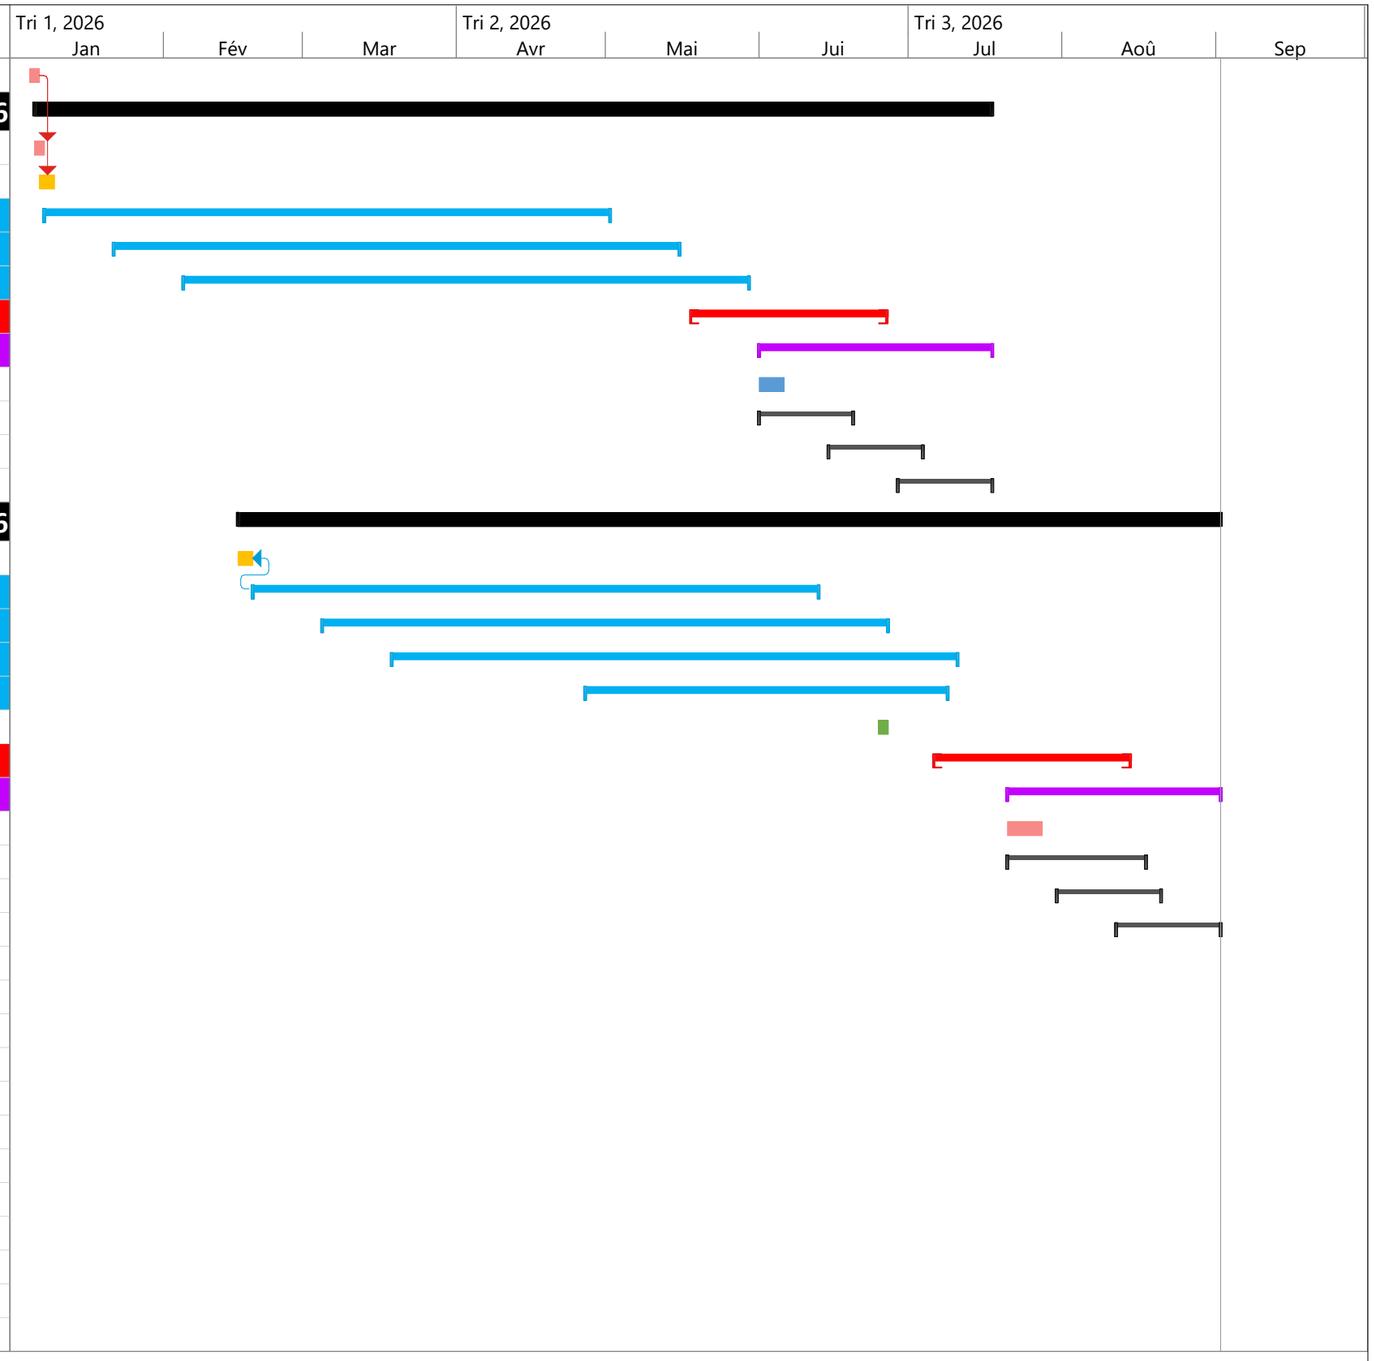N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	01 - Installation de la base vie	2 jours	05/01/26	06/01/26
2	**PHASE 1 : TRAVAUX DU R+6 au R+4**	**139 jours**	**06/01/26**	**17/07/26**
3	01 - Mise en place des protections phase 1	2 jours	06/01/26	07/01/26
4	06 - Protection des sols	3 jours	07/01/26	09/01/26
5	**R+6**	**82 jours**	**08/01/26**	**01/05/26**
51	**R+5**	**82 jours**	**22/01/26**	**15/05/26**
95	**R+4**	**82 jours**	**05/02/26**	**29/05/26**
140	**MISE A DISPOSITION ANTICIPEE PHASE 1**	**30 jours**	**18/05/26**	**26/06/26**
144	**MOBILIER ET NOURRICES PHASE 1**	**35 jours**	**01/06/26**	**17/07/26**
145	11 - Mobilier : Livraison phase 1	5 jours	01/06/26	05/06/26
146	**R+6**	**15 jours**	**01/06/26**	**19/06/26**
152	**R+5**	**15 jours**	**15/06/26**	**03/07/26**
158	**R+4**	**15 jours**	**29/06/26**	**17/07/26**
165	**PHASE 2 : TRAVAUX DU R+3 au RDC**	**142 jours**	**16/02/26**	**01/09/26**
166	06 - Protection des sols	3 jours	16/02/26	19/02/26
167	**R+3**	**82 jours**	**19/02/26**	**12/06/26**
211	**R+2**	**82 jours**	**05/03/26**	**26/06/26**
255	**R+1**	**82 jours**	**19/03/26**	**10/07/26**
299	**RDC**	**53 jours**	**27/04/26**	**08/07/26**
302	01 - Repli de la base vie	2 jours	25/06/26	26/06/26
303	**RECEPTION**	**30 jours**	**06/07/26**	**14/08/26**
307	**MOBILIER ET NOURRICES PHASE 2**	**31 jours**	**21/07/26**	**01/09/26**
308	11 - Mobilier : Livraison phase 2	5 jours	21/07/26	27/07/26
309	**R+3**	**20 jours**	**21/07/26**	**17/08/26**
315	**R+2**	**15 jours**	**31/07/26**	**20/08/26**
321	**R+1**	**15 jours**	**12/08/26**	**01/09/26**
327				
328	LOT 01 - INSTALLATIONS DE CHANTIER			
329	LOT 02 - PLÂTRERIE			
330	LOT 03 - MENUISERIE INTERIEURE ET PLANCHER TECHNIQUE			
331	LOT 04 - CLOISONS AMOVIBLES ET MURS MOBILES			
332	LOT 05 - FAUX-PLAFOND ET ACOUSTIQUE			
333	LOT 06 - REVETEMENTS SOLS SOUPLES			
334	LOT 07 - REVÊTEMENTS MURAUX ET PEINTURE			
335	LOT 08 - AGENCEMENT			
336	LOT 09 - CVC			
337	LOT 10 - ELECTRICITE CFO-CFA			
338	LOT 11 - MOBILIER
