PLANNING PREVISIONNEL - DOUANES ORLEANS DCE

N°	Prédécesseu	Début	Fin	Durée	Nom de la tâche
1					
2		**Lun 15/09/25**	**Ven 10/04/26**	**150 jrs**	**PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX**
3		**Lun 15/09/25**	**Ven 10/04/26**	**150 jrs**	**PHASE TRAVAUX**
4		**Lun 15/09/25**	**Lun 09/02/26**	**106 jrs**	**DEMOLITION - DESAMIANTAGE**
5		Lun 15/09/25	Ven 19/09/25	5 jrs	Préparations de chantier
6		Lun 15/09/25	Ven 17/10/25	25 jrs	Etablissement plan de retrait amiante + Délai légal de préparation du chantier de
7	6	Lun 20/10/25	Lun 20/10/25	1 jr	Installation base vie bâtiment C RDC + Roulotte
8	7	Mar 21/10/25	Lun 10/11/25	15 jrs	Démolition (RDC, R+1) / Désamiantage R+1 (Bât C)
9	8	Mar 11/11/25	Mer 19/11/25	7 jrs	Mesure environnementale R+1 bât C (contrôle de l'empoussièrement de l'air)
10	7	Mar 21/10/25	Lun 24/11/25	25 jrs	Démolition/Désamiantage Bât A R+1/R+2
11	10	Mar 25/11/25	Mer 03/12/25	7 jrs	Mesure environnementale bât A (contrôle de l'empoussièrement de l'air)
12		**Lun 22/09/25**	**Mar 07/10/25**	**12 jrs**	**TRAVAUX BATIMENT B**
13	5	Lun 22/09/25	Mer 24/09/25	3 jrs	Peinture
14	5	Lun 22/09/25	Ven 03/10/25	10 jrs	Remplacement des réseaux en plomb
15	14	Lun 06/10/25	Lun 06/10/25	1 jr	Finitions, nettoyage
16	15	Mar 07/10/25	Mar 07/10/25	1 jr	OPR et réception des travaux
17	**8**	**Mar 11/11/25**	**Lun 09/02/26**	**65 jrs**	**TRAVAUX BATIMENT C**
18	9	Jeu 20/11/25	Mer 17/12/25	20 jrs	Travaux aménagement RDC
19	8	Mar 11/11/25	Lun 09/02/26	65 jrs	Ouverture menuiseries extérieures (gros œuvre), livraison et pose RDC
20	10	Mar 25/11/25	Mer 26/11/25	2 jrs	Condamnation réseau chauffage/clim existante
21	9	Jeu 20/11/25	Mer 17/12/25	20 jrs	Electricité / radiateur RDC
22	9	Jeu 20/11/25	Mer 03/12/25	10 jrs	Dévoiement des réseaux de chauffage RDC
23	9	Jeu 20/11/25	Mer 17/12/25	20 jrs	Travaux aménagement R+1
24	9	Jeu 20/11/25	Mer 17/12/25	20 jrs	Electricité R+1
25	24	Jeu 18/12/25	Mer 31/12/25	10 jrs	Peinture/Sols
26	25	Jeu 01/01/26	Ven 02/01/26	2 jrs	Finitions, nettoyage
27	26	Lun 05/01/26	Mar 06/01/26	2 jrs	OPR et réception des travaux
28		**Jeu 18/12/25**	**Ven 10/04/26**	**82 jrs**	**TRAVAUX BATIMENT A**
29	11	Jeu 04/12/25	Lun 08/12/25	3 jrs	Installation base vie R+1 bâtiment A
30	27	Mer 07/01/26	Mar 03/02/26	20 jrs	Travaux aménagement R+1
31	30FD-15 jrs	Mer 14/01/26	Mar 10/02/26	20 jrs	Electricité R+1
32	30FD-15 jrs	Mer 14/01/26	Mar 10/02/26	20 jrs	Travaux chauffage, ventilation et Plomberie R+1
33	30FD-10 jrs	Mer 21/01/26	Mar 17/02/26	20 jrs	Peinture, revêtement de sol R+1
34	33	Mer 18/02/26	Jeu 19/02/26	2 jrs	Finition, nettoyage
35	34	Ven 20/02/26	Lun 23/02/26	2 jrs	OPR et réception de travaux R+1
36	18	Jeu 18/12/25	Mer 24/12/25	5 jrs	Travaux peinture R+2
37	44FD-10 jrs	Mar 20/01/26	Mar 20/01/26	1 jr	Finition, nettoyage
38	37	Mer 21/01/26	Mer 21/01/26	1 jr	OPR et réception des travaux R+2
39	35	Mar 24/02/26	Lun 16/03/26	15 jrs	Travaux aménagement Rdc
40	39	Mar 17/03/26	Lun 30/03/26	10 jrs	Electricité Rdc
41	40FD-5 jrs	Mar 24/03/26	Lun 06/04/26	10 jrs	Travaux peinture Rdc
42	41	Mar 07/04/26	Mer 08/04/26	2 jrs	Finitions, nettoyage RDC
43	42	Jeu 09/04/26	Ven 10/04/26	2 jrs	OPR et réception des travaux RDC
44	29FD+20 jrs	Mar 06/01/26	Lun 02/02/26	20 jrs	Travaux de remplacement des réseaux en plomb
45	44	Mar 03/02/26	Lun 23/02/26	15 jrs	Travaux de raccordement des nouveaux compteurs d'eau

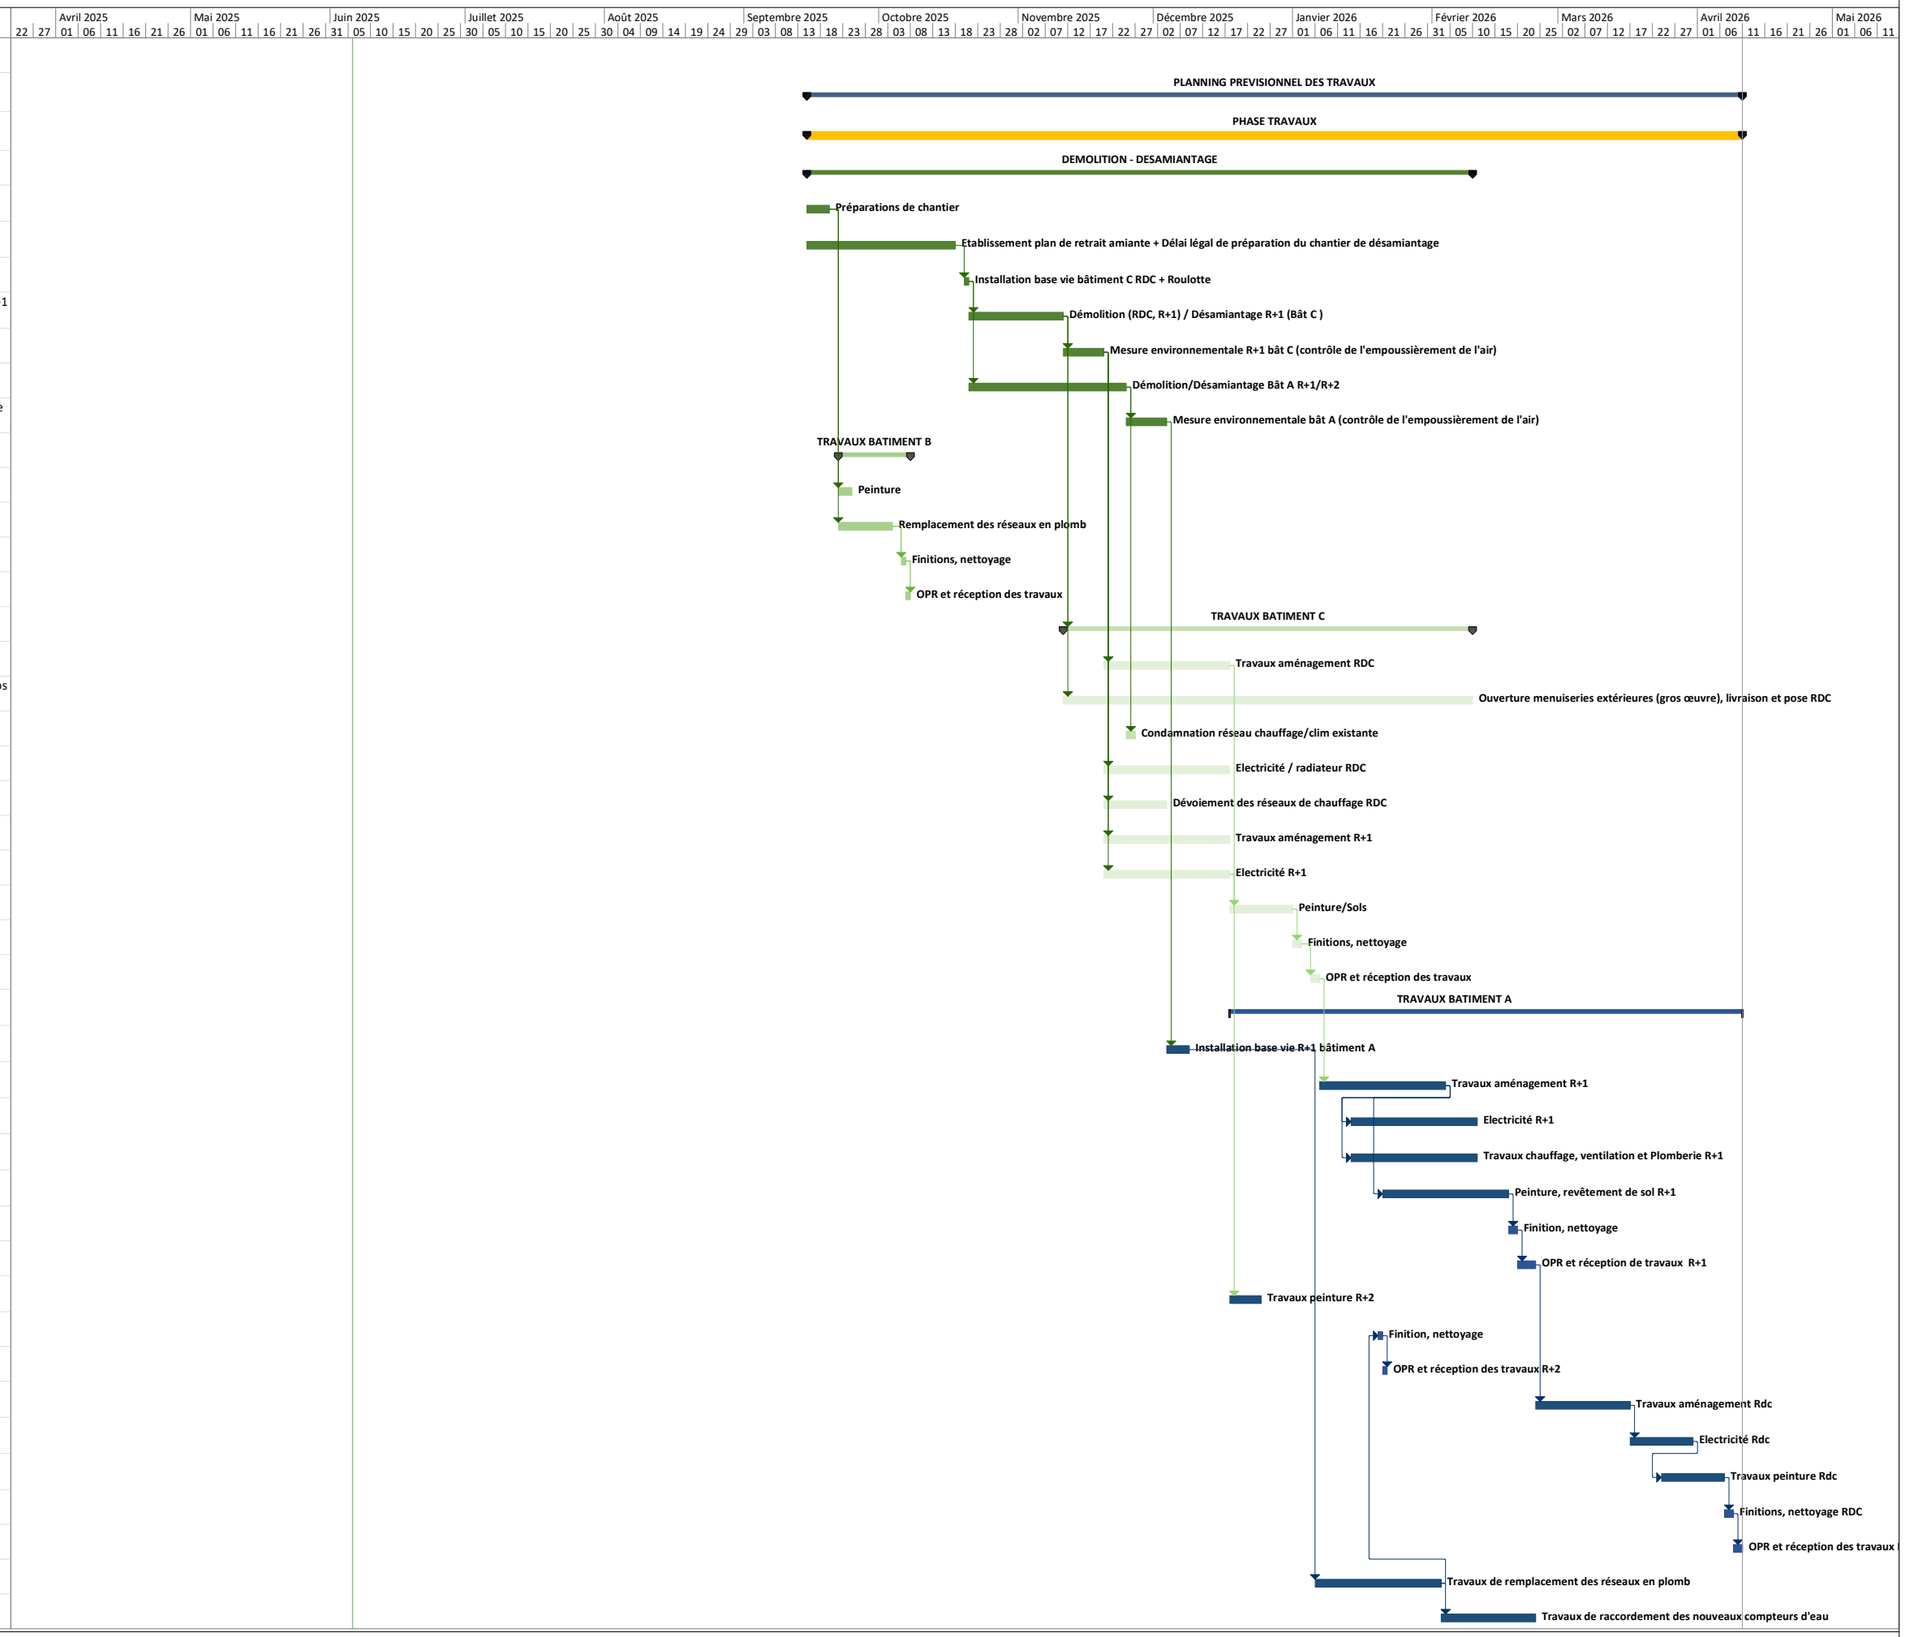

PLANNING PREVISIONNEL - DOUANES ORLEANS DCE

| | | |
