EXTENSION DE LA SALLE DE REGULATION DU SAMU - RDC
CHU DIJON
PLANNING DE CONSULTATION - 09_07_25
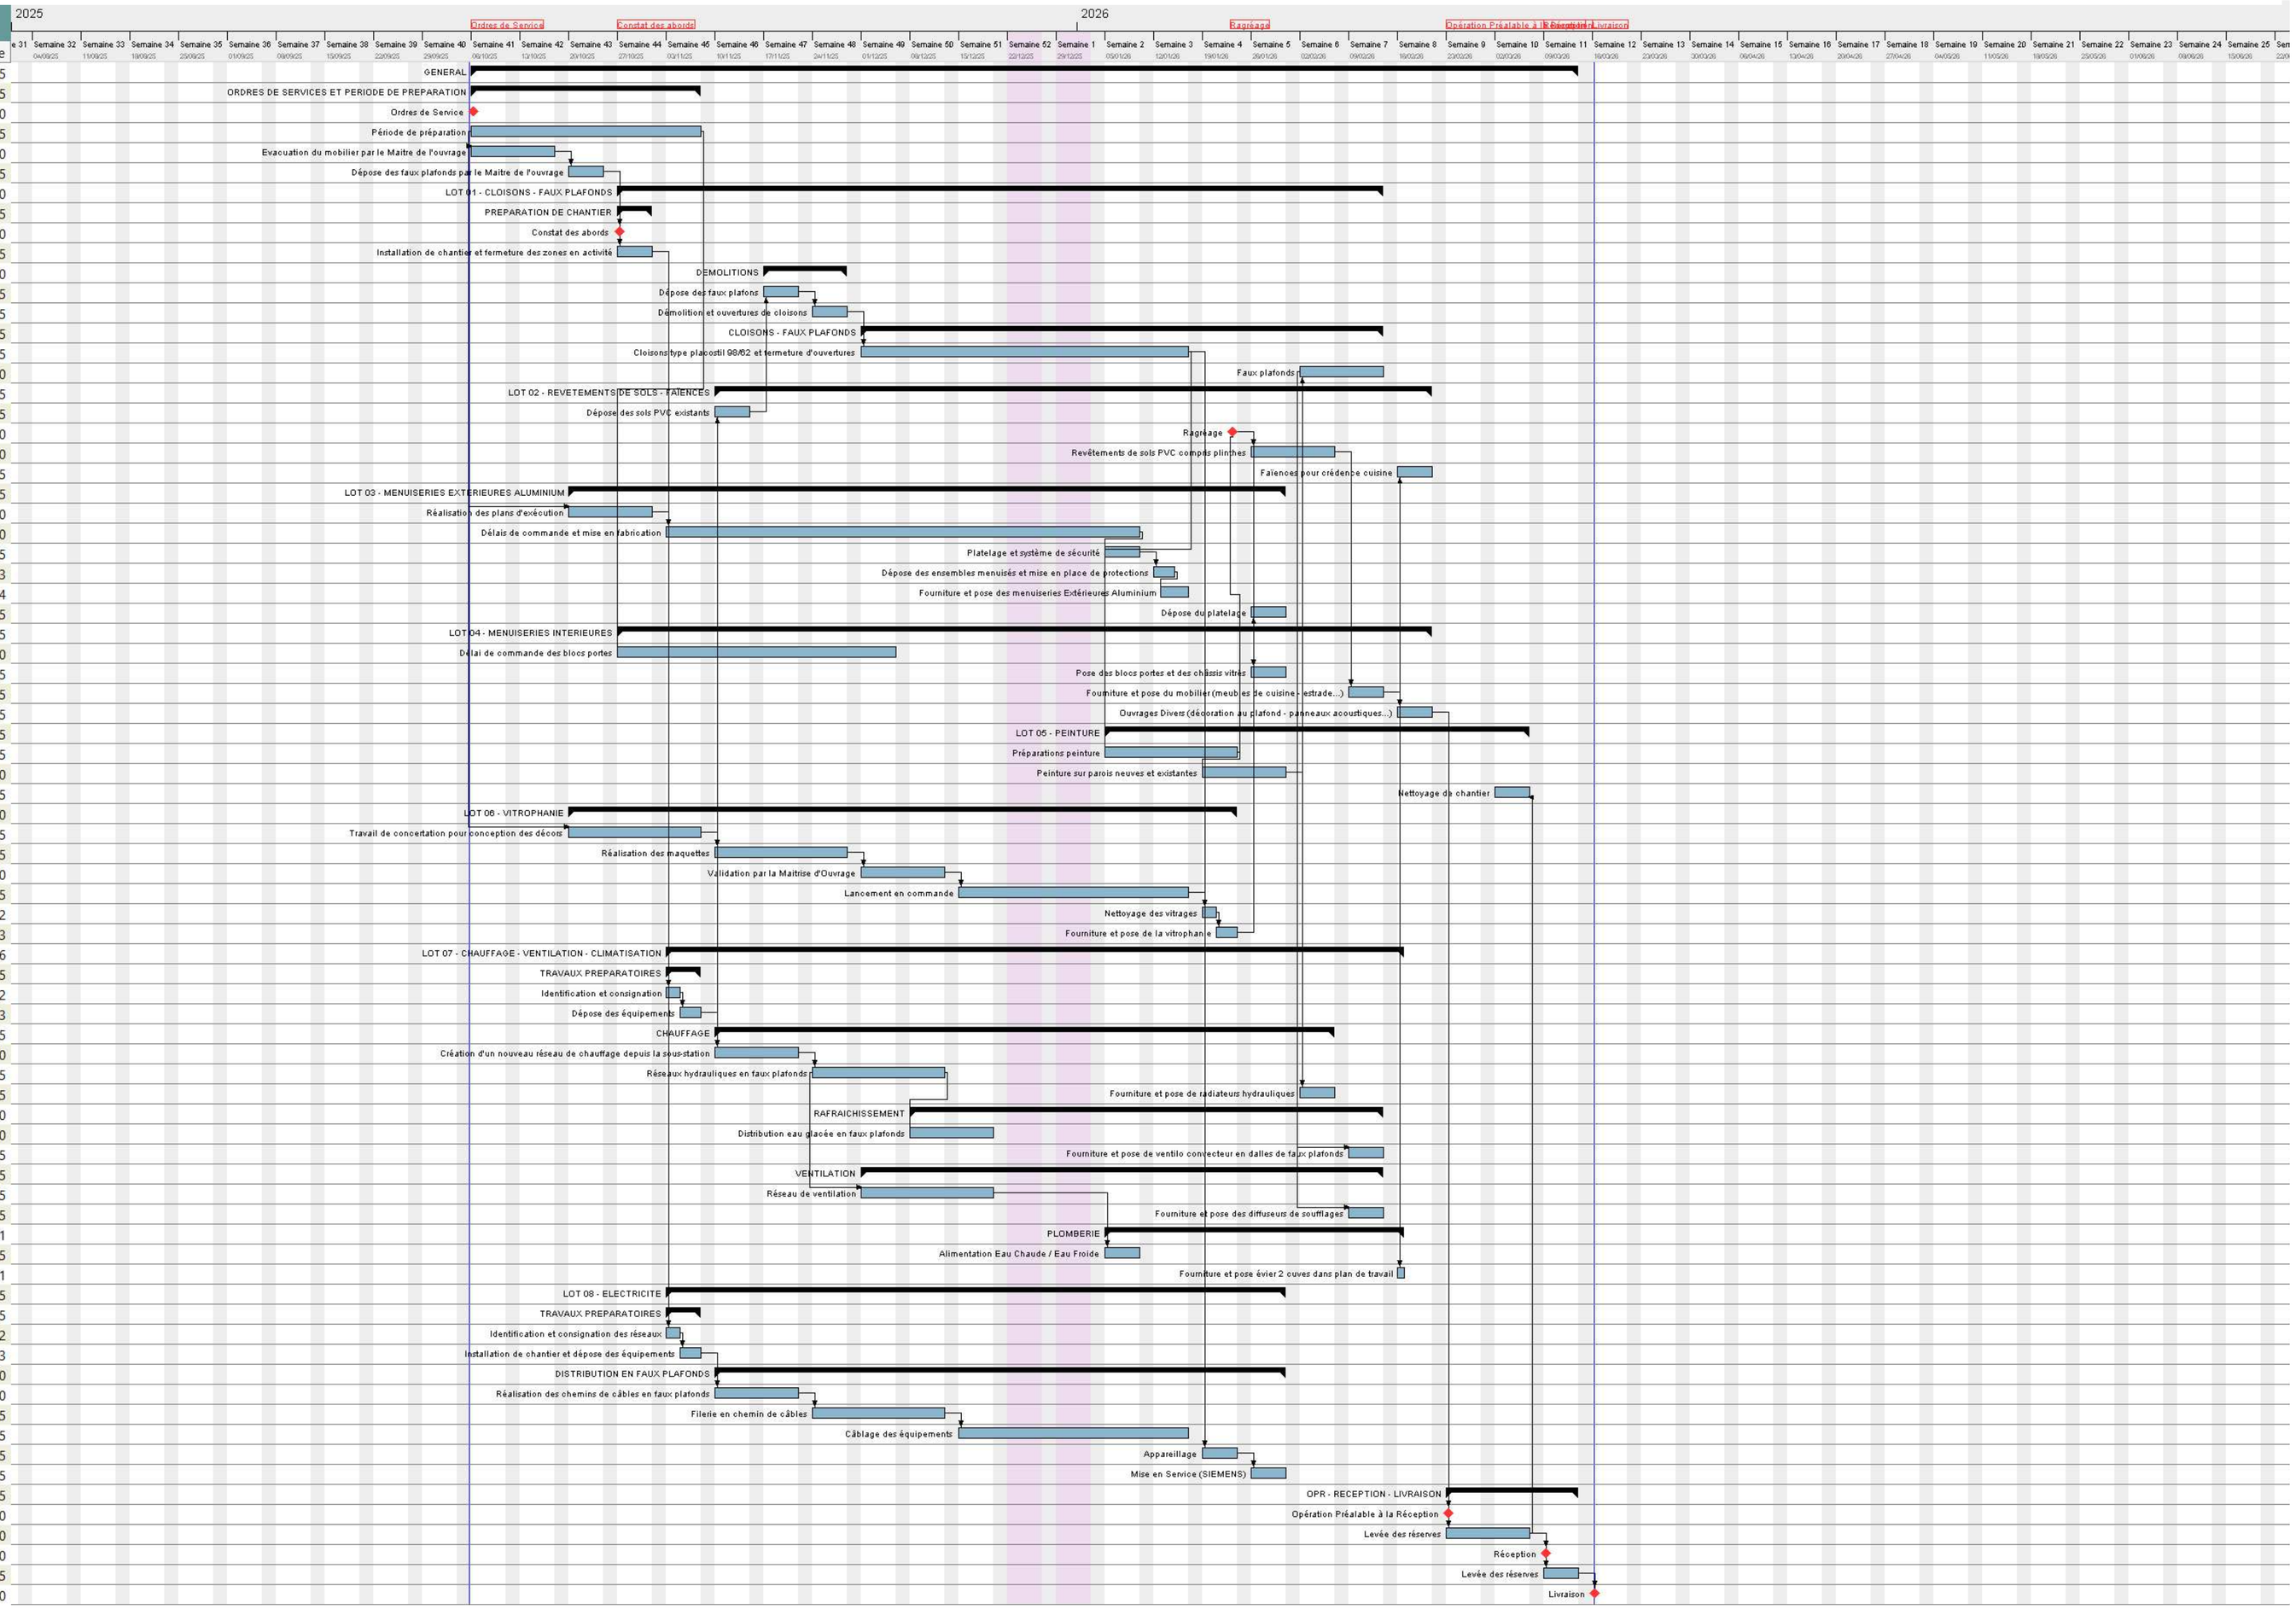
Nom	Date de début	Date de fin	Durée
GENERAL	06/10/25	13/03/26	105
ORDRES DE SERVICES ET PERIODE DE PREPARATION	06/10/25	07/11/25	25
Ordres de Service	06/10/25	06/10/25	0
Période de préparation	06/10/25	07/11/25	25
Evacuation du mobilier par le Maitre de l'ouvrage	06/10/25	17/10/25	10
Dépose des faux plafonds par le Maitre de l'ouvrage	20/10/25	24/10/25	5
LOT 01 - CLOISONS - FAUX PLAFONDS	27/10/25	13/02/26	70
PREPARATION DE CHANTIER	27/10/25	31/10/25	5
Constat des abords	27/10/25	27/10/25	0
Installation de chantier et fermeture des zones en activité	27/10/25	31/10/25	5
DEMOLITIONS	17/11/25	28/11/25	10
Dépose des faux plafons	17/11/25	21/11/25	5
Démolition et ouvertures de cloisons	24/11/25	28/11/25	5
CLOISONS - FAUX PLAFONDS	01/12/25	13/02/26	45
Cloisons type placostil 98/62 et fermeture d'ouvertures	01/12/25	16/01/26	25
Faux plafonds	02/02/26	13/02/26	10
LOT 02 - REVETEMENTS DE SOLS - FAÏENCES	10/11/25	20/02/26	65
Dépose des sols PVC existants	10/11/25	14/11/25	5
Ragréage	23/01/26	23/01/26	0
Revêtements de sols PVC compris plinthes	26/01/26	06/02/26	10
Faiences pour crédence cuisine	16/02/26	20/02/26	5
LOT 03 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM	20/10/25	30/01/26	65
Réalisation des plans d'exécution	20/10/25	31/10/25	10
Délais de commande et mise en fabrication	03/11/25	09/01/26	40
Platelage et système de sécurité	05/01/26	09/01/26	5
Dépose des ensembles menuisés et mise en place de protections	12/01/26	14/01/26	3
Fourniture et pose des menuiseries Extérieures Aluminium	13/01/26	16/01/26	4
Dépose du platelage	26/01/26	30/01/26	5
LOT 04 - MENUISERIES INTERIEURES	27/10/25	20/02/26	75
Délai de commande des blocs portes	27/10/25	05/12/25	30
Pose des blocs portes et des châssis vitrés	26/01/26	30/01/26	5
Fourniture et pose du mobilier (meubles de cuisine - estrade...)	09/02/26	13/02/26	5
Ouvrages Divers (décoration au plafond - panneaux acoustiques...)	16/02/26	20/02/26	5
LOT 05 - PEINTURE	05/01/26	06/03/26	45
Préparations peinture	05/01/26	23/01/26	15
Peinture sur parois neuves et existantes	19/01/26	30/01/26	10
Nettoyage de chantier	02/03/26	06/03/26	5
LOT 06 - VITROPHANIE	20/10/25	23/01/26	60
Travail de concertation pour conception des décors	20/10/25	07/11/25	15
Réalisation des maquettes	10/11/25	28/11/25	15
Validation par la Maitrise d'Ouvrage	01/12/25	12/12/25	10
Lancement en commande	15/12/25	16/01/26	15
Nettoyage des vitrages	19/01/26	20/01/26	2
Fourniture et pose de la vitrophanie	21/01/26	23/01/26	3
LOT 07 - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION	03/11/25	16/02/26	66
TRAVAUX PREPARATOIRES	03/11/25	07/11/25	5
Identification et consignation	03/11/25	04/11/25	2
Dépose des équipements	05/11/25	07/11/25	3
CHAUFFAGE	10/11/25	06/02/26	55
Création d'un nouveau réseau de chauffage depuis la sous-stat...	10/11/25	21/11/25	10
Réseaux hydrauliques en faux plafonds	24/11/25	12/12/25	15
Fourniture et pose de radiateurs hydrauliques	02/02/26	06/02/26	5
RAFRAICHISSEMENT	08/12/25	13/02/26	40
Distribution eau glacée en faux plafonds	08/12/25	19/12/25	10
Fourniture et pose de ventilo convecteur en dalles de faux plaf...	09/02/26	13/02/26	5
VENTILATION	01/12/25	13/02/26	45
Réseau de ventilation	01/12/25	19/12/25	15
Fourniture et pose des diffuseurs de soufflages	09/02/26	13/02/26	5
PLOMBERIE	05/01/26	16/02/26	31
Alimentation Eau Chaude / Eau Froide	05/01/26	09/01/26	5
Fourniture et pose évier 2 cuves dans plan de travail	16/02/26	16/02/26	1
LOT 08 - ELECTRICITE	03/11/25	30/01/26	55
TRAVAUX PREPARATOIRES	03/11/25	07/11/25	5
Identification et consignation des réseaux	03/11/25	04/11/25	2
Installation de chantier et dépose des équipements	05/11/25	07/11/25	3
DISTRIBUTION EN FAUX PLAFONDS	10/11/25	30/01/26	50
Réalisation des chemins de câbles en faux plafonds	10/11/25	21/11/25	10
Filerie en chemin de câbles	24/11/25	12/12/25	15
Câblage des équipements	15/12/25	16/01/26	15
Appareillage	19/01/26	23/01/26	5
Mise en Service (SIEMENS)	26/01/26	30/01/26	5
OPR - RECEPTION - LIVRAISON	23/02/26	13/03/26	15
Opération Préalable à la Réception	23/02/26	23/02/26	0
Levée des réserves	23/02/26	06/03/26	10
Réception	09/03/26	09/03/26	0
Levée des réserves	09/03/26	13/03/26	5
Livraison	16/03/26	16/03/26	0
