Planning DCE
15 juilletb 2025

EXTENSION du batiment Marie Curie - Plateau etchnique de Rééducation (PTR)

RG CONCEPT
Bayonne
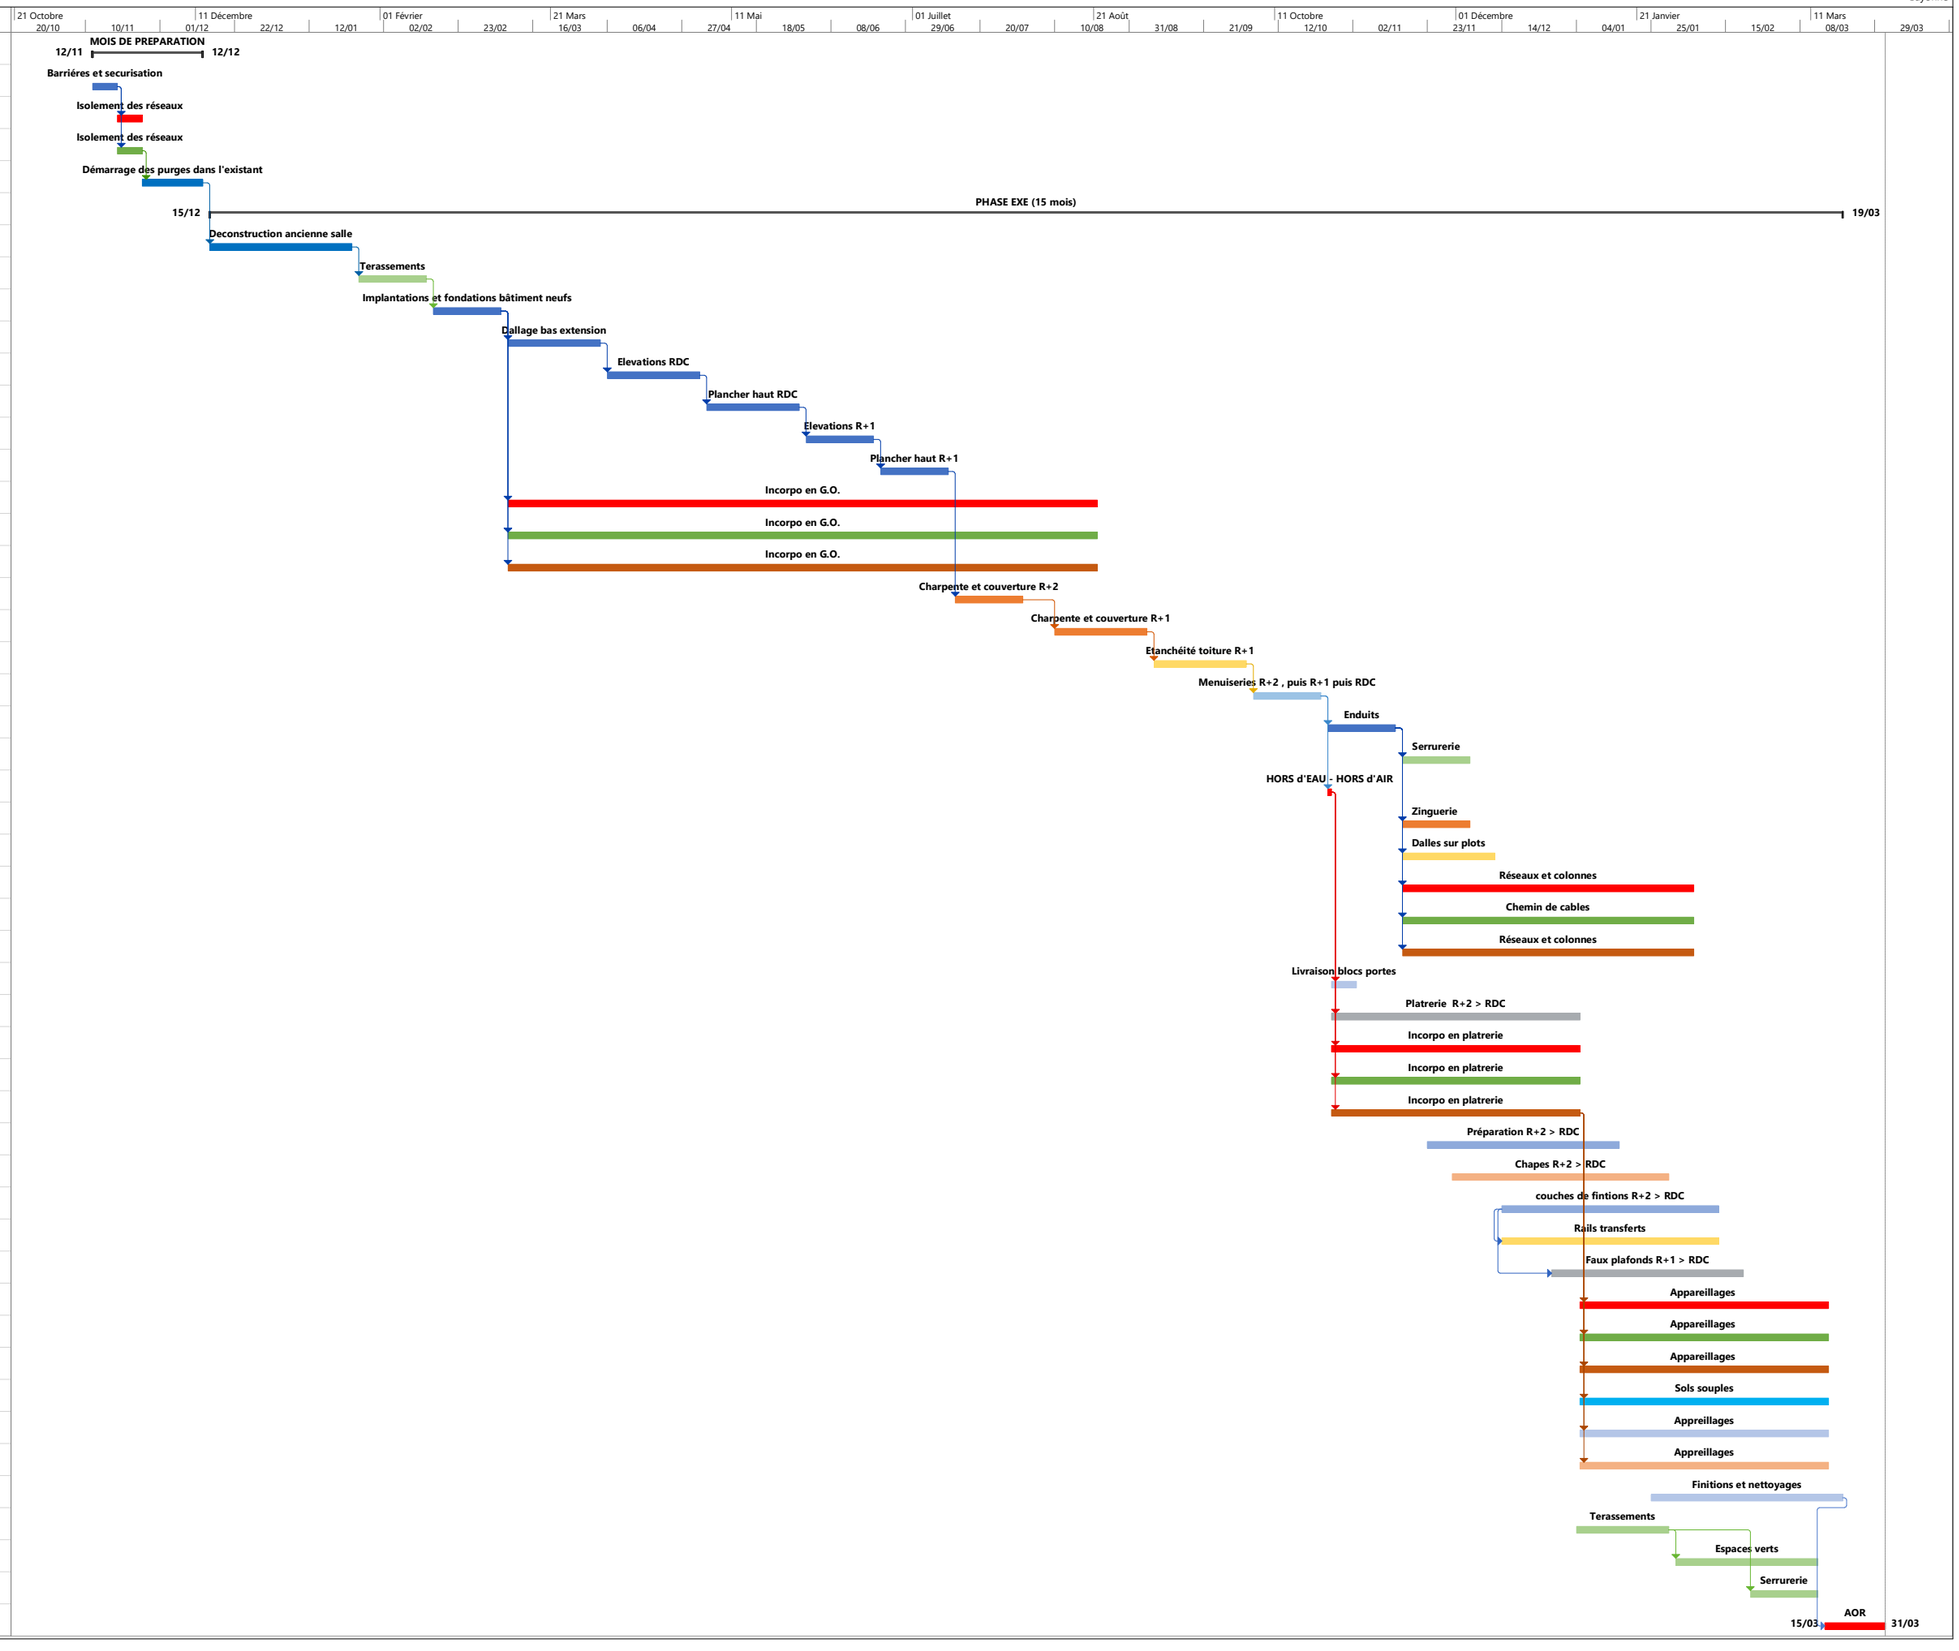
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Texte1
1	**MOIS DE PREPARATION**	**23 jours**	**Mer 12/11/25**	**Ven 12/12/25**	**TCE**
2	Barriéres et securisation	5 jours	Mer 12/11/25	Mar 18/11/25	lot 03
3	Isolement des réseaux	5 jours	Mer 19/11/25	Mar 25/11/25	lot 15
4	Isolement des réseaux	5 jours	Mer 19/11/25	Mar 25/11/25	lot 16
5	Démarrage des purges dans l'existant	13 jours	Mer 26/11/25	Ven 12/12/25	lot 02
6	**PHASE EXE (15 mois)**	**330 jours**	**Lun 15/12/25**	**Ven 19/03/27**	**TCE**
7	Deconstruction ancienne salle	30 jours	Lun 15/12/25	Ven 23/01/26	lot 02
8	Terassements	15 jours	Lun 26/01/26	Ven 13/02/26	lot 01
9	Implantations et fondations bâtiment neufs	15 jours	Lun 16/02/26	Ven 06/03/26	lot 03
10	Dallage bas extension	20 jours	Lun 09/03/26	Ven 03/04/26	lot 03
11	Elevations RDC	20 jours	Lun 06/04/26	Ven 01/05/26	lot 03
12	Plancher haut RDC	20 jours	Lun 04/05/26	Ven 29/05/26	lot 03
13	Elevations R+1	15 jours	Lun 01/06/26	Ven 19/06/26	lot 03
14	Plancher haut R+1	15 jours	Lun 22/06/26	Ven 10/07/26	lot 03
15	Incorpo en G.O.	120 jours	Lun 09/03/26	Ven 21/08/26	lot 15
16	Incorpo en G.O.	120 jours	Lun 09/03/26	Ven 21/08/26	lot 16
17	Incorpo en G.O.	120 jours	Lun 09/03/26	Ven 21/08/26	lot 17
18	Charpente et couverture R+2	15 jours	Lun 13/07/26	Ven 31/07/26	lot 04
19	Charpente et couverture R+1	20 jours	Lun 10/08/26	Ven 04/09/26	lot 04
20	Etanchéité toiture R+1	20 jours	Lun 07/09/26	Ven 02/10/26	lot 05
21	Menuiseries R+2 , puis R+1 puis RDC	15 jours	Lun 05/10/26	Ven 23/10/26	lot 07
22	Enduits	15 jours	Lun 26/10/26	Ven 13/11/26	lot 03
23	Serrurerie	15 jours	Lun 16/11/26	Ven 04/12/26	lot 06
24	HORS d'EAU - HORS d'AIR	1 jour	Lun 26/10/26	Lun 26/10/26	
25	Zinguerie	15 jours	Lun 16/11/26	Ven 04/12/26	lot 04
26	Dalles sur plots	20 jours	Lun 16/11/26	Ven 11/12/26	lot 05
27	Réseaux et colonnes	60 jours	Lun 16/11/26	Ven 05/02/27	lot 15
28	Chemin de cables	60 jours	Lun 16/11/26	Ven 05/02/27	lot 16
29	Réseaux et colonnes	60 jours	Lun 16/11/26	Ven 05/02/27	lot 17
30	Livraison blocs portes	5 jours	Mar 27/10/26	Lun 02/11/26	lot 08
31	Platrerie R+2 > RDC	50 jours	Mar 27/10/26	Lun 04/01/27	lot 09
32	Incorpo en platrerie	50 jours	Mar 27/10/26	Lun 04/01/27	lot 15
33	Incorpo en platrerie	50 jours	Mar 27/10/26	Lun 04/01/27	lot 16
34	Incorpo en platrerie	50 jours	Mar 27/10/26	Lun 04/01/27	lot 17
35	Préparation R+2 > RDC	40 jours	Lun 23/11/26	Ven 15/01/27	lot 11
36	Chapes R+2 > RDC	45 jours	Lun 30/11/26	Ven 29/01/27	lot 10
37	couches de fintions R+2 > RDC	45 jours	Lun 14/12/26	Ven 12/02/27	lot 11
38	Rails transferts	45 jours	Lun 14/12/26	Ven 12/02/27	lot 09
39	Faux plafonds R+1 > RDC	40 jours	Lun 28/12/26	Ven 19/02/27	lot 09
40	Appareillages	50 jours	Mar 05/01/27	Lun 15/03/27	lot 15
41	Appareillages	50 jours	Mar 05/01/27	Lun 15/03/27	lot 16
42	Appareillages	50 jours	Mar 05/01/27	Lun 15/03/27	lot 17
43	Sols souples	50 jours	Mar 05/01/27	Lun 15/03/27	lot 17
44	Appreillages	50 jours	Mar 05/01/27	Lun 15/03/27	lot 08
45	Appreillages	50 jours	Mar 05/01/27	Lun 15/03/27	lot 08
46	Finitions et nettoyages	40 jours	Lun 25/01/27	Ven 19/03/27	
47	Terassements	20 jours	Lun 04/01/27	Ven 29/01/27	lot 01
48	Espaces verts	30 jours	Lun 01/02/27	Ven 12/03/27	lot 01
49	Serrurerie	15 jours	Lun 22/02/27	Ven 12/03/27	lot 06
50	**AOR**	13 jours	Lun 15/03/27	Mer 31/03/27	TCE
