MAITRISE D'OUVRAGE : INP

PLANNING PREVISIONNEL
ENSIACET GTB
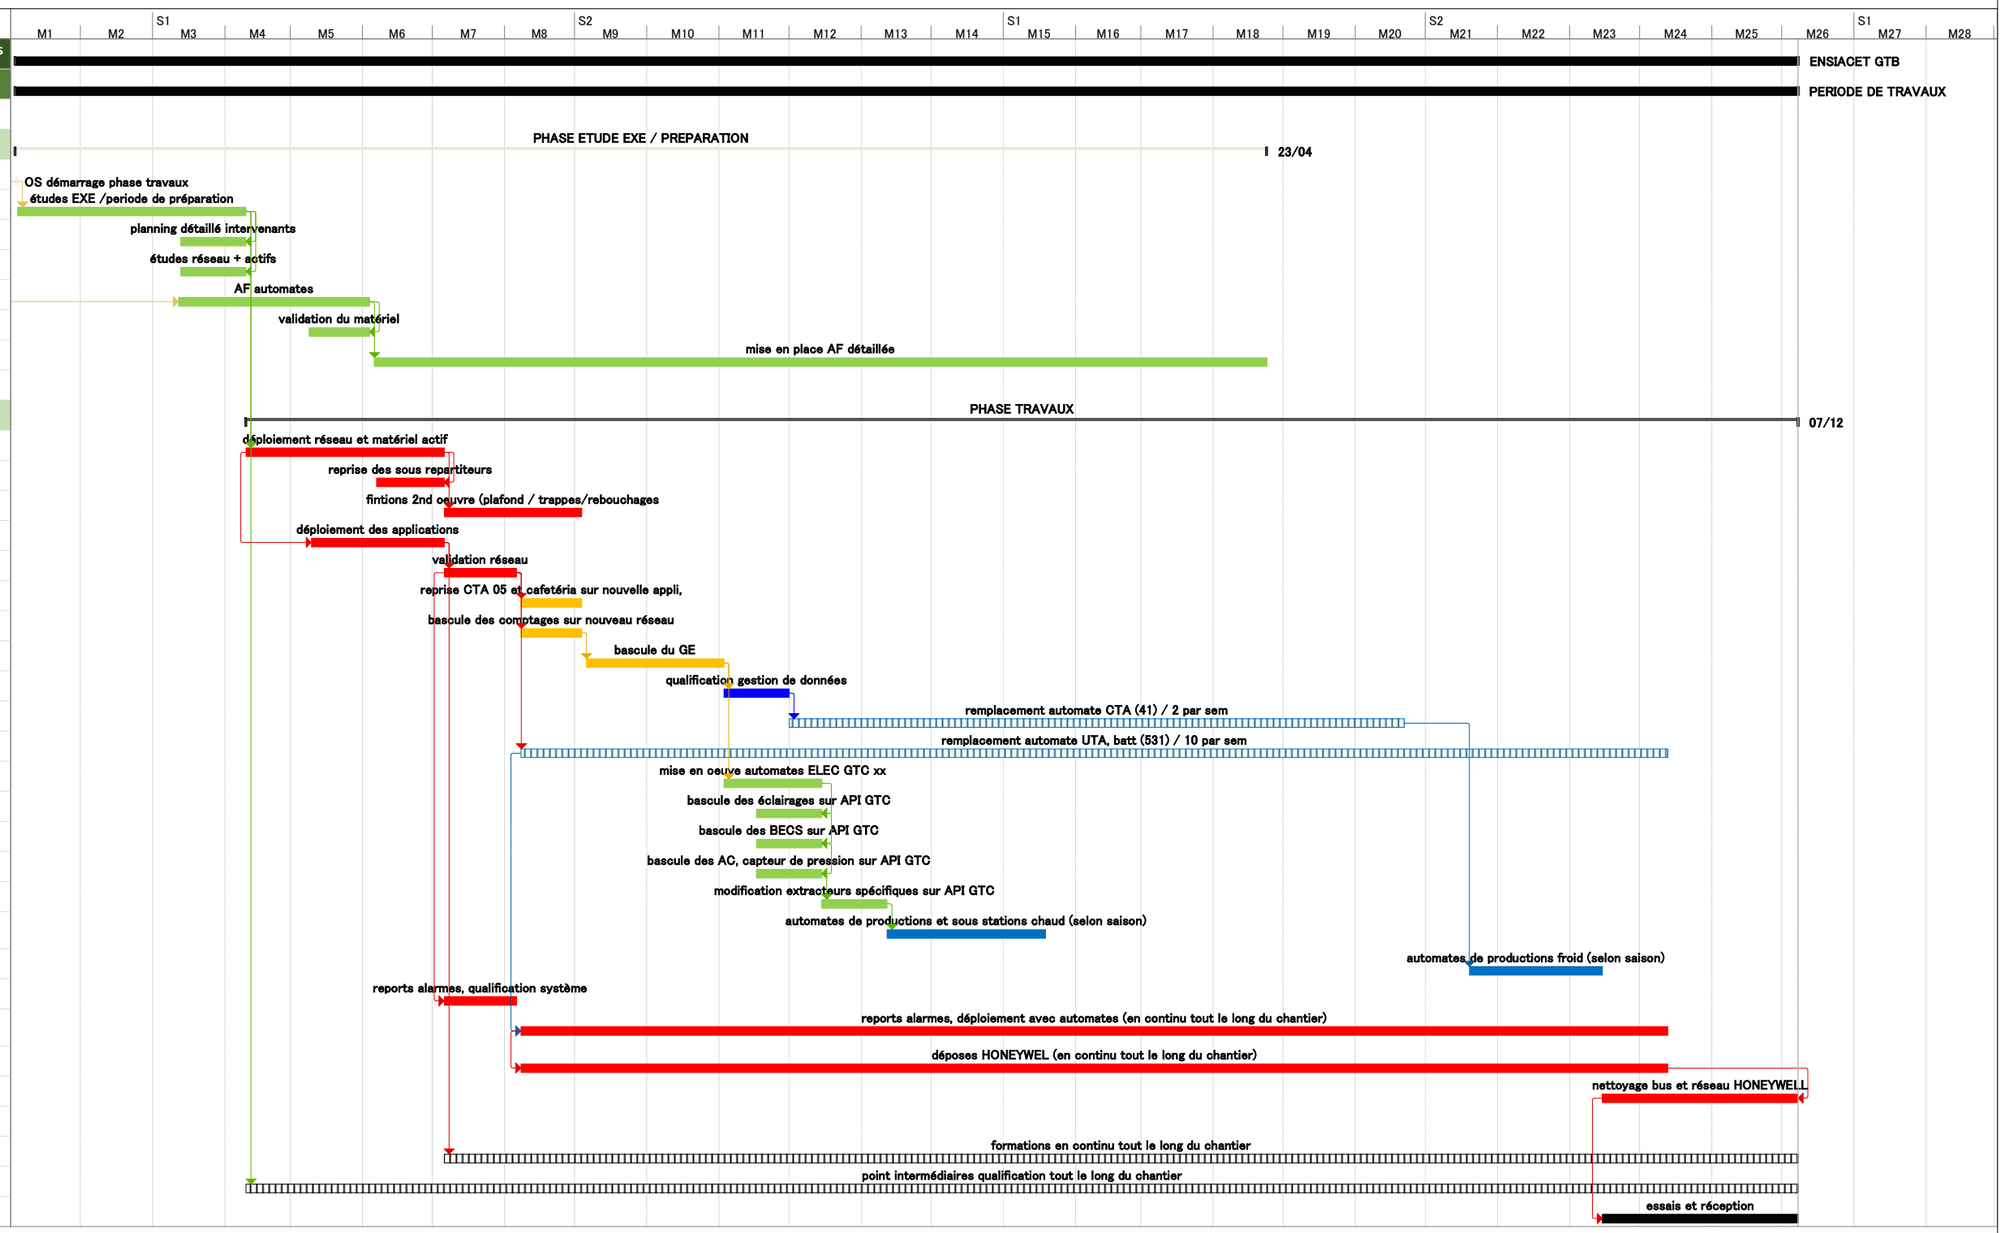
N°	Nom de la tâche	Durée
1	**ENSIACET GTB**	**24,05 mois**
2	**PERIODE DE TRAVAUX**	**24,05 mois**
3		
4	**PHASE ETUDE EXE / PREPARATION**	**17 mois**
5	OS démarrage phase travaux	1 jr
6	études EXE /periode de préparation	3 mois
7	planning détaillé intervenants	1 mois
8	études réseau + actifs	1 mois
9	AF automates	3 mois
10	validation du matériel	1 mois
11	mise en place AF détaillée	12 mois
12		
13	**PHASE TRAVAUX**	**21 mois**
14	déploiement réseau et matériel actif	3 mois
15	reprise des sous repartiteurs	1 mois
16	fintions 2nd oeuvre (plafond / trappes/rebouchages	2 mois
17	déploiement des applications	2 mois
18	validation réseau	1 mois
19	reprise CTA 05 et cafetéria sur nouvelle appli,	1 mois
20	bascule des comptages sur nouveau réseau	1 mois
21	bascule du GE	1 mois
22	qualification gestion de données	1 mois
23	remplacement automate CTA (41) / 2 par sem	9 mois
24	remplacement automate UTA, batt (531) / 10 par sem	15 mois
25	mise en oeuve automates ELEC GTC xx	6 sem.
26	bascule des éclairages sur API GTC	1 mois
27	bascule des BECS sur API GTC	1 mois
28	bascule des AC, capteur de pression sur API GTC	1 mois
29	modification extracteurs spécifiques sur API GTC	1 mois
30	automates de productions et sous stations chaud (selon saison)	2 mois
31	automates de productions froid (selon saison)	1 mois
32	reports alarmes, qualification système	1 mois
33	reports alarmes, déploiement avec automates (en continu tout le long du chantier)	15 mois
34	déposes HONEYWEL (en continu tout le long du chantier)	15 mois
35	nettoyage bus et réseau HONEYWELL	3 mois
36		
37	formations en continu tout le long du chantier	18 mois
38	point intermédiaires qualification tout le long du chantier	21 mois
39	essais et réception	3 mois
