# Diagramme de Gantt
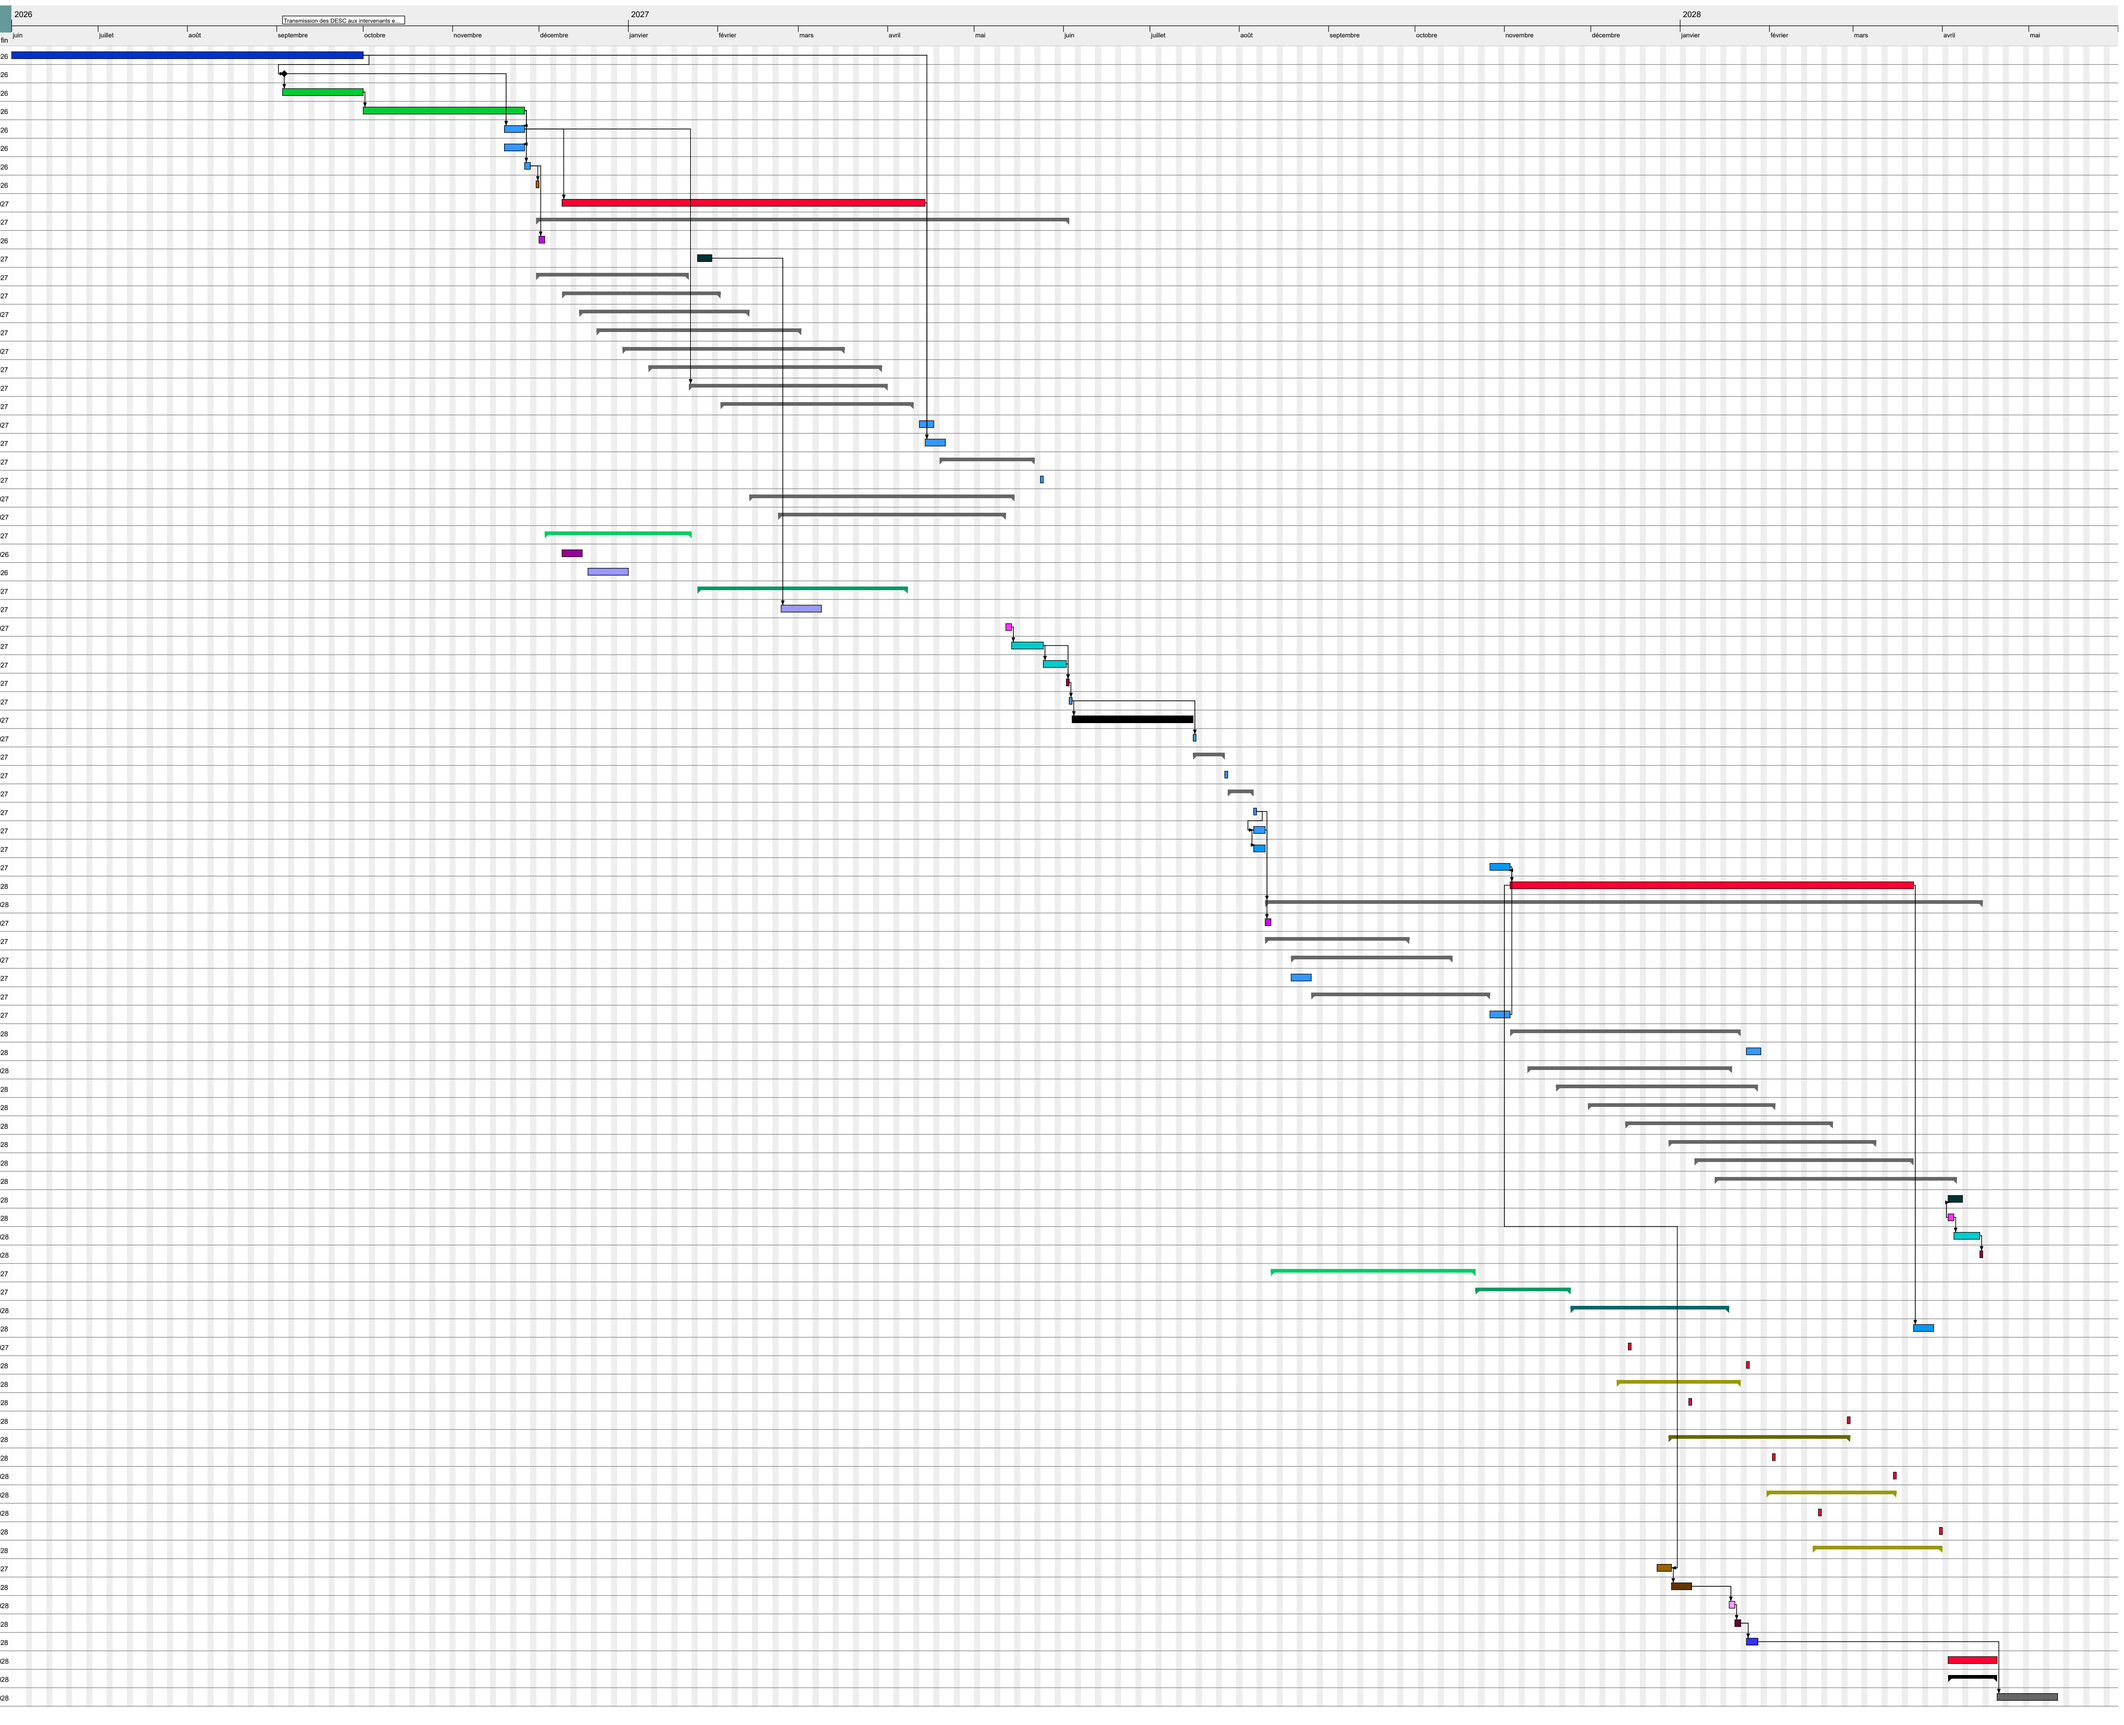
| Nom | Date de début | Durée | Date de fin |
|---|---|---|---|
| Période de préparation | 01/06/2026 | 88 | 30/09/2026 |
| Transmission des DESC aux intervenants extérieurs | 03/09/2026 | 0 | 03/09/2026 |
| Etudes préalable des gestionnaires extérieurs | 03/09/2026 | 20 | 30/09/2026 |
| Intervention des gestionnaires extérieures - Travaux | 01/10/2026 | 40 | 25/11/2026 |
| Déviation de Plombière sur Lesseps Sud | 19/11/2026 | 5 | 25/11/2026 |
| Modification provisoire du carrefour Lesseps | 19/11/2026 | 5 | 25/11/2026 |
| Signalisation provisoire Extrados | 26/11/2026 | 2 | 27/11/2026 |
| Dépose mât P4 | 30/11/2026 | 1 | 30/11/2026 |
| Configuration sans circulation sous OA - F... | 09/12/2026 | 90 | 13/04/2027 |
| Phase 1 | 30/11/2026 | 133 | 02/06/2027 |
| Phase 1 - Dépose de l'enrobé + caniveau | 01/12/2026 | 2 | 02/12/2026 |
| Travaux réfection assainissement culée C0'... | 25/01/2027 | 5 | 29/01/2027 |
| Plot 1 | 30/11/2026 | 39 | 21/01/2027 |
| Plot 11 | 09/12/2026 | 39 | 01/02/2027 |
| Plot 12 Sud | 15/12/2026 | 43 | 11/02/2027 |
| Plot 2 | 21/12/2026 | 51 | 01/03/2027 |
| Plot 3 | 30/12/2026 | 55 | 16/03/2027 |
| Plot 4 | 08/01/2027 | 57 | 29/03/2027 |
| Plot 5 | 22/01/2027 | 49 | 31/03/2027 |
| Plot 6 | 02/02/2027 | 49 | 09/04/2027 |
| Phase 1 - Signalisation/îlots provisoires carrefour Lesseps modification | 12/04/2027 | 5 | 16/04/2027 |
| Remise en état de la déviation Plombière sur Lesseps Sud | 14/04/2027 | 5 | 20/04/2027 |
| Plot 7 | 19/04/2027 | 25 | 21/05/2027 |
| Phase 1 - Signalisation provisoire carrefour Lesseps - Dépose | 24/05/2027 | 1 | 24/05/2027 |
| Plot 8 | 12/02/2027 | 66 | 14/05/2027 |
| Plot 9 | 22/02/2027 | 57 | 11/05/2027 |
| Phase 1 - Travaux voies d'accès C0' Nord | 03/12/2026 | 37 | 22/01/2027 |
| Phase 1 - Chambres de tirage et ouvrages réseaux | 09/12/2026 | 5 | 15/12/2026 |
| Phase 1 - Assainissement C0' hors ouvrage | 18/12/2026 | 10 | 31/12/2026 |
| Phase 1 - Travaux voies d'accès C8 Nord | 25/01/2027 | 53 | 07/04/2027 |
| Phase 1 - Assainissement C8 hors ouvrage +... | 23/02/2027 | 10 | 08/03/2027 |
| Phase 1 - Ponçage + grenaillage étanchéité... | 12/05/2027 | 2 | 13/05/2027 |
| Phase 1 - Etanchéité (hors interface longrine) + réception (essais) | 14/05/2027 | 7 | 24/05/2027 |
| Phase 1 - Relevé d'étanchéité + réception | 25/05/2027 | 6 | 01/06/2027 |
| Phase 1 - Couche reprofilage | 02/06/2027 | 1 | 02/06/2027 |
| Phase 1 - Dépose signalisation provisoire Extrados | 03/06/2027 | 1 | 03/06/2027 |
| Marge Post-Phase 1 | 04/06/2027 | 30 | 15/07/2027 |
| Phase 2 - Fermeture A7>A557 + Pose signalisation provisoire Extrados | 16/07/2027 | 1 | 16/07/2027 |
| Phase 2 | 16/07/2027 | 7 | 26/07/2027 |
| Phase 2/3 - Dépose/Pose signalisation provisoire Extrados | 27/07/2027 | 1 | 27/07/2027 |
| Phase 3 | 28/07/2027 | 7 | 05/08/2027 |
| Phase 3 - Dépose signalisation provisoire Extrados | 06/08/2027 | 1 | 06/08/2027 |
| Phase 4 - Ouverture A7>A557 + Signalisation provisoire Extrados | 06/08/2027 | 2 | 09/08/2027 |
| Phase 4 - Modification de la signalisation provisoire sous l'OA | 06/08/2027 | 2 | 09/08/2027 |
| Déviation de Plombère sur Lesseps Sud | 27/10/2027 | 5 | 02/11/2027 |
| Configuration sans circulation sous OA - F... | 03/11/2027 | 100 | 21/03/2028 |
| Phase 4 | 10/08/2027 | 179 | 14/04/2028 |
| Phase 4 - Dépose de l'enrobé + caniveau | 10/08/2027 | 2 | 11/08/2027 |
| Plot 21 | 10/08/2027 | 36 | 28/09/2027 |
| Plot 20 | 19/08/2027 | 40 | 13/10/2027 |
| Signalisation provisoire carrefour Lesseps - Installation | 19/08/2027 | 5 | 25/08/2027 |
| Plot 19 | 26/08/2027 | 44 | 26/10/2027 |
| Signalisation provisoire carrefour Lesseps - Modification | 27/10/2027 | 5 | 02/11/2027 |
| Plot 18 | 03/11/2027 | 58 | 21/01/2028 |
| Signalisation provisoire carrefour Lesseps - Dépose | 24/01/2028 | 5 | 28/01/2028 |
| Plot 17 | 09/11/2027 | 51 | 18/01/2028 |
| Plot 16 | 19/11/2027 | 50 | 27/01/2028 |
| Plot 15 | 30/11/2027 | 47 | 02/02/2028 |
| Plot 14 | 13/12/2027 | 52 | 22/02/2028 |
| Plot 13 | 28/12/2027 | 52 | 08/03/2028 |
| Plot 12 Nord | 06/01/2028 | 54 | 21/03/2028 |
| Plot 10 | 13/01/2028 | 60 | 05/04/2028 |
| Travaux réfection assainissement culée C0'... | 03/04/2028 | 5 | 07/04/2028 |
| Phase 4 - Ponçage + grenaillage étanchéité existante | 03/04/2028 | 2 | 04/04/2028 |
| Phase 4 - Etanchéité | 05/04/2028 | 7 | 13/04/2028 |
| Phase 4 - Couche reprofilage | 14/04/2028 | 1 | 14/04/2028 |
| Phase 4 - Travaux voies d'accès C8 Sud | 12/08/2027 | 51 | 21/10/2027 |
| Phase 4 - Travaux voies d'accès C0 Sud | 22/10/2027 | 23 | 23/11/2027 |
| Phase 4 - Travaux voies d'accès C0 Nord - C0' Sud | 24/11/2027 | 39 | 17/01/2028 |
| Remise en état de la déviation Plombière sur Lesseps Sud | 22/03/2028 | 5 | 28/03/2028 |
| Fermeture de nuit pour opération vérinage | 14/12/2027 | 1 | 14/12/2027 |
| Fermeture de nuit pour opération dévérinage | 24/01/2028 | 1 | 24/01/2028 |
| Culée C8 - Remplacement des appareils d'appuis | 10/12/2027 | 31 | 21/01/2028 |
| Fermeture de nuit pour opération vérinage | 04/01/2028 | 1 | 04/01/2028 |
| Fermeture de nuit pour opération dévérinage | 28/02/2028 | 1 | 28/02/2028 |
| Piles P3-P4 - Remplacement des appareils d'appuis | 28/12/2027 | 45 | 28/02/2028 |
| Fermeture de nuit pour opération vérinage | 02/02/2028 | 1 | 02/02/2028 |
| Fermeture de nuit pour opération dévérinage | 15/03/2028 | 1 | 15/03/2028 |
| Culée C0 - Remplacement des appareils d'appuis | 31/01/2028 | 33 | 15/03/2028 |
| Fermeture de nuit pour opération vérinage | 18/02/2028 | 1 | 18/02/2028 |
| Fermeture de nuit pour opération dévérinage | 31/03/2028 | 1 | 31/03/2028 |
| Culée C0' - Remplacement des appareils d'appuis | 16/02/2028 | 33 | 31/03/2028 |
| Repose mât P4 | 24/12/2027 | 3 | 28/12/2027 |
| Repose portique C8 | 29/12/2027 | 5 | 04/01/2028 |
| Rabotage final | 18/01/2028 | 2 | 19/01/2028 |
| Enrobé final | 20/01/2028 | 2 | 21/01/2028 |
| Signalisation définitive | 24/01/2028 | 4 | 27/01/2028 |
| 8 Fermetures de nuit pour remplacement des joints de chaussées | 03/04/2028 | 13 | 19/04/2028 |
| Remplacement des joints de chaussée (par 1/2 largeur) | 03/04/2028 | 13 | 19/04/2028 |
| Repli des installations de chantier | 20/04/2028 | 15 | 10/05/2028 |
