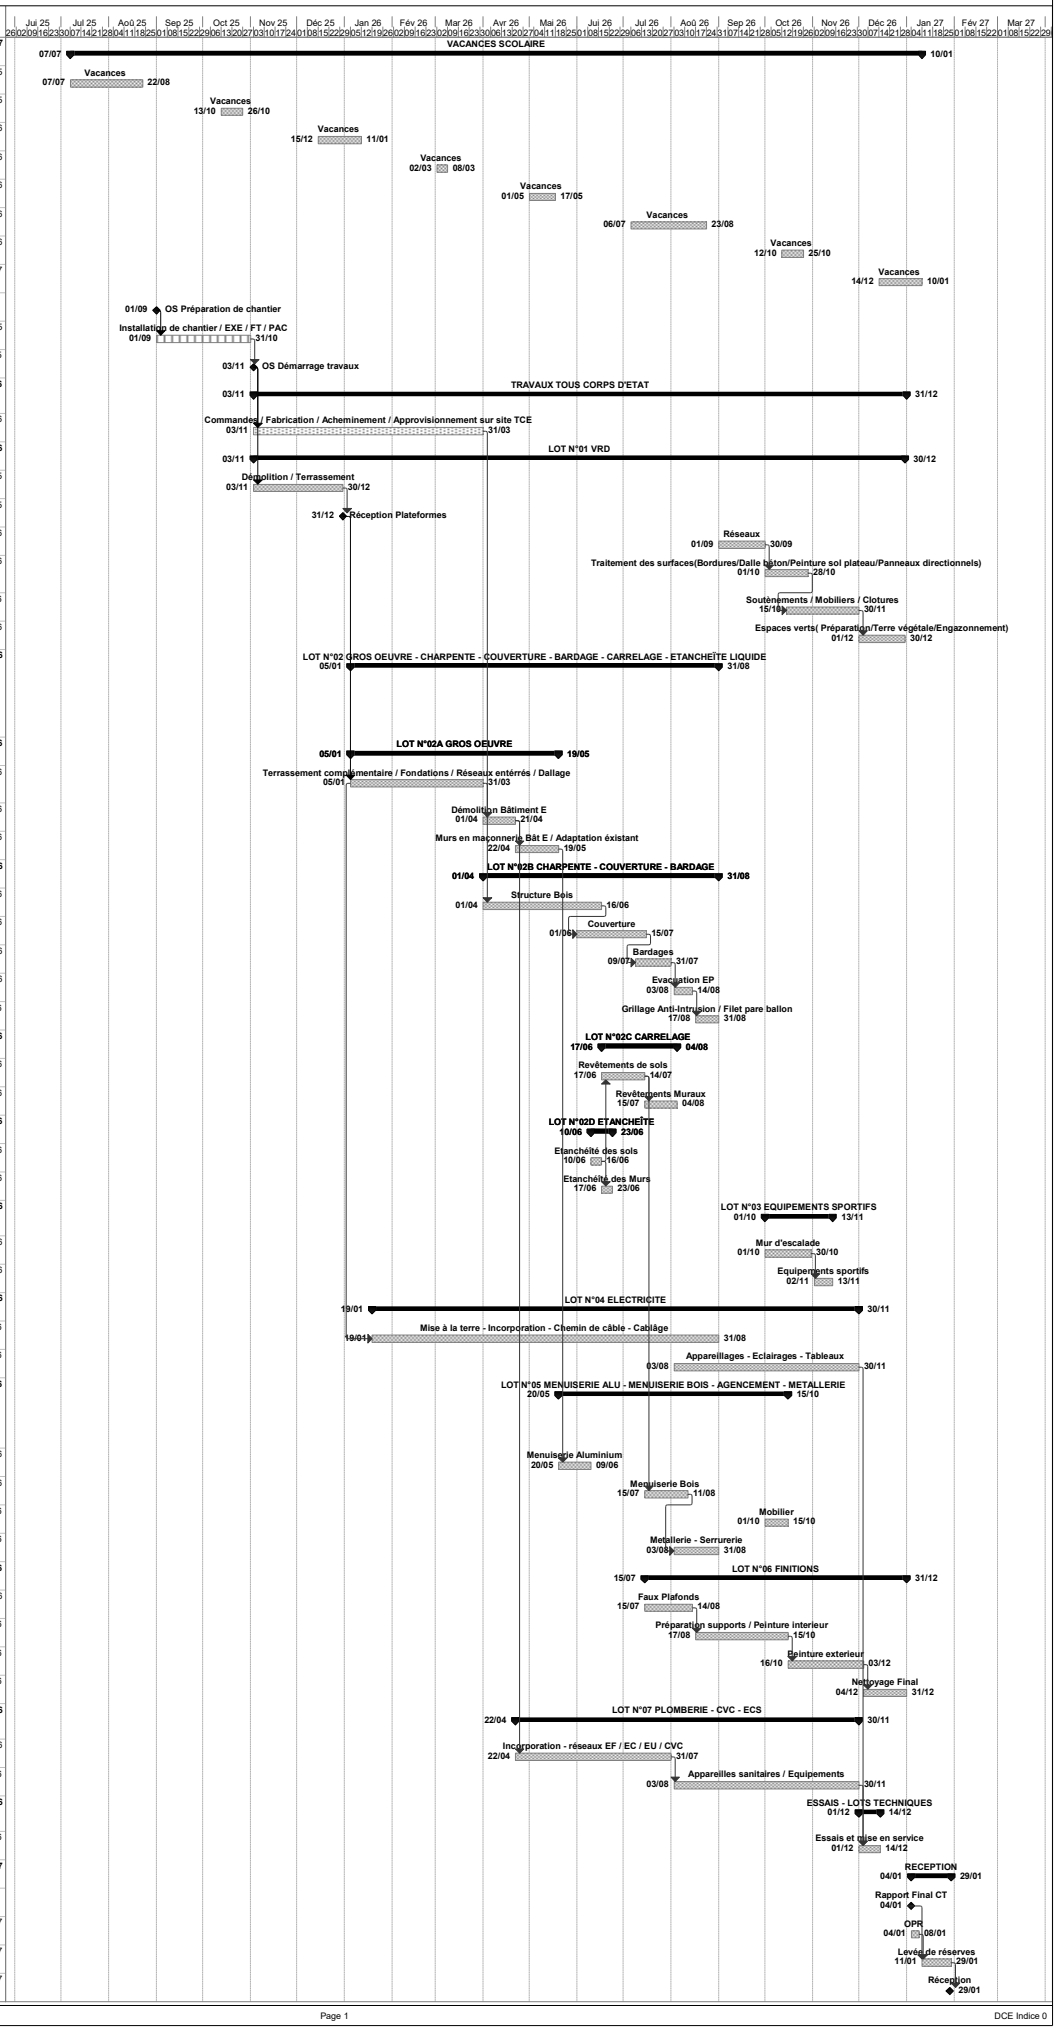N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**VACANCES SCOLAIRE**	**395 jrs**	**Lun 07/07/25**	**Dim 10/01/27**
2	Vacances	35 jrs	Lun 07/07/25	Ven 22/08/25
3	Vacances	11 jrs	Lun 13/10/25	Dim 26/10/25
4	Vacances	21 jrs	Lun 15/12/25	Dim 11/01/26
5	Vacances	6 jrs	Lun 02/03/26	Dim 08/03/26
6	Vacances	12 jrs	Ven 01/05/26	Dim 17/05/26
7	Vacances	36 jrs	Lun 06/07/26	Dim 23/08/26
8	Vacances	11 jrs	Lun 12/10/26	Dim 25/10/26
9	Vacances	21 jrs	Lun 14/12/26	Dim 10/01/27
10	OS Préparation de chantier		Lun 01/09/25	
11	Installation de chantier / EXE / FT / PAC	45 jrs	Lun 01/09/25	Ven 31/10/25
12	OS Démarrage travaux	0 jr	Lun 03/11/25	Lun 03/11/25
13	**TRAVAUX TOUS CORPS D'ETAT**	**304 jrs**	**Lun 03/11/25**	**Jeu 31/12/26**
14	Commandes / Fabrication / Acheminement / Approvisionnement sur site TCE	107 jrs	Lun 03/11/25	Mar 31/03/26
15	**LOT N°01 VRD**	**303 jrs**	**Lun 03/11/25**	**Mer 30/12/26**
16	Démolition / Terrassement	42 jrs	Lun 03/11/25	Mar 30/12/25
17	Réception Plateformes	1 jr	Mer 31/12/25	Mer 31/12/25
18	Réseaux	22 jrs	Mar 01/09/26	Mer 30/09/26
19	Traitement des surfaces(Bordures/Dalle béton/Peinture sol plateau/Panneaux directionnels)	20 jrs	Jeu 01/10/26	Mer 28/10/26
20	Soutènements / Mobiliers / Clotures	33 jrs	Jeu 15/10/26	Lun 30/11/26
21	Espaces verts(Préparation/Terre végétale/Engazonnement)	22 jrs	Mar 01/12/26	Mer 30/12/26
22	**LOT N°02 GROS OEUVRE - CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE - CARRELAGE - ETANCHEÎTE LIQUIDE**	**171 jrs**	**Lun 05/01/26**	**Lun 31/08/26**
23	**LOT N°02A GROS OEUVRE**	**97 jrs**	**Lun 05/01/26**	**Mar 19/05/26**
24	Terrassement complémentaire / Fondations / Réseaux enterrés / Dallage	62 jrs	Lun 05/01/26	Mar 31/03/26
25	Démolition Bâtiment E	15 jrs	Mer 01/04/26	Mar 21/04/26
26	Murs en maçonnerie Bât E / Adaptation éxistant	20 jrs	Mer 22/04/26	Mar 19/05/26
27	**LOT N°02B CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE**	**109 jrs**	**Mer 01/04/26**	**Lun 31/08/26**
28	Structure Bois	55 jrs	Mer 01/04/26	Mar 16/06/26
29	Couverture	33 jrs	Lun 01/06/26	Mer 15/07/26
30	Bardages	17 jrs	Jeu 09/07/26	Ven 31/07/26
31	Evacuation EP	10 jrs	Lun 03/08/26	Ven 14/08/26
32	Grillage Anti-Intrusion / Filet pare ballon	11 jrs	Lun 17/08/26	Lun 31/08/26
33	**LOT N°02C CARRELAGE**	**35 jrs**	**Mer 17/06/26**	**Mar 04/08/26**
34	Revêtements de sols	20 jrs	Mer 17/06/26	Mar 14/07/26
35	Revêtements Muraux	15 jrs	Mer 15/07/26	Mar 04/08/26
36	**LOT N°02D ETANCHEÎTE**	**10 jrs**	**Mer 10/06/26**	**Mar 23/06/26**
37	Etanchéîté des sols	5 jrs	Mer 10/06/26	Mar 16/06/26
38	Etanchéîté des Murs	5 jrs	Mer 17/06/26	Mar 23/06/26
39	**LOT N°03 EQUIPEMENTS SPORTIFS**	**32 jrs**	**Jeu 01/10/26**	**Ven 13/11/26**
40	Mur d'escalade	22 jrs	Jeu 01/10/26	Ven 30/10/26
41	Equipements sportifs	10 jrs	Lun 02/11/26	Ven 13/11/26
42	**LOT N°04 ELECTRICITE**	**226 jrs**	**Lun 19/01/26**	**Lun 30/11/26**
43	Mise à la terre - Incorporation - Chemin de câble - Cablâge	161 jrs	Lun 19/01/26	Lun 31/08/26
44	Appareillages - Eclairages - Tableaux	86 jrs	Lun 03/08/26	Lun 30/11/26
45	**LOT N°05 MENUISERIE ALU - MENUISERIE BOIS - AGENCEMENT - METALLERIE**	**107 jrs**	**Mer 20/05/26**	**Jeu 15/10/26**
46	Menuiserie Aluminium	15 jrs	Mer 20/05/26	Mar 09/06/26
47	Menuiserie Bois	20 jrs	Mer 15/07/26	Mar 11/08/26
48	Mobilier	11 jrs	Jeu 01/10/26	Jeu 15/10/26
49	Metallerie - Serrurerie	21 jrs	Lun 03/08/26	Lun 31/08/26
50	**LOT N°06 FINITIONS**	**122 jrs**	**Mer 15/07/26**	**Jeu 31/12/26**
51	Faux Plafonds	23 jrs	Mer 15/07/26	Ven 14/08/26
52	Préparation supports / Peinture interieur	44 jrs	Lun 17/08/26	Jeu 15/10/26
53	Peinture exterieur	35 jrs	Ven 16/10/26	Jeu 03/12/26
54	Nettoyage Final	20 jrs	Ven 04/12/26	Jeu 31/12/26
55	**LOT N°07 PLOMBERIE - CVC - ECS**	**159 jrs**	**Mer 22/04/26**	**Lun 30/11/26**
56	Incorporation - réseaux EF / EC / EU / CVC	73 jrs	Mer 22/04/26	Ven 31/07/26
57	Appareilles sanitaires / Equipements	86 jrs	Lun 03/08/26	Lun 30/11/26
58	**ESSAIS - LOTS TECHNIQUES**	**10 jrs**	**Mar 01/12/26**	**Lun 14/12/26**
59	Essais et mise en service	10 jrs	Mar 01/12/26	Lun 14/12/26
60	**RECEPTION**	**20 jrs**	**Lun 04/01/27**	**Ven 29/01/27**
61	Rapport Final CT		Lun 04/01/27	
62	OPR	5 jrs	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27
63	Levée de réserves	15 jrs	Lun 11/01/27	Ven 29/01/27
64	Réception	0 jr	Ven 29/01/27	Ven 29/01/27
