N°	Nom de la tâche	Durée
1	**Période de préparation**	**65 jours**
2	Etude d'execution	13 semaines
3	Appro PAC + CTA	16 semaines
4	**Travaux**	**110 jours**
5	**Travaux préparatoires**	**25 jours**
6	Dépose SOE avant corps et plafond aile nord	2 semaines
7	Modification des éclairages	1 semaine
8	Modification des têtes de DI de l'aile nord (action MOA)	1 semaine
9	Création de la plateforme support d'équipements et son escalier	2 semaines
10	Dépose menuiseries + pose grilles extérieures	1 semaine
11	**Travaux neuf CVC**	**55 jours**
12	Livraison PAC + CTA	1 semaine
13	Tuyauterie sous station	5 semaines
14	Gaines CTA	3 semaines
15	Tuyauterie secondaire / panoplie CTA	2 semaines
16	Electricité	3 semaines
17	Calorifuges hydraulique et aéraulique	3 semaines
18	Essais, formation	1 semaine
19	**Travaux de dépose existant**	**30 jours**
20	Dépose amiantée	4 semaines
21	Mesure amiante après travaux MOA	1 semaine
22	Dépose chaufferie, sous station, radiateurs	2 semaines

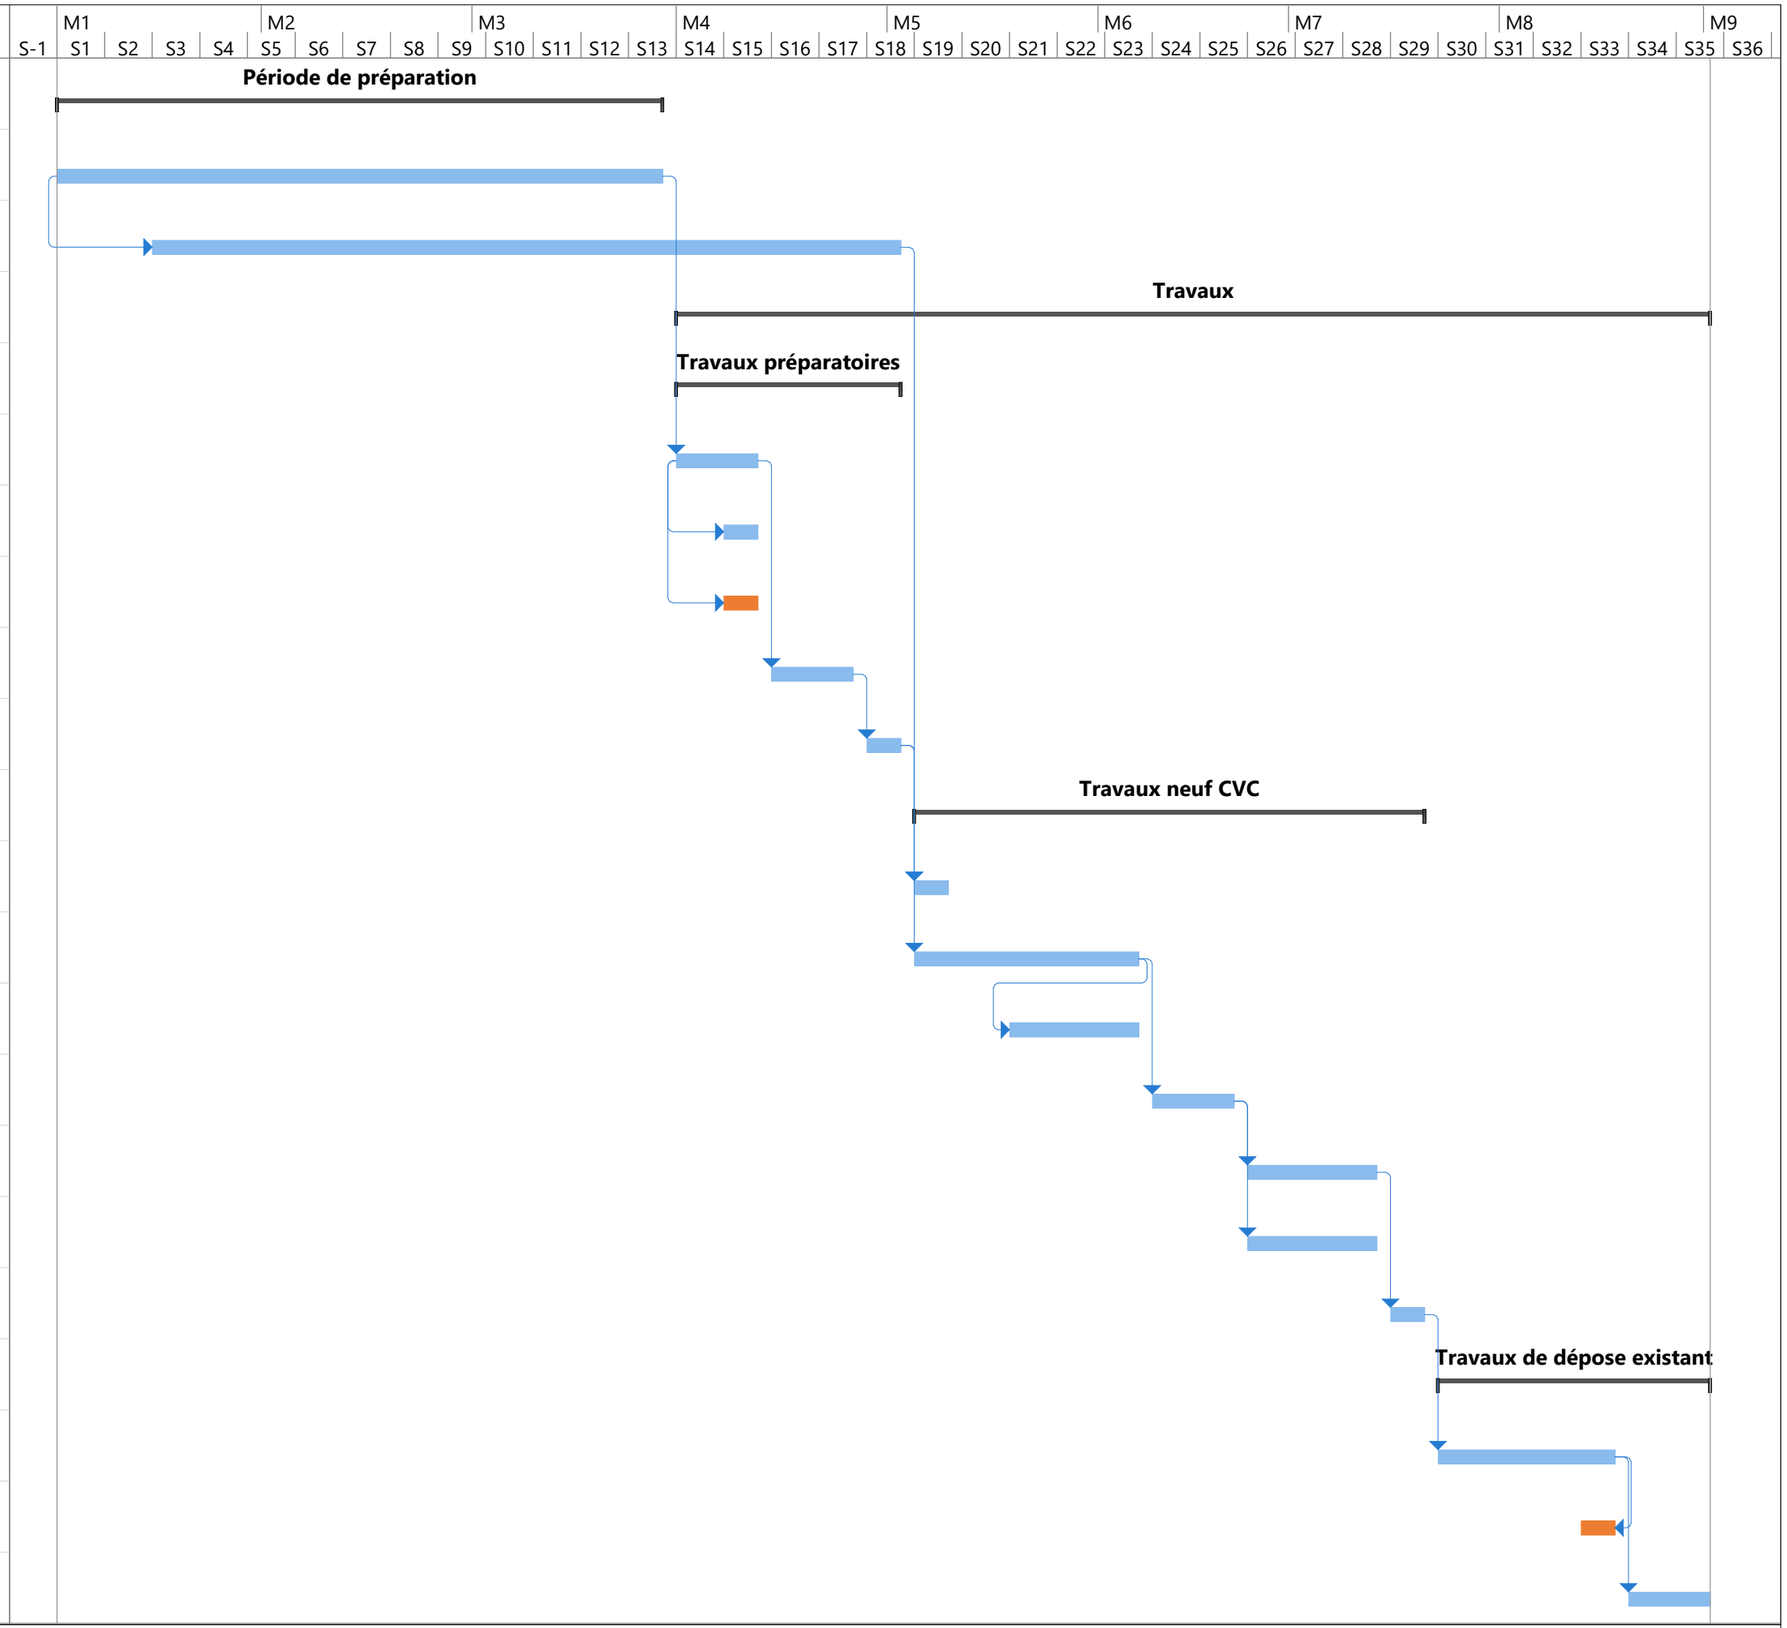

CHE_PAC+CTA_planning
