CNRS - Gif-sur-Yvette
Bâtiment 14
Planning prévisionnel
Phasage
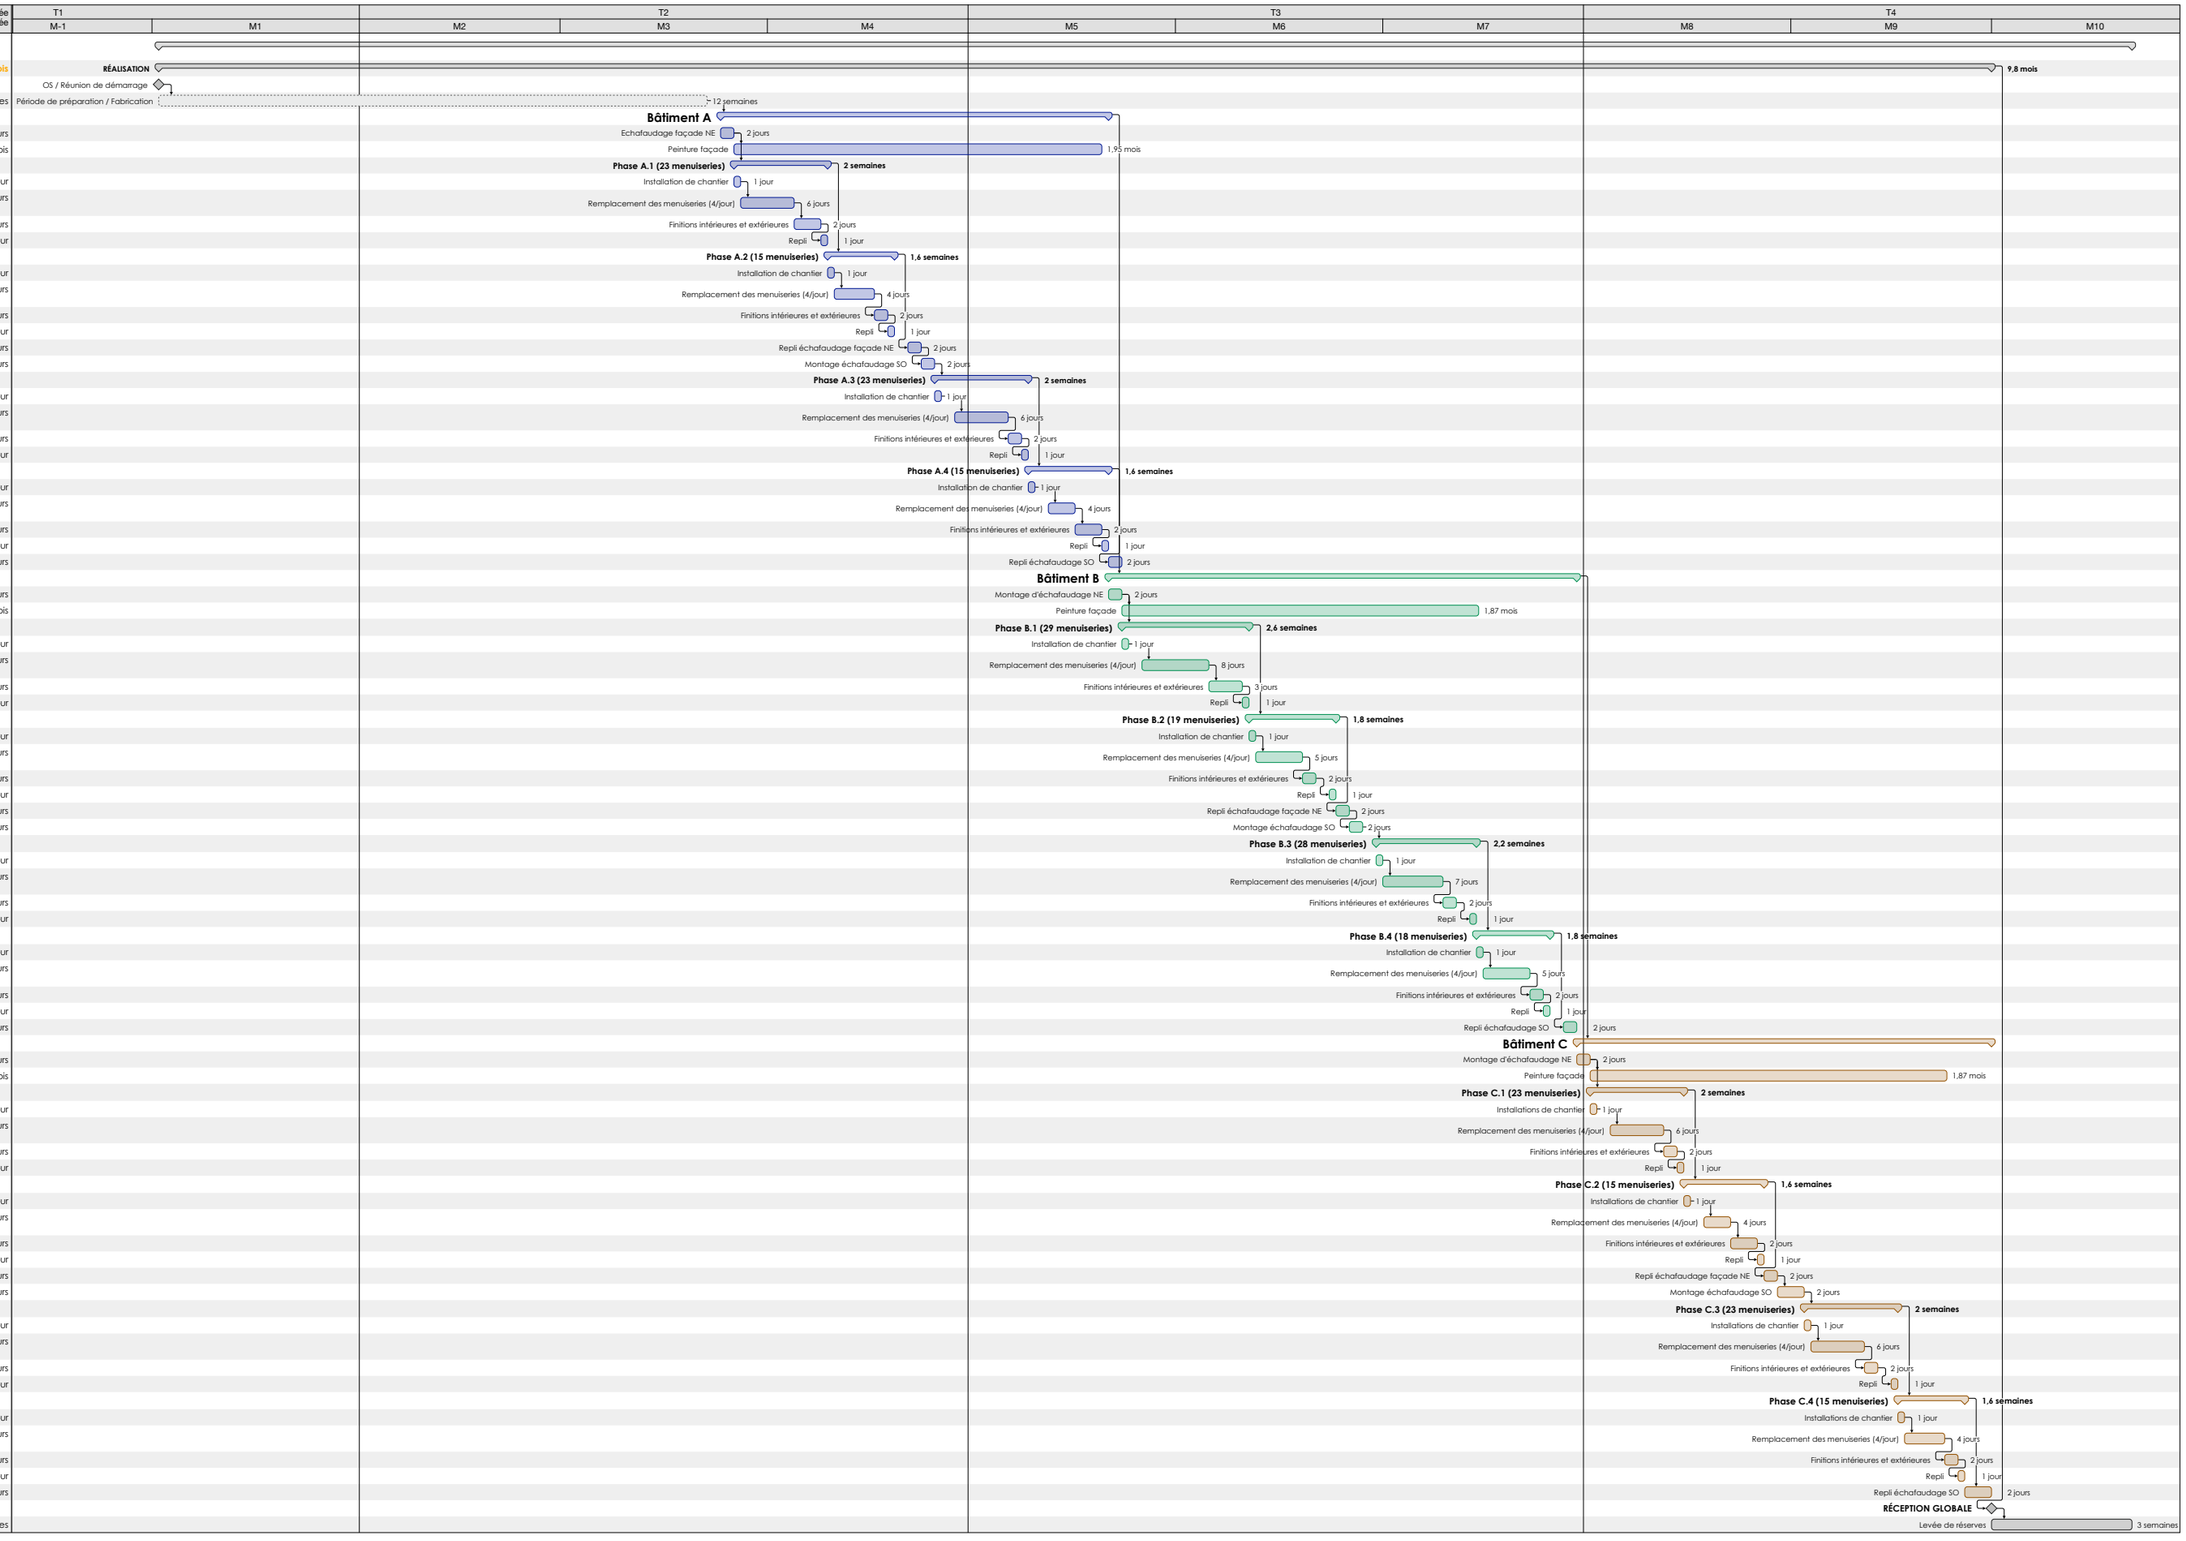
#	Traits	Titre	Durée donnée
0		**24LRX11_CNRS_Gif sur Yvette_Bât 14_Planning_PRO**	
1		**RÉALISATION**	8,55 mois
2		OS / Réunion de démarrage	
3		Période de préparation / Fabrication	12 semaines
4		**Bâtiment A**	
5		Echafaudage façade NE	2 jours
6		Peinture façade	1,95 mois
7		**Phase A.1 (23 menuiseries)**	
8		Installation de chantier	1 jour
9		Remplacement des menuiseries (4/jour)	6 jours
10		Finitions intérieures et extérieures	2 jours
11		Repli	1 jour
12		**Phase A.2 (15 menuiseries)**	
13		Installation de chantier	1 jour
14		Remplacement des menuiseries (4/jour)	4 jours
15		Finitions intérieures et extérieures	2 jours
16		Repli	1 jour
17		Repli échafaudage façade NE	2 jours
18		Montage échafaudage SO	2 jours
19		**Phase A.3 (23 menuiseries)**	
20		Installation de chantier	1 jour
21		Remplacement des menuiseries (4/jour)	6 jours
22		Finitions intérieures et extérieures	2 jours
23		Repli	1 jour
24		**Phase A.4 (15 menuiseries)**	
25		Installation de chantier	1 jour
26		Remplacement des menuiseries (4/jour)	4 jours
27		Finitions intérieures et extérieures	2 jours
28		Repli	1 jour
29		Repli échafaudage SO	2 jours
30		**Bâtiment B**	
31		Montage d'échafaudage NE	2 jours
32		Peinture façade	1,87 mois
33		**Phase B.1 (29 menuiseries)**	
34		Installation de chantier	1 jour
35		Remplacement des menuiseries (4/jour)	8 jours
36		Finitions intérieures et extérieures	3 jours
37		Repli	1 jour
38		**Phase B.2 (19 menuiseries)**	
39		Installation de chantier	1 jour
40		Remplacement des menuiseries (4/jour)	5 jours
41		Finitions intérieures et extérieures	2 jours
42		Repli	1 jour
43		Repli échafaudage façade NE	2 jours
44		Montage échafaudage SO	2 jours
45		**Phase B.3 (28 menuiseries)**	
46		Installation de chantier	1 jour
47		Remplacement des menuiseries (4/jour)	7 jours
48		Finitions intérieures et extérieures	2 jours
49		Repli	1 jour
50		**Phase B.4 (18 menuiseries)**	
51		Installation de chantier	1 jour
52		Remplacement des menuiseries (4/jour)	5 jours
53		Finitions intérieures et extérieures	2 jours
54		Repli	1 jour
55		Repli échafaudage SO	2 jours
56		**Bâtiment C**	
57		Montage d'échafaudage NE	2 jours
58		Peinture façade	1,87 mois
59		**Phase C.1 (23 menuiseries)**	
60		Installations de chantier	1 jour
61		Remplacement des menuiseries (4/jour)	6 jours
62		Finitions intérieures et extérieures	2 jours
63		Repli	1 jour
64		**Phase C.2 (15 menuiseries)**	
65		Installations de chantier	1 jour
66		Remplacement des menuiseries (4/jour)	4 jours
67		Finitions intérieures et extérieures	2 jours
68		Repli	1 jour
69		Repli échafaudage façade NE	2 jours
70		Montage échafaudage SO	2 jours
71		**Phase C.3 (23 menuiseries)**	
72		Installations de chantier	1 jour
73		Remplacement des menuiseries (4/jour)	6 jours
74		Finitions intérieures et extérieures	2 jours
75		Repli	1 jour
76		**Phase C.4 (15 menuiseries)**	
77		Installations de chantier	1 jour
78		Remplacement des menuiseries (4/jour)	4 jours
79		Finitions intérieures et extérieures	2 jours
80		Repli	1 jour
81		Repli échafaudage SO	2 jours
82	!!!	**RÉCEPTION GLOBALE**	
83		Levée de réserves	3 semaines
