AME Architecture
DCE
Ind. A

CNRS - Gif-sur-Yvette
Bâtiment 14
Planning prévisionnel
Phasage

#	Traits	Titre	Durée donnée
0		**24LRX11_CNRS_Gif sur Yvette_Bât 14_Planning_PRO**	
1	!	**RÉALISATION**	8,55 mois
2		OS / Réunion de démarrage	
3		Période de préparation / Fabrication	12 semaines
4		**Bâtiment A**	
5		Echafaudage façade NE	2 jours
6		Peinture façade	1,95 mois
7		**Phase A.1 (23 menuiseries)**	
12		**Phase A.2 (15 menuiseries)**	
17		Repli échafaudage façade NE	2 jours
18		Montage échafaudage SO	2 jours
19		**Phase A.3 (23 menuiseries)**	
24		**Phase A.4 (15 menuiseries)**	
29		Repli échafaudage SO	2 jours
30		**Bâtiment B**	
31		Montage d'échafaudage NE	2 jours
32		Peinture façade	1,87 mois
33		**Phase B.1 (29 menuiseries)**	
38		**Phase B.2 (19 menuiseries)**	
43		Repli échafaudage façade NE	2 jours
44		Montage échafaudage SO	2 jours
45		**Phase B.3 (28 menuiseries)**	
50		**Phase B.4 (18 menuiseries)**	
55		Repli échafaudage SO	2 jours
56		**Bâtiment C**	
57		Montage d'échafaudage NE	2 jours
58		Peinture façade	1,87 mois
59		**Phase C.1 (23 menuiseries)**	
64		**Phase C.2 (15 menuiseries)**	
69		Repli échafaudage façade NE	2 jours
70		Montage échafaudage SO	2 jours
71		**Phase C.3 (23 menuiseries)**	
76		**Phase C.4 (15 menuiseries)**	
81		Repli échafaudage SO	2 jours
82	!!!	**RÉCEPTION GLOBALE**	
83		Levée de réserves	3 semaines

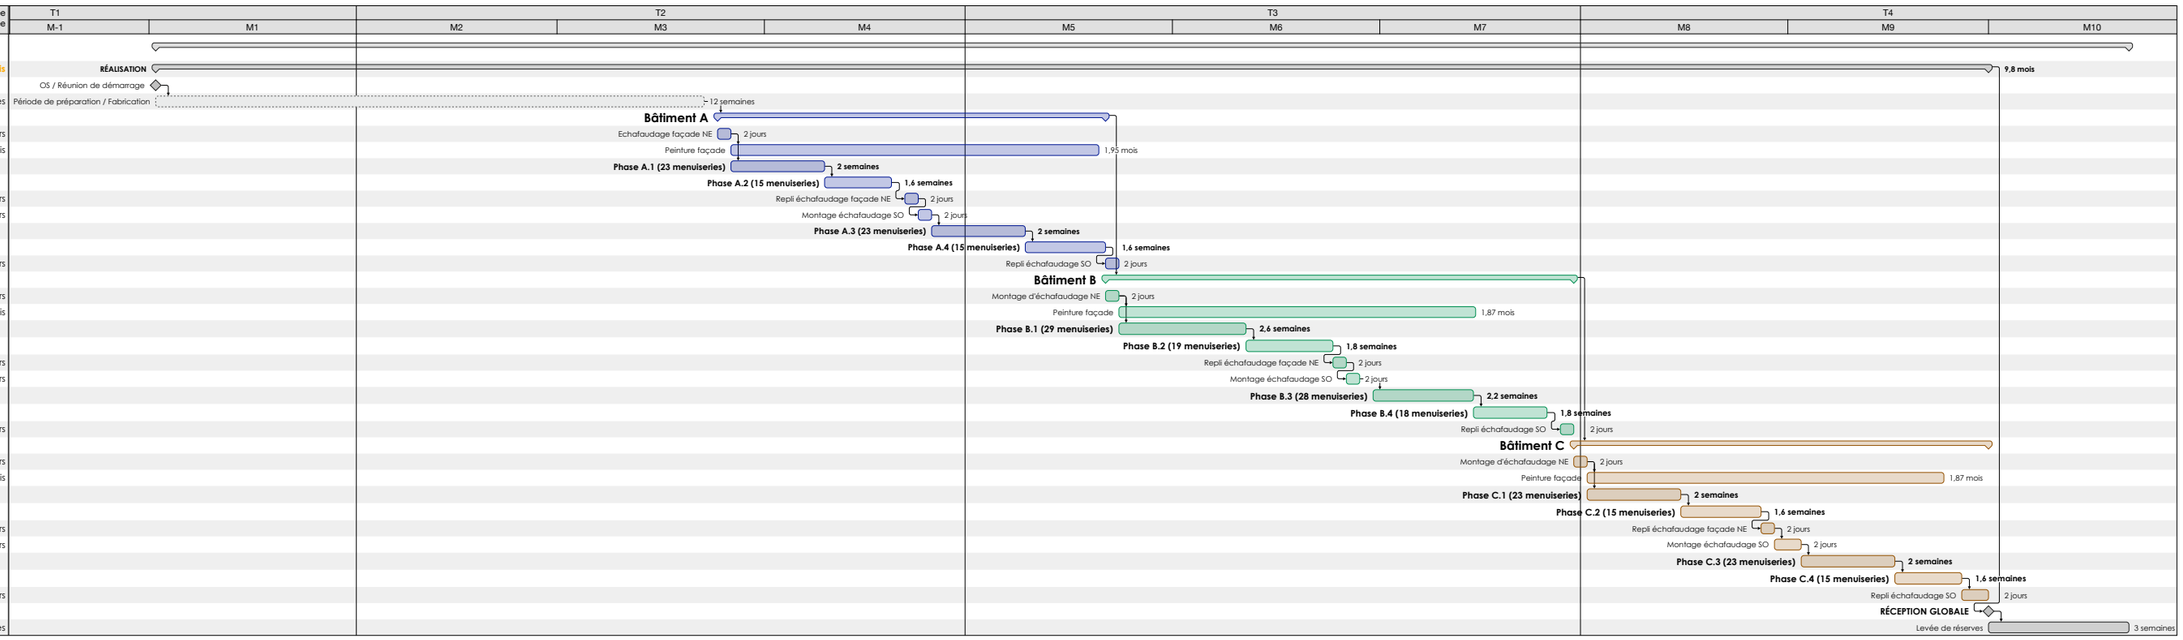

26 janv. 2026
