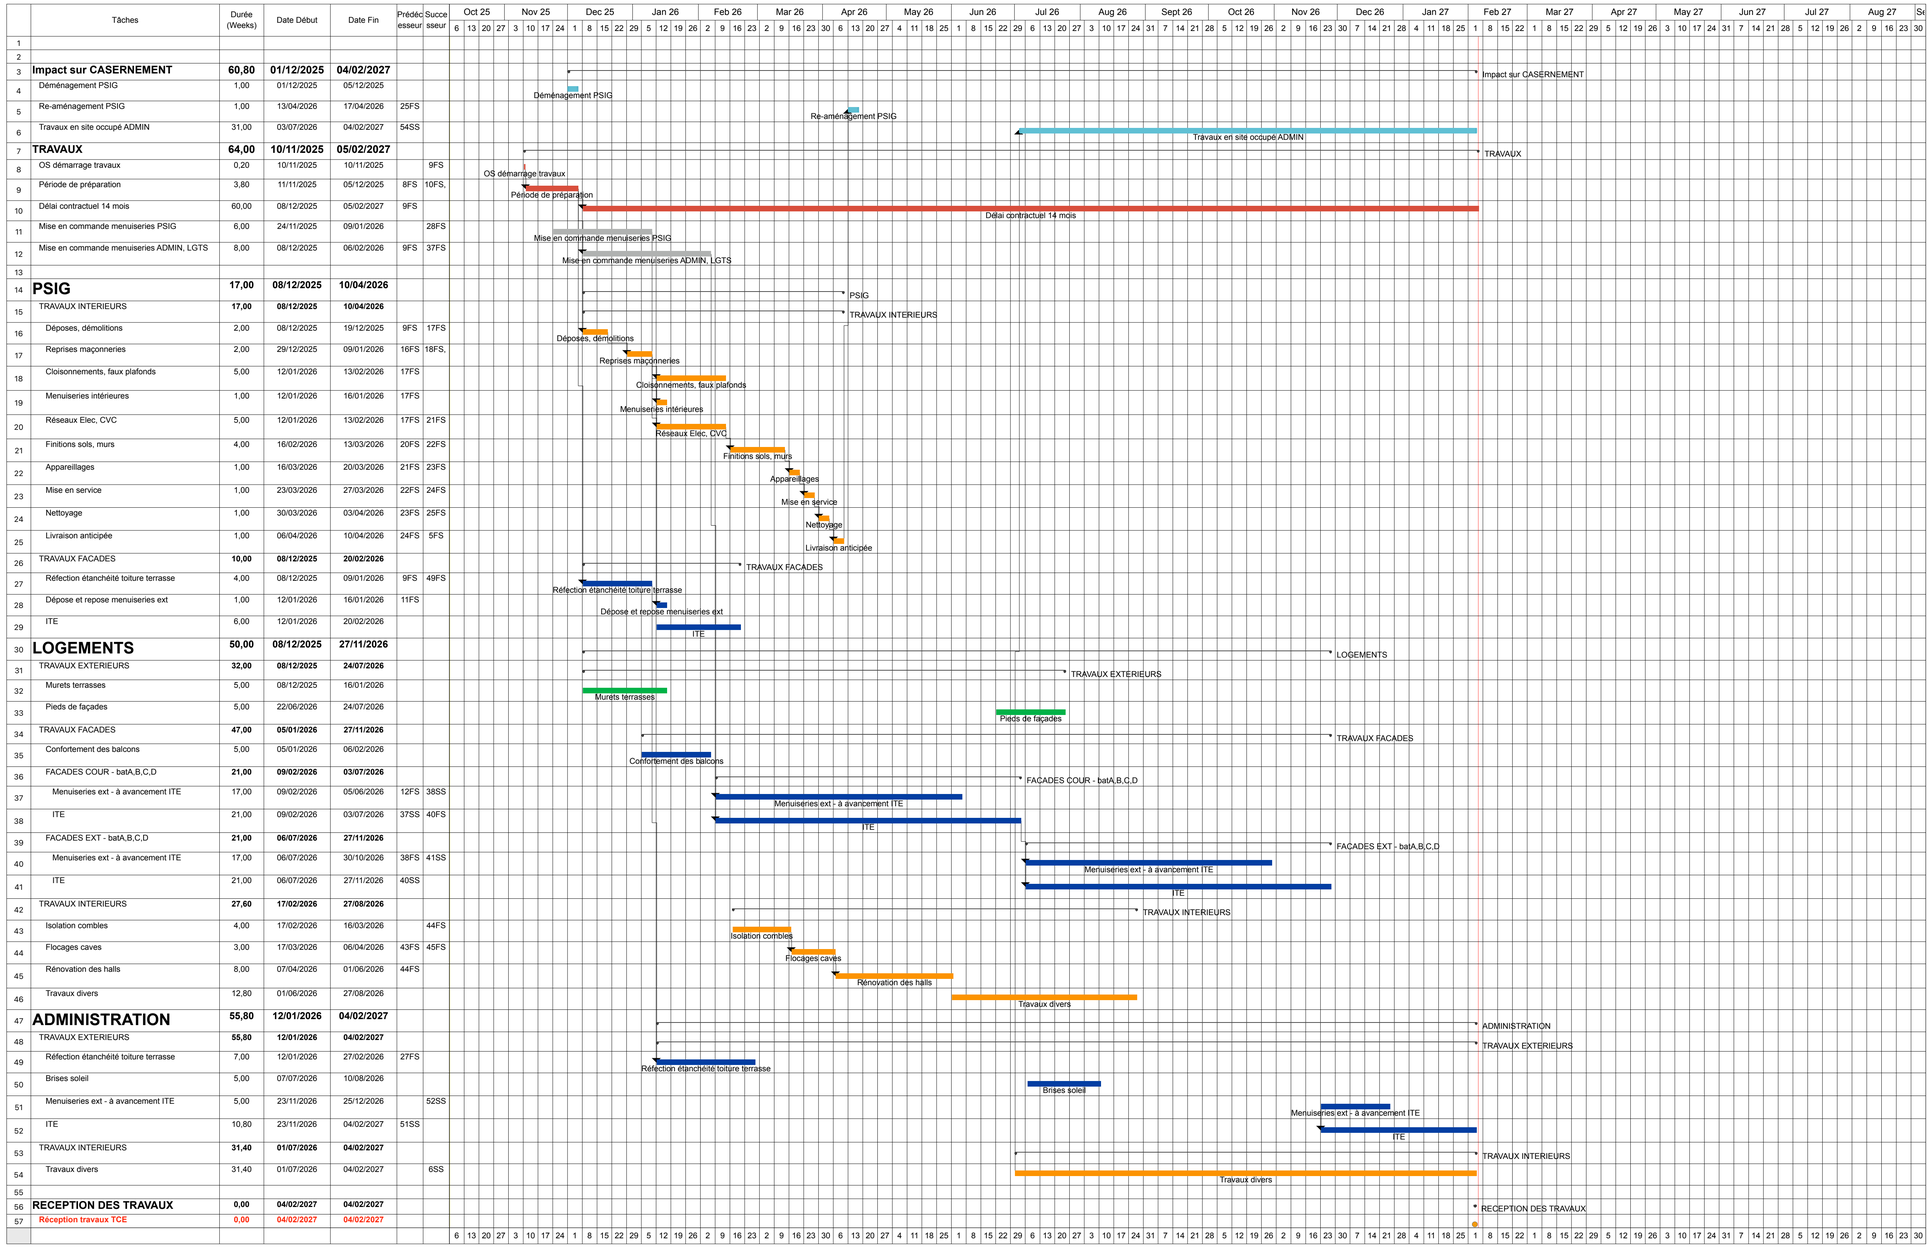| | Tâches | Durée (Weeks) | Date Début | Date Fin | Prédécesseur | Successeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | **Impact sur CASERNEMENT** | **60,80** | **01/12/2025** | **04/02/2027** | | |
| 4 | Déménagement PSIG | 1,00 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | | |
| 5 | Re-aménagement PSIG | 1,00 | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 25FS | |
| 6 | Travaux en site occupé ADMIN | 31,00 | 03/07/2026 | 04/02/2027 | 54SS | |
| 7 | **TRAVAUX** | **64,00** | **10/11/2025** | **05/02/2027** | | |
| 8 | OS démarrage travaux | 0,20 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | | 9FS |
| 9 | Période de préparation | 3,80 | 11/11/2025 | 05/12/2025 | 8FS | 10FS, |
| 10 | Délai contractuel 14 mois | 60,00 | 08/12/2025 | 05/02/2027 | 9FS | |
| 11 | Mise en commande menuiseries PSIG | 6,00 | 24/11/2025 | 09/01/2026 | | 28FS |
| 12 | Mise en commande menuiseries ADMIN, LGTS | 8,00 | 08/12/2025 | 06/02/2026 | 9FS | 37FS |
| 13 | | | | | | |
| 14 | **PSIG** | **17,00** | **08/12/2025** | **10/04/2026** | | |
| 15 | TRAVAUX INTERIEURS | **17,00** | **08/12/2025** | **10/04/2026** | | |
| 16 | Déposes, démolitions | 2,00 | 08/12/2025 | 19/12/2025 | 9FS | 17FS |
| 17 | Reprises maçonneries | 2,00 | 29/12/2025 | 09/01/2026 | 16FS | 18FS, |
| 18 | Cloisonnements, faux plafonds | 5,00 | 12/01/2026 | 13/02/2026 | 17FS | |
| 19 | Menuiseries intérieures | 1,00 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 17FS | |
| 20 | Réseaux Elec, CVC | 5,00 | 12/01/2026 | 13/02/2026 | 17FS | 21FS |
| 21 | Finitions sols, murs | 4,00 | 16/02/2026 | 13/03/2026 | 20FS | 22FS |
| 22 | Appareillages | 1,00 | 16/03/2026 | 20/03/2026 | 21FS | 23FS |
| 23 | Mise en service | 1,00 | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 22FS | 24FS |
| 24 | Nettoyage | 1,00 | 30/03/2026 | 03/04/2026 | 23FS | 25FS |
| 25 | Livraison anticipée | 1,00 | 06/04/2026 | 10/04/2026 | 24FS | 5FS |
| 26 | TRAVAUX FACADES | **10,00** | **08/12/2025** | **20/02/2026** | | |
| 27 | Réfection étanchéité toiture terrasse | 4,00 | 08/12/2025 | 09/01/2026 | 9FS | 49FS |
| 28 | Dépose et repose menuiseries ext | 1,00 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | 11FS | |
| 29 | ITE | 6,00 | 12/01/2026 | 20/02/2026 | | |
| 30 | **LOGEMENTS** | **50,00** | **08/12/2025** | **27/11/2026** | | |
| 31 | TRAVAUX EXTERIEURS | **32,00** | **08/12/2025** | **24/07/2026** | | |
| 32 | Murets terrasses | 5,00 | 08/12/2025 | 16/01/2026 | | |
| 33 | Pieds de façades | 5,00 | 22/06/2026 | 24/07/2026 | | |
| 34 | TRAVAUX FACADES | **47,00** | **05/01/2026** | **27/11/2026** | | |
| 35 | Confortement des balcons | 5,00 | 05/01/2026 | 06/02/2026 | | |
| 36 | FACADES COUR - batA,B,C,D | **21,00** | **09/02/2026** | **03/07/2026** | | |
| 37 | Menuiseries ext - à avancement ITE | 17,00 | 09/02/2026 | 05/06/2026 | 12FS | 38SS |
| 38 | ITE | 21,00 | 09/02/2026 | 03/07/2026 | 37SS | 40FS |
| 39 | FACADES EXT - batA,B,C,D | **21,00** | **06/07/2026** | **27/11/2026** | | |
| 40 | Menuiseries ext - à avancement ITE | 17,00 | 06/07/2026 | 30/10/2026 | 38FS | 41SS |
| 41 | ITE | 21,00 | 06/07/2026 | 27/11/2026 | 40SS | |
| 42 | TRAVAUX INTERIEURS | **27,60** | **17/02/2026** | **27/08/2026** | | |
| 43 | Isolation combles | 4,00 | 17/02/2026 | 16/03/2026 | | 44FS |
| 44 | Flocages caves | 3,00 | 17/03/2026 | 06/04/2026 | 43FS | 45FS |
| 45 | Rénovation des halls | 8,00 | 07/04/2026 | 01/06/2026 | 44FS | |
| 46 | Travaux divers | 12,80 | 01/06/2026 | 27/08/2026 | | |
| 47 | **ADMINISTRATION** | **55,80** | **12/01/2026** | **04/02/2027** | | |
| 48 | TRAVAUX EXTERIEURS | **55,80** | **12/01/2026** | **04/02/2027** | | |
| 49 | Réfection étanchéité toiture terrasse | 7,00 | 12/01/2026 | 27/02/2026 | 27FS | |
| 50 | Brises soleil | 5,00 | 07/07/2026 | 10/08/2026 | | |
| 51 | Menuiseries ext - à avancement ITE | 5,00 | 23/11/2026 | 25/12/2026 | | 52SS |
| 52 | ITE | 10,80 | 23/11/2026 | 04/02/2027 | 51SS | |
| 53 | TRAVAUX INTERIEURS | **31,40** | **01/07/2026** | **04/02/2027** | | |
| 54 | Travaux divers | 31,40 | 01/07/2026 | 04/02/2027 | | 6SS |
| 55 | | | | | | |
| 56 | **RECEPTION DES TRAVAUX** | **0,00** | **04/02/2027** | **04/02/2027** | | |
| 57 | **Réception travaux TCE** | **0,00** | **04/02/2027** | **04/02/2027** | | |
