DGAC 401 - PLANNING PREVISIONNEL PHASE DCE
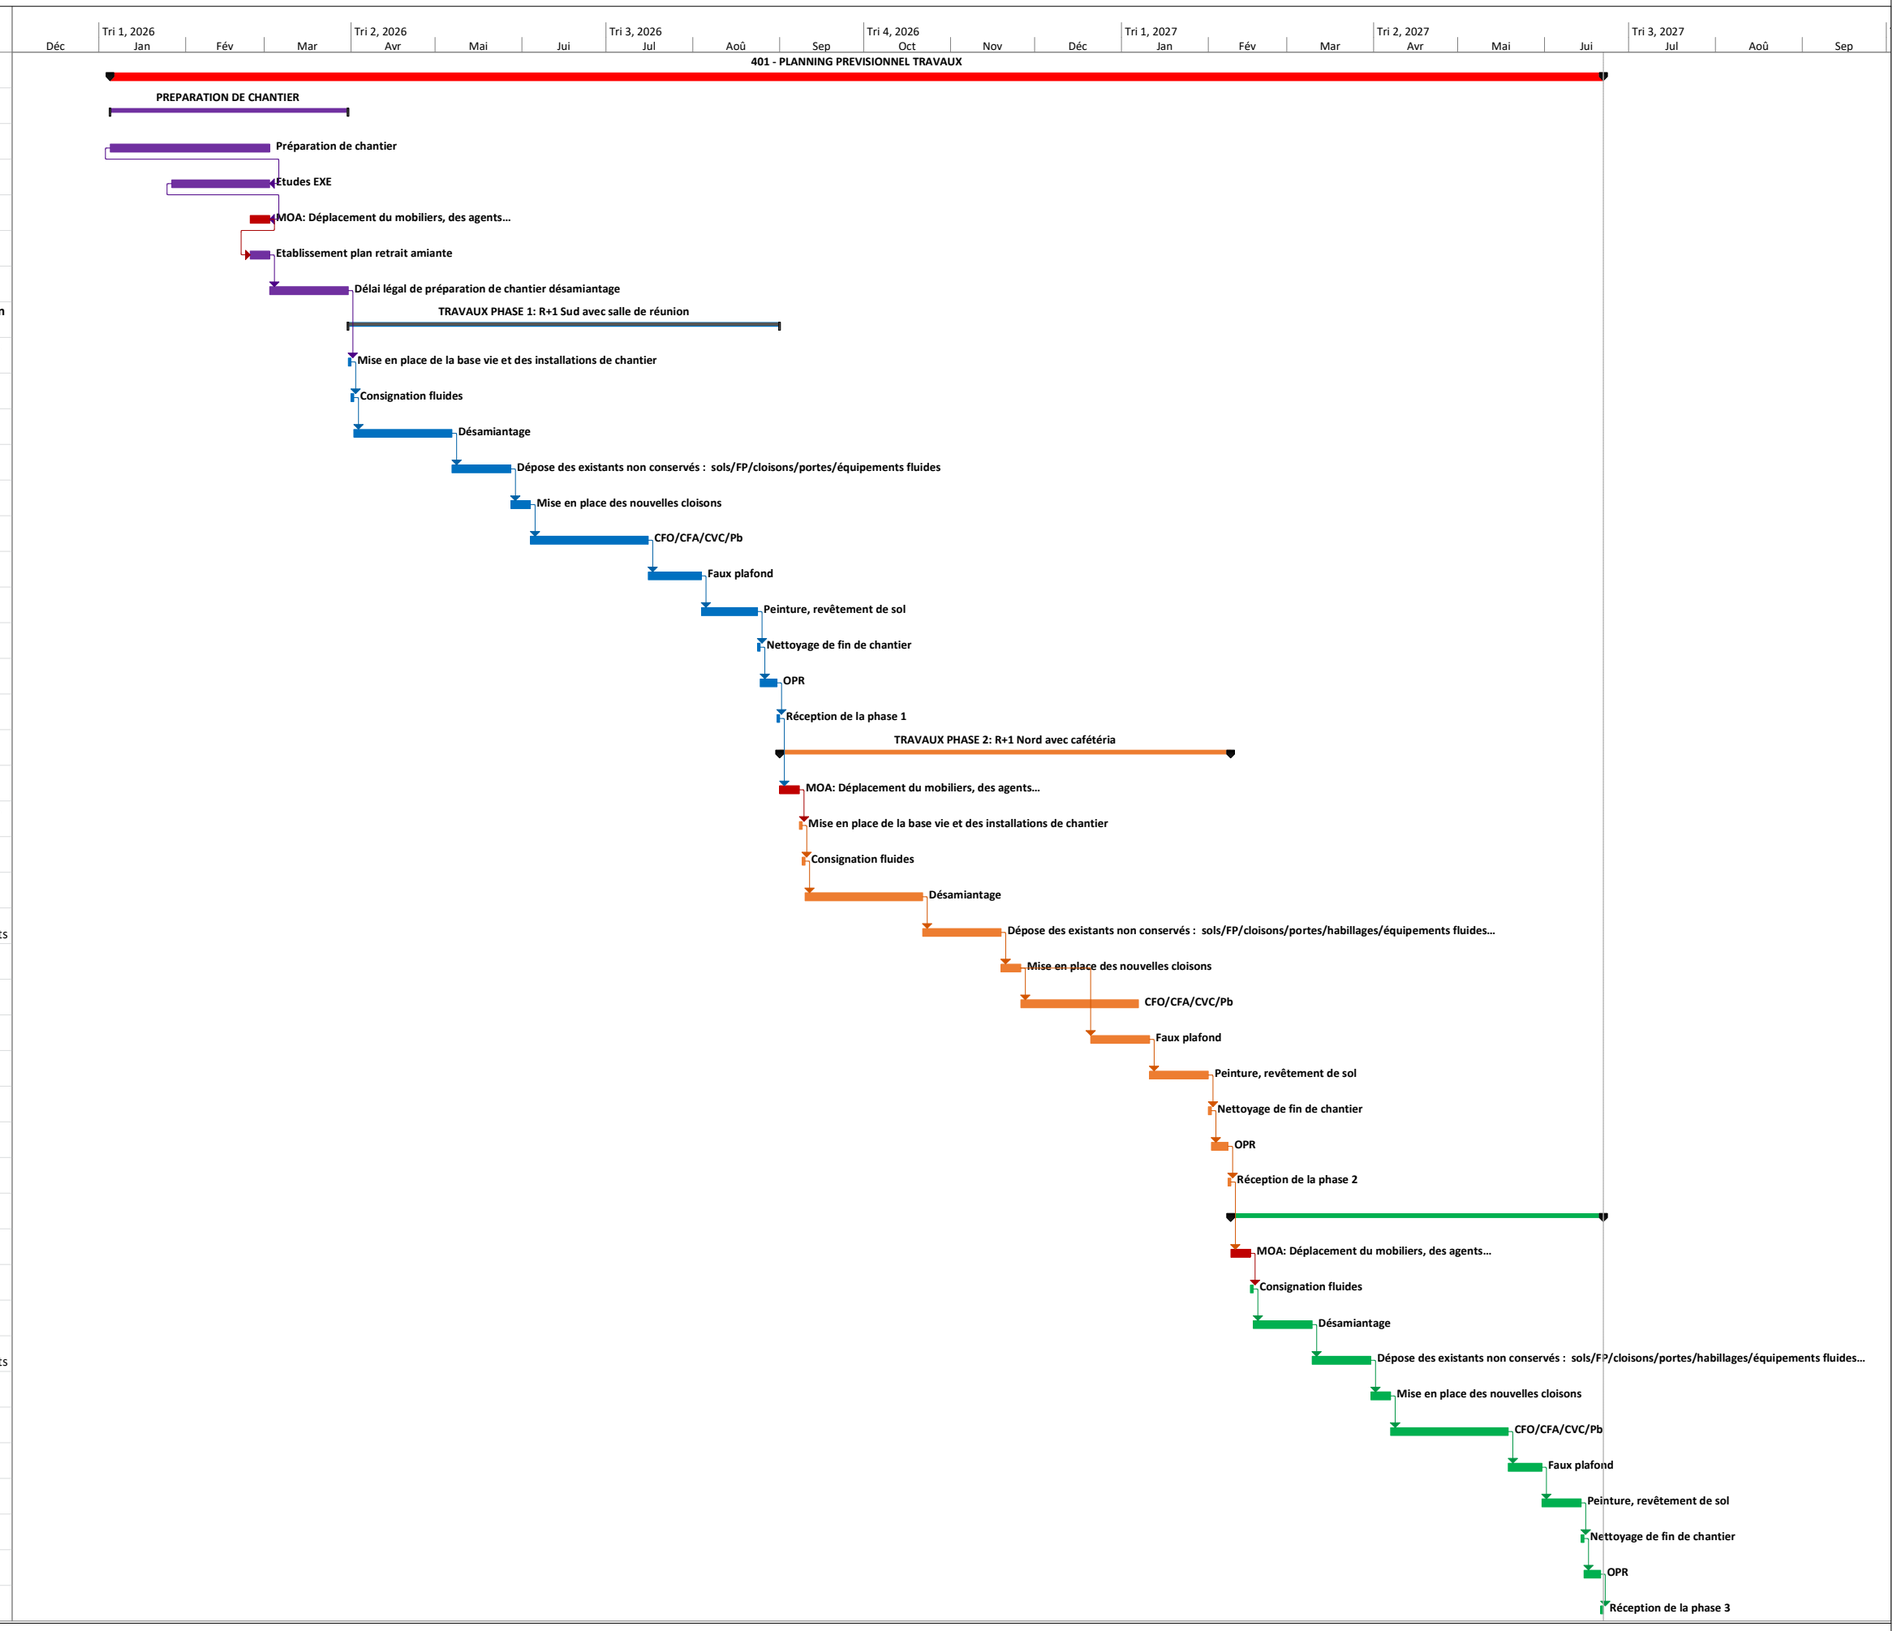
N°	Préd	Début	Fin	Durée	Nom de la tâche
1		**Lun 05/01/26**	**Lun 21/06/27**	**533 jrs**	**401 - PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX**
2		**Lun 05/01/26**	**Lun 30/03/26**	**85 jrs**	**PREPARATION DE CHANTIER**
3		Lun 05/01/26	Lun 02/03/26	57 jrs	Préparation de chantier
4	3DF jrs	Mar 27/01/26	Lun 02/03/26	35 jrs	Etudes EXE
5	4DF jrs	Mar 24/02/26	Lun 02/03/26	7 jrs	MOA: Déplacement du mobiliers, des agents…
6	5FF jrs	Mar 24/02/26	Lun 02/03/26	7 jrs	Etablissement plan retrait amiante
7	6	Mar 03/03/26	Lun 30/03/26	28 jrs	Délai légal de préparation de chantier désamiantage
8		**Mar 31/03/26**	**Lun 31/08/26**	**154 jrs**	**TRAVAUX PHASE 1: R+1 Sud avec salle de réunion**
9	7	Mar 31/03/26	Mar 31/03/26	1 jr	Mise en place de la base vie et des installations de chantier
10	9	Mer 01/04/26	Mer 01/04/26	1 jr	Consignation fluides
11	10	Jeu 02/04/26	Mer 06/05/26	35 jrs	Désamiantage
12	11	Jeu 07/05/26	Mer 27/05/26	21 jrs	Dépose des existants non conservés : sols/FP/cloisons/portes/équipements fluides
13	12	Jeu 28/05/26	Mer 03/06/26	7 jrs	Mise en place des nouvelles cloisons
14	13	Jeu 04/06/26	Mer 15/07/26	42 jrs	CFO/CFA/CVC/Pb
15	14	Jeu 16/07/26	Lun 03/08/26	19 jrs	Faux plafond
16	15	Mar 04/08/26	Dim 23/08/26	20 jrs	Peinture, revêtement de sol
17	16	Lun 24/08/26	Lun 24/08/26	1 jr	Nettoyage de fin de chantier
18	17	Mar 25/08/26	Dim 30/08/26	6 jrs	OPR
19	18	Lun 31/08/26	Lun 31/08/26	1 jr	Réception de la phase 1
20		**Mar 01/09/26**	**Lun 08/02/27**	**161 jrs**	**TRAVAUX PHASE 2: R+1 Nord avec cafétéria**
21	19	Mar 01/09/26	Lun 07/09/26	7 jrs	MOA: Déplacement du mobiliers, des agents…
22	21	Mar 08/09/26	Mar 08/09/26	1 jr	Mise en place de la base vie et des installations de chantier
23	22	Mer 09/09/26	Mer 09/09/26	1 jr	Consignation fluides
24	23	Jeu 10/09/26	Mer 21/10/26	42 jrs	Désamiantage
25	24	Jeu 22/10/26	Mer 18/11/26	28 jrs	Dépose des existants non conservés : sols/FP/cloisons/portes/habillages/équipements
26	25	Jeu 19/11/26	Mer 25/11/26	7 jrs	Mise en place des nouvelles cloisons
27	26	Jeu 26/11/26	Mer 06/01/27	42 jrs	CFO/CFA/CVC/Pb
28	26	Lun 21/12/26	Dim 10/01/27	21 jrs	Faux plafond
29	28	Lun 11/01/27	Dim 31/01/27	21 jrs	Peinture, revêtement de sol
30	29	Lun 01/02/27	Lun 01/02/27	1 jr	Nettoyage de fin de chantier
31	30	Mar 02/02/27	Dim 07/02/27	6 jrs	OPR
32	31	Lun 08/02/27	Lun 08/02/27	1 jr	Réception de la phase 2
33		**Mar 09/02/27**	**Lun 21/06/27**	**133 jrs**	**TRAVAUX PHASE 3: Rdc & R-1**
34	32	Mar 09/02/27	Lun 15/02/27	7 jrs	MOA: Déplacement du mobiliers, des agents…
35	34	Mar 16/02/27	Mar 16/02/27	1 jr	Consignation fluides
36	35	Mer 17/02/27	Mar 09/03/27	21 jrs	Désamiantage
37	36	Mer 10/03/27	Mar 30/03/27	21 jrs	Dépose des existants non conservés : sols/FP/cloisons/portes/habillages/équipements
38	37	Mer 31/03/27	Mar 06/04/27	7 jrs	Mise en place des nouvelles cloisons
39	38	Mer 07/04/27	Mar 18/05/27	42 jrs	CFO/CFA/CVC/Pb
40	39	Mer 19/05/27	Dim 30/05/27	12 jrs	Faux plafond
41	40	Lun 31/05/27	Dim 13/06/27	14 jrs	Peinture, revêtement de sol
42	41	Lun 14/06/27	Lun 14/06/27	1 jr	Nettoyage de fin de chantier
43	42	Mar 15/06/27	Dim 20/06/27	6 jrs	OPR
44	43	Lun 21/06/27	Lun 21/06/27	1 jr	Réception de la phase 3
