# Planning - Aéroport de Nîmes-Garons
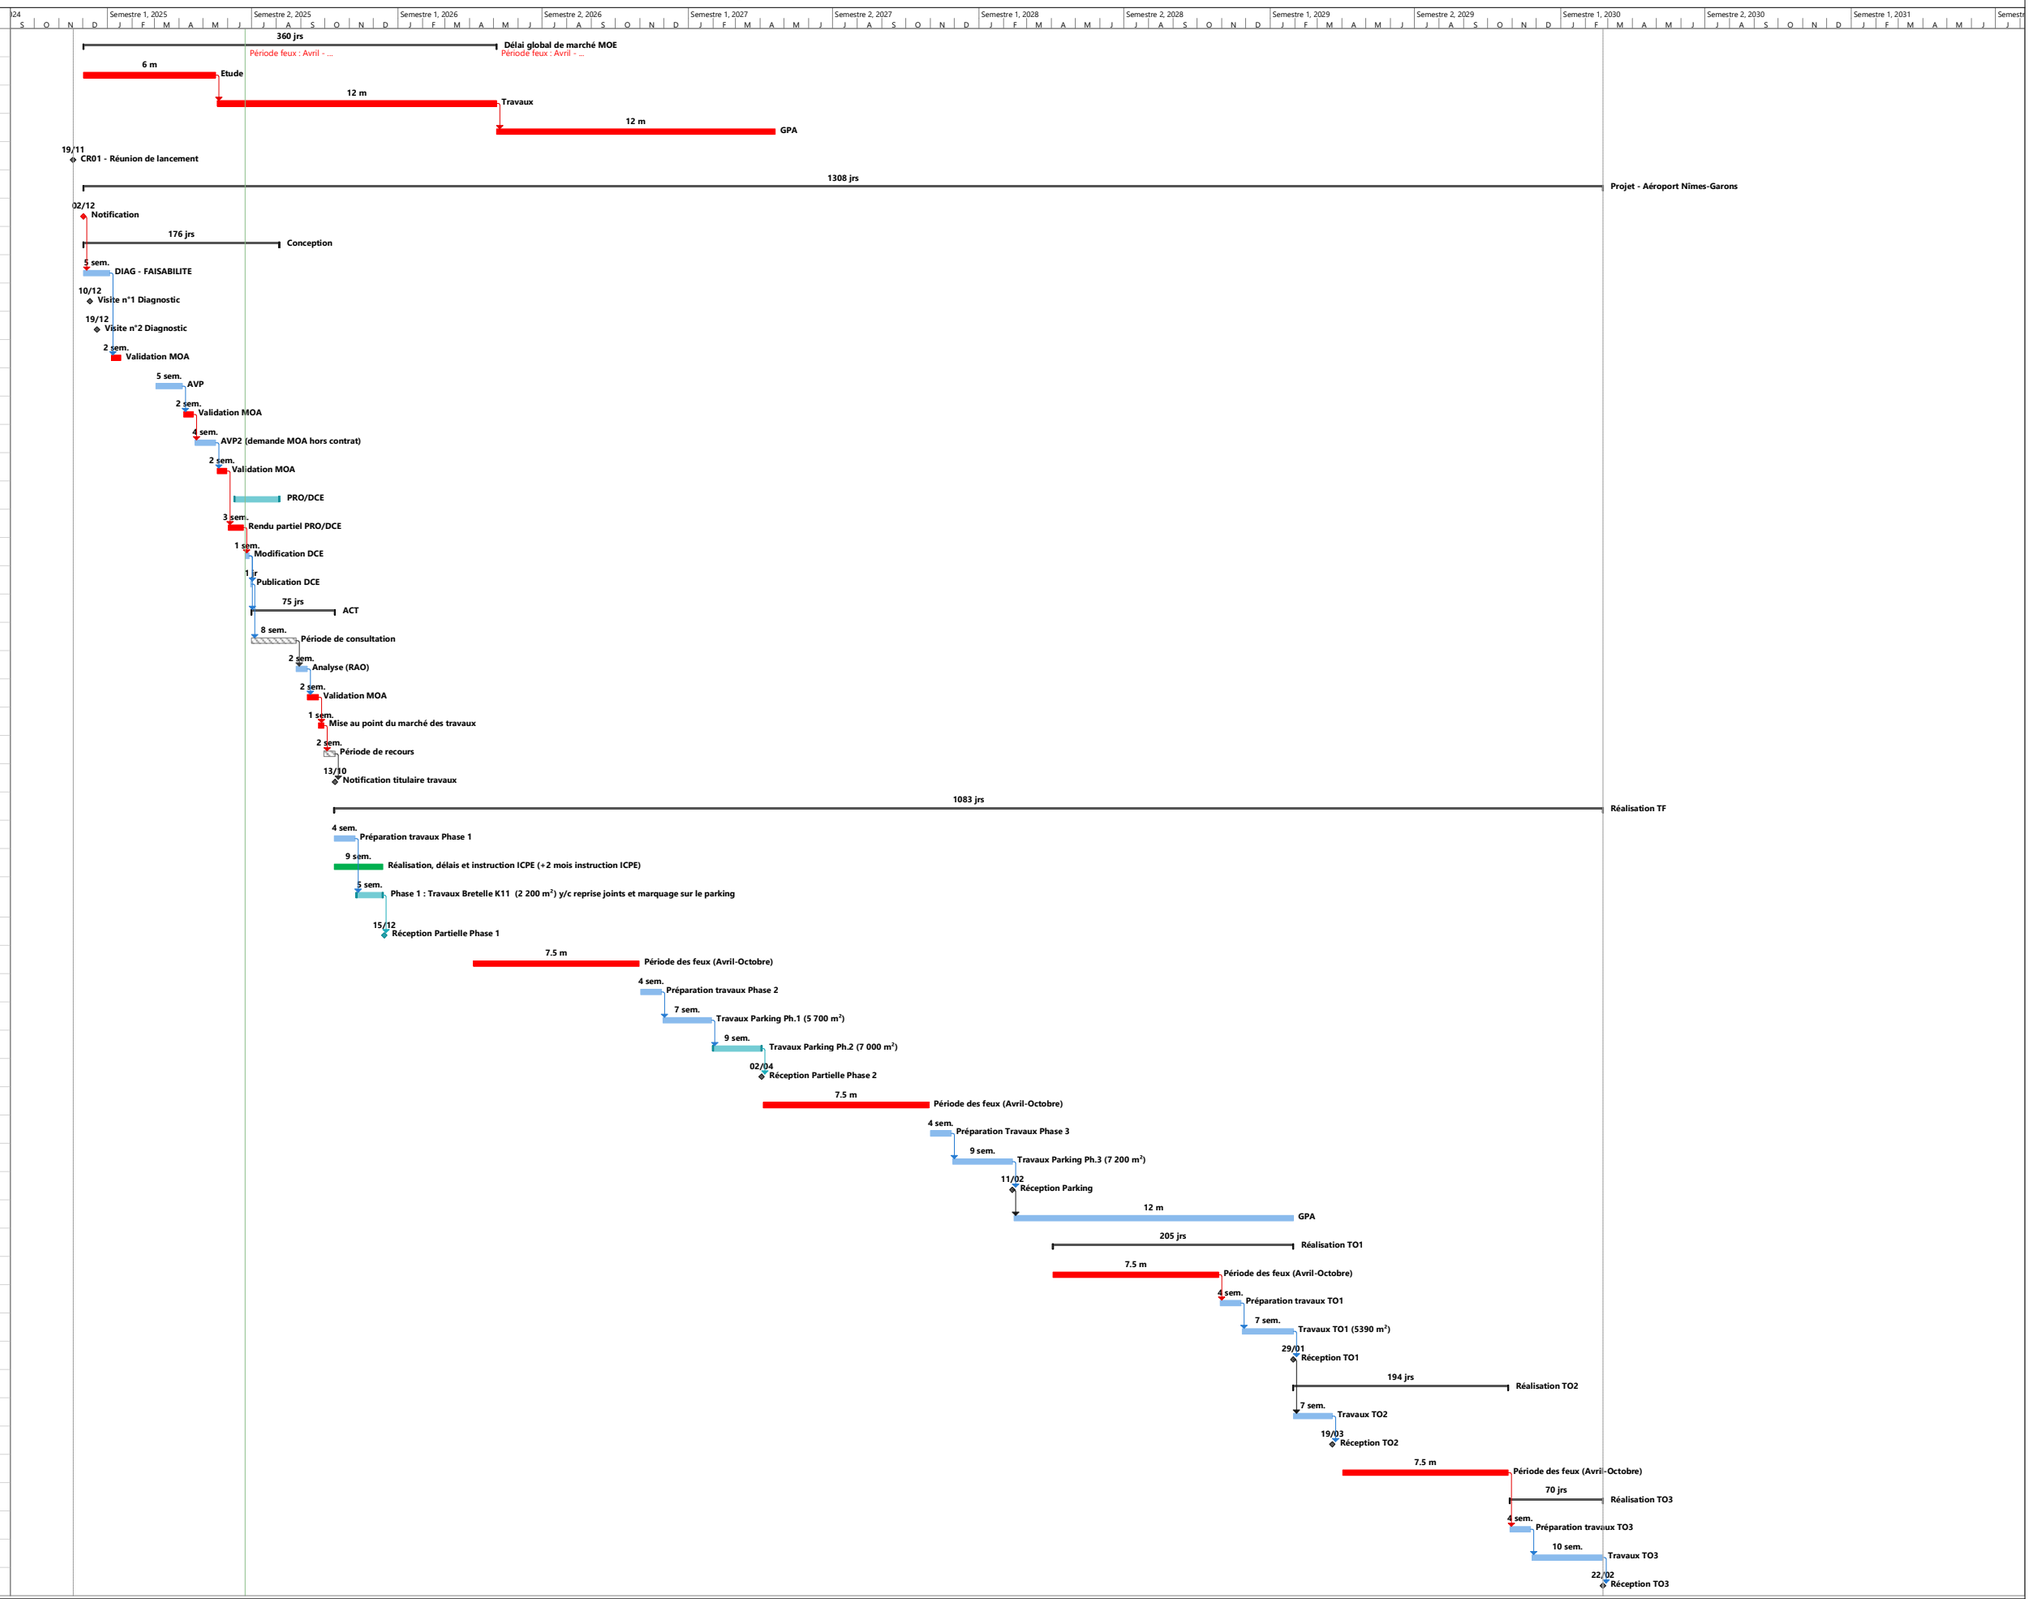
| N° | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Délai global de marché MOE** | **360 jrs** | **Lun 02/12/24** | **Lun 04/05/26** |
| 2 | | **Etude** | 6 m | Lun 02/12/24 | Ven 16/05/25 |
| 3 | | **Travaux** | 12 m | Lun 19/05/25 | Lun 04/05/26 |
| 4 | | **GPA** | 12 m | Mar 05/05/26 | Lun 19/04/27 |
| 5 | | CR01 - Réunion de lancement | 0 jr | Mar 19/11/24 | Mar 19/11/24 |
| 6 | | **Projet - Aéroport Nîmes-Garons** | **1308 jrs** | **Lun 02/12/24** | **Ven 22/02/30** |
| 7 | | Notification | 0 jr | Lun 02/12/24 | Lun 02/12/24 |
| 8 | | **Conception** | **176 jrs** | **Lun 02/12/24** | **Lun 04/08/25** |
| 9 | | DIAG - FAISABILITE | 5 sem. | Lun 02/12/24 | Ven 03/01/25 |
| 10 | | Visite n°1 Diagnostic | 0 jr | Mar 10/12/24 | Mar 10/12/24 |
| 11 | | Visite n°2 Diagnostic | 0 jr | Jeu 19/12/24 | Jeu 19/12/24 |
| 12 | | Validation MOA | 2 sem. | Lun 06/01/25 | Ven 17/01/25 |
| 13 | | AVP | 5 sem. | Lun 03/03/25 | Ven 04/04/25 |
| 14 | | Validation MOA | 2 sem. | Lun 07/04/25 | Ven 18/04/25 |
| 15 | | AVP2 (demande MOA hors contrat) | 4 sem. | Lun 21/04/25 | Ven 16/05/25 |
| 16 | | Validation MOA | 2 sem. | Lun 19/05/25 | Ven 30/05/25 |
| 17 | | PRO/DCE | 8 sem. | Mar 10/06/25 | Lun 04/08/25 |
| 18 | | Rendu partiel PRO/DCE | 3 sem. | Lun 02/06/25 | Ven 20/06/25 |
| 19 | | Modification DCE | 1 sem. | Lun 23/06/25 | Ven 27/06/25 |
| 20 | | Publication DCE | 1 jr | Lun 30/06/25 | Lun 30/06/25 |
| 21 | | **ACT** | **75 jrs** | **Mar 01/07/25** | **Lun 13/10/25** |
| 22 | | Période de consultation | 8 sem. | Mar 01/07/25 | Lun 25/08/25 |
| 23 | | Analyse (RAO) | 2 sem. | Mar 26/08/25 | Lun 08/09/25 |
| 24 | | Validation MOA | 2 sem. | Mar 09/09/25 | Lun 22/09/25 |
| 25 | | Mise au point du marché des travaux | 1 sem. | Mar 23/09/25 | Lun 29/09/25 |
| 26 | | Période de recours | 2 sem. | Mar 30/09/25 | Lun 13/10/25 |
| 27 | | Notification titulaire travaux | 0 jr | Lun 13/10/25 | Lun 13/10/25 |
| 28 | | **Réalisation TF** | **1083 jrs** | **Lun 13/10/25** | **Ven 22/02/30** |
| 29 | | Préparation travaux Phase 1 | 4 sem. | Lun 13/10/25 | Ven 07/11/25 |
| 30 | | Réalisation, délais et instruction ICPE (+2 mois instruction ICPE) | 9 sem. | Lun 13/10/25 | Ven 12/12/25 |
| 31 | | Phase 1 : Travaux Bretelle K11 (2 200 m²) y/c reprise joints et marquage sur le parking | 5 sem. | Lun 10/11/25 | Ven 12/12/25 |
| 32 | | Réception Partielle Phase 1 | 0 jr | Lun 15/12/25 | Lun 15/12/25 |
| 33 | | Période des feux (Avril-Octobre) | 7.5 m | Lun 06/04/26 | Ven 30/10/26 |
| 34 | | Préparation travaux Phase 2 | 4 sem. | Lun 02/11/26 | Ven 27/11/26 |
| 35 | | Travaux Parking Ph.1 (5 700 m²) | 7 sem. | Lun 30/11/26 | Ven 29/01/27 |
| 36 | | Travaux Parking Ph.2 (7 000 m²) | 9 sem. | Lun 01/02/27 | Ven 02/04/27 |
| 37 | | Réception Partielle Phase 2 | 0 jr | Ven 02/04/27 | Ven 02/04/27 |
| 38 | | Période des feux (Avril-Octobre) | 7.5 m | Lun 05/04/27 | Ven 29/10/27 |
| 39 | | Préparation Travaux Phase 3 | 4 sem. | Lun 01/11/27 | Ven 26/11/27 |
| 40 | | Travaux Parking Ph.3 (7 200 m²) | 9 sem. | Lun 29/11/27 | Ven 11/02/28 |
| 41 | | Réception Parking | 0 jr | Ven 11/02/28 | Ven 11/02/28 |
| 42 | | GPA | 12 m | Lun 14/02/28 | Lun 29/01/29 |
| 43 | | **Réalisation TO1** | **205 jrs** | **Lun 03/04/28** | **Lun 29/01/29** |
| 44 | | Période des feux (Avril-Octobre) | 7.5 m | Lun 03/04/28 | Ven 27/10/28 |
| 45 | | Préparation travaux TO1 | 4 sem. | Lun 30/10/28 | Ven 24/11/28 |
| 46 | | Travaux TO1 (5390 m²) | 7 sem. | Lun 27/11/28 | Lun 29/01/29 |
| 47 | | Réception TO1 | 0 jr | Lun 29/01/29 | Lun 29/01/29 |
| 48 | | **Réalisation TO2** | **194 jrs** | **Mar 30/01/29** | **Ven 26/10/29** |
| 49 | | Travaux TO2 | 7 sem. | Mar 30/01/29 | Lun 19/03/29 |
| 50 | | Réception TO2 | 0 jr | Lun 19/03/29 | Lun 19/03/29 |
| 51 | | Période des feux (Avril-Octobre) | 7.5 m | Lun 02/04/29 | Ven 26/10/29 |
| 52 | | **Réalisation TO3** | **70 jrs** | **Lun 29/10/29** | **Ven 22/02/30** |
| 53 | | Préparation travaux TO3 | 4 sem. | Lun 29/10/29 | Ven 23/11/29 |
| 54 | | Travaux TO3 | 10 sem. | Lun 26/11/29 | Ven 22/02/30 |
| 55 | | Réception TO3 | 0 jr | Ven 22/02/30 | Ven 22/02/30 |
