RENOVATION DU CROSS CORSEN _ ETANCHEITE TERRASSE INTERMEDIAIRE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**ADMINISTRATIF**	**6 jours**	**Ven 28/11/25**	**Ven 05/12/25**
2	NOTIFICATION MARCHE DE TRAVAUX	1 jour	Ven 28/11/25	Ven 28/11/25
3	ETABLISSEMENT DES MARCHES	5 jours	Lun 01/12/25	Ven 05/12/25
4	**TRAVAUX**	**104 jours**	**Lun 09/02/26**	**Ven 03/07/26**
5	PERIODE DE PREPARATION TCE	23 jours	Lun 09/02/26	Mer 11/03/26
6	**DESAMIANTAGE**	**29 jours**	**Lun 09/02/26**	**Jeu 19/03/26**
7	Plan de retrait	20 jours	Lun 09/02/26	Ven 06/03/26
8	Installation de chantier (amiante)	3 jours	Lun 09/03/26	Mer 11/03/26
9	Désamiantage	4 jours	Jeu 12/03/26	Mar 17/03/26
10	Mesures libératoires	2 jours	Mer 18/03/26	Jeu 19/03/26
11	Libération des zones (toiture niveau 2)	0 jour	Jeu 19/03/26	Jeu 19/03/26
12	**GROS ŒUVRE**	**60 jours**	**Ven 20/03/26**	**Ven 12/06/26**
13	Installation de chantier (hors amiante) + tour d'accès	5 jours	Ven 20/03/26	Jeu 26/03/26
14	Déconnection et reconnexion paraboles TV	1 jour	Jeu 26/03/26	Jeu 26/03/26
15	Création point d'éclairage extérieur + PC extérieure étanche	3 jours	Ven 27/03/26	Mar 31/03/26
16	Création point d'alimentation en eau	3 jours	Mer 01/04/26	Ven 03/04/26
17	Dressement des acrotères + traitement des épauffrures et fissures	5 jours	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26
18	Reprise jonctions entre les éléments	5 jours	Mar 21/04/26	Lun 27/04/26
19	Plot béton	5 jours	Mar 28/04/26	Lun 04/05/26
20	Vérification des ancrages de potelets	1 jour	Mar 05/05/26	Mar 05/05/26
21	Garde corps + portillon	3 jours	Mer 06/05/26	Ven 08/05/26
22	Emmarchement extérieur	2 jours	Mar 09/06/26	Mer 10/06/26
23	Nettoyage et repli chantier	1 jour	Ven 12/06/26	Ven 12/06/26
24	**ETANCHEITE (hors PSE)**	**48 jours**	**Lun 06/04/26**	**Jeu 11/06/26**
25	Réfection étanchéité (compris dépose)	45 jours	Lun 06/04/26	Lun 08/06/26
26	Végétalisation (semis)	3 jours	Mar 09/06/26	Jeu 11/06/26
27	**OPR & RECEPTION**	**15 jours**	**Lun 15/06/26**	**Ven 03/07/26**
28	OPR	1 jour	Lun 15/06/26	Lun 15/06/26
29	Levée des réserves ENTREPRISES	13 jours	Mar 16/06/26	Jeu 02/07/26
30	RECEPTION	1 jour	Ven 03/07/26	Ven 03/07/26

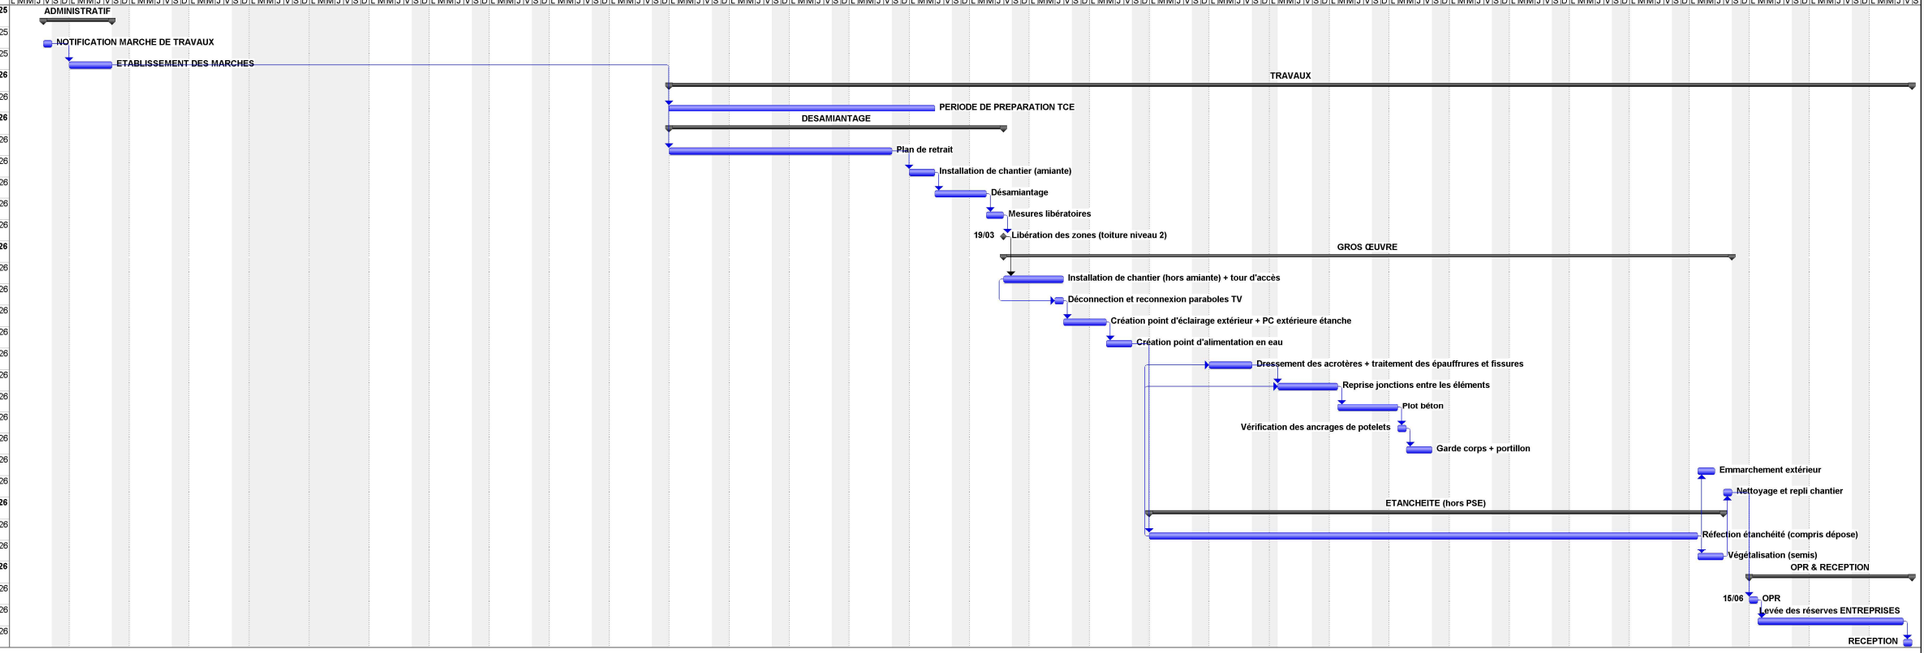

Projet : CROSS CORSEN _ TERRAS
Date : Mar 09/09/25

Tâche · Fractionnement · Avancement · Jalon · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâches externes · Jalons externes · Échéance
