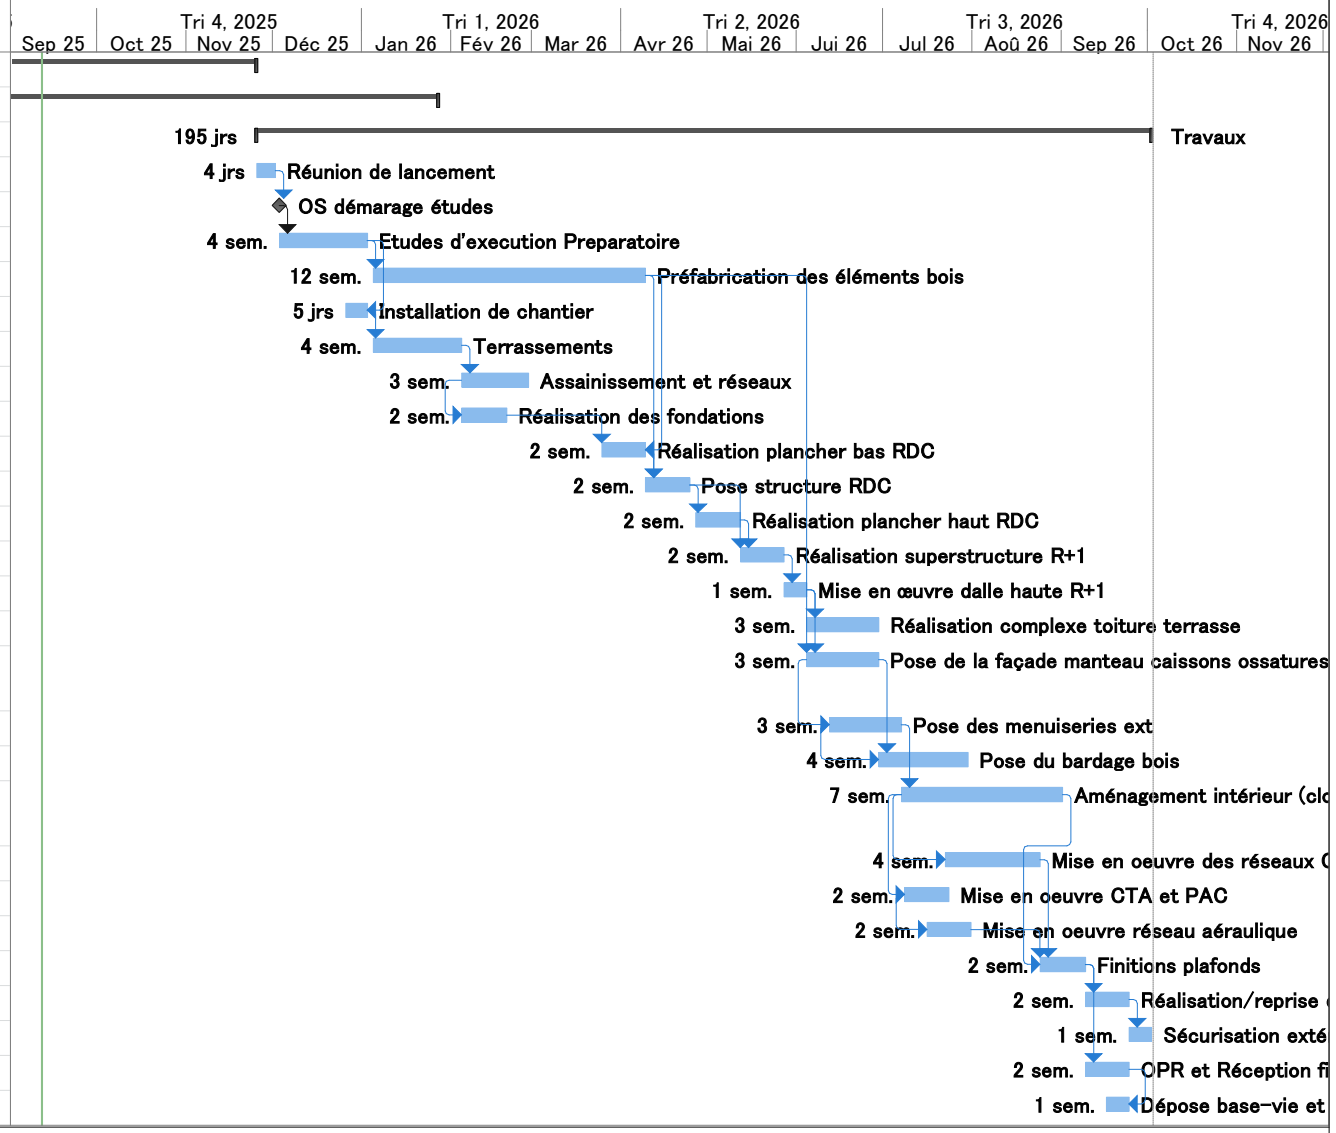N°	MT	Nom de la tâche	Durée	Début
1		**Etudes de conception**	**151.75**	**Jeu 27/03/25**
16		**Démarches administratives et achats**	**127 jrs**	**Mar 08/07/25**
24		**Travaux**	**195 jrs**	**Mar 25/11/25**
25		Réunion de lancement	4 jrs	Mar 25/11/25
26		OS démarage études	1 jr	Mar 02/12/25
27		Etudes d'execution Preparatoire	4 sem.	Mer 03/12/25
28		Préfabrication des éléments bois	12 sem	Lun 05/01/26
29		Installation de chantier	5 jrs	Ven 26/12/25
30		Terrassements	4 sem.	Lun 05/01/26
31		Assainissement et réseaux	3 sem.	Mer 04/02/26
32		Réalisation des fondations	2 sem.	Mer 04/02/26
33		Réalisation plancher bas RDC	2 sem.	Mer 25/03/26
34		Pose structure RDC	2 sem.	Jeu 09/04/26
35		Réalisation plancher haut RDC	2 sem.	Lun 27/04/26
36		Réalisation superstructure R+1	2 sem.	Mar 12/05/26
37		Mise en œuvre dalle haute R+1	1 sem.	Mer 27/05/26
38		Réalisation complexe toiture terrasse	3 sem.	Jeu 04/06/26
39		Pose de la façade manteau caissons ossatures bois (préfa)	3 sem.	Jeu 04/06/26
40		Pose des menuiseries ext	3 sem.	Ven 12/06/26
41		Pose du bardage bois	4 sem.	Lun 29/06/26
42		Aménagement intérieur (cloisons, revêtements sols et muraux)	7 sem.	Mar 07/07/26
43		Mise en oeuvre des réseaux CFO/CFA	4 sem.	Mer 22/07/26
44		Mise en oeuvre CTA et PAC	2 sem.	Mer 08/07/26
45		Mise en oeuvre réseau aéraulique	2 sem.	Jeu 16/07/26
46		Finitions plafonds	2 sem.	Lun 24/08/26
47		Réalisation/reprise des extérieurs	2 sem.	Mer 09/09/26
48		Sécurisation extérieur	1 sem.	Jeu 24/09/26
49		OPR et Réception finale	2 sem.	Mer 09/09/26
50		Dépose base-vie et clôture de chantie	1 sem.	Mer 16/09/26
