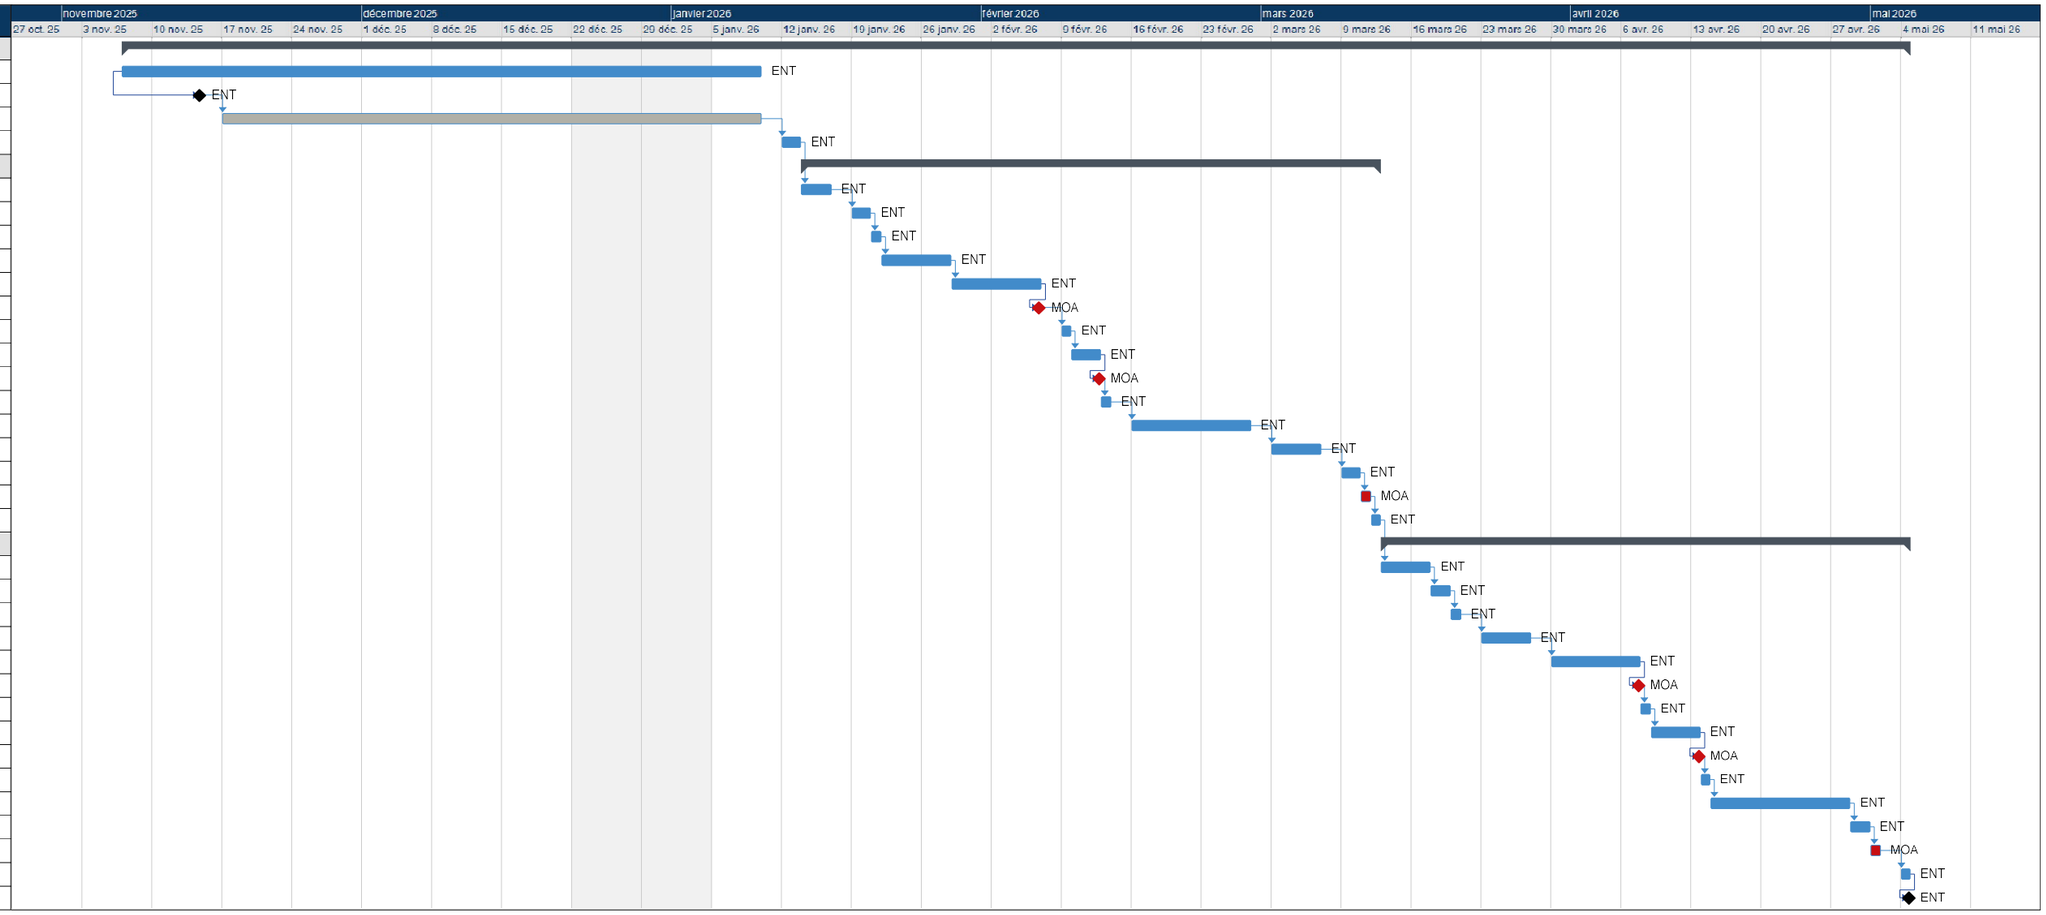| | Nom de tâche | Durée |
|---|---|---|
| 1 | **Travaux** | **116 jours** |
| 2 | Période de préparation | 35 jours |
| 3 | Dépose du PRA | 0 jours |
| 4 | Délai reglementaire PRA | 30 jours |
| 5 | Installation de chantier | 2 jours |
| 6 | **Cage Sud** | **42 jours** |
| 7 | Mesure d'état initial | 3 jours |
| 8 | Mise en place de l'isolement de chantier | 2 jours |
| 9 | Pré-curage des cages d'escalier (si nécessaire) | 1 jour |
| 10 | Confinement des cages d'escalier | 5 jours |
| 11 | Désamiantage des cages d'escalier | 7 jours |
| 12 | 1er Contrôle visuel | 0 jours |
| 13 | Mesure de première restitution | 1 jour |
| 14 | Déconfinement des cages d'escalier | 3 jours |
| 15 | 2ème constat visuel | 0 jours |
| 16 | Mesure de fin de chantier amiante | 1 jour |
| 17 | Pose d'un revêtement type sol souple et reprises des Limons | 10 jours |
| 18 | Pose d'un protection murale en condition SS4 | 5 jours |
| 19 | Dépose de l'isolement de chantier | 2 jours |
| 20 | Mesure de seconde restitution | 1 jour |
| 21 | Repli de la zone de chantier | 1 jour |
| 22 | **Cage Nord** | **37 jours** |
| 23 | Mesure d'état initial | 3 jours |
| 24 | Mise en place de l'isolement de chantier | 2 jours |
| 25 | Pré-curage des cages d'escalier (si nécessaire) | 1 jour |
| 26 | Confinement des cages d'escalier | 5 jours |
| 27 | Désamiantage des cages d'escalier | 7 jours |
| 28 | 1er Contrôle visuel | 0 jours |
| 29 | Mesure de première restitution | 1 jour |
| 30 | Déconfinement des cages d'escalier | 3 jours |
| 31 | 2ème constat visuel | 0 jours |
| 32 | Mesure de fin de chantier amiante | 1 jour |
| 33 | Pose d'un revêtement type sol souple et reprises des Limons | 10 jours |
| 34 | Dépose de l'isolement de chantier | 2 jours |
| 35 | Mesure de seconde restitution | 1 jour |
| 36 | Repli de la zone de chantier | 1 jour |
| 37 | Fin des travaux | 0 jours |
