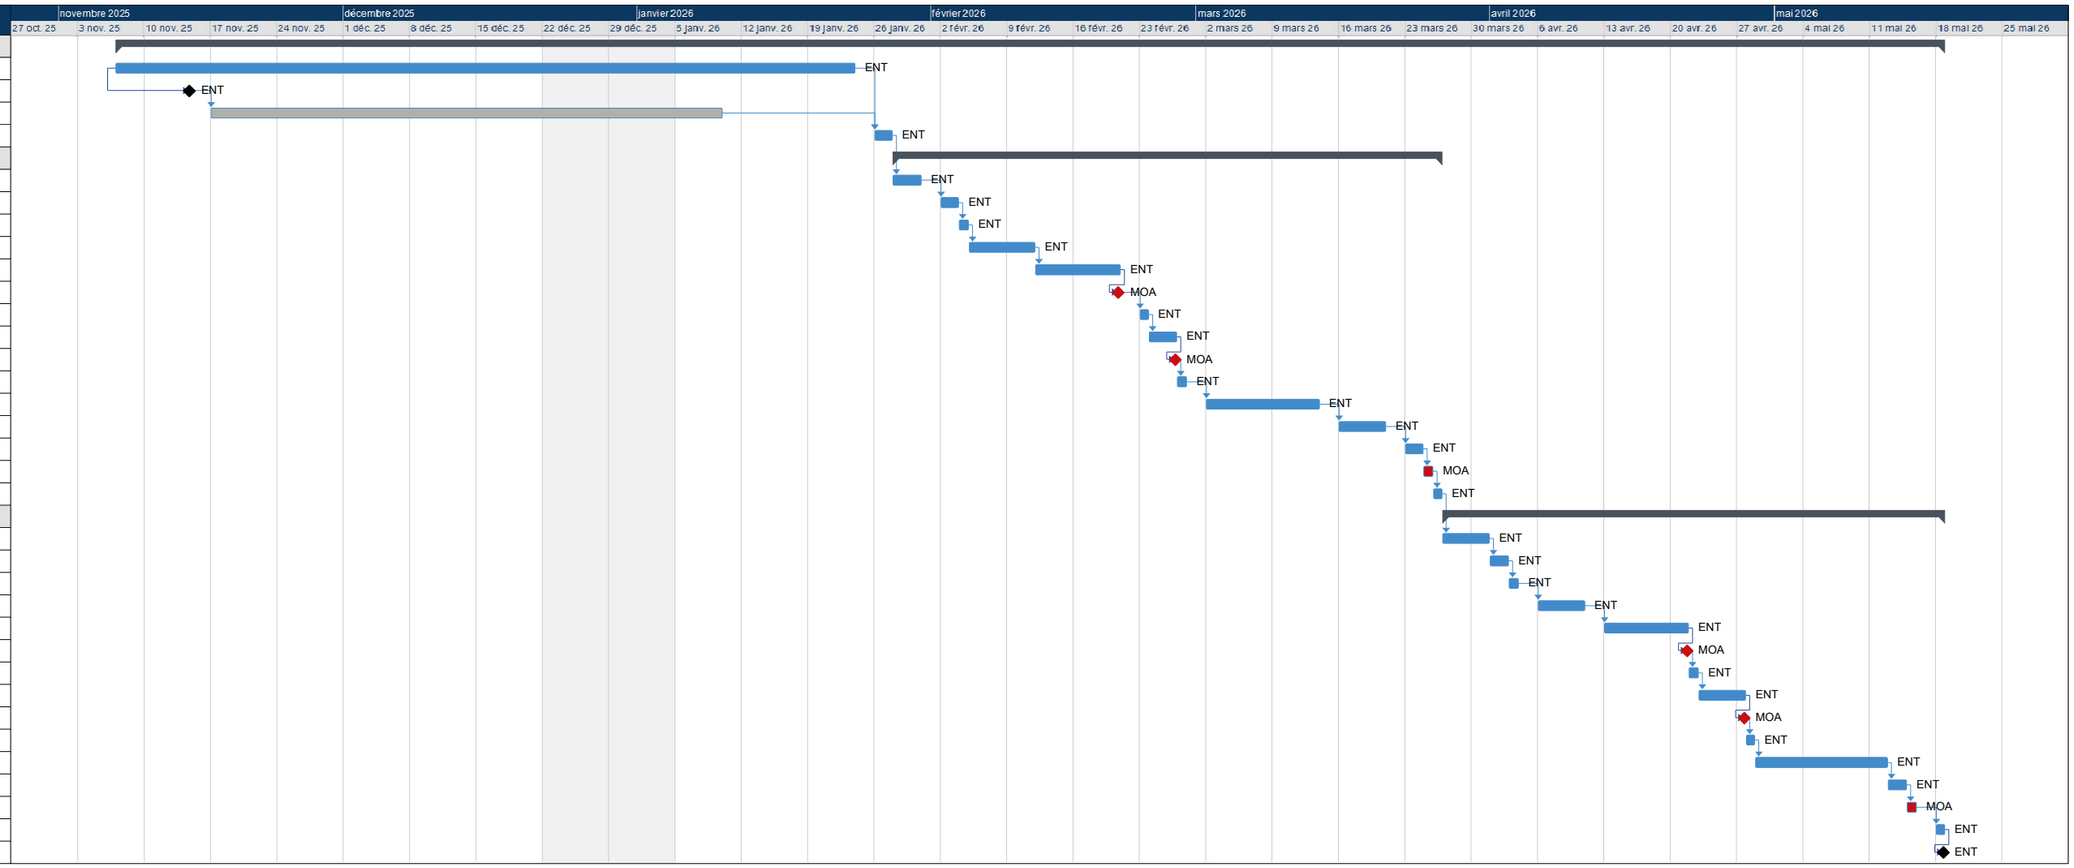	Nom de tâche	Durée
1	**Travaux**	**126 jours**
2	Période de préparation	45 jours
3	Dépose du PRA	0 jours
4	Délai reglementaire PRA	30 jours
5	Installation de chantier	2 jours
6	**Cage Sud**	**42 jours**
7	Mesure d'état initial	3 jours
8	Mise en place de l'isolement de chantier	2 jours
9	Pré-curage des cages d'escalier (si nécessaire)	1 jour
10	Confinement des cages d'escalier	5 jours
11	Désamiantage des cages d'escalier	7 jours
12	1er Contrôle visuel	0 jours
13	Mesure de première restitution	1 jour
14	Déconfinement des cages d'escalier	3 jours
15	2ème constat visuel	0 jours
16	Mesure de fin de chantier amiante	1 jour
17	Pose d'un revêtement type sol souple et reprises des Limons	10 jours
18	Pose d'un protection murale en condition SS4	5 jours
19	Dépose de l'isolement de chantier	2 jours
20	Mesure de seconde restitution	1 jour
21	Repli de la zone de chantier	1 jour
22	**Cage Nord**	**37 jours**
23	Mesure d'état initial	3 jours
24	Mise en place de l'isolement de chantier	2 jours
25	Pré-curage des cages d'escalier (si nécessaire)	1 jour
26	Confinement des cages d'escalier	5 jours
27	Désamiantage des cages d'escalier	7 jours
28	1er Contrôle visuel	0 jours
29	Mesure de première restitution	1 jour
30	Déconfinement des cages d'escalier	3 jours
31	2ème constat visuel	0 jours
32	Mesure de fin de chantier amiante	1 jour
33	Pose d'un revêtement type sol souple et reprises des Limons	10 jours
34	Dépose de l'isolement de chantier	2 jours
35	Mesure de seconde restitution	1 jour
36	Repli de la zone de chantier	1 jour
37	Fin des travaux	0 jours
