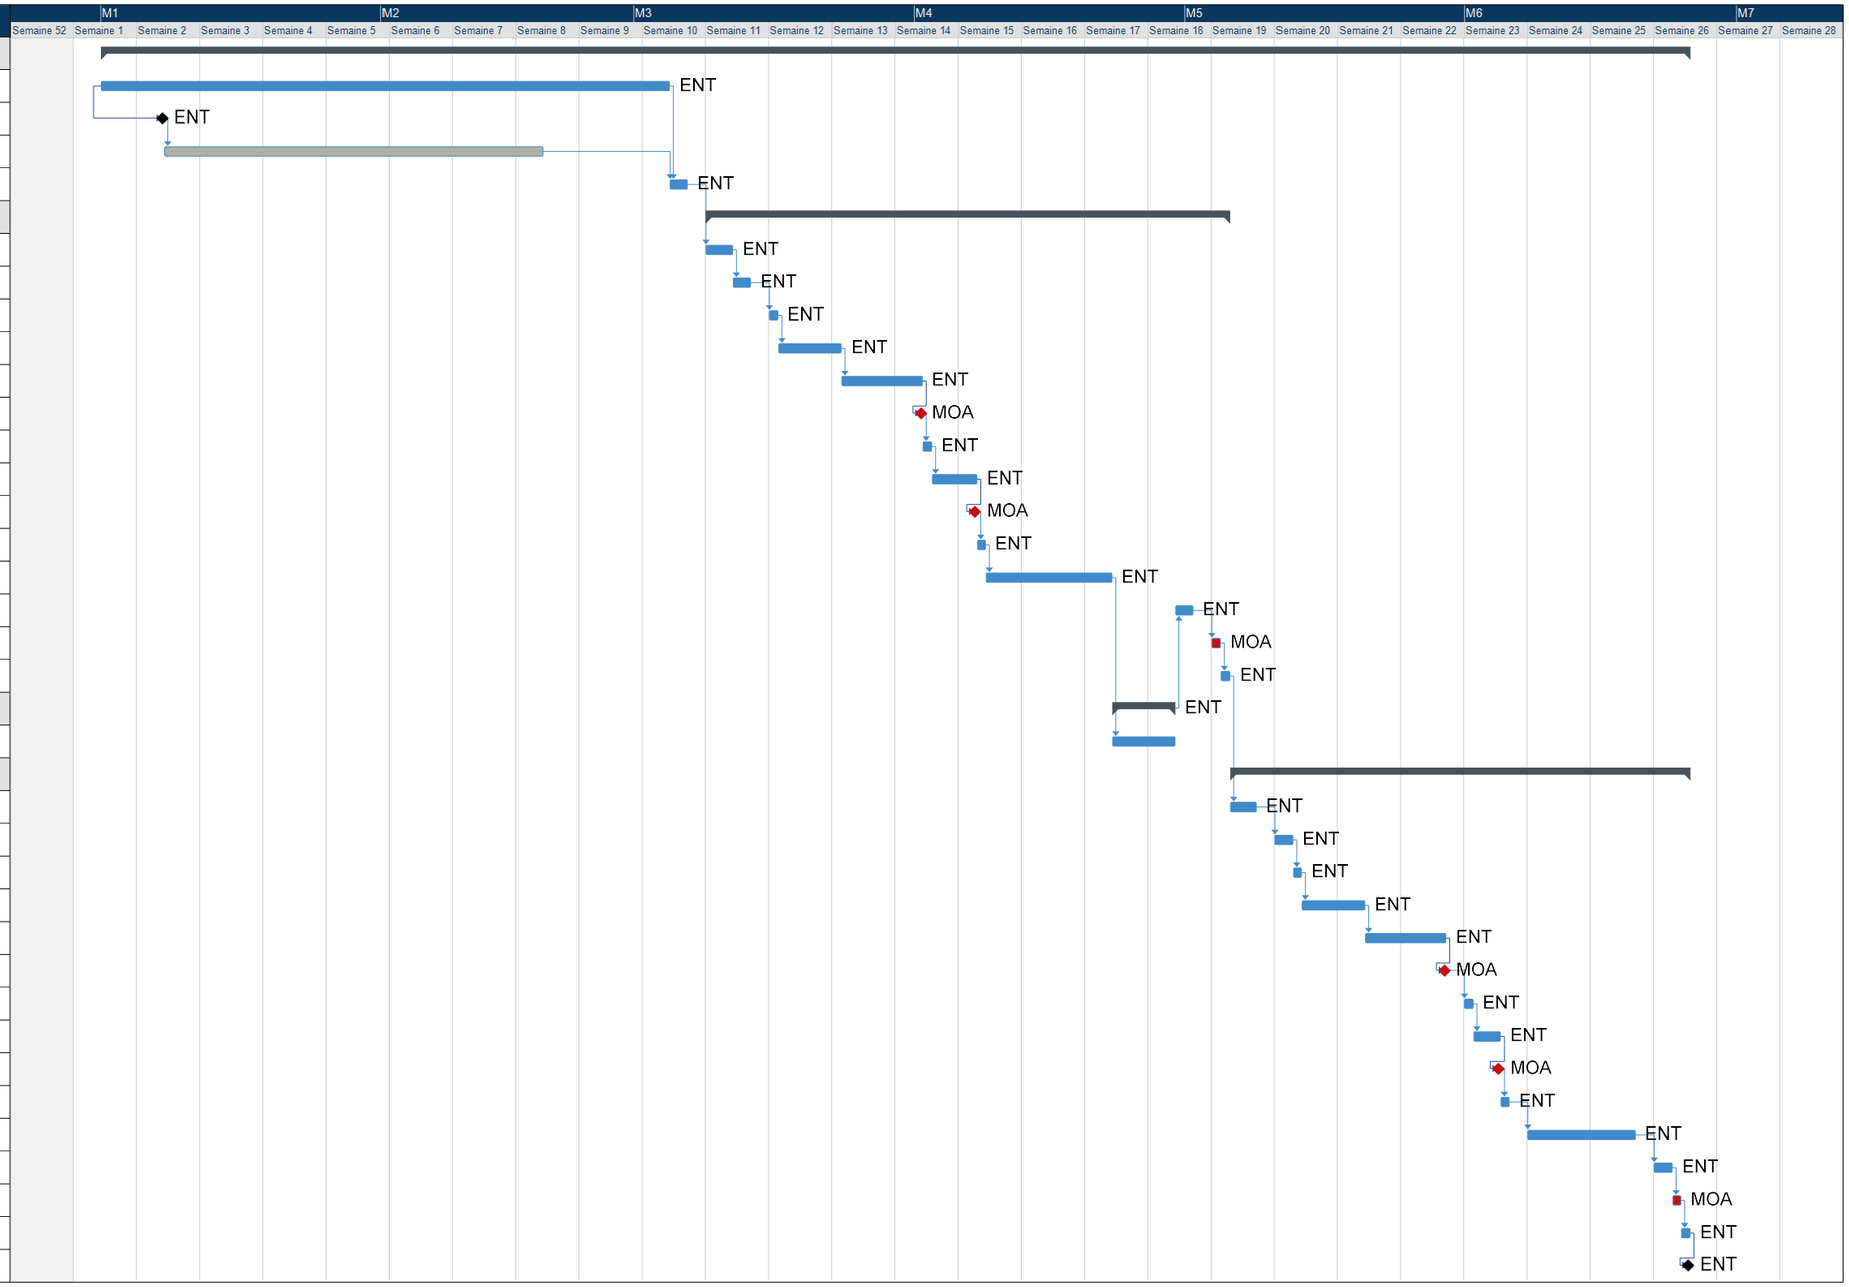	Nom de tâche	Durée
1	**Travaux**	**126 jours**
2	Période de préparation	45 jours
3	Dépose du PRA	0 jours
4	Délai reglementaire PRA	30 jours
5	Installation de chantier	2 jours
6	**Cage Sud (TO1)**	**42 jours**
7	Mesure d'état initial	3 jours
8	Mise en place de l'isolement de chantier	2 jours
9	Pré-curage des cages d'escalier (si nécessaire)	1 jour
10	Confinement des cages d'escalier	5 jours
11	Désamiantage des cages d'escalier	7 jours
12	1er Contrôle visuel	0 jours
13	Mesure de première restitution	1 jour
14	Déconfinement des cages d'escalier	3 jours
15	2ème constat visuel	0 jours
16	Mesure de fin de chantier amiante	1 jour
17	Pose d'un revêtement type sol souple et reprises des Limons	10 jours
18	Dépose de l'isolement de chantier	2 jours
19	Mesure de seconde restitution	1 jour
20	Repli de la zone de chantier	1 jour
21	**Pose d'un protection murale en condition SS4 (TO2)**	**5 jours**
22	Pose d'un protection murale en condition Ss4	5 jours
23	**Cage Nord (TF)**	**37 jours**
24	Mesure d'état initial	3 jours
25	Mise en place de l'isolement de chantier	2 jours
26	Pré-curage des cages d'escalier (si nécessaire)	1 jour
27	Confinement des cages d'escalier	5 jours
28	Désamiantage des cages d'escalier	7 jours
29	1er Contrôle visuel	0 jours
30	Mesure de première restitution	1 jour
31	Déconfinement des cages d'escalier	3 jours
32	2ème constat visuel	0 jours
33	Mesure de fin de chantier amiante	1 jour
34	Pose d'un revêtement type sol souple et reprises des Limons	10 jours
35	Dépose de l'isolement de chantier	2 jours
36	Mesure de seconde restitution	1 jour
37	Repli de la zone de chantier	1 jour
38	Fin des travaux	0 jours
