UNIVERSITÉ DE LYON

//ENTPE

L'école de l'aménagement durable des territoires

RESTRUCTURATION DU BATIMENT D DE L'ENTPE à Vaulx en Velin
PLANNING GENERAL DCE
du Mar 03/12/24

GCC ingénierie
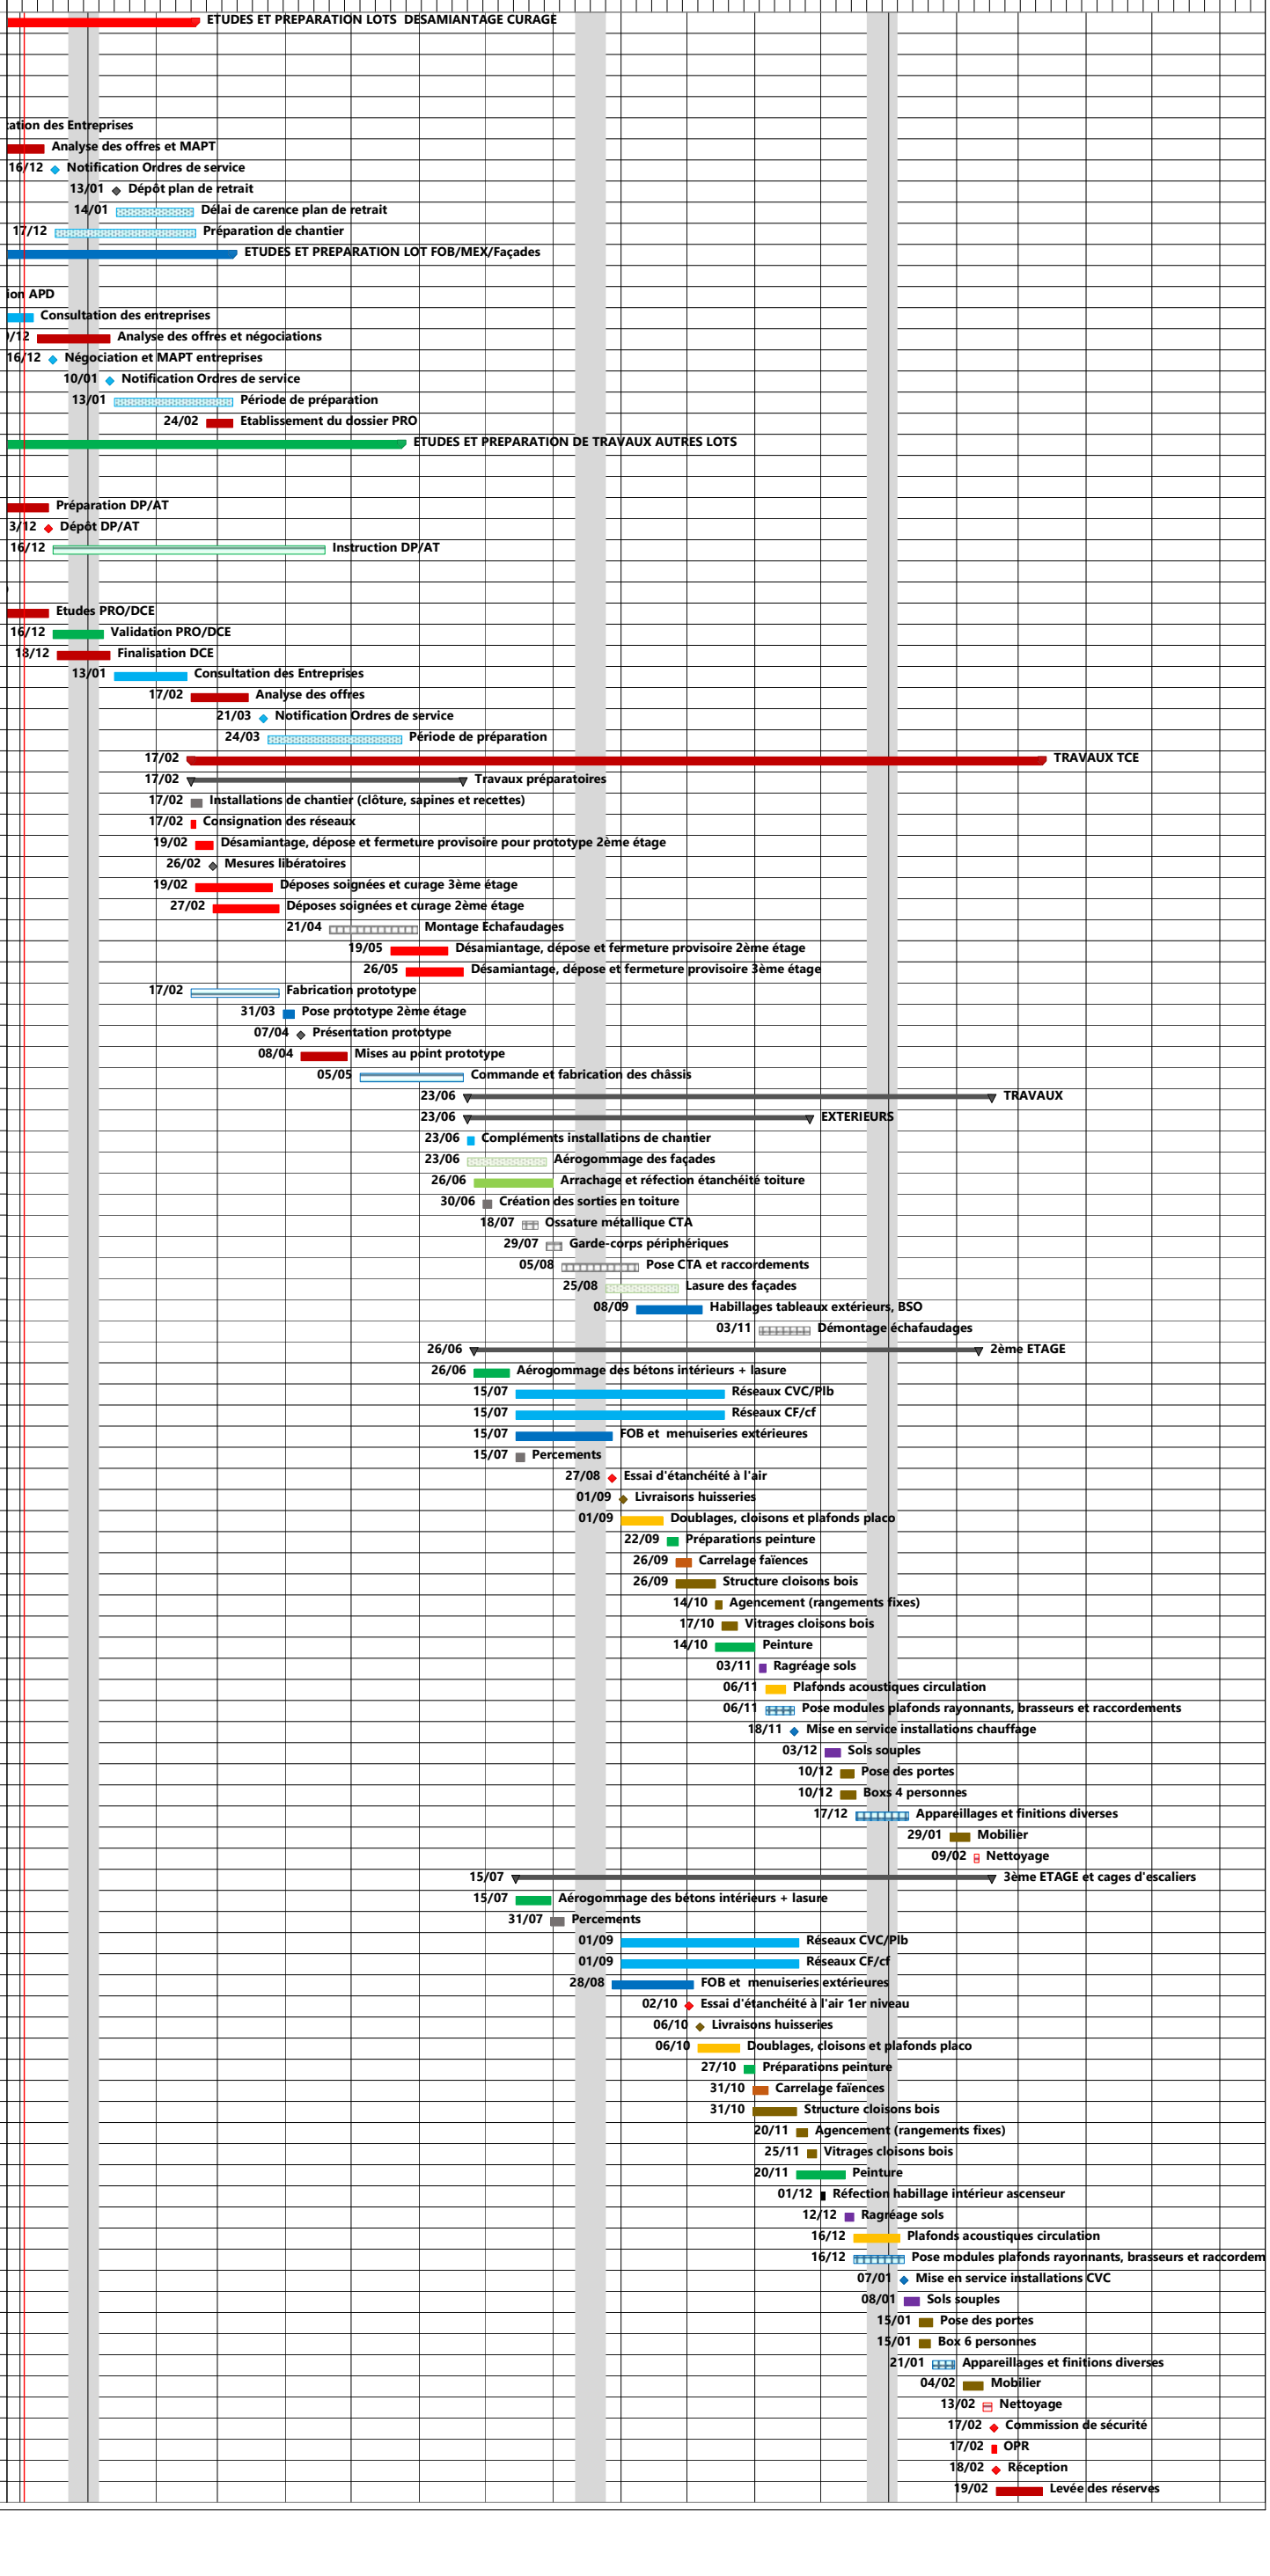
N°	Nom de la tâche	Durée
1	ETUDES ET PREPARATION LOTS DESAMIANTAGE CURAGE	132 jours
2	APD	20 jours
3	Validation APD	10 jours
4	Etudes PRO/DCE	20 jours
5	Validation PRO/DCE	5 jours
6	Consultation des Entreprises	25 jours
7	Analyse des offres et MAPT	28 jours
8	Notification Ordres de service	0 jour
9	Dépôt plan de retrait	0 jour
10	Délai de carence plan de retrait	25 jours
11	Préparation de chantier	36 jours
12	ETUDES ET PREPARATION LOT FOB/MEX/Façades	145 jours
13	APD	55 jours
14	Validation APD	10 jours
15	Consultation des entreprises	25 jours
16	Analyse des offres et négociations	15 jours
17	Négociation et MAPT entreprises	0 jour
18	Notification Ordres de service	0 jour
19	Période de préparation	40 jours
20	Etablissement du dossier PRO	10 jours
21	ETUDES ET PREPARATION DE TRAVAUX AUTRES LOTS	225 jours
22	Etudes/APS	25 jours
23	Validation APS	10 jours
24	Préparation DP/AT	80 jours
25	Dépôt DP/AT	0 jour
26	Instruction DP/AT	80 jours
27	APD	30 jours
28	Validation APD	10 jours
29	Etudes PRO/DCE	45 jours
30	Validation PRO/DCE	7 jours
31	Finalisation DCE	8 jours
32	Consultation des Entreprises	25 jours
33	Analyse des offres	20 jours
34	Notification Ordres de service	0 jour
35	Période de préparation	45 jours
36	TRAVAUX TCE	255 jours
37	**Travaux préparatoires**	**90 jours**
38	Installations de chantier (clôture, sapines et recettes)	5 jours
39	Consignation des réseaux	2 jours
40	Désamiantage, dépose et fermeture provisoire pour prototype 2ème étage	6 jours
41	Mesures libératoires	0 jour
42	Déposes soignées et curage 3ème étage	25 jours
43	Déposes soignées et curage 2ème étage	22 jours
44	Montage Echafaudages	30 jours
45	Désamiantage, dépose et fermeture provisoire 2ème étage	20 jours
46	Désamiantage, dépose et fermeture provisoire 3ème étage	20 jours
47	Fabrication prototype	30 jours
48	Pose prototype 2ème étage	5 jours
49	Présentation prototype	0 jour
50	Mises au point prototype	15 jours
51	Commande et fabrication des châssis	35 jours
52	**TRAVAUX**	**148 jours**
53	**EXTERIEURS**	**99 jours**
54	Compléments installations de chantier	3 jours
55	Aérogommage des façades	25 jours
56	Arrachage et réfection étanchéité toiture	25 jours
57	Création des sorties en toiture	4 jours
58	Ossature métallique CTA	5 jours
59	Garde-corps périphériques	5 jours
60	Pose CTA et raccordements	15 jours
61	Lasure des façades	25 jours
62	Habillages tableaux extérieurs, BSO	22 jours
63	Démontage échafaudages	15 jours
64	**2ème ETAGE**	**141 jours**
65	Aérogommage des bétons intérieurs + lasure	12 jours
66	Réseaux CVC/Plb	59 jours
67	Réseaux CF/cf	59 jours
68	FOB et menuiseries extérieures	22 jours
69	Percements	4 jours
70	Essai d'étanchéité à l'air	0 jour
71	Livraisons huisseries	0 jour
72	Doublages, cloisons et plafonds placo	15 jours
73	Préparations peinture	5 jours
74	Carrelage faïences	5 jours
75	Structure cloisons bois	12 jours
76	Agencement (rangements fixes)	3 jours
77	Vitrages cloisons bois	5 jours
78	Peinture	14 jours
79	Ragréage sols	3 jours
80	Plafonds acoustiques circulation	5 jours
81	Pose modules plafonds rayonnants, brasseurs et raccordements	7 jours
82	Mise en service installations chauffage	0 jour
83	Sols souples	5 jours
84	Pose des portes	4 jours
85	Boxs 4 personnes	5 jours
86	Appareillages et finitions diverses	8 jours
87	Mobilier	7 jours
88	Nettoyage	2 jours
89	**3ème ETAGE et cages d'escaliers**	**133 jours**
90	Aérogommage des bétons intérieurs + lasure	12 jours
91	Percements	4 jours
92	Réseaux CVC/Plb	57 jours
93	Réseaux CF/cf	57 jours
94	FOB et menuiseries extérieures	27 jours
95	Essai d'étanchéité à l'air 1er niveau	0 jour
96	Livraisons huisseries	0 jour
97	Doublages, cloisons et plafonds placo	15 jours
98	Préparations peinture	5 jours
99	Carrelage faïences	5 jours
100	Structure cloisons bois	12 jours
101	Agencement (rangements fixes)	3 jours
102	Vitrages cloisons bois	4 jours
103	Peinture	16 jours
104	Réfection habillage intérieur ascenseur	2 jours
105	Ragréage sols	2 jours
106	Plafonds acoustiques circulation	5 jours
107	Pose modules plafonds rayonnants, brasseurs et raccordements	7 jours
108	Mise en service installations CVC	0 jour
109	Sols souples	5 jours
110	Pose des portes	4 jours
111	Box 6 personnes	3 jours
112	Appareillages et finitions diverses	8 jours
113	Mobilier	7 jours
114	Nettoyage	2 jours
115	Commission de sécurité	0 jour
116	OPR	2 jours
117	Réception	0 jour
118	Levée des réserves	15 jours
