005 - LA VALBONNE

SEO

IM2S
1bis Avenue François Adam
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		**Projet SEO VALENCE**	**41 jrs**	**Mar 28/04/26**	**Mar 30/06/26**	
2		**Installation de chantier**	**2 jrs**	**Mar 28/04/26**	**Mer 29/04/26**	
3		Installation de la base vie	1 jr	Mar 28/04/26	Mar 28/04/26	
4		Mise en place des barrières HERAS et protections du chantier	1 jr	Mer 29/04/26	Mer 29/04/26	3
5		**Phase 1**	**35 jrs**	**Jeu 30/04/26**	**Mer 24/06/26**	**4**
6		**Démolition**	**4 jrs**	**Jeu 30/04/26**	**Mer 06/05/26**	
7		Mise en sécurité électrique de la station	1 jr	Jeu 30/04/26	Jeu 30/04/26	
8		Nettoyage / Dégazage des cuves et tuyauteries existantes (Mise en sécurité de la station)	3 jrs	Jeu 30/04/26	Mar 05/05/26	4
9		Démolition d'îlot	1 jr	Mer 06/05/26	Mer 06/05/26	8
10		**Réservoir**	**18 jrs**	**Mer 06/05/26**	**Jeu 04/06/26**	
11		Adéquation de stockage	1 jr	Mer 06/05/26	Mer 06/05/26	8
12		Inspection interne des cuves	5 jrs	Jeu 07/05/26	Lun 18/05/26	11
13		Réhaussement des regards de trous d'homme	7 jrs	Mar 19/05/26	Jeu 28/05/26	12
14		Reprise peinture et étanchéité des trous d'homme	5 jrs	Ven 29/05/26	Jeu 04/06/26	13
15		Mise en place des équipements des plateaux de trous d'homme	1 jr	Jeu 07/05/26	Jeu 07/05/26	11
16		**Réseaux**	**6 jrs**	**Ven 05/06/26**	**Ven 12/06/26**	
17		Remplacement des SHY	3 jrs	Ven 05/06/26	Mar 09/06/26	14
18		Mise en place des fourreaux électrique et AEP	2 jrs	Mer 10/06/26	Jeu 11/06/26	17
19		Mise en place de la tuyauteries (distributeurs)	1 jr	Ven 12/06/26	Ven 12/06/26	18
20		**Distribution et local technique**	**7 jrs**	**Lun 15/06/26**	**Mar 23/06/26**	
21		Pose chaises des distributeur et remontées de tuyauteries	2 jrs	Lun 15/06/26	Mar 16/06/26	19
22		Pose des appareils de distribution et du bulk AdBlue	2 jrs	Mer 17/06/26	Jeu 18/06/26	21
23		Déplacement des unités de détection de fuite de l'aire de lavage et tirage des différents câbles	2 jrs	Ven 19/06/26	Lun 22/06/26	22
24		Réfection d'îlot	1 jr	Mar 23/06/26	Mar 23/06/26	23
25		**Auvent**	**4 jrs**	**Jeu 07/05/26**	**Mer 13/05/26**	
26		Remplacement de l'éclairage	3 jrs	Jeu 07/05/26	Mar 12/05/26	9
27		Mis en place de la signalétique SEO	1 jr	Mer 13/05/26	Mer 13/05/26	26
28		**Travaux voirie**	**1 jr**	**Mer 24/06/26**	**Mer 24/06/26**	
29		Mise en place de la signalisation horizontale et verticale	1 jr	Mer 24/06/26	Mer 24/06/26	24
30		**Tests et essais**	**1 jr**	**Ven 19/06/26**	**Ven 19/06/26**	
31		Tests et essais de bon fonctionnement des tuyauteries	1 jr	Ven 19/06/26	Ven 19/06/26	22
32		Tests et essais de bon fonctionnement électrique	1 jr	Ven 19/06/26	Ven 19/06/26	22
33		**Préparation à la réception du chantier**	**1 jr**	**Lun 22/06/26**	**Lun 22/06/26**	
34		Déplacement des clôtures de chantier phase 1 vers phase 2	1 jr	Lun 22/06/26	Lun 22/06/26	32
35		**Phase 2**	**6 jrs**	**Mar 23/06/26**	**Mar 30/06/26**	**4**
36		**Démolition**	**1 jr**	**Mar 23/06/26**	**Mar 23/06/26**	
37		Mise en sécurité électrique de la station	1 jr	Mar 23/06/26	Mar 23/06/26	34
38		Nettoyage / Dégazage des cuves et tuyauteries existantes (Mise en sécurité de la station)	1 jr	Mar 23/06/26	Mar 23/06/26	34
39		**Réseaux**	**2 jrs**	**Mer 24/06/26**	**Jeu 25/06/26**	
40		Ajout dispositif de sécurité sur Satelitte	2 jrs	Mer 24/06/26	Jeu 25/06/26	38
41		**Auvent**	**1 jr**	**Ven 26/06/26**	**Ven 26/06/26**	
42		Mis en place de la signalétique SEO	1 jr	Ven 26/06/26	Ven 26/06/26	40
43		**Travaux voirie**	**1 jr**	**Ven 26/06/26**	**Ven 26/06/26**	
44		Mise en place de la signalisation horizontale et verticale	1 jr	Ven 26/06/26	Ven 26/06/26	40
45		**Tests et essais**	**1 jr**	**Ven 26/06/26**	**Ven 26/06/26**	
46		Tests et essais de bon fonctionnement des tuyauteries	1 jr	Ven 26/06/26	Ven 26/06/26	40
47		Tests et essais de bon fonctionnement électrique	1 jr	Ven 26/06/26	Ven 26/06/26	40
48		**Préparation à la réception du chantier**	**2 jrs**	**Lun 29/06/26**	**Mar 30/06/26**	
49		Retrait des clôtures de chantier phase 2 et base vie	1 jr	Lun 29/06/26	Lun 29/06/26	47
50		Nettoyage général	1 jr	Mar 30/06/26	Mar 30/06/26	49

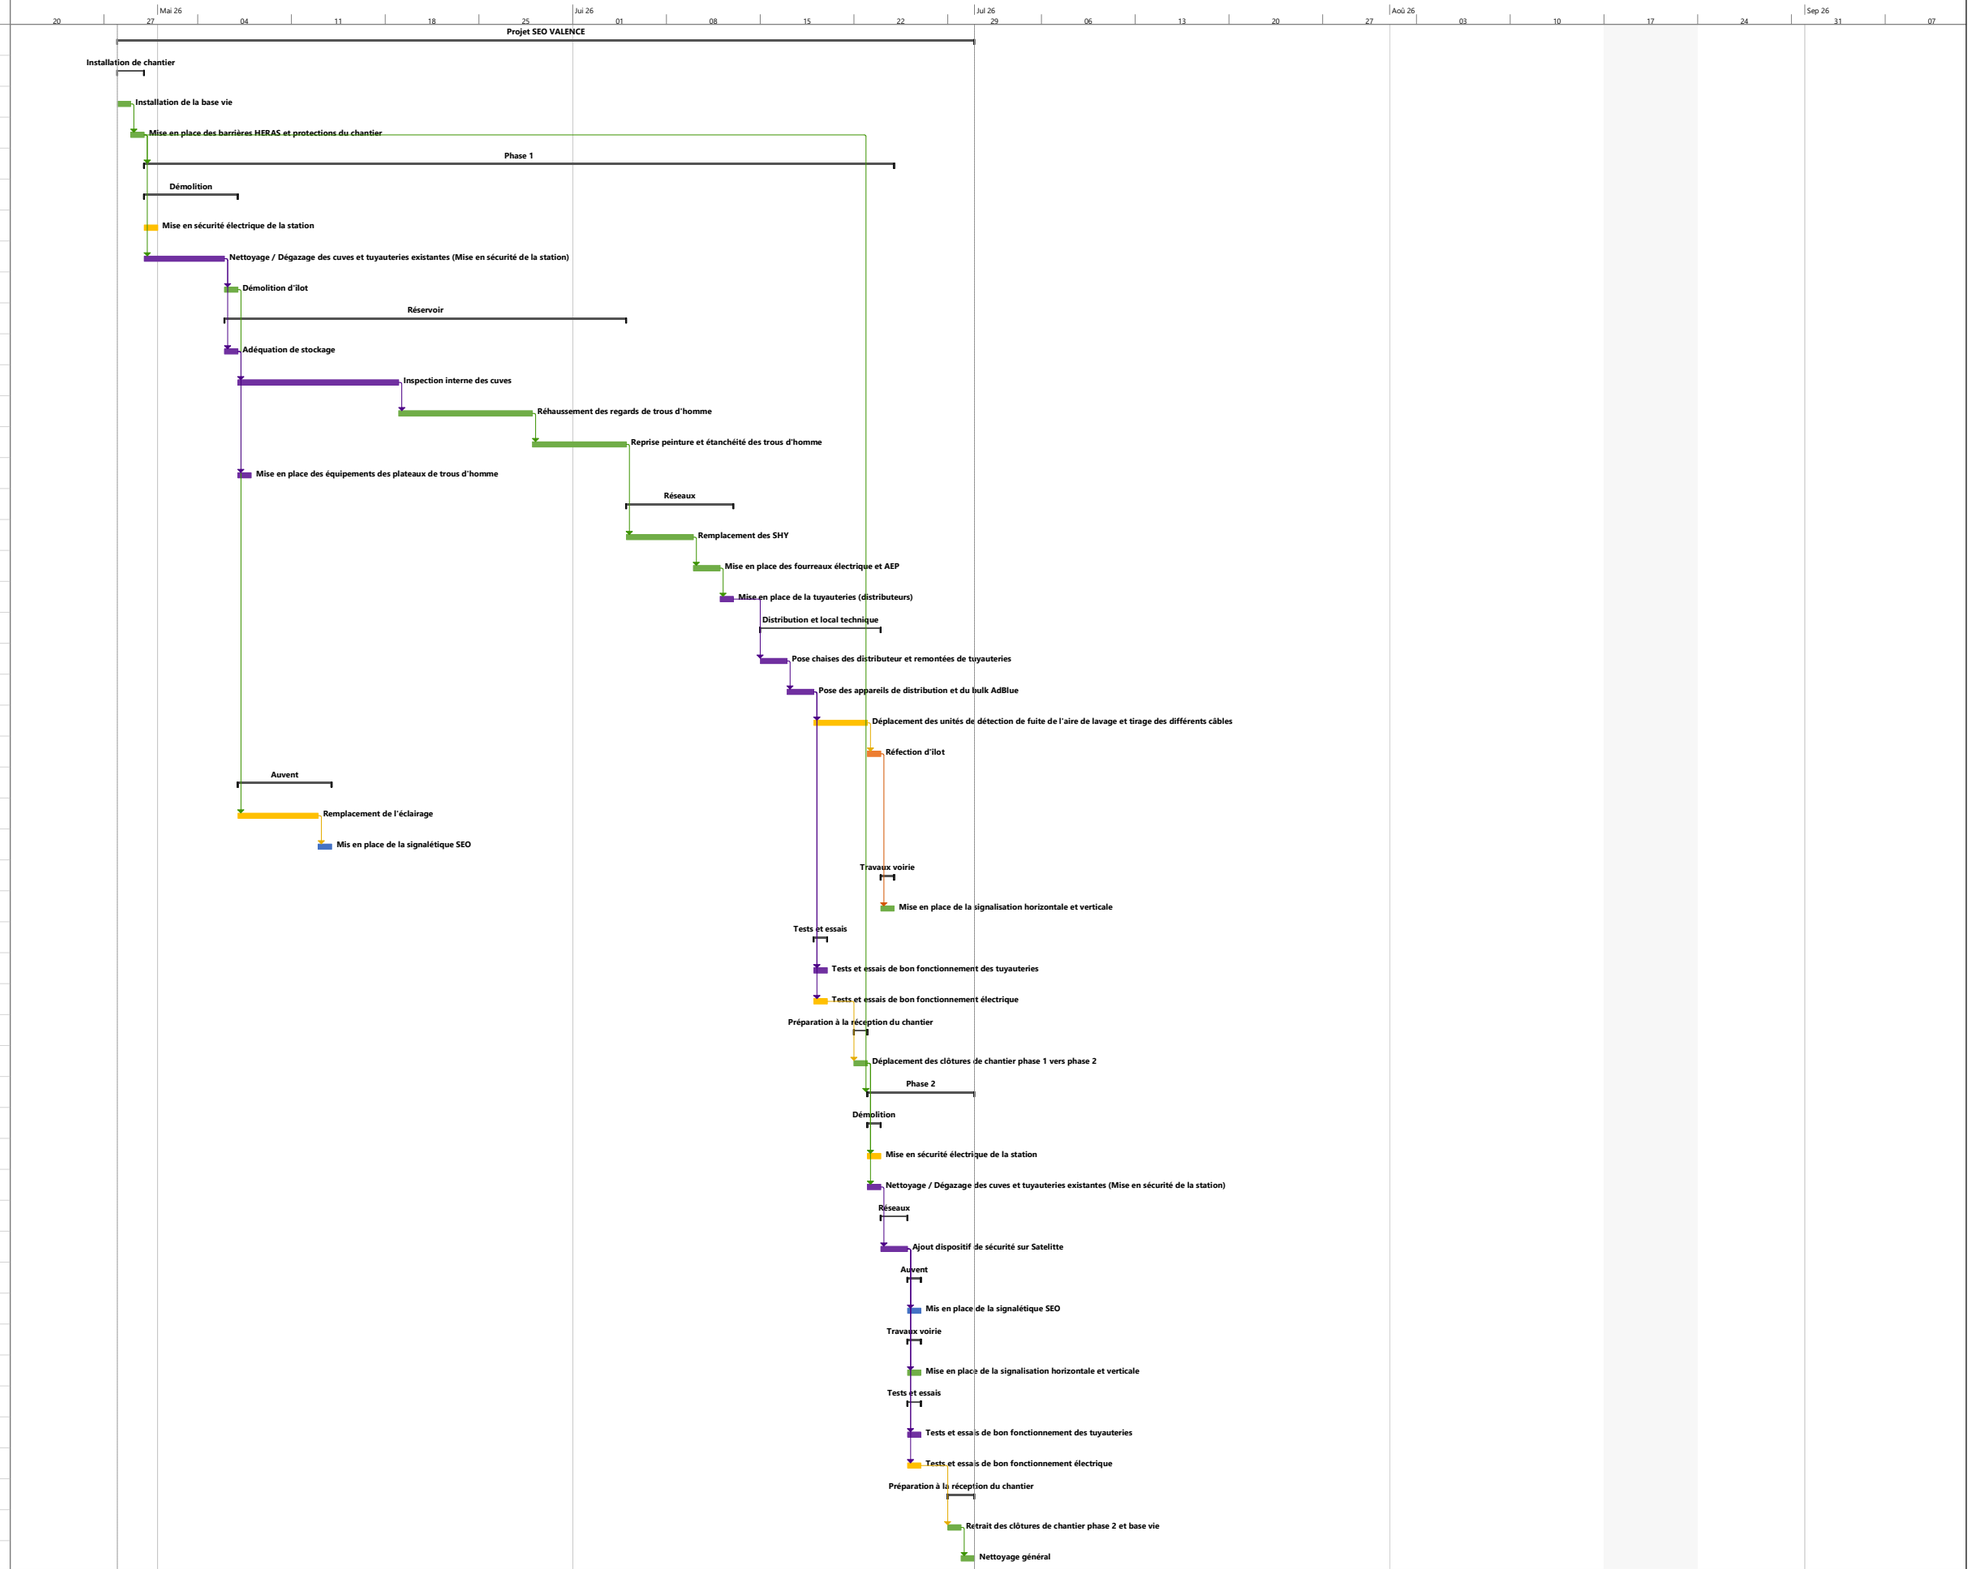

Projet : MsProject - Base
Date : Jeu 30/10/25

Tâche — Jalon — Récapitulatif du projet — Jalon inactif — Tâche manuelle — Report récapitulatif manuel — Début uniquement — Tâches externes — Échéance — Progression manuelle
Fractionnement — Récapitulative — Tâche inactive — Récapitulatif inactif — Durée uniquement — Récapitulatif manuel — Fin uniquement — Jalons externes — Avancement
