133 - LYON

SEO

IM2S
voir & sécuriser l'ingénierie
1bis Avenue François Adam
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

N°	Mo	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		**Projet SEO LYON**	**53 jrs**	**Lun 24/08/26**	**Jeu 12/11/26**	
2		**Installation de chantier**	**2 jrs**	**Lun 24/08/26**	**Mar 25/08/26**	
3		Installation de la base vie	1 jr	Lun 24/08/26	Lun 24/08/26	
4		Mise en place des barrières HERAS et protections du chantier	1 jr	Mar 25/08/26	Mar 25/08/26	3
5		**Démolition**	**10 jrs**	**Mer 26/08/26**	**Mar 08/09/26**	
6		Mise en sécurité électrique de la station	1 jr	Mer 26/08/26	Mer 26/08/26	4
7		Nettoyage / Dégazage des cuves et tuyauteries existantes (Mise en sécurité de la station)	1 jr	Mer 26/08/26	Mer 26/08/26	4
8		Démolition des regards de trous d'hommes	3 jrs	Jeu 27/08/26	Lun 31/08/26	7
9		Dépose de l'ensemble du matériel sur piste (distributeurs, tête d'affiche, etc.)	3 jrs	Mar 01/09/26	Jeu 03/09/26	8
10		Dépose du local technique	1 jr	Mar 01/09/26	Mar 01/09/26	8
11		Dépose de l'ensemble des réseaux (assainissement, électricité, télécom)	3 jrs	Mer 02/09/26	Ven 04/09/26	10
12		Démolition des pistes	2 jrs	Lun 07/09/26	Mar 08/09/26	11
13		**Terrassement**	**3 jrs**	**Lun 14/09/26**	**Mer 16/09/26**	
14		Réalisation des tranchées pour tuyauteries, fourreaux et assainissement	3 jrs	Lun 14/09/26	Mer 16/09/26	23
15		**Réservoir**	**13 jrs**	**Ven 04/09/26**	**Mar 22/09/26**	
16		Mise en place des équipements des plateaux de trous d'homme	6 jrs	Ven 04/09/26	Ven 11/09/26	9
17		Mise en place des cheminées de trous d'homme	7 jrs	Lun 14/09/26	Mar 22/09/26	16
18		**Réseaux**	**11 jrs**	**Jeu 17/09/26**	**Jeu 01/10/26**	
19		Réalisation de l'assainissement (canalisation, SHY, regards, etc.)	1 jr	Jeu 17/09/26	Jeu 17/09/26	14
20		Mise en place des fourreaux électrique et AEP	3 jrs	Ven 18/09/26	Mar 22/09/26	19
21		Mise en place de la tuyauteries (cuve, distributeurs, évent)	7 jrs	Mer 23/09/26	Jeu 01/10/26	17
22		**Distribution et local technique**	**38 jrs**	**Mer 09/09/26**	**Ven 06/11/26**	
23		Réalisation du vide-sanitaire et dalle sous le local technique	3 jrs	Mer 09/09/26	Ven 11/09/26	12
24		Réalisation des îlots y compris musoirs	6 jrs	Ven 18/09/26	Ven 25/09/26	19
25		Pose chaises des distributeur et remontées de tuyauteries	3 jrs	Mer 23/09/26	Ven 25/09/26	24FF
26		Réalisation du dépotage et soutirage et remontée de tuyauteries	3 jrs	Ven 02/10/26	Mar 06/10/26	21
27		Réalisation massif event et remontée de tuyauteries	2 jrs	Mer 07/10/26	Jeu 08/10/26	26
28		Mise en place du système incendie	2 jrs	Lun 28/09/26	Mar 29/09/26	24
29		Réalisation de la dalle de piste et de dépotage	5 jrs	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26	34
30		Pose des appareils de distribution et du bulk AdBlue	4 jrs	Lun 26/10/26	Jeu 29/10/26	29FD+5 jrs
31		Réalisation du local technique y compris ensemble des équipements intérieur	15 jrs	Lun 19/10/26	Ven 06/11/26	29
32		**Auvent**	**3 jrs**	**Mer 30/09/26**	**Ven 02/10/26**	
33		Mise en place éclairage	2 jrs	Mer 30/09/26	Jeu 01/10/26	28
34		Mis en place de la signalétique SEO	1 jr	Ven 02/10/26	Ven 02/10/26	33
35		**Tests et essais**	**8 jrs**	**Ven 30/10/26**	**Mar 10/11/26**	
36		Tests et essais de bon fonctionnement des tuyauteries	2 jrs	Ven 30/10/26	Lun 02/11/26	30
37		Tests et essais de bon fonctionnement électrique	2 jrs	Lun 09/11/26	Mar 10/11/26	31
38		**Préparation à la réception du chantier**	**1 jr**	**Jeu 12/11/26**	**Jeu 12/11/26**	
39		Retrait des clôtures de chantier	1 jr	Jeu 12/11/26	Jeu 12/11/26	37
40		Nettoyage général	1 jr	Jeu 12/11/26	Jeu 12/11/26	37

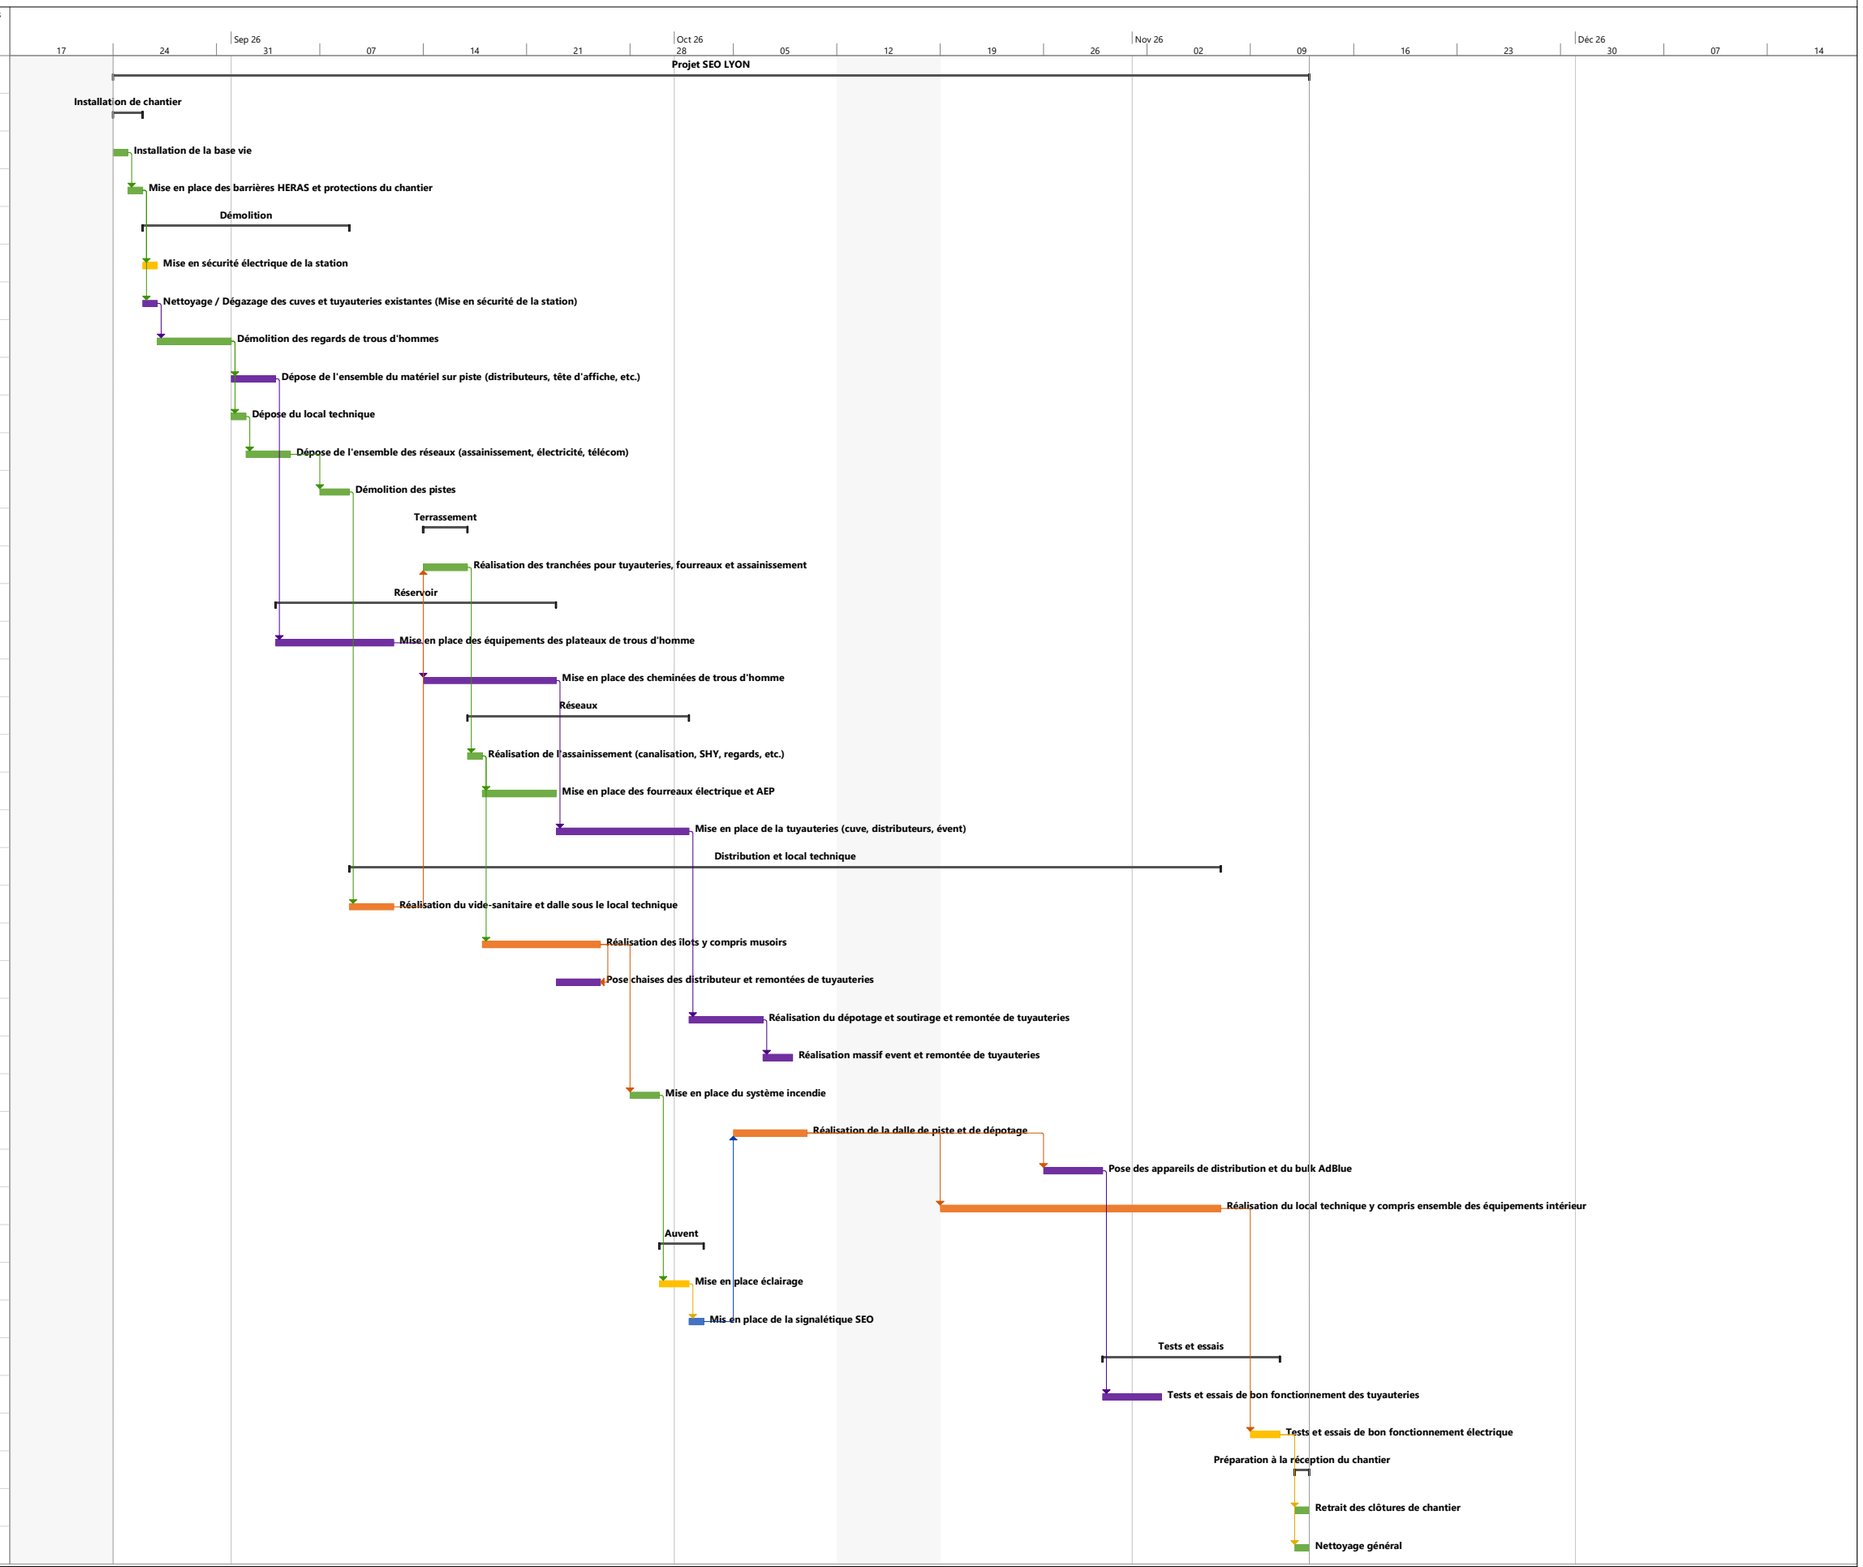

Projet : MsProject - Base
Date : Jeu 30/10/25

Tâche · Fractionnement · Jalon · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâche inactive · Jalon inactif · Récapitulatif inactif · Tâche manuelle · Durée uniquement · Report récapitulatif manuel · Récapitulatif manuel · Début uniquement · Fin uniquement · Tâches externes · Jalons externes · Échéance · Avancement · Progression manuelle
