124 - GAP

SEO

IM2S
1bis Avenue François Adam
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		**Projet SEO GAP**	**70 jrs**	**Mar 28/04/26**	**Mer 12/08/26**	
2		**Installation de chantier**	**2 jrs**	**Mar 28/04/26**	**Mer 29/04/26**	
3		Installation de la base vie	1 jr	Mar 28/04/26	Mar 28/04/26	
4		Mise en place des barrières HERAS et protections du chantier	1 jr	Mer 29/04/26	Mer 29/04/26	3
5		**Démolition**	**14 jrs**	**Jeu 30/04/26**	**Mar 26/05/26**	
6		Mise en sécurité électrique de la station	1 jr	Jeu 30/04/26	Jeu 30/04/26	4
7		Nettoyage / Dégazage des cuves et tuyauteries existantes (Mise en sécurité de la station)	1 jr	Jeu 30/04/26	Jeu 30/04/26	4
8		Extraction des cuves existantes	4 jrs	Lun 04/05/26	Jeu 07/05/26	7
9		Dépose de l'ensemble du matériel sur piste VL et PL (distributeurs, tête d'affiche, etc.)	2 jrs	Lun 11/05/26	Mar 12/05/26	8
10		Dépose du local technique	1 jr	Lun 11/05/26	Lun 11/05/26	8
11		Dépose de l'ensemble des réseaux (assainissement, électricité, télécom)	4 jrs	Mar 12/05/26	Mar 19/05/26	10
12		Démolition des pistes	3 jrs	Mer 20/05/26	Ven 22/05/26	11
13		Démolition de chaussée	1 jr	Mar 26/05/26	Mar 26/05/26	12
14		**Terrassement**	**13 jrs**	**Mer 27/05/26**	**Ven 12/06/26**	
15		Terrassement Cuve	2 jrs	Mer 27/05/26	Jeu 28/05/26	13
16		Terrassement Plateforme	2 jrs	Lun 01/06/26	Mar 02/06/26	21
17		Réalisation des tranchées pour tuyauteries, fourreaux et assainissement	4 jrs	Mar 09/06/26	Ven 12/06/26	29
18		**Réservoir**	**12 jrs**	**Ven 29/05/26**	**Lun 15/06/26**	
19		Mise en place des réservoirs	1 jr	Ven 29/05/26	Ven 29/05/26	15
20		Réalisation du radier béton	1 jr	Ven 29/05/26	Ven 29/05/26	15
21		Remblaiement jusqu'au trou d'homme en sable Ph Neutre	1 jr	Ven 29/05/26	Ven 29/05/26	15
22		Mise en place des équipements des plateaux de trous d'homme	5 jrs	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26	21
23		Mise en place des cheminées de trous d'homme	6 jrs	Lun 08/06/26	Lun 15/06/26	22
24		**Réseaux**	**7 jrs**	**Lun 15/06/26**	**Mar 23/06/26**	
25		Réalisation de l'assainissement (canalisation, SHY, regards, etc.)	3 jrs	Lun 15/06/26	Mer 17/06/26	17
26		Mise en place des fourreaux électrique et AEP	4 jrs	Jeu 18/06/26	Mar 23/06/26	25
27		Mise en place de la tuyauteries (cuve, distributeurs, évent)	6 jrs	Mar 16/06/26	Mar 23/06/26	23
28		**Distribution et local technique**	**47 jrs**	**Mer 03/06/26**	**Lun 10/08/26**	
29		Réalisation du vide-sanitaire et dalle sous les locaux techniques	4 jrs	Mer 03/06/26	Lun 08/06/26	16
30		Réalisation des îlots y compris musoirs	10 jrs	Jeu 18/06/26	Mer 01/07/26	25
31		Pose chaises des distributeur et remontées de tuyauteries	2 jrs	Mar 30/06/26	Mer 01/07/26	30FF
32		Réalisation du dépotage et soutirage et remontée de tuyauteries	3 jrs	Mer 24/06/26	Ven 26/06/26	27
33		Réalisation massif event et remontée de tuyauteries	2 jrs	Lun 29/06/26	Mar 30/06/26	32
34		Mise en place de gravillon au-dessus du réservoir	2 jrs	Mer 01/07/26	Jeu 02/07/26	33
35		Mise en place du système incendie	2 jrs	Jeu 02/07/26	Ven 03/07/26	30
36		Réalisation de la dalle de piste et de dépotage	4 jrs	Jeu 09/07/26	Jeu 16/07/26	41
37		Pose des appareils de distribution et du bulk AdBlue	5 jrs	Ven 24/07/26	Jeu 30/07/26	36FD+5 jrs
38		Réalisation des locaux techniques y compris ensemble des équipements intérieur	17 jrs	Ven 17/07/26	Lun 10/08/26	36
39		**Auvent**	**3 jrs**	**Lun 06/07/26**	**Mer 08/07/26**	
40		Mise en place éclairage	2 jrs	Lun 06/07/26	Mar 07/07/26	35
41		Mis en place de la signalétique SEO	1 jr	Mer 08/07/26	Mer 08/07/26	40
42		**Travaux voirie**	**5 jrs**	**Ven 17/07/26**	**Jeu 23/07/26**	
43		Réalisation de la voirie	3 jrs	Ven 17/07/26	Mar 21/07/26	36
44		Mise en place de la signalisation horizontale et verticale	2 jrs	Mer 22/07/26	Jeu 23/07/26	43
45		**Tests et essais**	**8 jrs**	**Ven 31/07/26**	**Mar 11/08/26**	
46		Tests et essais de bon fonctionnement des tuyauteries	1 jr	Ven 31/07/26	Ven 31/07/26	37
47		Tests et essais de bon fonctionnement électrique	1 jr	Mar 11/08/26	Mar 11/08/26	38
48		**Préparation à la réception du chantier**	**1 jr**	**Mer 12/08/26**	**Mer 12/08/26**	
49		Retrait des clôtures de chantier	1 jr	Mer 12/08/26	Mer 12/08/26	47
50		Nettoyage général	1 jr	Mer 12/08/26	Mer 12/08/26	47

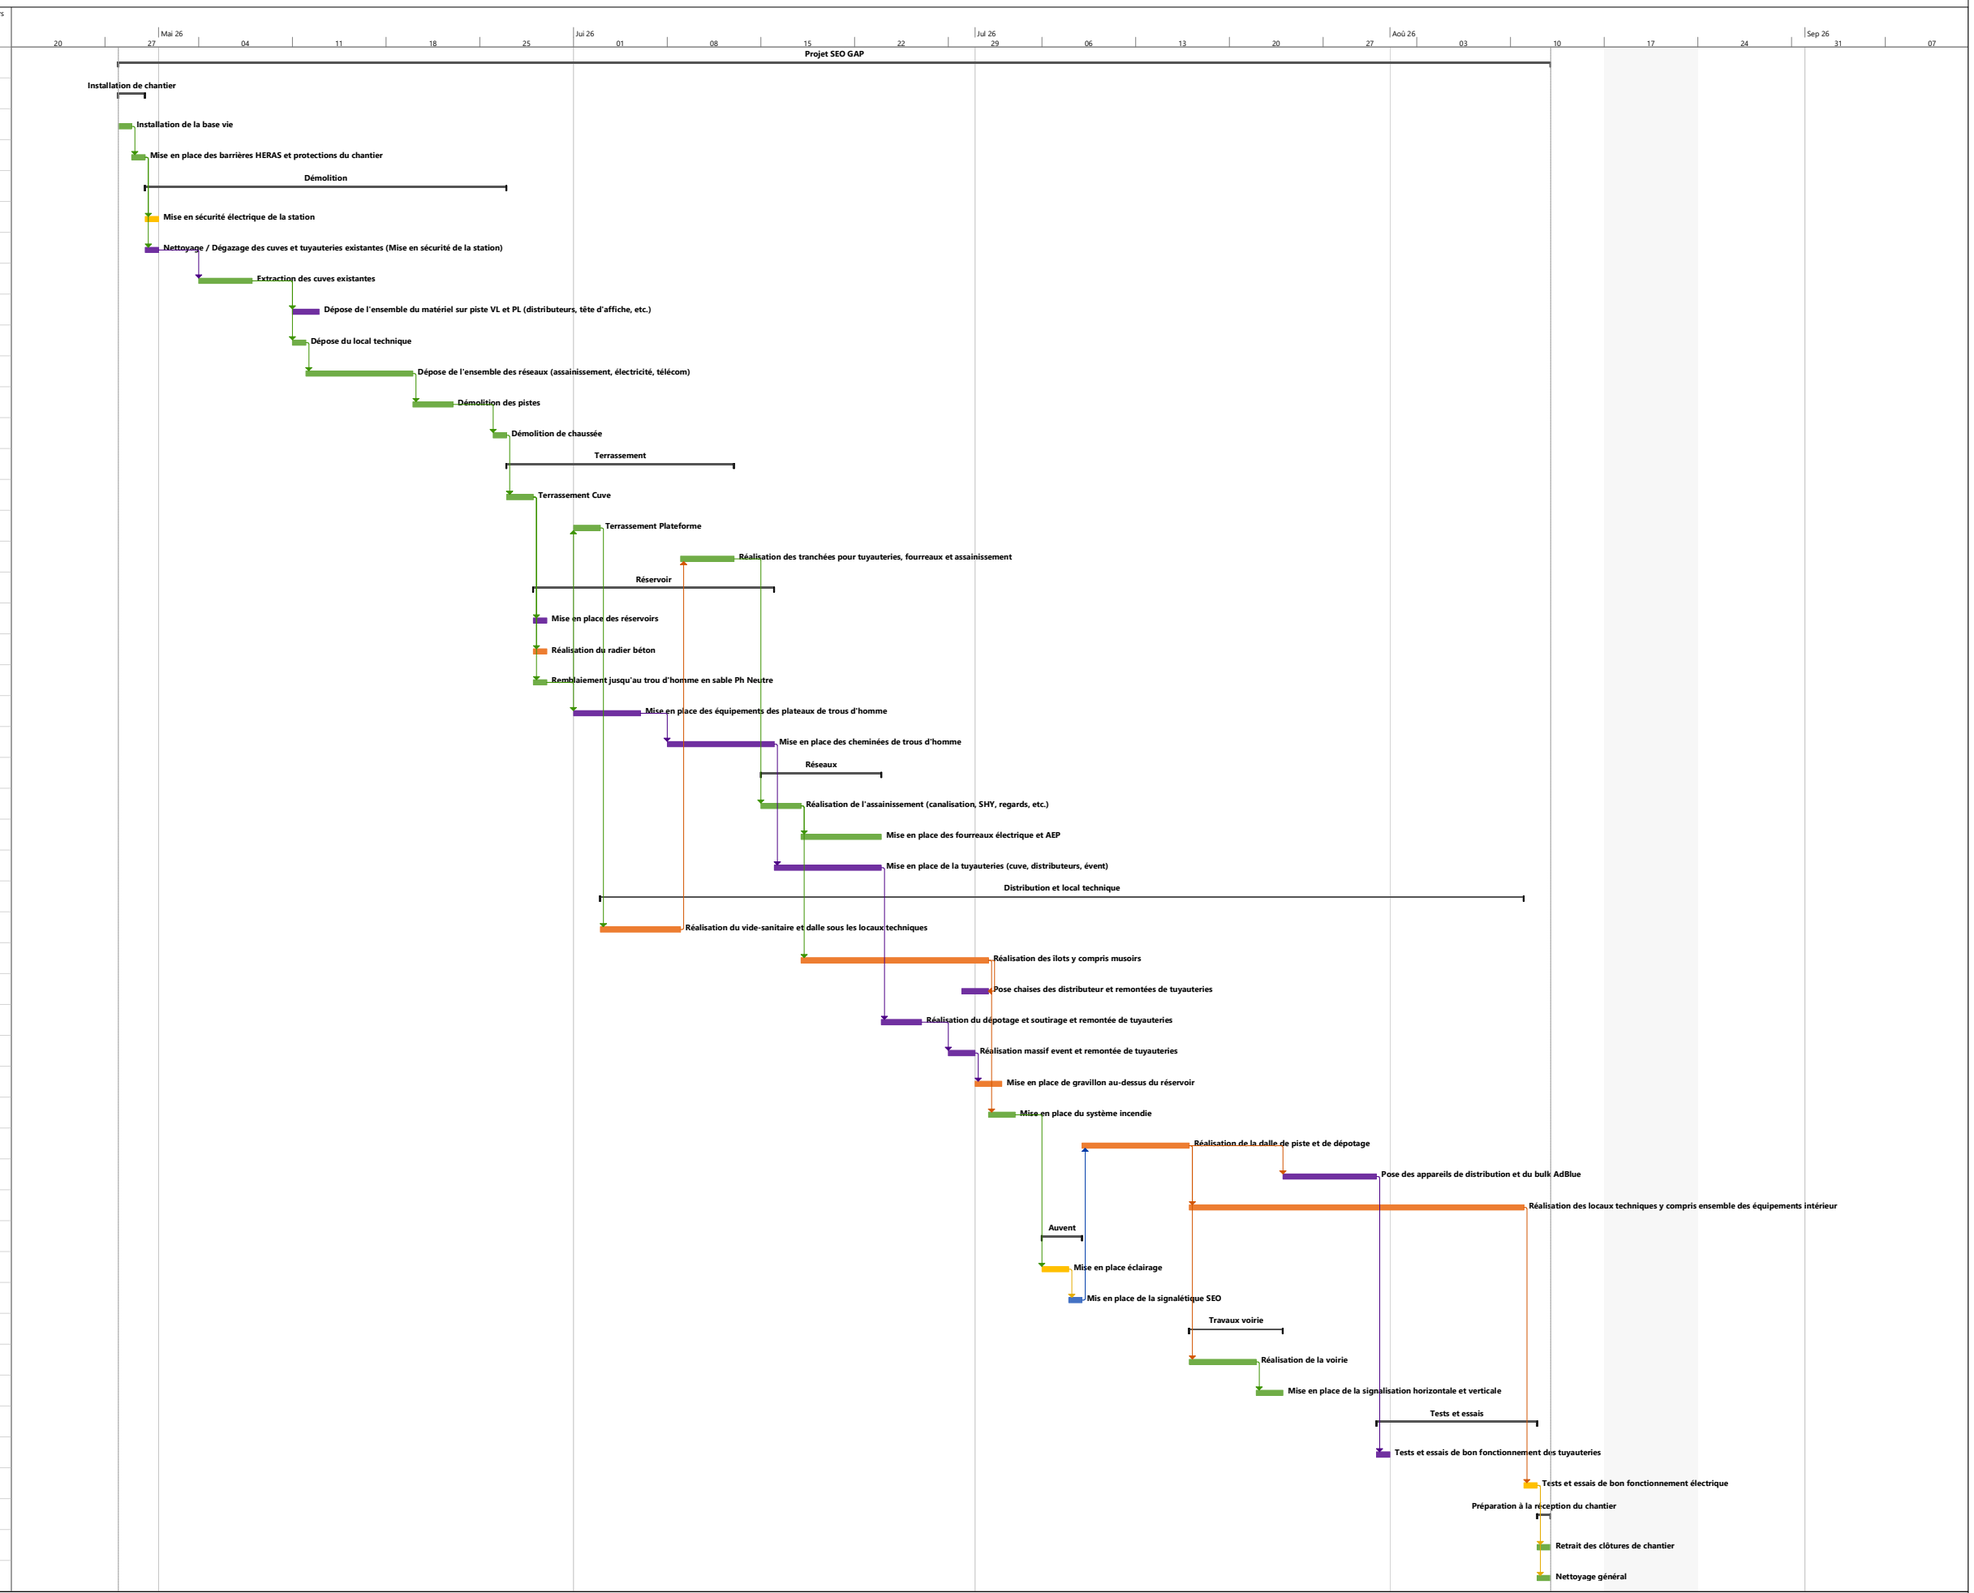

Projet : MsProject - Base
Date : Jeu 30/10/25

Tâche · Fractionnement · Jalon · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâche inactive · Jalon inactif · Récapitulatif inactif · Tâche manuelle · Durée uniquement · Report récapitulatif manuel · Récapitulatif manuel · Début uniquement · Fin uniquement · Tâches externes · Jalons externes · Échéance · Avancement · Progression manuelle
